

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre							
								3 diciembre	1 septiembre	11 mayo	18 enero	7 septiembre	05 junio	12 febrero	22 octubre
1			CRONOGRAMAS COMPRAS 2015	278,5 días	lun 08/12/14	lun 08/02/16									
2			LICITACIONES PÚBLICAS	260,5 días	vie 12/12/14	mar 19/01/16									
3			2015LN-000001-503"USG_Contratación de Servicios de limpieza (Vence 08/06/2015)" \$100,000.000,00	234,5 días	vie 12/12/14	jue 26/11/15									
4			Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	vie 12/12/14	vie 12/12/14									
5			Confección Documento complementario al cartel	23 días	vie 12/12/14	mar 27/01/15									
6			Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	vie 12/12/14	jue 18/12/14	4								
7			Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	vie 19/12/14	vie 09/01/15	6								
8			Revisión Técnica de cartel	7 días	lun 12/01/15	mar 20/01/15	7								
9			Incorporación de ajustes y confección de Documento complementario al cartel	5 días	mié 21/01/15	mar 27/01/15	8								
10			Invitación a participar	43 días	mié 28/01/15	vie 27/03/15									
11			Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de Mer	5 días	mié 28/01/15	mar 03/02/15	9								
12			Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	mié 04/02/15	mar 10/02/15	11								
13			Invitación a participar en Mer Link	1 día	mié 11/02/15	mié 11/02/15	12								
14			Plazo para recibir ofertas	32 días	jue 12/02/15	vie 27/03/15	13								
15			Recurso de Objeción al Cartel	32 días	mié 11/02/15	jue 26/03/15									
16			Presentacion de Objeción al cartel	10 días	mié 11/02/15	mar 24/02/15	13CC								
17			Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	mié 25/02/15	mié 25/02/15	16								
18			La DCA solicita expediente administrativo a la USP y solicita criterio técnico acerca	1 día	jue 26/02/15	jue 26/02/15	17								
19			Respuesta con el criterio de la UT a la USP para ser enviado a la DCA	3 días	vie 27/02/15	mar 03/03/15	18								
20			Remisión del criterio técnico a la DCA	1 día	mié 04/03/15	mié 04/03/15	19								
21			Confeccion de Resolucion a la Objecion	4 días	jue 05/03/15	mar 10/03/15	20								
22			Comunicación de Resolucion final por medio de Mer Link	1 día	mié 11/03/15	mié 11/03/15	21								
23			Nuevo plazo para recibir ofertas	22 días	mié 25/02/15	jue 26/03/15	16								
24			Recepción y estudio de ofertas	23 días	vie 27/03/15	jue 30/04/15									
25			Apertura de ofertas	1 día	vie 27/03/15	vie 27/03/15	23								
26			Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y téc	1 día	lun 30/03/15	lun 30/03/15	25								
27			Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respuestas;	5 días	mar 31/03/15	mié 08/04/15	26								
28			Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenciones	0 días	mié 08/04/15	mié 08/04/15	27								
29			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En Mer-Lir	5 días	jue 09/04/15	mié 15/04/15	28								
30			Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	mié 15/04/15	mié 15/04/15	29								
31			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	jue 16/04/15	lun 20/04/15	30								
32			Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	mar 21/04/15	jue 23/04/15	31								
33			Elaboración de Informe de recomendación (UT)	5 días	vie 24/04/15	jue 30/04/15	32								
34			Proceso de adjudicación	64 días	lun 30/03/15	mar 30/06/15									

Proyecto: Cronograma de compra

Fecha: mar 20/01/15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre								
								3 diciembre	4 septiembre	11 mayo	18 enero	7 septiembre	05 junio	12 febrero	22 octubre	
35			Fecha máxima para adjudicar	64 días	lun 30/03/15	mar 30/06/15	25									
36			Recomendación, adjudicación y comunicación	16 días	lun 04/05/15	lun 25/05/15										
37			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	lun 04/05/15	mié 06/05/15	33									
38			Sesión de la Comision de Adjduaciones	0,5 días	jue 07/05/15	jue 07/05/15	37									
39			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	jue 07/05/15	jue 07/05/15	38									
40			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	vie 08/05/15	vie 08/05/15	39									
41			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicación (Mer Link)	1 día	lun 11/05/15	lun 11/05/15	40									
42			Firmeza del acto de adjudicación	10 días	mar 12/05/15	lun 25/05/15	41									
43			Recurso de revocatoria o apelación (DCA)	90,5 días	mar 12/05/15	mié 16/09/15										
44			Plazo para recibir recurso (Art 174 RLCA)	10 días	mar 12/05/15	lun 25/05/15	41									
45			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisible (Art	10 días	mar 26/05/15	lun 08/06/15	44									
46			Notificacion al Adjudicatario y a la administración del recurso	1 día	mar 09/06/15	mar 09/06/15	45									
47			Plazo para recibir respuesta del adjudicatario y de la administración (Art182 RLCA)	10 días	mié 10/06/15	mar 23/06/15	46									
48			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria	40 días	mié 24/06/15	mar 18/08/15	47									
49			Notificacion de la resolución (Mer Link)	1 día	mié 19/08/15	mié 19/08/15	48									
50			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	5 días	jue 20/08/15	mié 26/08/15	49									
51			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	3 días	jue 27/08/15	lun 31/08/15	50									
52			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mar 01/09/15	mar 01/09/15	51									
53			Adjudicación en firme	10 días	mar 01/09/15	mié 16/09/15	44,52									
54			Trámite de contrato	37 días	mié 16/09/15	lun 09/11/15										
55			Elaboración del Contrato	5 días	mié 16/09/15	mié 23/09/15	53									
56			Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	mié 16/09/15	mié 16/09/15	55CC									
57			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía, etc)	5 días	mié 16/09/15	mié 23/09/15	56									
58			Firma de contrato oferente	1 día	mié 23/09/15	jue 24/09/15	53,57									
59			Envío de contrato para firma al Despacho contralor	1 día	jue 24/09/15	vie 25/09/15	58									
60			Firma de contrato despacho contralor	5 días	vie 25/09/15	vie 02/10/15	59									
61			Envío de contrato a refrendo contralor	0 días	vie 02/10/15	vie 02/10/15	58,60									
62			Refrendo del Contrato	25 días	vie 02/10/15	lun 09/11/15	61									
63			Comunicación a la (las) empresa del refendo del contrato y orden de inicio	0 días	lun 09/11/15	lun 09/11/15	62									
64			Trámite del Pedido	3 días	lun 09/11/15	jue 12/11/15										
65			Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	lun 09/11/15	mié 11/11/15	63									
66			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	mié 11/11/15	mié 11/11/15	65									
67			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	mié 11/11/15	jue 12/11/15	66									
68			Notificación de Pedido de Compra	0 días	jue 12/11/15	jue 12/11/15	67									
69			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	jue 12/11/15	jue 12/11/15	68									

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: mar 20/01/15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 2

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre							
								3 diciembre	1 septiembre	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio	12 febrero	22 octubre
70			Recepción de los items	4 días	jue 12/11/15	mié 18/11/15									
71			Entrega items en Almacén	1 día	jue 12/11/15	vie 13/11/15	69								
72			Recibido a satisfacción	3 días	vie 13/11/15	mié 18/11/15	71								
73			Fin recepción de items	0 días	mié 18/11/15	mié 18/11/15	72								
74			Trámite de pago	6 días	mié 18/11/15	jue 26/11/15									
75			Envio documentos a Financiero	1 día	mié 18/11/15	jue 19/11/15	73								
76			Emisión de pago en Financiero	5 días	jue 19/11/15	jue 26/11/15	75								
77			Conclusión trámite licitación	0 días	jue 26/11/15	jue 26/11/15	76								
78			2015LN-0000002-503"USG_Sistema contra incendios (Contratación a 01/07/15)" \$83,509.600,00	234,5 días	lun 02/02/15	mar 19/01/16									
79			Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	lun 02/02/15	lun 02/02/15									
80			Confección Documento complementario al cartel	23 días	lun 02/02/15	mié 04/03/15									
81			Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 02/02/15	vie 06/02/15	79								
82			Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	lun 09/02/15	lun 16/02/15	81								
83			Revisión Técnica de cartel	7 días	mar 17/02/15	mié 25/02/15	82								
84			Incorporación de ajustes y confección de Documento complementario al cartel	5 días	jue 26/02/15	mié 04/03/15	83								
85			Invitación a participar	43 días	jue 05/03/15	jue 07/05/15									
86			Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de Mer	5 días	jue 05/03/15	mié 11/03/15	84								
87			Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	jue 12/03/15	mié 18/03/15	86								
88			Invitación a participar en Mer Link	1 día	jue 19/03/15	jue 19/03/15	87								
89			Plazo para recibir ofertas	32 días	vie 20/03/15	jue 07/05/15	88								
90			Recurso de Objeción al Cartel	32 días	jue 19/03/15	mié 06/05/15									
91			Presentacion de Objeción al cartel	10 días	jue 19/03/15	mié 01/04/15	88CC								
92			Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	lun 06/04/15	lun 06/04/15	91								
93			La DCA solicita expediente administrativo a la USP y solicita criterio técnico acerca	1 día	mar 07/04/15	mar 07/04/15	92								
94			Respuesta con el criterio de la UT a la USP para ser enviado a la DCA	3 días	mié 08/04/15	vie 10/04/15	93								
95			Remisión del criterio técnico a la DCA	1 día	lun 13/04/15	lun 13/04/15	94								
96			Confeccion de Resolucion a la Objecion	4 días	mar 14/04/15	vie 17/04/15	95								
97			Comunicación de Resolucion final por medio de Mer Link	1 día	lun 20/04/15	lun 20/04/15	96								
98			Nuevo plazo para recibir ofertas	22 días	lun 06/04/15	mié 06/05/15	91								
99			Recepción y estudio de ofertas	23 días	jue 07/05/15	lun 08/06/15									
100			Apertura de ofertas	1 día	jue 07/05/15	jue 07/05/15	98								
101			Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y téc	1 día	vie 08/05/15	vie 08/05/15	100								
102			Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respuestas;	5 días	lun 11/05/15	vie 15/05/15	101								
103			Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenciones	0 días	vie 15/05/15	vie 15/05/15	102								

Proyecto: Cronograma de compra

Fecha: mar 20/01/15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

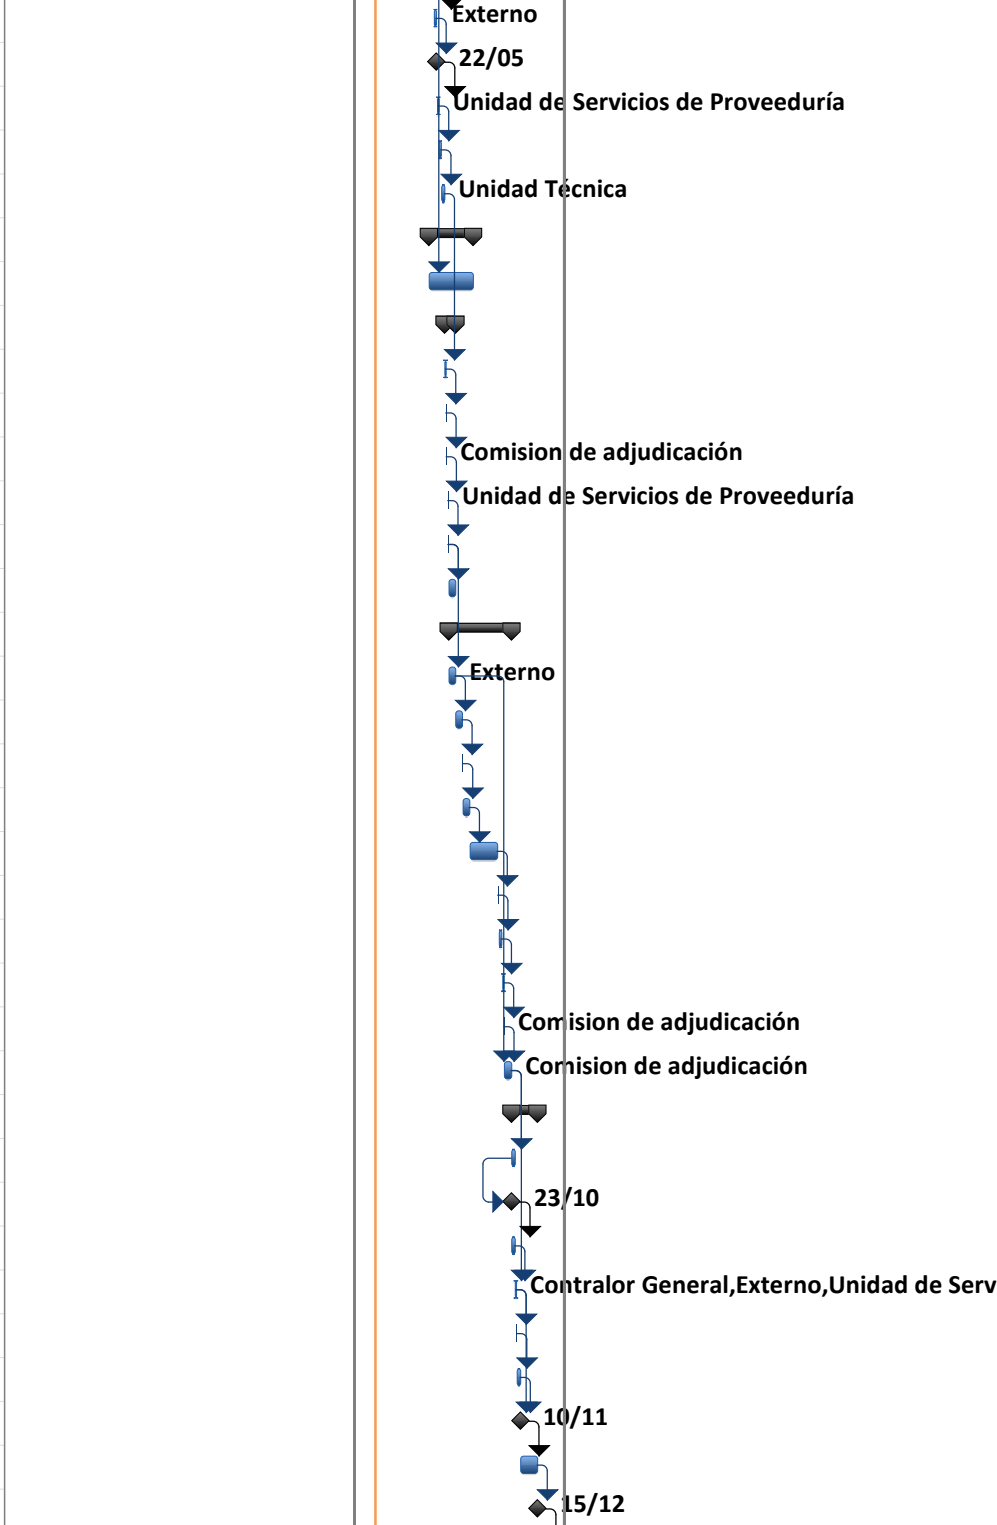
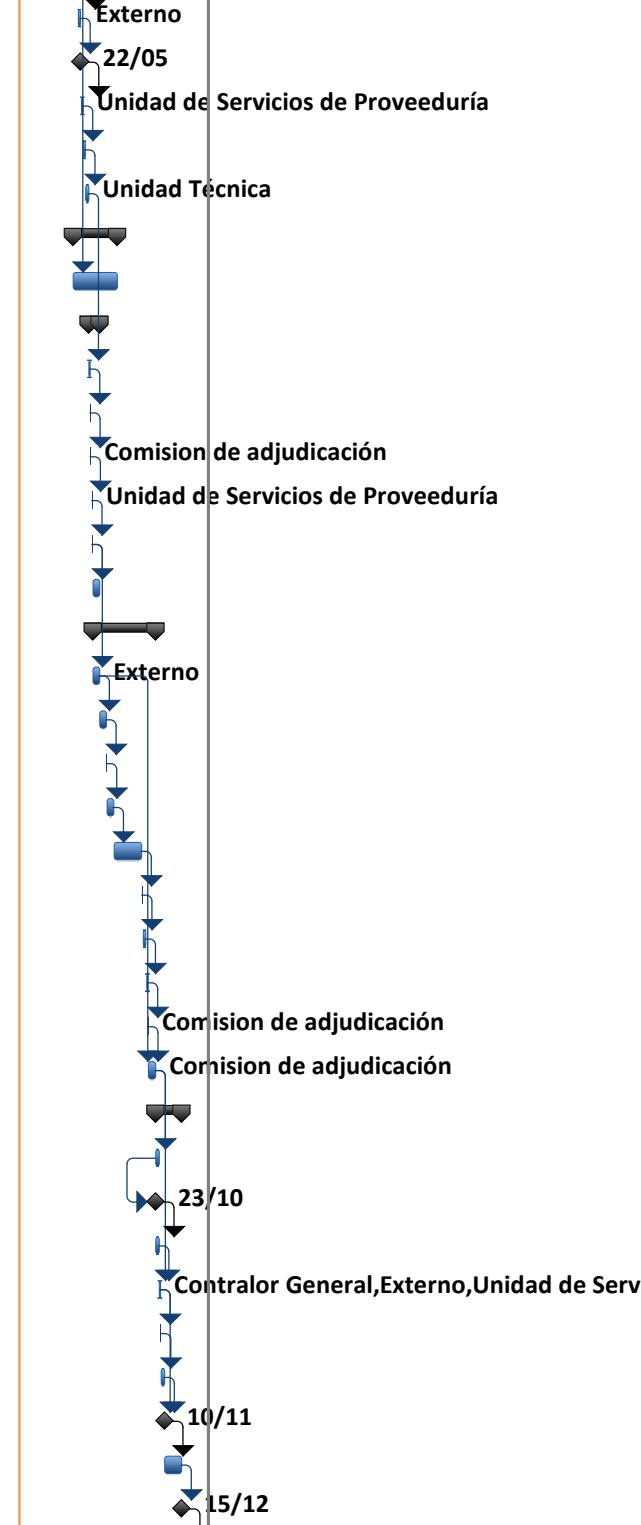
Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

</

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre					
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio
104			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En Mer-Lir	5 días	lun 18/05/15	vie 22/05/15	103			Externo 22/05 Unidad de Servicios de Proveeduría Unidad Técnica Comision de adjudicación Unidad de Servicios de Proveeduría Externo Comision de adjudicación Comision de adjudicación 23/10 Contralor General,Externo,Unidad de Servi 10/11 15/12			
105			Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	vie 22/05/15	vie 22/05/15	104						
106			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	lun 25/05/15	mié 27/05/15	105						
107			Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	jue 28/05/15	lun 01/06/15	106						
108			Elaboración de Informe de recomendación (UT)	5 días	mar 02/06/15	lun 08/06/15	107						
109			Proceso de adjudicación	64 días	vie 08/05/15	mié 05/08/15							
110			Fecha máxima para adjudicar	64 días	vie 08/05/15	mié 05/08/15	100						
111			Recomendación, adjudicación y comunicación	16 días	mar 09/06/15	mar 30/06/15							
112			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mar 09/06/15	jue 11/06/15	108						
113			Sesión de la Comision de Adjuducaciones	0,5 días	vie 12/06/15	vie 12/06/15	112						
114			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	vie 12/06/15	vie 12/06/15	113						
115			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	lun 15/06/15	lun 15/06/15	114						
116			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicación (Mer Link)	1 día	mar 16/06/15	mar 16/06/15	115						
117			Firmeza del acto de adjudicación	10 días	mié 17/06/15	mar 30/06/15	116						
118			Recurso de revocatoria o apelación (DCA)	90,5 días	mié 17/06/15	vie 23/10/15							
119			Plazo para recibir recurso (Art 174 RLCA)	10 días	mié 17/06/15	mar 30/06/15	116						
120			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisible (Art	10 días	mié 01/07/15	mar 14/07/15	119						
121			Notificacion al Adjudicatario y a la administración del recurso	1 día	mié 15/07/15	mié 15/07/15	120						
122			Plazo para recibir respuesta del adjudicatario y de la administración (Art182 RLCA)	10 días	jue 16/07/15	mié 29/07/15	121						
123			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria	40 días	jue 30/07/15	jue 24/09/15	122						
124			Notificacion de la resolución (Mer Link)	1 día	vie 25/09/15	vie 25/09/15	123						
125			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	5 días	lun 28/09/15	vie 02/10/15	124						
126			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	3 días	lun 05/10/15	mié 07/10/15	125						
127			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 08/10/15	jue 08/10/15	126						
128			Adjudicación en firme	10 días	jue 08/10/15	vie 23/10/15	119,127						
129			Trámite de contrato	37 días	vie 23/10/15	mar 15/12/15							
130			Elaboración del Contrato	5 días	vie 23/10/15	vie 30/10/15	128						
131			Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	vie 23/10/15	vie 23/10/15	130CC						
132			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	vie 23/10/15	vie 30/10/15	131						
133			Firma de contrato oferente	1 día	vie 30/10/15	lun 02/11/15	128,132						
134			Envío de contrato para firma al Despacho contralor	1 día	lun 02/11/15	mar 03/11/15	133						
135			Firma de contrato despacho contralor	5 días	mar 03/11/15	mar 10/11/15	134						
136			Envío de contrato a refrendo contralor	0 días	mar 10/11/15	mar 10/11/15	133,135						
137			Refrendo del Contrato	25 días	mar 10/11/15	mar 15/12/15	136						
138			Comunicación a la (las) empresa del refendo del contrato y orden de inicio	0 días	mar 15/12/15	mar 15/12/15	137						

Proyecto: Cronograma de compra Fecha: mar 20/01/15	Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin	
	División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite	
	Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen		Hito inactivo		Resumen manual			
	Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo			

Página 4

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre						
								3 diciembre	1 septiembre	11 mayo	18 enero	7 septiembre	05 junio	12 febrero
139			Trámite del Pedido	3 días	mar 15/12/15	mar 05/01/16								
140			Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	mar 15/12/15	jue 17/12/15	138							
141			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	jue 17/12/15	jue 17/12/15	140							
142			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	jue 17/12/15	mar 05/01/16	141							
143			Notificación de Pedido de Compra	0 días	mar 05/01/16	mar 05/01/16	142							
144			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mar 05/01/16	mar 05/01/16	143							
145			Recepción de los items	4 días	mar 05/01/16	lun 11/01/16								
146			Entrega items en Almacén	1 día	mar 05/01/16	mié 06/01/16	144							
147			Recibido a satisfacción	3 días	mié 06/01/16	lun 11/01/16	146							
148			Fin recepción de items	0 días	lun 11/01/16	lun 11/01/16	147							
149			Trámite de pago	6 días	lun 11/01/16	mar 19/01/16								
150			Envio documentos a Financiero	1 día	lun 11/01/16	mar 12/01/16	148							
151			Emisión de pago en Financiero	5 días	mar 12/01/16	mar 19/01/16	150							
152			Conclusión trámite licitación	0 días	mar 19/01/16	mar 19/01/16	151							
153			2015LN-000003-503"UTI_Compra de Portátiles (Contratado al 01/08/2015)"	235,5 días	lun 12/01/15	lun 14/12/15								
154			Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	1 día	lun 12/01/15	lun 12/01/15								
155			Confección Documento complementario al cartel	23 días	mar 13/01/15	jue 12/02/15								
156			Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	mar 13/01/15	lun 19/01/15	154							
157			Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	mar 20/01/15	mar 27/01/15	156							
158			Revisión Técnica de cartel	7 días	mié 28/01/15	jue 05/02/15	157							
159			Incorporación de ajustes y confección de Documento complementario al cartel	5 días	vie 06/02/15	jue 12/02/15	158							
160			Invitación a participar	43 días	vie 13/02/15	jue 16/04/15								
161			Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de Mer	5 días	vie 13/02/15	jue 19/02/15	159							
162			Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	vie 20/02/15	jue 26/02/15	161							
163			Invitación a participar en Mer Link	1 día	vie 27/02/15	vie 27/02/15	162							
164			Plazo para recibir ofertas	32 días	lun 02/03/15	jue 16/04/15	163							
165			Recurso de Objeción al Cartel	32 días	vie 27/02/15	mié 15/04/15								
166			Presentacion de Objeción al cartel	10 días	vie 27/02/15	jue 12/03/15	163CC							
167			Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	vie 13/03/15	vie 13/03/15	166							
168			La DCA solicita expediente administrativo a la USP y solicita criterio técnico acerca	1 día	lun 16/03/15	lun 16/03/15	167							
169			Respuesta con el criterio de la UT a la USP para ser enviado a la DCA	3 días	mar 17/03/15	jue 19/03/15	168							
170			Remisión del criterio técnico a la DCA	1 día	vie 20/03/15	vie 20/03/15	169							
171			Confeccion de Resolucion a la Objecion	4 días	lun 23/03/15	jue 26/03/15	170							
172			Comunicación de Resolucion final por medio de Mer Link	1 día	vie 27/03/15	vie 27/03/15	171							
173			Nuevo plazo para recibir ofertas	22 días	vie 13/03/15	mié 15/04/15	166							

Proyecto: Cronograma de compra

Fecha: mar 20/01/15

Tarea

División

Hito

Resumen

<

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras								
								3 diciembre	1 septiembre	11 mayo	18 enero	7 septiembr	05 junio	1er semestre	12 febrero
174			Recepción y estudio de ofertas	23 días	jue 16/04/15	mar 19/05/15									
175			Apertura de ofertas	1 día	jue 16/04/15	jue 16/04/15	173								
176			Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técn	1 día	vie 17/04/15	vie 17/04/15	175								
177			Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respuestas;	5 días	lun 20/04/15	vie 24/04/15	176								
178			Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenciones	0 días	vie 24/04/15	vie 24/04/15	177								
179			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En Mer-Lir	5 días	lun 27/04/15	lun 04/05/15	178								
180			Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	lun 04/05/15	lun 04/05/15	179								
181			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mar 05/05/15	jue 07/05/15	180								
182			Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	vie 08/05/15	mar 12/05/15	181								
183			Elaboración de Informe de recomendación (UT)	5 días	mié 13/05/15	mar 19/05/15	182								
184			Proceso de adjudicación	64 días	vie 17/04/15	jue 16/07/15									
185			Fecha máxima para adjudicar	64 días	vie 17/04/15	jue 16/07/15	175								
186			Recomendación, adjudicación y comunicación	16 días	mié 20/05/15	mié 10/06/15									
187			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mié 20/05/15	vie 22/05/15	183								
188			Sesión de la Comision de Adjuducaciones	0,5 días	lun 25/05/15	lun 25/05/15	187								
189			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	lun 25/05/15	lun 25/05/15	188								
190			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mar 26/05/15	mar 26/05/15	189								
191			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicación (Mer Link)	1 día	mié 27/05/15	mié 27/05/15	190								
192			Firmeza del acto de adjudicación	10 días	jue 28/05/15	mié 10/06/15	191								
193			Recurso de revocatoria o apelación (DCA)	90,5 días	jue 28/05/15	vie 02/10/15									
194			Plazo para recibir recurso (Art 174 RLCA)	10 días	jue 28/05/15	mié 10/06/15	191								
195			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisible (Art	10 días	jue 11/06/15	mié 24/06/15	194								
196			Notificacion al Adjudicatario y a la administración del recurso	1 día	jue 25/06/15	jue 25/06/15	195								
197			Plazo para recibir respuesta del adjudicatario y de la administración (Art182 RLCA)	10 días	vie 26/06/15	jue 09/07/15	196								
198			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria	40 días	vie 10/07/15	jue 03/09/15	197								
199			Notificacion de la resolución (Mer Link)	1 día	vie 04/09/15	vie 04/09/15	198								
200			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	5 días	lun 07/09/15	vie 11/09/15	199								
201			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	3 días	lun 14/09/15	jue 17/09/15	200								
202			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	vie 18/09/15	vie 18/09/15	201								
203			Adjudicación en firme	10 días	vie 18/09/15	vie 02/10/15	194,202								
204			Trámite de contrato	37 días	vie 02/10/15	mié 25/11/15									
205			Elaboración del Contrato	5 días											

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre								
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio	12 febrero	22 octubre	
209			Envío de contrato para firma al Despacho contralor	1 día	mar 13/10/15	mié 14/10/15	208									
210			Firma de contrato despacho contralor	5 días	mié 14/10/15	mié 21/10/15	209									
211			Envío de contrato a refrendo contralor	0 días	mié 21/10/15	mié 21/10/15	208,210									
212			Refrendo del Contrato	25 días	mié 21/10/15	mié 25/11/15	211									
213			Comunicación a la (las) empresa del refendo del contrato y orden de inicio	0 días	mié 25/11/15	mié 25/11/15	212									
214			Trámite del Pedido	3 días	mié 25/11/15	lun 30/11/15										
215			Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	mié 25/11/15	vie 27/11/15	213									
216			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	vie 27/11/15	vie 27/11/15	215									
217			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	vie 27/11/15	lun 30/11/15	216									
218			Notificación de Pedido de Compra	0 días	lun 30/11/15	lun 30/11/15	217									
219			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	lun 30/11/15	lun 30/11/15	218									
220			Recepción de los items	4 días	lun 30/11/15	vie 04/12/15										
221			Entrega items en Almacén	1 día	lun 30/11/15	mar 01/12/15	219									
222			Recibido a satisfacción	3 días	mar 01/12/15	vie 04/12/15	221									
223			Fin recepción de items	0 días	vie 04/12/15	vie 04/12/15	222									
224			Trámite de pago	6 días	vie 04/12/15	lun 14/12/15										
225			Envio documentos a Financiero	1 día	vie 04/12/15	lun 07/12/15	223									
226			Emisión de pago en Financiero	5 días	lun 07/12/15	lun 14/12/15	225									
227			Conclusión trámite licitación	0 días	lun 14/12/15	lun 14/12/15	226									
228			LICITACIONES ABREVIADAS	224 días	mié 10/12/14	lun 09/11/15										
229			2015LA-000001-503UAF_ Auditoría Externa (Contratación a 11/05/15) \$13,000.000,00	138 días	mié 10/12/14	mié 08/07/15										
230			Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	mié 10/12/14	mié 10/12/14										
231			Confección Documento complementario al cartel	23 días	mié 10/12/14	vie 23/01/15										
232			Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	mié 10/12/14	mar 16/12/14	230									
233			Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	mié 17/12/14	mié 07/01/15	232									
234			Revisión Técnica de cartel	7 días	jue 08/01/15	vie 16/01/15	233									
235			Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al cartel	5 días	lun 19/01/15	vie 23/01/15	234									
236			Invitación a participar	28 días	lun 26/01/15	mié 04/03/15										
237			Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de Mer	5 días	lun 26/01/15	vie 30/01/15	235									
238			Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	lun 02/02/15	vie 06/02/15	237									
239			Invitación a participar en Mer Link	1 día	lun 09/02/15	lun 09/02/15	238									
240			Plazo para recibir ofertas	17 días	mar 10/02/15	mié 04/03/15	239									
241			Recurso de Objeción al Cartel	17 días	mar 10/02/15	mié 04/03/15										
242			Presentacion de Objeción al cartel	5 días	mar 10/02/15	lun 16/02/15	239									
243			Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	mar 17/02/15	mar 17/02/15	242									

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: mar 20/01/15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 7

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre								
								3 diciembre	1 septiembre	11 mayo	18 enero	7 septiembre	05 junio	12 febrero	22 octubre	
244			Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	mié 18/02/15	mié 18/02/15	243									
245			Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	jue 19/02/15	mié 25/02/15	244									
246			Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	jue 26/02/15	mar 03/03/15	245									
247			Comunicación de Resolución final	1 día	mié 04/03/15	mié 04/03/15	246									
248			Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	mar 17/02/15	mié 04/03/15	242									
249			Recepción y estudio de ofertas	33 días	jue 05/03/15	mié 22/04/15										
250			Apertura de ofertas	1 día	jue 05/03/15	jue 05/03/15	248									
251			Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técn	1 día	vie 06/03/15	vie 06/03/15	250									
252			Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respuestas;	13 días	lun 09/03/15	mié 25/03/15	251									
253			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el análisis	1 día	jue 26/03/15	jue 26/03/15	252									
254			Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenciones	1 día	vie 27/03/15	vie 27/03/15	253									
255			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En Mer-Lir	5 días	lun 30/03/15	mar 07/04/15	254									
256			Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	mar 07/04/15	mar 07/04/15	255									
257			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mié 08/04/15	vie 10/04/15	256									
258			Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	lun 13/04/15	mié 15/04/15	257									
259			Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	mié 15/04/15	mié 15/04/15	258									
260			Elaboración de Informe de recomendación	5 días	jue 16/04/15	mié 22/04/15	259									
261			Proceso de adjudicación	34 días	vie 06/03/15	vie 24/04/15										
262			Fecha máxima para adjudicar	34 días	vie 06/03/15	vie 24/04/15	250									
263			Recomendación, adjudicación y comunicación	11 días	lun 27/04/15	mar 12/05/15										
264			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	lun 27/04/15	mié 29/04/15	262									
265			Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	jue 30/04/15	jue 30/04/15	264									
266			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	jue 30/04/15	jue 30/04/15	265									
267			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	lun 04/05/15	lun 04/05/15	266									
268			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	mar 05/05/15	mar 05/05/15	267									
269			Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	mié 06/05/15	mar 12/05/15	268			</						

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								3 diciembre	1 septiembre	11 mayo	18 enero	7 septiembre	05 junio	12 febrero	22 octubre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
279			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mié 17/06/15	mié 17/06/15	278																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre								
								3 diciembre	1 septiembre	11 mayo	18 enero	7 septiembre	05 junio	12 febrero	22 octubre	
313			Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de Mer	5 días	mar 31/03/15	mié 08/04/15	311									
314			Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	jue 09/04/15	mié 15/04/15	313									
315			Invitación a participar en Mer Link	1 día	jue 16/04/15	jue 16/04/15	314									
316			Plazo para recibir ofertas	17 días	vie 17/04/15	mar 12/05/15	315									
317			Recurso de Objeción al Cartel	17 días	vie 17/04/15	mar 12/05/15										
318			Presentacion de Objeción al cartel	5 días	vie 17/04/15	jue 23/04/15	315									
319			Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	vie 24/04/15	vie 24/04/15	318									
320			Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15	319									
321			Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	mar 28/04/15	mar 05/05/15	320									
322			Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	mié 06/05/15	lun 11/05/15	321									
323			Comunicación de Resolución final	1 día	mar 12/05/15	mar 12/05/15	322									
324			Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	vie 24/04/15	mar 12/05/15	318									
325			Recepción y estudio de ofertas	33 días	mié 13/05/15	vie 26/06/15										
326			Apertura de ofertas	1 día	mié 13/05/15	mié 13/05/15	324									
327			Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técn	1 día	jue 14/05/15	jue 14/05/15	326									
328			Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respuestas; 13 días	13 días	vie 15/05/15	mar 02/06/15	327									
329			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el análisis	1 día	mié 03/06/15	mié 03/06/15	328									
330			Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenciones	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15	329									
331			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En Mer-Link)	5 días	vie 05/06/15	jue 11/06/15	330									
332			Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	jue 11/06/15	jue 11/06/15	331									
333			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	vie 12/06/15	mar 16/06/15	332									
334			Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	mié 17/06/15	vie 19/06/15	333									
335			Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	vie 19/06/15	vie 19/06/15	334									
336			Elaboración de Informe de recomendación	5 días	lun 22/06/15	vie 26/06/15	335									
337			Proceso de adjudicación	34 días	jue 14/05/15	mar 30/06/15										
338			Fecha máxima para adjudicar	34 días	jue 14/05/15	mar 30/06/15	326									

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras									
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio	12 febrero	22 octubre	
348			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisible (Art	2 días	jue 16/07/15	vie 17/07/15	347									
349			Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	vie 17/07/15	vie 17/07/15	348									
350			Plazo para recibir respuesta del adjuducatorio (Art N°186 RLCA)	3 días	lun 20/07/15	mié 22/07/15	349									
351			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Art N°187 RLCA)	15 días	jue 23/07/15	mié 12/08/15	350									
352			Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	mié 12/08/15	mié 12/08/15	351									
353			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	5 días	jue 13/08/15	mié 19/08/15	352									
354			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 20/08/15	jue 20/08/15	353									
355			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 20/08/15	jue 20/08/15	354									
356			Adjudicación en firme	5 días	vie 21/08/15	jue 27/08/15	347,355									
357			Trámite de contrato	11 días	jue 13/08/15	jue 27/08/15										
358			Elaboración del Contrato	5 días	jue 20/08/15	jue 27/08/15	354									
359			Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	jue 20/08/15	jue 20/08/15	358CC									
360			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	jue 20/08/15	jue 27/08/15	359									
361			Firma de contrato oferente	1 día	jue 13/08/15	jue 13/08/15	352									
362			Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	0 días	jue 13/08/15	jue 13/08/15	361									
363			Firma de contrato Despacho Contralor	5 días	vie 14/08/15	jue 20/08/15	362									
364			Envío de contrato a aprobación interna	0 días	jue 20/08/15	jue 20/08/15	361,363									
365			Aprobacion Interna de Contrato	5 días	vie 21/08/15	jue 27/08/15	364									
366			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	jue 27/08/15	jue 27/08/15	365									
367			Trámite del Pedido	3 días	vie 28/08/15	mar 01/09/15										
368			Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	vie 28/08/15	lun 31/08/15	365									
369			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	lun 31/08/15	lun 31/08/15	368									
370			Devolución de pedido a Proveduría	1 día	mar 01/09/15	mar 01/09/15	369									
371			Notificación de Pedido de Compra	0 días	mar 01/09/15	mar 01/09/15	369,370									
372			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mar 01/09/15	mar 01/09/15	371									
373			Recepción de los items	4 días	vie 28/08/15	mié 02/09/15										
374			Entrega items en Almacén	1 día	vie 28/08/15	vie 28/08/15	365									
375			Recibido a satisfacción	3 días	lun 31/08/15	mié 02/09/15	374									
376			Fin recepción de items	0 días	mié 02/09/15	mié 02/09/15	375									
377			Trámite de pago	6 días	jue 03/09/15	jue 10/09/15										
378			Envio documentos a Financiero	1 día	jue 03/09/15	jue 03/09/15	376									
379			Emisión de pago en Financiero	5 días	vie 04/09/15	jue 10/09/15	378									
380			Conclusión trámite licitación	0 días	jue 10/09/15	jue 10/09/15	379									
381			2015LA-0000004-503 UTI_Access Point (Contratación a 01/06/2015) \$21,570,000,00	138 días	jue 26/03/15	vie 09/10/15										
382			Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	jue 26/03/15	jue 26/03/15										

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: mar 20/01/15

TareaTareas externas

DivisiónHito externo

HitoTarea inactiva

ResumenHito inactivo

Resumen del proyectoResumen inactivo

Tarea manualSólo duración

Informe de resumen manualResumen manual

Sólo el comienzo

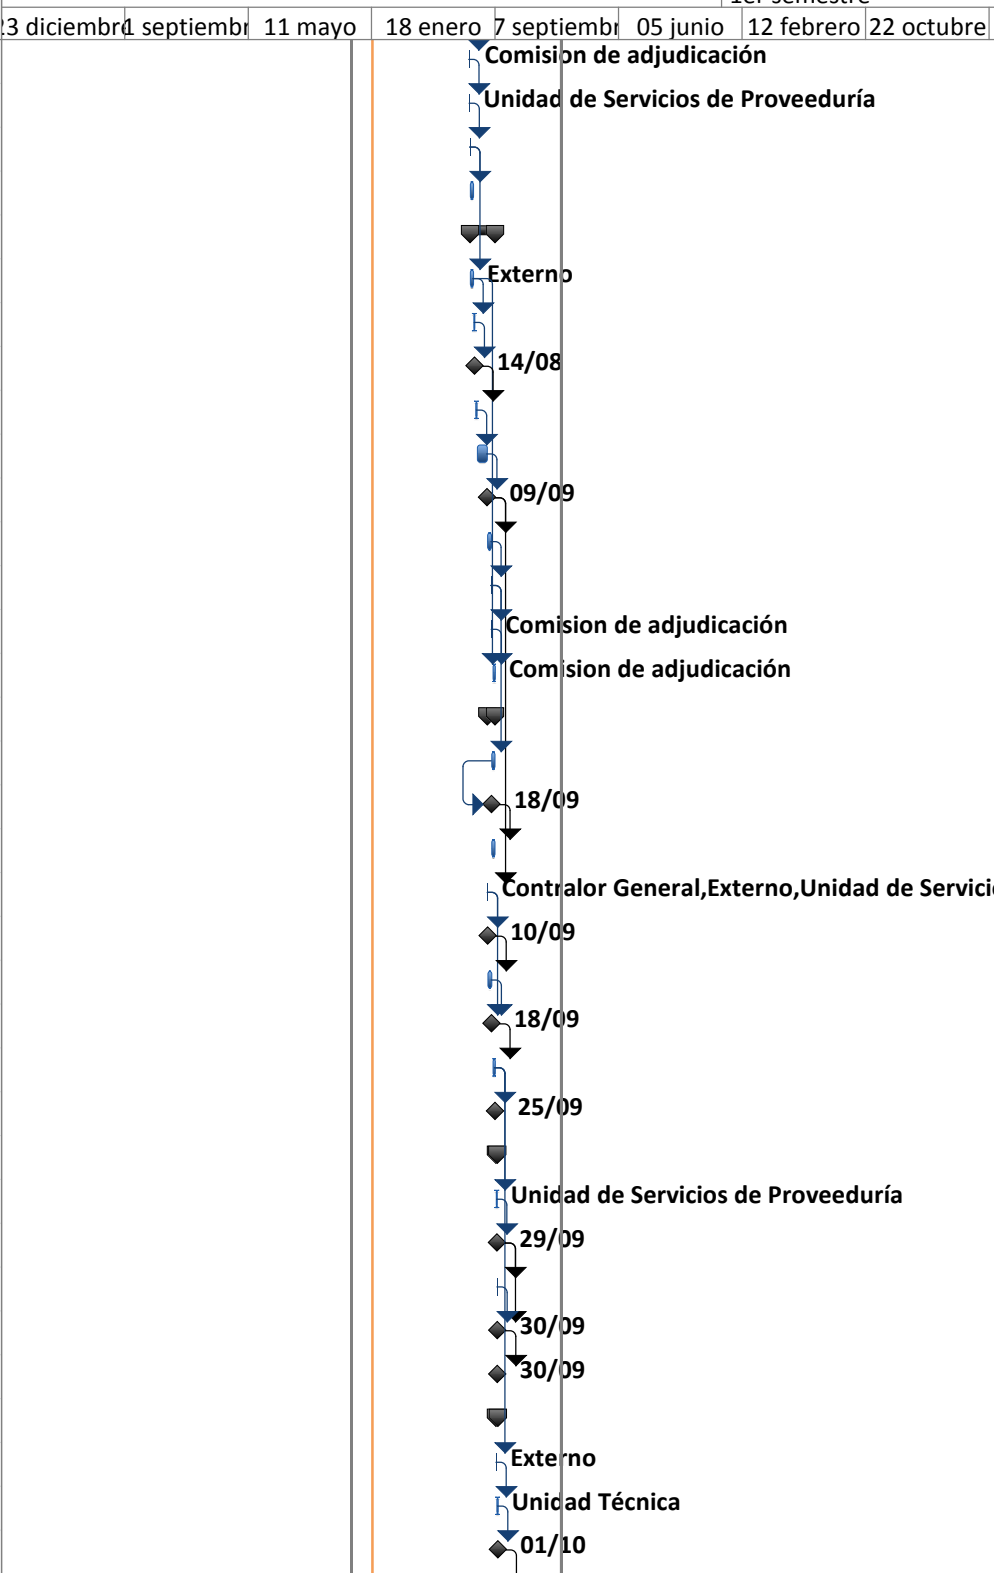
Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 11

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre								
								3 diciembre	1 septiembre	11 mayo	18 enero	7 septiembre	05 junio	12 febrero	22 octubre	
383			Confección Documento complementario al cartel	23 días	jue 26/03/15	mié 29/04/15										
384			Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	jue 26/03/15	mié 01/04/15	382									
385			Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	lun 06/04/15	lun 13/04/15	384									
386			Revisión Técnica de cartel	7 días	mar 14/04/15	mié 22/04/15	385									
387			Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al cartel	5 días	jue 23/04/15	mié 29/04/15	386									
388			Invitación a participar	28 días	jue 30/04/15	mar 09/06/15										
389			Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de Mer	5 días	jue 30/04/15	jue 07/05/15	387									
390			Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	vie 08/05/15	jue 14/05/15	389									
391			Invitación a participar en Mer Link	1 día	vie 15/05/15	vie 15/05/15	390									
392			Plazo para recibir ofertas	17 días	lun 18/05/15	mar 09/06/15	391									
393			Recurso de Objeción al Cartel	17 días	lun 18/05/15	mar 09/06/15										
394			Presentacion de Objeción al cartel	5 días	lun 18/05/15	vie 22/05/15	391									
395			Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	lun 25/05/15	lun 25/05/15	394									
396			Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	mar 26/05/15	mar 26/05/15	395									
397			Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	mié 27/05/15	mar 02/06/15	396									
398			Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	mié 03/06/15	lun 08/06/15	397									
399			Comunicación de Resolución final	1 día	mar 09/06/15	mar 09/06/15	398									
400			Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	lun 25/05/15	mar 09/06/15	394									
401			Recepción y estudio de ofertas	33 días	mié 10/06/15	vie 24/07/15										
402			Apertura de ofertas	1 día	mié 10/06/15	mié 10/06/15	400									
403			Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técn	1 día	jue 11/06/15	jue 11/06/15	402									
404	 		Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respuestas; 13 días	13 días	vie 12/06/15	mar 30/06/15	403									
405			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el análisis	1 día	mié 01/07/15	mié 01/07/15	404									
406			Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenciones	1 día	jue 02/07/15	jue 02/07/15	405									
407			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En Mer-Lir	5 días	vie 03/07/15	jue 09/07/15	406									
408			Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	jue 09/07/15	jue 09/07										

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre					
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio
418			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	lun 03/08/15	lun 03/08/15	417						
419			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mar 04/08/15	mar 04/08/15	418						
420			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	mié 05/08/15	mié 05/08/15	419						
421			Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	jue 06/08/15	mié 12/08/15	420						
422			Recurso de revocatoria	36 días	jue 06/08/15	vie 25/09/15							
423			Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	jue 06/08/15	mié 12/08/15	420						
424			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisible (Art	2 días	jue 13/08/15	vie 14/08/15	423						
425			Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	vie 14/08/15	vie 14/08/15	424						
426			Plazo para recibir respuesta del adjuducatario (Art N°186 RLCA)	3 días	lun 17/08/15	mié 19/08/15	425						
427			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Art N°187 RLCA)	15 días	jue 20/08/15	mié 09/09/15	426						
428			Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	mié 09/09/15	mié 09/09/15	427						
429			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	5 días	jue 10/09/15	jue 17/09/15	428						
430			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	vie 18/09/15	vie 18/09/15	429						
431			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	vie 18/09/15	vie 18/09/15	430						
432			Adjudicación en firme	5 días	lun 21/09/15	vie 25/09/15	423,431						
433			Trámite de contrato	11 días	jue 10/09/15	vie 25/09/15							
434			Elaboración del Contrato	5 días	vie 18/09/15	vie 25/09/15	430						
435			Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	vie 18/09/15	vie 18/09/15	434CC						
436			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	vie 18/09/15	vie 25/09/15	435						
437			Firma de contrato oferente	1 día	jue 10/09/15	jue 10/09/15	428						
438			Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	0 días	jue 10/09/15	jue 10/09/15	437						
439			Firma de contrato Despacho Contralor	5 días	vie 11/09/15	vie 18/09/15	438						
440			Envío de contrato a aprobación interna	0 días	vie 18/09/15	vie 18/09/15	437,439						
441			Aprobacion Interna de Contrato	5 días	lun 21/09/15	vie 25/09/15	440						
442			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	vie 25/09/15	vie 25/09/15	441						
443			Trámite del Pedido	3 días	lun 28/09/15	mié 30/09/15							
444			Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	lun 28/09/15	mar 29/09/15	441						
445			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	mar 29/09/15	mar 29/09/15	444						
446			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	mié 30/09/15	mié 30/09/15	445						
447			Notificación de Pedido de Compra	0 días	mié 30/09/15	mié 30/09/15	445,446						
448			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mié 30/09/15	mié 30/09/15	447						
449			Recepción de los items	4 días	lun 28/09/15	jue 01/10/15							
450			Entrega items en Almacén	1 día	lun 28/09/15	lun 28/09/15	441						
451			Recibido a satisfacción	3 días	mar 29/09/15	jue 01/10/15	450						
452			Fin recepción de items	0 días	jue 01/10/15	jue 01/10/15	451						

Proyecto: Cronograma de compra

Fecha: mar 20/01/15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 13

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre							
								3 diciembre	1 septiembre	11 mayo	18 enero	7 septiembre	05 junio	12 febrero	22 octubre
453			Trámite de pago	6 días	vie 02/10/15	vie 09/10/15									
454			Envío documentos a Financiero	1 día	vie 02/10/15	vie 02/10/15	452								
455			Emisión de pago en Financiero	5 días	lun 05/10/15	vie 09/10/15	454								
456			Conclusión trámite licitación	0 días	vie 09/10/15	vie 09/10/15	455								
457			2015LA-0000005-503 USG_Compra de vehículo (Contratación a 30/06/2015) \$21,000.000,00	138 días	lun 16/03/15	mar 29/09/15									
458			Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	lun 16/03/15	lun 16/03/15									
459			Confección Documento complementario al cartel	23 días	lun 16/03/15	vie 17/04/15									
460			Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 16/03/15	vie 20/03/15	458								
461			Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	lun 23/03/15	lun 30/03/15	460								
462			Revisión Técnica de cartel	7 días	mar 31/03/15	vie 10/04/15	461								
463			Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al cartel	5 días	lun 13/04/15	vie 17/04/15	462								
464			Invitación a participar	28 días	lun 20/04/15	jue 28/05/15									
465			Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de Mer	5 días	lun 20/04/15	vie 24/04/15	463								
466			Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	lun 27/04/15	lun 04/05/15	465								
467			Invitación a participar en Mer Link	1 día	mar 05/05/15	mar 05/05/15	466								
468			Plazo para recibir ofertas	17 días	mié 06/05/15	jue 28/05/15	467								
469			Recurso de Objeción al Cartel	17 días	mié 06/05/15	jue 28/05/15									
470			Presentacion de Objeción al cartel	5 días	mié 06/05/15	mar 12/05/15	467								
471			Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	mié 13/05/15	mié 13/05/15	470								
472			Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	jue 14/05/15	jue 14/05/15	471								
473			Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	vie 15/05/15	jue 21/05/15	472								
474			Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	vie 22/05/15	mié 27/05/15	473								
475			Comunicación de Resolución final	1 día	jue 28/05/15	jue 28/05/15	474								
476			Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	mié 13/05/15	jue 28/05/15	470								
477			Recepción y estudio de ofertas	33 días	vie 29/05/15	mar 14/07/15									
478			Apertura de ofertas	1 día	vie 29/05/15	vie 29/05/15	476								
479			Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técn	1 día	lun 01/06/15	lun 01/06/15	478								
480			Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respuestas;	13 días	mar 02/06/15	jue 18/06/15	479								
481			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el análisis	1 día	vie 19/06/15	vie 19/06/15	480								
482			Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenciones	1 día	lun 22/06/15	lun 22/06/15	481								
483			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En Mer-Lir	5 días	mar 23/06/15	lun 29/06/15	482								
484			Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	lun 29/06/15	lun 29/06/15	483								
485			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mar 30/06/15	jue 02/07/15	484								
486			Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	vie 03/07/15	mar 07/07/15	485								

Proyecto: Cronograma de compra

Fecha: mar 20/01/15

Tarea

División

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre								
								3 diciembre	4 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio	12 febrero	22 octubre	
487			Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	mar 07/07/15	mar 07/07/15	486						07/07			
488			Elaboración de Informe de recomendación	5 días	mié 08/07/15	mar 14/07/15	487									
489			proceso de adjudicación	34 días	lun 01/06/15	jue 16/07/15										
490			Fecha máxima para adjudicar	34 días	lun 01/06/15	jue 16/07/15	478									
491			Recomendación, adjudicación y comunicación	6 días	vie 17/07/15	vie 24/07/15										
492			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	vie 17/07/15	mar 21/07/15	490									
493			Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 22/07/15	mié 22/07/15	492									
494			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 22/07/15	mié 22/07/15	493									
495			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	jue 23/07/15	jue 23/07/15	494									
496			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	vie 24/07/15	vie 24/07/15	495									
497			Proceso de adjudicación	5 días	lun 27/07/15	vie 31/07/15										
498			Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	lun 27/07/15	vie 31/07/15	496									
499			Recurso de revocatoria	36 días	lun 27/07/15	lun 14/09/15										
500			Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	lun 27/07/15	vie 31/07/15	496									
501			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisible (Art	2 días	lun 03/08/15	mar 04/08/15	500									
502			Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	mar 04/08/15	mar 04/08/15	501									
503			Plazo para recibir respuesta del adjuducatario (Art N°186 RLCA)	3 días	mié 05/08/15	vie 07/08/15	502									
504			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Art N°187 RLCA)	15 días	lun 10/08/15	vie 28/08/15	503									
505			Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	vie 28/08/15	vie 28/08/15	504									
506			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	5 días	lun 31/08/15	vie 04/09/15	505									
507			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	lun 07/09/15	lun 07/09/15	506									
508			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	lun 07/09/15	lun 07/09/15	507									
509			Adjudicación en firme	5 días	mar 08/09/15	lun 14/09/15	500,508									
510			Trámite de contrato	11 días	lun 31/08/15	lun 14/09/15										
511			Elaboración del Contrato	5 días	lun 07/09/15	lun 14/09/15	507									
512			Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	lun 07/09/15	lun 07/09/15	511CC									
513			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	lun 07/09/15	lun 14/09/15	512									
514			Firma de contrato oferente	1 día	lun 31/08/15	lun 31/08/15	505									
515			Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	0 días	lun 31/08/15	lun 31/08/15	514									
516			Firma de contrato Despacho Contralor	5 días	mar 01/09/15	lun 07/09/15	515									
517			Envío de contrato a aprobación interna	0 días	lun 07/09/15	lun 07/09/15	514,516									
518			Aprobacion Interna de Contrato	5 días	mar 08/09/15	lun 14/09/15	517									
519			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	lun 14/09/15	lun 14/09/15	518									
520			Trámite del Pedido	3 días	mié 16/09/15	vie 18/09/15										
521			Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	mié 16/09/15	jue 17/09/15	518									

Proyecto: Cronograma de compra Fecha: mar 20/01/15	Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin	
	División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite	
	Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen		Hito inactivo		Resumen manual			
	Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo			

Página 15

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre						
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio	12 febrero
522			Envío de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	jue 17/09/15	jue 17/09/15	521							
523			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	vie 18/09/15	vie 18/09/15	522							
524			Notificación de Pedido de Compra	0 días	vie 18/09/15	vie 18/09/15	522,523							
525			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	vie 18/09/15	vie 18/09/15	524							
526			Recepción de los items	4 días	mié 16/09/15	lun 21/09/15								
527			Entrega items en Almacén	1 día	mié 16/09/15	mié 16/09/15	518							
528			Recibido a satisfacción	3 días	jue 17/09/15	lun 21/09/15	527							
529			Fin recepción de items	0 días	lun 21/09/15	lun 21/09/15	528							
530			Trámite de pago	6 días	mar 22/09/15	mar 29/09/15								
531			Envío documentos a Financiero	1 día	mar 22/09/15	mar 22/09/15	529							
532			Emisión de pago en Financiero	5 días	mié 23/09/15	mar 29/09/15	531							
533			Conclusión trámite licitación	0 días	mar 29/09/15	mar 29/09/15	532							
534			2015LA-0000006-503 UTI_Mantenimiento de red de telefonía (Contratación a 01/07/2015)" \$30,740,000,00	138 días	lun 09/02/15	lun 24/08/15								
535			Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	lun 09/02/15	lun 09/02/15								
536			Confección Documento complementario al cartel	23 días	lun 09/02/15	mié 11/03/15								
537			Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 09/02/15	vie 13/02/15	535							
538			Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	lun 16/02/15	lun 23/02/15	537							
539			Revisión Técnica de cartel	7 días	mar 24/02/15	mié 04/03/15	538							
540			Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al cartel	5 días	jue 05/03/15	mié 11/03/15	539							
541			Invitación a participar	28 días	jue 12/03/15	mié 22/04/15								
542			Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de Mer	5 días	jue 12/03/15	mié 18/03/15	540							
543			Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	jue 19/03/15	mié 25/03/15	542							
544			Invitación a participar en Mer Link	1 día	jue 26/03/15	jue 26/03/15	543							
545			Plazo para recibir ofertas	17 días	vie 27/03/15	mié 22/04/15	544							
546			Recurso de Objeción al Cartel	17 días	vie 27/03/15	mié 22/04/15								
547			Presentacion de Objeción al cartel	5 días	vie 27/03/15	lun 06/04/15	544							
548			Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	mar 07/04/15	mar 07/04/15	547							
549			Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	mié 08/04/15	mié 08/04/15	548							
550			Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	jue 09/04/15	mié 15/04/15	549							
551			Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	jue 16/04/15	mar 21/04/15	550							
552			Comunicación de Resolución final	1 día	mié 22/04/15	mié 22/04/15	551							
553			Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	mar 07/04/15	mié 22/04/15	547							
554			Recepción y estudio de ofertas	33 días	jue 23/04/15	mar 09/06/15								
555			Apertura de ofertas	1 día	jue 23/04/15	jue 23/04/15	553							

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: mar 20/01/15

TareaTareas externas

DivisiónHito externo

HitoTarea inactiva

ResumenHito inactivo

Resumen del proyectoResumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 16

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre						
								3 diciembre	1 septiembre	11 mayo	18 enero	7 septiembre	05 junio	12 febrero
556			Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técn	1 día	vie 24/04/15	vie 24/04/15	555							
557			Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respuestas; 13 días	13 días	lun 27/04/15	jue 14/05/15	556							
558			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el análisis	1 día	vie 15/05/15	vie 15/05/15	557							
559			Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenciones	1 día	lun 18/05/15	lun 18/05/15	558							
560			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En Mer-Lir	5 días	mar 19/05/15	lun 25/05/15	559							
561			Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	lun 25/05/15	lun 25/05/15	560							
562			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mar 26/05/15	jue 28/05/15	561							
563			Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	vie 29/05/15	mar 02/06/15	562							
564			Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	mar 02/06/15	mar 02/06/15	563							
565			Elaboración de Informe de recomendación	5 días	mié 03/06/15	mar 09/06/15	564							
566			Proceso de adjudicación	34 días	vie 24/04/15	jue 11/06/15								
567			Fecha máxima para adjudicar	34 días	vie 24/04/15	jue 11/06/15	555							
568			Recomendación, adjudicación y comunicación	11 días	vie 12/06/15	vie 26/06/15								
569			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	vie 12/06/15	mar 16/06/15	567							
570			Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 17/06/15	mié 17/06/15	569							
571			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 17/06/15	mié 17/06/15	570							
572			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	jue 18/06/15	jue 18/06/15	571							
573			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	vie 19/06/15	vie 19/06/15	572							
574			Firma del acto de adjudicacion	5 días	lun 22/06/15	vie 26/06/15	573							
575			Recurso de revocatoria	36 días	lun 22/06/15	lun 10/08/15								
576			Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	lun 22/06/15	vie 26/06/15	573							
577			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisible (Art	2 días	lun 29/06/15	mar 30/06/15	576							
578			Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	mar 30/06/15	mar 30/06/15	577							
579			Plazo para recibir respuesta del adjuducatario (Art N°186 RLCA)	3 días	mié 01/07/15	vie 03/07/15	578							
580			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Art N°187 RLCA)	15 días	lun 06/07/15	vie 24/07/15	579							
581			Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	vie 24/07/15	vie 24/07/15	580							
582			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	5 días	lun 27/07/15	vie 31/07/15	581							
583			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	lun 03/08/15	lun 03/08/15	582							
584			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	lun 03/08/15	lun 03/08/15	583							
585			Adjudicación en firme	5 días	mar 04/08/15	lun 10/08/15	576,584							
586			Trámite de contrato	11 días	lun 27/07/15	lun 10/08/15								
587			Elaboración del Contrato	5 días	lun 03/08/15	lun 10/08/15	583							
588			Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	lun 03/08/15	lun 03/08/15	587CC							
589			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	lun 03/08/15	lun 10/08/15	588							
590			Firma de contrato oferente	1 día	lun 27/07/15	lun 27/07/15	581							

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: mar 20/01/15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 17

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre									
								3 diciembre	1 septiembre	11 mayo	18 enero	7 septiembre	05 junio	12 febrero	22 octubre		
591			Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	0 días	lun 27/07/15	lun 27/07/15	590										
592			Firma de contrato Despacho Contralor	5 días	mar 28/07/15	lun 03/08/15	591										
593			Envío de contrato a aprobación interna	0 días	lun 03/08/15	lun 03/08/15	590,592										
594			Aprobacion Interna de Contrato	5 días	mar 04/08/15	lun 10/08/15	593										
595			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	lun 10/08/15	lun 10/08/15	594										
596			Trámite del Pedido	3 días	mar 11/08/15	jue 13/08/15											
597			Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	mar 11/08/15	mié 12/08/15	594										
598			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	mié 12/08/15	mié 12/08/15	597										
599			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	jue 13/08/15	jue 13/08/15	598										
600			Notificación de Pedido de Compra	0 días	jue 13/08/15	jue 13/08/15	598,599										
601			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	jue 13/08/15	jue 13/08/15	600										
602			Recepción de los items	4 días	mar 11/08/15	vie 14/08/15											
603			Entrega items en Almacén	1 día	mar 11/08/15	mar 11/08/15	594										
604			Recibido a satisfacción	3 días	mié 12/08/15	vie 14/08/15	603										
605			Fin recepción de items	0 días	vie 14/08/15	vie 14/08/15	604										
606			Trámite de pago	6 días	lun 17/08/15	lun 24/08/15											
607			Envio documentos a Financiero	1 día	lun 17/08/15	lun 17/08/15	605										
608			Emisión de pago en Financiero	5 días	mar 18/08/15	lun 24/08/15	607										
609			Conclusión trámite licitación	0 días	lun 24/08/15	lun 24/08/15	608										
610			2015LA-0000007-503 UTI_Actualización de licencias de Software (Contratación a 01/07/2015)" \$41,882.100,00	138 días	lun 16/02/15	lun 31/08/15											
611			Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	lun 16/02/15	lun 16/02/15											
612			Confección Documento complementario al cartel	23 días	lun 16/02/15	mié 18/03/15											
613			Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 16/02/15	vie 20/02/15	611										
614			Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	lun 23/02/15	lun 02/03/15	613										
615			Revisión Técnica de cartel	7 días	mar 03/03/15	mié 11/03/15	614										
616																	

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre								
								3 diciembre	1 septiembre	11 mayo	18 enero	7 septiembre	05 junio	12 febrero	22 octubre	
625			Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	mié 15/04/15	mié 15/04/15	624									
626			Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	jue 16/04/15	mié 22/04/15	625									
627			Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	jue 23/04/15	mar 28/04/15	626									
628			Comunicación de Resolución final	1 día	mié 29/04/15	mié 29/04/15	627									
629			Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	mar 14/04/15	mié 29/04/15	623									
630			Recepción y estudio de ofertas	33 días	jue 30/04/15	mar 16/06/15										
631			Apertura de ofertas	1 día	jue 30/04/15	jue 30/04/15	629									
632			Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técn	1 día	lun 04/05/15	lun 04/05/15	631									
633	 		Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respuestas;	13 días	mar 05/05/15	jue 21/05/15	632									
634			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el análisis	1 día	vie 22/05/15	vie 22/05/15	633									
635			Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenciones	1 día	lun 25/05/15	lun 25/05/15	634									
636			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En Mer-Lir	5 días	mar 26/05/15	lun 01/06/15	635									
637			Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	lun 01/06/15	lun 01/06/15	636									
638			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mar 02/06/15	jue 04/06/15	637									
639			Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	vie 05/06/15	mar 09/06/15	638									
640			Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	mar 09/06/15	mar 09/06/15	639									
641			Elaboración de Informe de recomendación	5 días	mié 10/06/15	mar 16/06/15	640									
642			Proceso de adjudicación	34 días	lun 04/05/15	jue 18/06/15										
643			Fecha máxima para adjudicar	34 días	lun 04/05/15	jue 18/06/15	631									
644			Recomendación, adjudicación y comunicación	11 días	vie 19/06/15	vie 03/07/15										
645			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	vie 19/06/15	mar 23/06/15	643									
646			Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 24/06/15	mié 24/06/15	645									
647			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 24/06/15	mié 24/06/15	646									
648			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	jue 25/06/15	jue 25/06/15	647									
649			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	vie 26/06/15	vie 26/06/15	648									
650			Firmeza del acto de adjud													

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre							
								3 diciembre	1 septiembre	11 mayo	18 enero	7 septiembre	05 junio	12 febrero	22 octubre
660			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	lun 10/08/15	lun 10/08/15	659								
661			Adjudicación en firme	5 días	mar 11/08/15	lun 17/08/15	652,660								
662			Trámite de contrato	11 días	lun 03/08/15	lun 17/08/15									
663			Elaboración del Contrato	5 días	lun 10/08/15	lun 17/08/15	659								
664			Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	lun 10/08/15	lun 10/08/15	663CC								
665			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	lun 10/08/15	lun 17/08/15	664								
666			Firma de contrato oferente	1 día	lun 03/08/15	lun 03/08/15	657								
667			Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	0 días	lun 03/08/15	lun 03/08/15	666								
668			Firma de contrato Despacho Contralor	5 días	mar 04/08/15	lun 10/08/15	667								
669			Envío de contrato a aprobación interna	0 días	lun 10/08/15	lun 10/08/15	666,668								
670			Aprobacion Interna de Contrato	5 días	mar 11/08/15	lun 17/08/15	669								
671			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	lun 17/08/15	lun 17/08/15	670								
672			Trámite del Pedido	3 días	mar 18/08/15	jue 20/08/15									
673			Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	mar 18/08/15	mié 19/08/15	670								
674			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	mié 19/08/15	mié 19/08/15	673								
675			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	jue 20/08/15	jue 20/08/15	674								
676			Notificación de Pedido de Compra	0 días	jue 20/08/15	jue 20/08/15	674,675								
677			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	jue 20/08/15	jue 20/08/15	676								
678			Recepción de los items	4 días	mar 18/08/15	vie 21/08/15									
679			Entrega items en Almacén	1 día	mar 18/08/15	mar 18/08/15	670								
680			Recibido a satisfacción	3 días	mié 19/08/15	vie 21/08/15	679								
681			Fin recepción de items	0 días	vie 21/08/15	vie 21/08/15	680								
682			Trámite de pago	6 días	lun 24/08/15	lun 31/08/15									
683			Envio documentos a Financiero	1 día	lun 24/08/15	lun 24/08/15	681								
684			Emisión de pago en Financiero	5 días	mar 25/08/15	lun 31/08/15	683								
685			Conclusión trámite licitación	0 días	lun 31/08/15	lun 31/08/15	684								
686			2015LA-000008-503 UGPH_CC_Desarrollo de cursos virtuales (Contratación a 01/07/15) \$23,000,000,00	138 días	lun 23/02/15	lun 07/09/15									
687			Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	lun 23/02/15	lun 23/02/15									
688			Confección Documento complementario al cartel	23 días	lun 23/02/15	mié 25/03/15									
689			Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 23/02/15	vie 27/02/15	687								
690			Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	lun 02/03/15	lun 09/03/15	689								
691			Revisión Técnica de cartel	7 días	mar 10/03/15	mié 18/03/15	690								
692			Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al cartel	5 días	jue 19/03/15	mié 25/03/15	691								
693			Invitación a participar	28 días	jue 26/03/15	jue 07/05/15									
			Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin						
			División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite						
			Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso						
			Resumen		Hito inactivo		Resumen manual								
			Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo								
Página 20															

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre								
								3 diciembre	1 septiembre	11 mayo	18 enero	7 septiembre	05 junio	12 febrero	22 octubre	
694			Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de Mer	5 días	jue 26/03/15	mié 01/04/15	692									
695			Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	lun 06/04/15	vie 10/04/15	694									
696			Invitación a participar en Mer Link	1 día	lun 13/04/15	lun 13/04/15	695									
697			Plazo para recibir ofertas	17 días	mar 14/04/15	jue 07/05/15	696									
698			Recurso de Objeción al Cartel	17 días	mar 14/04/15	jue 07/05/15										
699			Presentacion de Objeción al cartel	5 días	mar 14/04/15	lun 20/04/15	696									
700			Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	mar 21/04/15	mar 21/04/15	699									
701			Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	mié 22/04/15	mié 22/04/15	700									
702			Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	jue 23/04/15	mié 29/04/15	701									
703			Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	jue 30/04/15	mié 06/05/15	702									
704			Comunicación de Resolución final	1 día	jue 07/05/15	jue 07/05/15	703									
705			Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	mar 21/04/15	jue 07/05/15	699									
706			Recepción y estudio de ofertas	33 días	vie 08/05/15	mar 23/06/15										
707			Apertura de ofertas	1 día	vie 08/05/15	vie 08/05/15	705									
708			Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técn	1 día	lun 11/05/15	lun 11/05/15	707									
709			Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respuestas;	13 días	mar 12/05/15	jue 28/05/15	708									
710			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el análisis	1 día	vie 29/05/15	vie 29/05/15	709									
711			Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenciones	1 día	lun 01/06/15	lun 01/06/15	710									
712			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En Mer-Lir	5 días	mar 02/06/15	lun 08/06/15	711									
713			Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	lun 08/06/15	lun 08/06/15	712									
714			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mar 09/06/15	jue 11/06/15	713									
715			Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	vie 12/06/15	mar 16/06/15	714									
716			Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	mar 16/06/15	mar 16/06/15	715									
717			Elaboración de Informe de recomendación	5 días	mié 17/06/15	mar 23/06/15	716									
718			Proceso de adjudicación	34 días	lun 11/05/15	jue 25/06/15										
719			Fecha máxima para adjudicar	34 días	lun 11/05/15	jue 25/06/15	707									
720			Recomendación, adjudicación y comunicación	11 días	vie 26/06/15	vie 10/07/15										
721			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	vie 26/06/15	mar 30/06/15	719									
722			Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 01/07/15	mié 01/07/15	721									
723			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 01/07/15	mié 01/07/15	722									
724			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	jue 02/07/15	jue 02/07/15	723									
725			Comunicación a empresas de Acuerdo													

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre							
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio	12 febrero	22 octubre
729			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisible (Art	2 días	lun 13/07/15	mar 14/07/15	728								
730			Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	mar 14/07/15	mar 14/07/15	729					14/07			
731			Plazo para recibir respuesta del adjuducatario (Art N°186 RLCA)	3 días	mié 15/07/15	vie 17/07/15	730								
732			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Art N°187 RLCA)	15 días	lun 20/07/15	vie 07/08/15	731								
733			Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	vie 07/08/15	vie 07/08/15	732					07/08			
734			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	5 días	lun 10/08/15	vie 14/08/15	733								
735			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	lun 17/08/15	lun 17/08/15	734								
736			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	lun 17/08/15	lun 17/08/15	735						Comision de adjudicación		
737			Adjudicación en firme	5 días	mar 18/08/15	lun 24/08/15	728,736						Comision de adjudicación		
738			Trámite de contrato	11 días	lun 10/08/15	lun 24/08/15									
739			Elaboración del Contrato	5 días	lun 17/08/15	lun 24/08/15	735								
740			Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	lun 17/08/15	lun 17/08/15	739CC					17/08			
741			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía, etc)	5 días	lun 17/08/15	lun 24/08/15	740								
742			Firma de contrato oferente	1 día	lun 10/08/15	lun 10/08/15	733						Contralor General,Externo,Unidad de Servicios		
743			Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	0 días	lun 10/08/15	lun 10/08/15	742					10/08			
744			Firma de contrato Despacho Contralor	5 días	mar 11/08/15	lun 17/08/15	743								
745			Envío de contrato a aprobación interna	0 días	lun 17/08/15	lun 17/08/15	742,744					17/08			
746			Aprobacion Interna de Contrato	5 días	mar 18/08/15	lun 24/08/15	745								
747			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	lun 24/08/15	lun 24/08/15	746					24/08			
748			Trámite del Pedido	3 días	mar 25/08/15	jue 27/08/15									
749			Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	mar 25/08/15	mié 26/08/15	746						Unidad de Servicios de Proveeduría		
750			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	mié 26/08/15	mié 26/08/15	749					26/08			
751			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	jue 27/08/15	jue 27/08/15	750								
752			Notificación de Pedido de Compra	0 días	jue 27/08/15	jue 27/08/15	750,751					27/08			
753			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	jue 27/08/15	jue 27/08/15	752					27/08			
754			Recepción de los items	4 días	mar 25/08/15	vie 28/08/15									
755			Entrega items en Almacén	1 día	mar 25/08/15	mar 25/08/15	746						Externo		
756			Recibido a satisfacción	3 días	mié 26/08/15	vie 28/08/15	755						Unidad Técnica		
757			Fin recepción de items	0 días	vie 28/08/15	vie 28/08/15	756					28/08			
758			Trámite de pago	6 días	lun 31/08/15	lun 07/09/15									
759			Envio documentos a Financiero	1 día	lun 31/08/15	lun 31/08/15	757						Unidad de Servicios de Proveeduría		
760			Emisión de pago en Financiero	5 días	mar 01/09/15	lun 07/09/15	759						Unidad de Administracion Financiera		
761			Conclusión trámite licitación	0 días	lun 07/09/15	lun 07/09/15	760					07/09			
762			2015LA-0000009-503 UTI_ Impresoras, Scanner (Contratación al 30/07/2015) \$17,800,000,00	138 días	jue 26/02/15	jue 10/09/15									

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: mar 20/01/15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre								
								3 diciembre	1 septiembre	11 mayo	18 enero	7 septiembre	05 junio	12 febrero	22 octubre	
763			Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	jue 26/02/15	jue 26/02/15										
764			Confección Documento complementario al cartel	23 días	jue 26/02/15	lun 30/03/15										
765			Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	jue 26/02/15	mié 04/03/15	763									
766			Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	jue 05/03/15	jue 12/03/15	765									
767			Revisión Técnica de cartel	7 días	vie 13/03/15	lun 23/03/15	766									
768			Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al cartel	5 días	mar 24/03/15	lun 30/03/15	767									
769			Invitación a participar	28 días	mar 31/03/15	mar 12/05/15										
770			Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de Mer	5 días	mar 31/03/15	mié 08/04/15	768									
771			Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	jue 09/04/15	mié 15/04/15	770									
772			Invitación a participar en Mer Link	1 día	jue 16/04/15	jue 16/04/15	771									
773			Plazo para recibir ofertas	17 días	vie 17/04/15	mar 12/05/15	772									
774			Recurso de Objeción al Cartel	17 días	vie 17/04/15	mar 12/05/15										
775			Presentacion de Objeción al cartel	5 días	vie 17/04/15	jue 23/04/15	772									
776			Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	vie 24/04/15	vie 24/04/15	775									
777			Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15	776									
778			Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	mar 28/04/15	mar 05/05/15	777									
779			Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	mié 06/05/15	lun 11/05/15	778									
780			Comunicación de Resolución final	1 día	mar 12/05/15	mar 12/05/15	779									
781			Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	vie 24/04/15	mar 12/05/15	775									
782			Recepción y estudio de ofertas	33 días	mié 13/05/15	vie 26/06/15										
783			Apertura de ofertas	1 día	mié 13/05/15	mié 13/05/15	781									
784			Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técn	1 día	jue 14/05/15	jue 14/05/15	783									
785			Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respuestas;	13 días	vie 15/05/15	mar 02/06/15	784									
786			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el análisis	1 día	mié 03/06/15	mié 03/06/15	785									
787			Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenciones	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15	786									
788			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En Mer-Lir	5 días	vie 05/06/15	jue 11/06/15	787									
789			Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	jue 11/06/15	jue 11/06/15	788									
790			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	vie 12/06/15	mar 16/06/15	789									
791			Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	mié											

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre								
								3 diciembre	1 septiembre	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio	12 febrero	22 octubre	
798			Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	lun 06/07/15	lun 06/07/15	797									
799			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	lun 06/07/15	lun 06/07/15	798									
800			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mar 07/07/15	mar 07/07/15	799									
801			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	mié 08/07/15	mié 08/07/15	800									
802			Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	jue 09/07/15	mié 15/07/15	801									
803			Recurso de revocatoria	36 días	jue 09/07/15	jue 27/08/15										
804			Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	jue 09/07/15	mié 15/07/15	801									
805			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisible (Art	2 días	jue 16/07/15	vie 17/07/15	804									
806			Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	vie 17/07/15	vie 17/07/15	805									
807			Plazo para recibir respuesta del adjuducatario (Art N°186 RLCA)	3 días	lun 20/07/15	mié 22/07/15	806									
808			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Art N°187 RLCA)	15 días	jue 23/07/15	mié 12/08/15	807									
809			Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	mié 12/08/15	mié 12/08/15	808									
810			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	5 días	jue 13/08/15	mié 19/08/15	809									
811			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 20/08/15	jue 20/08/15	810									
812			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 20/08/15	jue 20/08/15	811									
813			Adjudicación en firme	5 días	vie 21/08/15	jue 27/08/15	804,812									
814			Trámite de contrato	11 días	jue 13/08/15	jue 27/08/15										
815			Elaboración del Contrato	5 días	jue 20/08/15	jue 27/08/15	811									
816			Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	jue 20/08/15	jue 20/08/15	815CC									
817			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía, etc)	5 días	jue 20/08/15	jue 27/08/15	816									
818			Firma de contrato oferente	1 día	jue 13/08/15	jue 13/08/15	809									
819			Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	0 días	jue 13/08/15	jue 13/08/15	818									
820			Firma de contrato Despacho Contralor	5 días	vie 14/08/15	jue 20/08/15	819									
821			Envío de contrato a aprobación interna	0 días	jue 20/08/15	jue 20/08/15	818,820									
822			Aprobacion Interna de Contrato	5 días	vie 21/08/15	jue 27/08/15	821									
823			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	jue 27/08/15	jue 27/08/15	822									
824			Trámite del Pedido	3 días	vie 28/08/15	mar 01/09/15										
825			Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	vie 28/08/15	lun 31/08/15	822									
826			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	lun 31/08/15	lun 31/08/15	825									
827			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	mar 01/09/15	mar 01/09/15	826									
828			Notificación de Pedido de Compra	0 días	mar 01/09/15	mar 01/09/15	826,827									
829			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mar 01/09/15	mar 01/09/15	828									
830			Recepción de los items	4 días	vie 28/08/15	mié 02/09/15										
831			Entrega items en Almacén	1 día	vie 28/08/15	vie 28/08/15	822									
832			Recibido a satisfacción	3 días	lun 31/08/15	mié 02/09/15	831									

Proyecto: Cronograma de compra

Fecha: mar 20/01/15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre								
								3 diciembre	1 septiembre	11 mayo	18 enero	7 septiembre	05 junio	12 febrero	22 octubre	
868			Elaboración de Informe de recomendación	5 días	mié 27/05/15	mar 02/06/15	867									
869			Proceso de adjudicación	34 días	vie 17/04/15	jue 04/06/15										
870			Fecha máxima para adjudicar	34 días	vie 17/04/15	jue 04/06/15	858									
871			Recomendación, adjudicación y comunicación	6 días	vie 05/06/15	vie 12/06/15										
872			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	vie 05/06/15	mar 09/06/15	870									
873			Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 10/06/15	mié 10/06/15	872									
874			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 10/06/15	mié 10/06/15	873									
875			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	jue 11/06/15	jue 11/06/15	874									
876			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	vie 12/06/15	vie 12/06/15	875									
877			Adjudicación	5 días	lun 15/06/15	vie 19/06/15										
878			Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	lun 15/06/15	vie 19/06/15	876									
879			Recurso de revocatoria	36 días	lun 15/06/15	lun 03/08/15										
880			Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	lun 15/06/15	vie 19/06/15	876									
881			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisible (Art	2 días	lun 22/06/15	mar 23/06/15	880									
882			Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	mar 23/06/15	mar 23/06/15	881									
883			Plazo para recibir respuesta del adjuducatorio (Art N°186 RLCA)	3 días	mié 24/06/15	vie 26/06/15	882									
884			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Art N°187 RLCA)	15 días	lun 29/06/15	vie 17/07/15	883									
885			Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	vie 17/07/15	vie 17/07/15	884									
886			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	5 días	lun 20/07/15	vie 24/07/15	885									
887			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	lun 27/07/15	lun 27/07/15	886									
888			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	lun 27/07/15	lun 27/07/15	887									
889			Adjudicación en firme	5 días	mar 28/07/15	lun 03/08/15	880,888									
890			Trámite de contrato	11 días	lun 20/07/15	lun 03/08/15										
891			Elaboración del Contrato	5 días	lun 27/07/15	lun 03/08/15	887									
892			Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	lun 27/07/15	lun 27/07/15	891CC									
893			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía, etc)	5 días	lun 27/07/15	lun 03/08/15	892									
894			Firma de contrato oferente	1 día	lun 20/07/15	lun 20/07/15	885									
895			Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	0 días	lun 20/07/15	lun 20/07/15	894									
896			Firma de contrato Despacho Contralor	5 días	mar 21/07/15	lun 27/07/15	895									
897			Envío de contrato a aprobación interna	0 días	lun 27/07/15	lun 27/07/15	894,896									
898			Aprobacion Interna de Contrato	5 días	mar 28/07/15	lun 03/08/15	897									
899			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	lun 03/08/15	lun 03/08/15	898									
900			Trámite del Pedido	3 días	mar 04/08/15	jue 06/08/15										
901			Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	mar 04/08/15	mié 05/08/15										

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre					
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio
903			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	jue 06/08/15	jue 06/08/15	902						
904			Notificación de Pedido de Compra	0 días	jue 06/08/15	jue 06/08/15	902,903						
905			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	jue 06/08/15	jue 06/08/15	904						
906			Recepción de los items	4 días	mar 04/08/15	vie 07/08/15							
907			Entrega items en Almacén	1 día	mar 04/08/15	mar 04/08/15	898						
908			Recibido a satisfacción	3 días	mié 05/08/15	vie 07/08/15	907						
909			Fin recepción de items	0 días	vie 07/08/15	vie 07/08/15	908						
910			Trámite de pago	24 días	lun 10/08/15	jue 10/09/15							
911			Envio documentos a Financiero	1 día	lun 10/08/15	lun 10/08/15	909						
912			Emisión de pago en Financiero	5 días	mar 11/08/15	lun 17/08/15	911						
913			Conclusión trámite licitación	0 días	lun 17/08/15	lun 17/08/15	912						
914			Conclusión trámite licitación	0 días	jue 10/09/15	jue 10/09/15	836						
915			2015LA-00000011-503 USG_Servicios de Seguridad y vigilancia (Vence 08/08/15)" \$13,000,000,00	138 días	lun 02/03/15	lun 14/09/15							
916			Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	lun 02/03/15	lun 02/03/15							
917			Confección Documento complementario al cartel	23 días	lun 02/03/15	mié 01/04/15							
918			Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 02/03/15	vie 06/03/15	916						
919			Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	lun 09/03/15	lun 16/03/15	918						
920			Revisión Técnica de cartel	7 días	mar 17/03/15	mié 25/03/15	919						
921			Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al cartel	5 días	jue 26/03/15	mié 01/04/15	920						
922			Invitación a participar	28 días	lun 06/04/15	jue 14/05/15							
923			Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de Mer	5 días	lun 06/04/15	vie 10/04/15	921						
924			Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	lun 13/04/15	vie 17/04/15	923						
925			Invitación a participar en Mer Link	1 día	lun 20/04/15	lun 20/04/15	924						
926			Plazo para recibir ofertas	17 días	mar 21/04/15	jue 14/05/15	925						
927			Recurso de Objeción al Cartel	17 días	mar 21/04/15	jue 14/05/15							
928			Presentacion de Objeción al cartel	5 días	mar 21/04/15	lun 27/04/15	925						
929			Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	mar 28/04/15	mar 28/04/15	928						
930			Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	mié 29/04/15	mié 29/04/15	929						
931			Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	jue 30/04/15	jue 07/05/15	930						
932			Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	vie 08/05/15	mié 13/05/15	931						
933			Comunicación de Resolución final	1 día	jue 14/05/15	jue 14/05/15	932						
934			Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	mar 28/04/15	jue 14/05/15	928						
935			Recepción y estudio de ofertas	33 días	vie 15/05/15	mar 30/06/15							
936			Apertura de ofertas	1 día	vie 15/05/15	vie 15/05/15	934						

Proyecto: Cronograma de compra

Fecha: mar 20/01/15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 27

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre						
								3 diciembre	1 septiembre	11 mayo	18 enero	7 septiembre	05 junio	12 febrero
937			Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnica)	1 día	lun 18/05/15	lun 18/05/15	936							
938			Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respuestas;	13 días	mar 19/05/15	jue 04/06/15	937							
939			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el análisis	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15	938							
940			Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenciones	1 día	lun 08/06/15	lun 08/06/15	939							
941			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En Mer-Link)	5 días	mar 09/06/15	lun 15/06/15	940							
942			Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	lun 15/06/15	lun 15/06/15	941							
943			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mar 16/06/15	jue 18/06/15	942							
944			Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	vie 19/06/15	mar 23/06/15	943							
945			Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	mar 23/06/15	mar 23/06/15	944							
946			Elaboración de Informe de recomendación	5 días	mié 24/06/15	mar 30/06/15	945							
947			Proceso de adjudicación	34 días	lun 18/05/15	jue 02/07/15								
948			Fecha máxima para adjudicar	34 días	lun 18/05/15	jue 02/07/15	936							
949			Recomendación, adjudicación y comunicación	6 días	vie 03/07/15	vie 10/07/15								
950			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	vie 03/07/15	mar 07/07/15	948							
951			Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 08/07/15	mié 08/07/15	950							
952			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 08/07/15	mié 08/07/15	951							
953			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	jue 09/07/15	jue 09/07/15	952							
954			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	vie 10/07/15	vie 10/07/15	953							
955			Adjudicación	5 días	lun 13/07/15	vie 17/07/15								
956			Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	lun 13/07/15	vie 17/07/15	954							
957			Recurso de revocatoria	36 días	lun 13/07/15	lun 31/08/15								
958			Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	lun 13/07/15	vie 17/07/15	954							
959			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisble (Art N°186 RLCA)	2 días	lun 20/07/15	mar 21/07/15	958							
960			Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	mar 21/07/15	mar 21/07/15	959							
961			Plazo para recibir respuesta del adjuducatario (Art N°186 RLCA)	3 días	mié 22/07/15	vie 24/07/15	960							
962			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Art N°187 RLCA)	15 días	lun 27/07/15	vie 14/08/15	961							
963			Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	vie 14/08/15	vie 14/08/15	962							
964			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	5 días	lun 17/08/15	vie 21/08/15	963							
965			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	lun 24/08/15	lun 24/08/15	964							
966			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	lun 24/08/15	lun 24/08/15	965							
967			Adjudicación en firme	5 días	mar 25/08/15	lun 31/08/15	958,966							
968			Trámite de contrato	11 días	lun 17/08/15	lun 31/08/15								
969			Elaboración del Contrato	5 días	lun 24/08/15	lun 31/08/15	965							
970			Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	lun 24/08/15	lun 24/08/15	969CC							
971			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	lun 24/08/15	lun 31/08/15	970							

Proyecto: Cronograma de compra

Fecha: mar 20/01/15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 28

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre											
								3 diciembre	4 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio	12 febrero	22 octubre				
972			Firma de contrato oferente	1 día	lun 17/08/15	lun 17/08/15	963												
973			Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	0 días	lun 17/08/15	lun 17/08/15	972												
974			Firma de contrato Despacho Contralor	5 días	mar 18/08/15	lun 24/08/15	973												
975			Envío de contrato a aprobación interna	0 días	lun 24/08/15	lun 24/08/15	972,974												
976			Aprobacion Interna de Contrato	5 días	mar 25/08/15	lun 31/08/15	975												
977			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	lun 31/08/15	lun 31/08/15	976												
978			Trámite del Pedido	3 días	mar 01/09/15	jue 03/09/15													
979			Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	mar 01/09/15	mié 02/09/15	976												
980			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	mié 02/09/15	mié 02/09/15	979												
981			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	jue 03/09/15	jue 03/09/15	980												
982			Notificación de Pedido de Compra	0 días	jue 03/09/15	jue 03/09/15	980,981												
983			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	jue 03/09/15	jue 03/09/15	982												
984			Recepción de los items	4 días	mar 01/09/15	vie 04/09/15													
985			Entrega items en Almacén	1 día	mar 01/09/15	mar 01/09/15	976												
986			Recibido a satisfacción	3 días	mié 02/09/15	vie 04/09/15	985												
987			Fin recepción de items	0 días	vie 04/09/15	vie 04/09/15	986												
988			Trámite de pago	6 días	lun 07/09/15	lun 14/09/15													
989			Envio documentos a Financiero	1 día	lun 07/09/15	lun 07/09/15	987												
990			Emisión de pago en Financiero	5 días	mar 08/09/15	lun 14/09/15	989												
991			Conclusión trámite licitación	0 días	lun 14/09/15	lun 14/09/15	990												
992			2015LA-0000012-503 USG_ Remodelación Despacho Contralor (Contratado al 30/08/15) \$15,000.000,00	138 días	lun 23/03/15	mar 06/10/15													
993			Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	lun 23/03/15	lun 23/03/15													
994			Confección Documento complementario al cartel	23 días	lun 23/03/15	vie 24/04/15													
995			Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 23/03/15	vie 27/03/15	993												
996			Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	lun 30/03/15	mié 08/04/15	995												
997			Revisión Técnica de cartel	7 días	jue 09/04/15	vie 17/04/15	996												
998			Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al cartel	5 días	lun 20/04/15	vie 24/04/15	997												
999			Invitación a participar	28 días	lun 27/04/15	jue 04/06/15													
1000			Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de Mer	5 días	lun 27/04/15	lun 04/05/15	998												
1001			Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	mar 05/05/15	lun 11/05/15	1000												
1002			Invitación a participar en Mer Link	1 día	mar 12/05/15	mar 12/05/15	1001												
1003			Plazo para recibir ofertas	17 días	mié 13/05/15	jue 04/06/15	1002												
1004			Recurso de Objeción al Cartel	17 días	mié 13/05/15	jue 04/06/15													
1005			Presentacion de Objeción al cartel	5 días	mié 13/05/15	mar 19/05/15	1002												

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: mar 20/01/15

TareaTareas externas

DivisiónHito externo

HitoTarea inactiva

ResumenHito inactivo

Resumen del proyectoResumen inactivo

Tarea manualSólo duración

Informe de resumen manualResumen manual

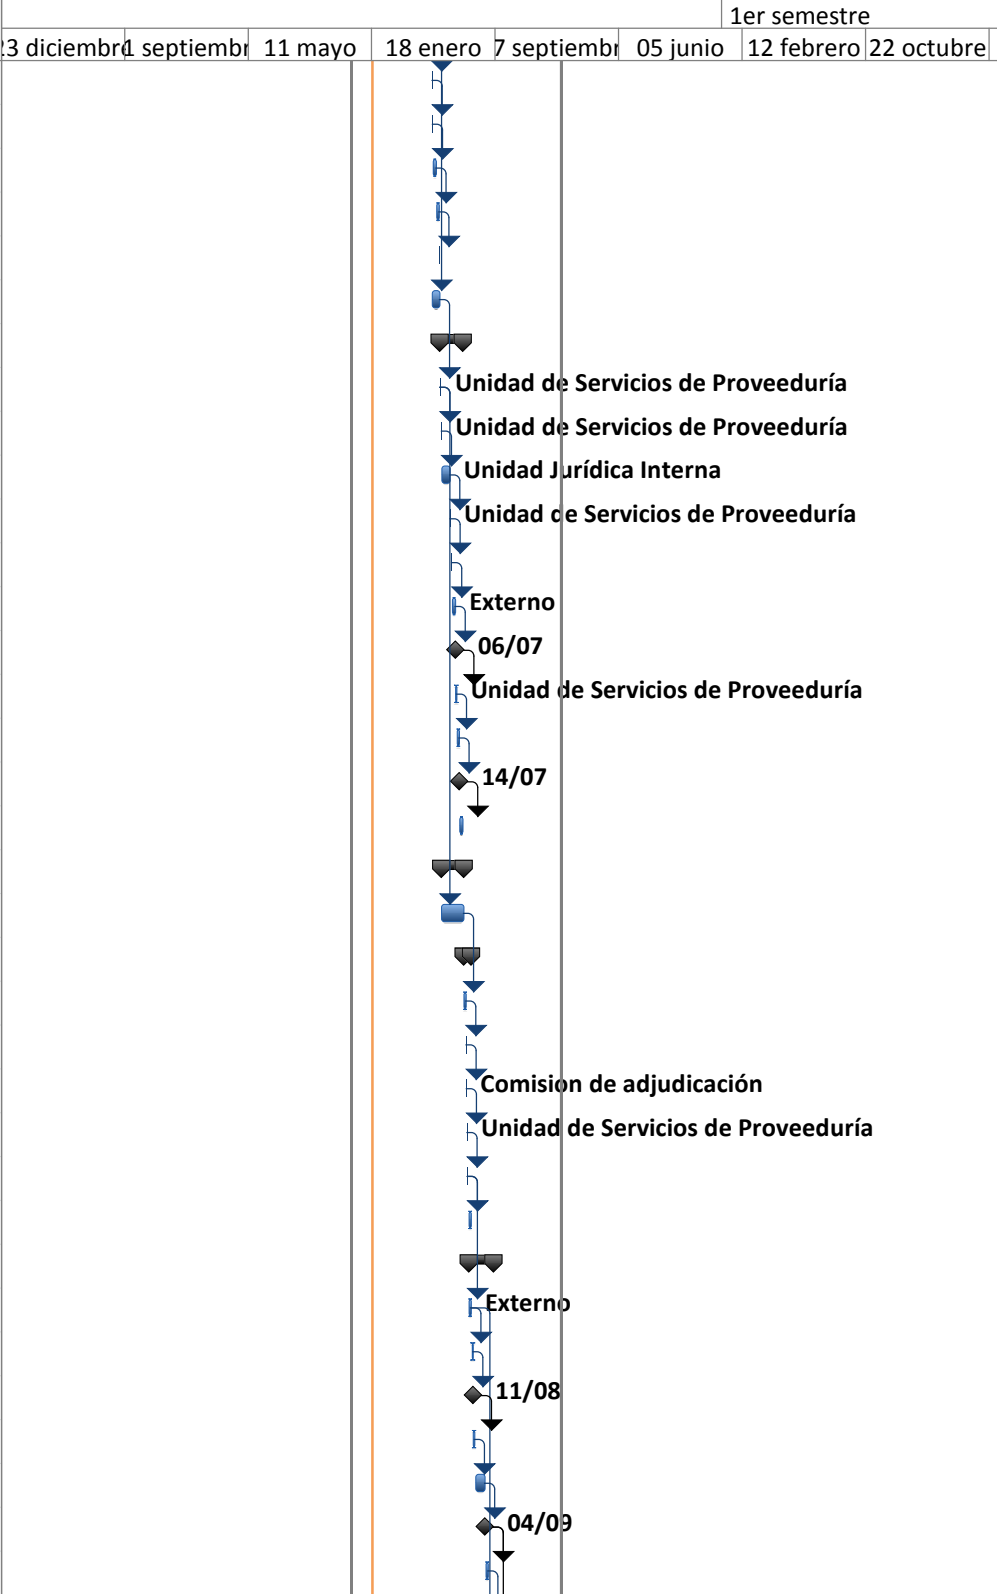
Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 29

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre						
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio	12 febrero
1006			Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	mié 20/05/15	mié 20/05/15	1005							
1007			Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	jue 21/05/15	jue 21/05/15	1006							
1008			Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	vie 22/05/15	jue 28/05/15	1007							
1009			Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	vie 29/05/15	mié 03/06/15	1008							
1010			Comunicación de Resolución final	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15	1009							
1011			Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	mié 20/05/15	jue 04/06/15	1005							
1012			Recepción y estudio de ofertas	33 días	vie 05/06/15	mar 21/07/15								
1013			Apertura de ofertas	1 día	vie 05/06/15	vie 05/06/15	1011		Unidad de Servicios de Proveeduría					
1014			Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técn	1 día	lun 08/06/15	lun 08/06/15	1013		Unidad de Servicios de Proveeduría					
1015			Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respuestas;	13 días	mar 09/06/15	jue 25/06/15	1014		Unidad Jurídica Interna					
1016			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el análisis	1 día	vie 26/06/15	vie 26/06/15	1015		Unidad de Servicios de Proveeduría					
1017			Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenciones	1 día	lun 29/06/15	lun 29/06/15	1016							
1018			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En Mer-Link)	5 días	mar 30/06/15	lun 06/07/15	1017		Externo					
1019			Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	lun 06/07/15	lun 06/07/15	1018		06/07					
1020			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mar 07/07/15	jue 09/07/15	1019		Unidad de Servicios de Proveeduría					
1021			Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	vie 10/07/15	mar 14/07/15	1020							
1022			Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	mar 14/07/15	mar 14/07/15	1021		14/07					
1023			Elaboración de Informe de recomendación	5 días	mié 15/07/15	mar 21/07/15	1022							
1024			Proceso de adjudicación	34 días	lun 08/06/15	jue 23/07/15								
1025			Fecha máxima para adjudicar	34 días	lun 08/06/15	jue 23/07/15	1013							
1026			Recomendación, adjudicación y comunicación	11 días	vie 24/07/15	vie 07/08/15								
1027			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	vie 24/07/15	mar 28/07/15	1025							
1028			Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 29/07/15	mié 29/07/15	1027							
1029			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 29/07/15	mié 29/07/15	1028		Comision de adjudicación					
1030			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	jue 30/07/15	jue 30/07/15	1029		Unidad de Servicios de Proveeduría					
1031			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	vie 31/07/15	vie 31/07/15	1030							
1032			Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	lun 03/08/15	vie 07/08/15	1031							
1033			Recurso de revocatoria	36 días	lun 03/08/15	mar 22/09/15								
1034			Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	lun 03/08/15	vie 07/08/15	1031		Externo					
1035			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisble (Art	2 días	lun 10/08/15	mar 11/08/15	1034							
1036			Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	mar 11/08/15	mar 11/08/15	1035		11/08					
1037			Plazo para recibir respuesta del adjuducatario (Art N°186 RLCA)	3 días	mié 12/08/15	vie 14/08/15	1036							
1038			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Art N°187 RLCA)	15 días	lun 17/08/15	vie 04/09/15	1037							
1039			Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	vie 04/09/15	vie 04/09/15	1038		04/09					
1040			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	5 días	lun 07/09/15	vie 11/09/15	1039							

Proyecto: Cronograma de compra Fecha: mar 20/01/15	Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin	
	División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite	
	Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen		Hito inactivo		Resumen manual			
	Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo			

Página 30

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre					
								3 diciembre	1 septiembre	11 mayo	18 enero	7 septiembre	05 junio
1041			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	lun 14/09/15	lun 14/09/15	1040						
1042			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	lun 14/09/15	lun 14/09/15	1041						
1043			Adjudicación en firme	5 días	mié 16/09/15	mar 22/09/15	1034,1042						
1044			Trámite de contrato	11 días	lun 07/09/15	mar 22/09/15							
1045			Elaboración del Contrato	5 días	lun 14/09/15	mar 22/09/15	1041						
1046			Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	lun 14/09/15	lun 14/09/15	1045CC						
1047			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	lun 14/09/15	mar 22/09/15	1046						
1048			Firma de contrato oferente	1 día	lun 07/09/15	lun 07/09/15	1039						
1049			Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	0 días	lun 07/09/15	lun 07/09/15	1048						
1050			Firma de contrato Despacho Contralor	5 días	mar 08/09/15	lun 14/09/15	1049						
1051			Envío de contrato a aprobación interna	0 días	lun 14/09/15	lun 14/09/15	1048,1050						
1052			Aprobacion Interna de Contrato	5 días	mié 16/09/15	mar 22/09/15	1051						
1053			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	mar 22/09/15	mar 22/09/15	1052						
1054			Trámite del Pedido	3 días	mié 23/09/15	vie 25/09/15							
1055			Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	mié 23/09/15	jue 24/09/15	1052						
1056			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	jue 24/09/15	jue 24/09/15	1055						
1057			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	vie 25/09/15	vie 25/09/15	1056						
1058			Notificación de Pedido de Compra	0 días	vie 25/09/15	vie 25/09/15	1056,1057						
1059			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	vie 25/09/15	vie 25/09/15	1058						
1060			Recepción de los items	4 días	mié 23/09/15	lun 28/09/15							
1061			Entrega items en Almacén	1 día	mié 23/09/15	mié 23/09/15	1052						
1062			Recibido a satisfacción	3 días	jue 24/09/15	lun 28/09/15	1061						
1063			Fin recepción de items	0 días	lun 28/09/15	lun 28/09/15	1062						
1064			Trámite de pago	6 días	mar 29/09/15	mar 06/10/15							
1065			Envio documentos a Financiero	1 día	mar 29/09/15	mar 29/09/15	1063						
1066			Emisión de pago en Financiero	5 días	mié 30/09/15	mar 06/10/15	1065						
1067			Conclusión trámite licitación	0 días	mar 06/10/15	mar 06/10/15	1066						
1068			2015LA-0000013-503 UTI_Accesorios (Contratación a 30/08/2015) \$46,440.800,00	138 días	jue 26/02/15	jue 10/09/15							
1069			Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	jue 26/02/15	jue 26/02/15							
1070			Confección Documento complementario al cartel	23 días	jue 26/02/15	lun 30/03/15							
1071			Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	jue 26/02/15	mié 04/03/15	1069						
1072			Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	jue 05/03/15	jue 12/03/15	1071						
1073			Revisión Técnica de cartel	7 días	vie 13/03/15	lun 23/03/15	1072						
1074			Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al cartel	5 días	mar 24/03/15	lun 30/03/15	1073						
1075			Invitación a participar	28 días	mar 31/03/15	mar 12/05/15							

Proyecto: Cronograma de compra

Fecha: mar 20/01/15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 31

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre								
								3 diciembre	1 septiembre	11 mayo	18 enero	7 septiembre	05 junio	12 febrero	22 octubre	
1076			Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de Mer	5 días	mar 31/03/15	mié 08/04/15	1074									
1077			Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	jue 09/04/15	mié 15/04/15	1076									
1078			Invitación a participar en Mer Link	1 día	jue 16/04/15	jue 16/04/15	1077									
1079			Plazo para recibir ofertas	17 días	vie 17/04/15	mar 12/05/15	1078									
1080			Recurso de Objeción al Cartel	17 días	vie 17/04/15	mar 12/05/15										
1081			Presentacion de Objeción al cartel	5 días	vie 17/04/15	jue 23/04/15	1078									
1082			Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	vie 24/04/15	vie 24/04/15	1081									
1083			Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	lun 27/04/15	lun 27/04/15	1082									
1084			Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	mar 28/04/15	mar 05/05/15	1083									
1085			Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	mié 06/05/15	lun 11/05/15	1084									
1086			Comunicación de Resolución final	1 día	mar 12/05/15	mar 12/05/15	1085									
1087			Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	vie 24/04/15	mar 12/05/15	1081									
1088			Recepción y estudio de ofertas	33 días	mié 13/05/15	vie 26/06/15										
1089			Apertura de ofertas	1 día	mié 13/05/15	mié 13/05/15	1087									
1090			Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técn	1 día	jue 14/05/15	jue 14/05/15	1089									
1091			Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respuestas;	13 días	vie 15/05/15	mar 02/06/15	1090									
1092			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el análisis	1 día	mié 03/06/15	mié 03/06/15	1091									
1093			Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenciones	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15	1092									
1094			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En Mer-Link)	5 días	vie 05/06/15	jue 11/06/15	1093									
1095			Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	jue 11/06/15	jue 11/06/15	1094									
1096			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	vie 12/06/15	mar 16/06/15	1095									
1097			Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	mié 17/06/15	vie 19/06/15	1096									
1098			Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	vie 19/06/15	vie 19/06/15	1097									
1099			Elaboración de Informe de recomendación	5 días	lun 22/06/15	vie 26/06/15	1098									
1100			Proceso de adjudicación	34 días	jue 14/05/15	mar 30/06/15										
1101			Fecha máxima para adjudicar	34 días	jue 14/05/15	mar 30/06/15	1089									
1102			Recomendación, adjudicación y comunicación	11 días	mié 01/07/15	mié 15/07/15										
1103			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mié 01/07/15	vie 03/07/15	1101									
1104			Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	lun 06/07/15	lun 06/07/15	1103									
1105			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	lun 06/07/15	lun 06/07/15	1104									
1106			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mar 07/07/15	mar 07/07/15	1105									
1107			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	mié 08/07/15	mié 08/07/15	1106									
1108			Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	jue 09/07/15	mié 15/07/15	1107									
1109			Recurso de revocatoria	36 días	jue 09/07/15	jue 27/08/15										
1110			Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	jue 09/07/15	mié 15/07/15	1107									

Proyecto: Cronograma de compra Fecha: mar 20/01/15	Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin	
	División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite	
	Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen		Hito inactivo		Resumen manual			
	Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo			

Página 32

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre							
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio	12 febrero	22 octubre
1111			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisible (Art	2 días	jue 16/07/15	vie 17/07/15	1110								
1112			Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	vie 17/07/15	vie 17/07/15	1111						17/07		
1113			Plazo para recibir respuesta del adjuducatario (Art N°186 RLCA)	3 días	lun 20/07/15	mié 22/07/15	1112								
1114			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Art N°187 RLCA)	15 días	jue 23/07/15	mié 12/08/15	1113								
1115			Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	mié 12/08/15	mié 12/08/15	1114						12/08		
1116			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	5 días	jue 13/08/15	mié 19/08/15	1115								
1117			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 20/08/15	jue 20/08/15	1116								
1118			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 20/08/15	jue 20/08/15	1117						Comision de adjudicación		
1119			Adjudicación en firme	5 días	vie 21/08/15	jue 27/08/15	1110,1118						Comision de adjudicación		
1120			Trámite de contrato	11 días	jue 13/08/15	jue 27/08/15									
1121			Elaboración del Contrato	5 días	jue 20/08/15	jue 27/08/15	1117								
1122			Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	jue 20/08/15	jue 20/08/15	1121CC						20/08		
1123			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía, etc)	5 días	jue 20/08/15	jue 27/08/15	1122								
1124			Firma de contrato oferente	1 día	jue 13/08/15	jue 13/08/15	1115						Contralor General,Externo,Unidad de Servicios		
1125			Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	0 días	jue 13/08/15	jue 13/08/15	1124						13/08		
1126			Firma de contrato Despacho Contralor	5 días	vie 14/08/15	jue 20/08/15	1125								
1127			Envío de contrato a aprobación interna	0 días	jue 20/08/15	jue 20/08/15	1124,1126						20/08		
1128			Aprobacion Interna de Contrato	5 días	vie 21/08/15	jue 27/08/15	1127								
1129			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	jue 27/08/15	jue 27/08/15	1128						27/08		
1130			Trámite del Pedido	3 días	vie 28/08/15	mar 01/09/15									
1131			Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	vie 28/08/15	lun 31/08/15	1128						Unidad de Servicios de Proveeduría		
1132			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	lun 31/08/15	lun 31/08/15	1131						31/08		
1133			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	mar 01/09/15	mar 01/09/15	1132								
1134			Notificación de Pedido de Compra	0 días	mar 01/09/15	mar 01/09/15	1132,1133						01/09		
1135			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mar 01/09/15	mar 01/09/15	1134						01/09		
1136			Recepción de los items	4 días	vie 28/08/15	mié 02/09/15									
1137			Entrega items en Almacén	1 día	vie 28/08/15	vie 28/08/15	1128						Externo		
1138			Recibido a satisfacción	3 días	lun 31/08/15	mié 02/09/15	1137						Unidad Técnica		
1139			Fin recepción de items	0 días	mié 02/09/15	mié 02/09/15	1138						02/09		
1140			Trámite de pago	6 días	jue 03/09/15	jue 10/09/15									
1141			Envio documentos a Financiero	1 día	jue 03/09/15	jue 03/09/15	1139						Unidad de Servicios de Proveeduría		
1142			Emisión de pago en Financiero	5 días	vie 04/09/15	jue 10/09/15	1141						Unidad de Administracion Financiera		
1143			Conclusión trámite licitación	0 días	jue 10/09/15	jue 10/09/15	1142						10/09		
1144			2015LA-0000014-503 UTI_Adquisición de Software (Contratación a 01/09/2015) \$14,780.000,00	138 días	lun 06/04/15	lun 19/10/15									

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: mar 20/01/15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre									
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio	12 febrero	22 octubre		
1145			Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	lun 06/04/15	lun 06/04/15											
1146			Confección Documento complementario al cartel	23 días	lun 06/04/15	jue 07/05/15											
1147			Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 06/04/15	vie 10/04/15	1145										
1148			Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	lun 13/04/15	lun 20/04/15	1147										
1149			Revisión Técnica de cartel	7 días	mar 21/04/15	mié 29/04/15	1148										
1150			Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al cartel	5 días	jue 30/04/15	jue 07/05/15	1149										
1151			Invitación a participar	28 días	vie 08/05/15	mar 16/06/15											
1152			Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de Mer	5 días	vie 08/05/15	jue 14/05/15	1150										
1153			Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	vie 15/05/15	jue 21/05/15	1152										
1154			Invitación a participar en Mer Link	1 día	vie 22/05/15	vie 22/05/15	1153										
1155			Plazo para recibir ofertas	17 días	lun 25/05/15	mar 16/06/15	1154										
1156			Recurso de Objeción al Cartel	17 días	lun 25/05/15	mar 16/06/15											
1157			Presentacion de Objeción al cartel	5 días	lun 25/05/15	vie 29/05/15	1154										
1158			Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	lun 01/06/15	lun 01/06/15	1157										
1159			Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	mar 02/06/15	mar 02/06/15	1158										
1160			Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	mié 03/06/15	mar 09/06/15	1159										
1161			Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	mié 10/06/15	lun 15/06/15	1160										
1162			Comunicación de Resolución final	1 día	mar 16/06/15	mar 16/06/15	1161										
1163			Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	lun 01/06/15	mar 16/06/15	1157										
1164			Recepción y estudio de ofertas	33 días	mié 17/06/15	vie 31/07/15											
1165			Apertura de ofertas	1 día	mié 17/06/15	mié 17/06/15	1163										
1166			Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y téc	1 día	jue 18/06/15	jue 18/06/15	1165										
1167			Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respuestas;	13 días	vie 19/06/15	mar 07/07/15	1166										
1168			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el análisis	1 día	mié 08/07/15	mié 08/07/15	1167										
1169			Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenciones	1 día	jue 09/07/15	jue 09/07/15	1168										
1170			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En Mer-Lir	5 días	vie 10/07/15	jue 16/07/15	1169										
1171			Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	jue 16/07/15	jue 16/07/15	1170										
1172			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	vie 17/07/15	mar 21/07/15	1171										
1173			Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	mié 22/07/15	vie 24/07/15	1172										
1174			Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	vie 24/07/15	vie 24/07/15	1173										
1175			Elaboración de Informe de recomendación	5 días	lun 27/07/15	vie 31/07/15	1174										
1176			Proceso de adjudicación	34 días	jue 18/06/15	mar 04/08/15											
1177			Fecha máxima para adjudicar	34 días	jue 18/06/15	mar 04/08/15	1165										
1178			Recomendación, adjudicación y comunicación	11 días	mié 05/08/15	mié 19/08/15											
1179			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mié 05/08/15	vie 07/08/15	1177										

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: mar 20/01/15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 34

[illegible]

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre											
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio	12 febrero	22 octubre				
1318			Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnica)	1 día	jue 09/07/15	jue 09/07/15	1317		Unidad de Servicios de Proveduría										
1319			Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respuestas;	13 días	vie 10/07/15	mar 28/07/15	1318		Unidad Jurídica Interna										
1320			Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado el análisis	1 día	mié 29/07/15	mié 29/07/15	1319		Unidad de Servicios de Proveduría										
1321			Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenciones	1 día	jue 30/07/15	jue 30/07/15	1320												
1322			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En Mer-Link)	5 días	vie 31/07/15	jue 06/08/15	1321		Externo										
1323			Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	jue 06/08/15	jue 06/08/15	1322		06/08										
1324			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	vie 07/08/15	mar 11/08/15	1323		Unidad de Servicios de Proveduría										
1325			Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	mié 12/08/15	vie 14/08/15	1324												
1326			Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	vie 14/08/15	vie 14/08/15	1325		14/08										
1327			Elaboración de Informe de recomendación	5 días	lun 17/08/15	vie 21/08/15	1326												
1328			Proceso de adjudicación	34 días	jue 09/07/15	mar 25/08/15													
1329			Fecha máxima para adjudicar	34 días	jue 09/07/15	mar 25/08/15	1317												
1330			Recomendación, adjudicación y comunicación	11 días	mié 26/08/15	mié 09/09/15													
1331			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mié 26/08/15	vie 28/08/15	1329												
1332			Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	lun 31/08/15	lun 31/08/15	1331												
1333			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	lun 31/08/15	lun 31/08/15	1332		Comision de adjudicación										
1334			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mar 01/09/15	mar 01/09/15	1333		Unidad de Servicios de Proveduría										
1335			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	mié 02/09/15	mié 02/09/15	1334												
1336			Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	jue 03/09/15	mié 09/09/15	1335												
1337			Recurso de revocatoria	36 días	jue 03/09/15	lun 26/10/15													
1338			Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	jue 03/09/15	mié 09/09/15	1335		Externo										
1339			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisible (Art N°186 RLCA)	2 días	jue 10/09/15	vie 11/09/15	1338												
1340			Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	vie 11/09/15	vie 11/09/15	1339		11/09										
1341			Plazo para recibir respuesta del adjuducatario (Art N°186 RLCA)	3 días	lun 14/09/15	jue 17/09/15	1340												
1342			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Art N°187 RLCA)	15 días	vie 18/09/15	jue 08/10/15	1341												
1343			Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	jue 08/10/15	jue 08/10/15	1342		08/10										
1344			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	5 días	vie 09/10/15	vie 16/10/15	1343												
1345			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	lun 19/10/15	lun 19/10/15	1344												
1346			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	lun 19/10/15	lun 19/10/15	1345		Comision de adjudicación										
1347			Adjudicación en firme	5 días	mar 20/10/15	lun 26/10/15	1338,1346		Comision de adjudicación										
1348			Trámite de contrato	11 días	vie 09/10/15	lun 26/10/15													
1349			Elaboración del Contrato	5 días	lun 19/10/15	lun 26/10/15	1345												
1350			Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	lun 19/10/15	lun 19/10/15	1349CC	19/10											
1351			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	lun 19/10/15	lun 26/10/15	1350												
1352			Firma de contrato oferente	1 día	vie 09/10/15	vie 09/10/15	1343	Contralor General,Externo,Unidad de Servicios											

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: mar 20/01/15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

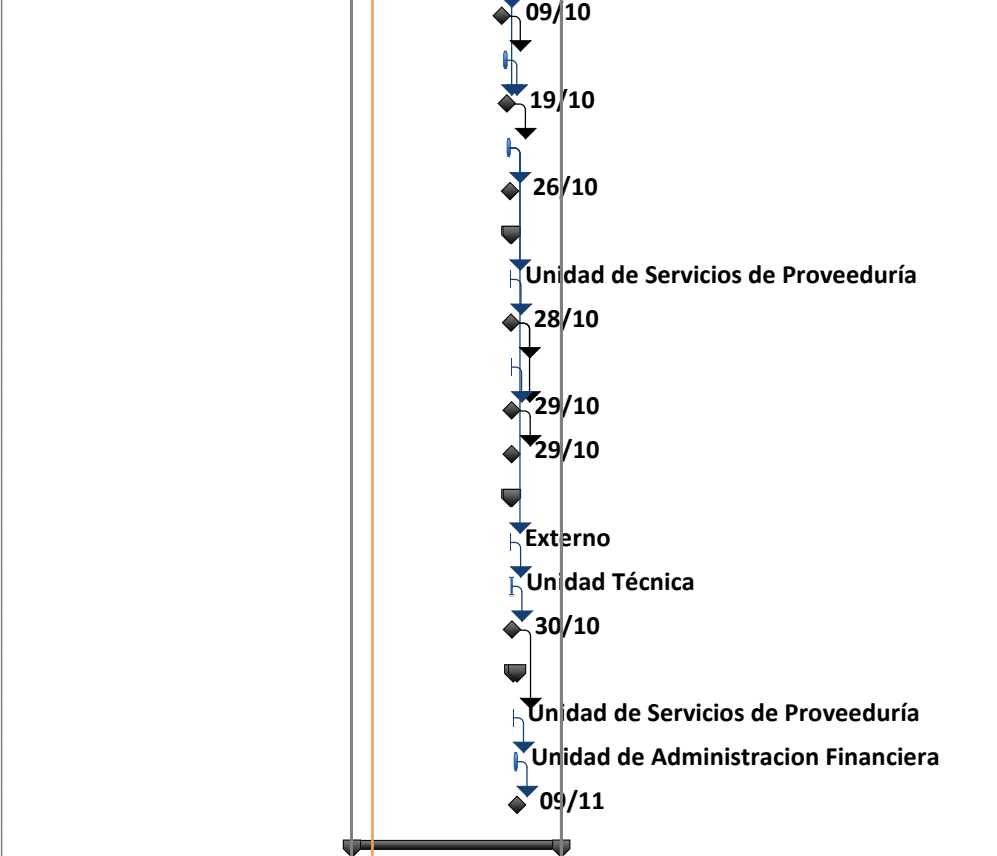
Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 39

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre						
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio	12 febrero
1353			Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	0 días	vie 09/10/15	vie 09/10/15	1352							
1354			Firma de contrato Despacho Contralor	5 días	mar 13/10/15	lun 19/10/15	1353							
1355			Envío de contrato a aprobación interna	0 días	lun 19/10/15	lun 19/10/15	1352,1354							
1356			Aprobacion Interna de Contrato	5 días	mar 20/10/15	lun 26/10/15	1355							
1357			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	lun 26/10/15	lun 26/10/15	1356							
1358			Trámite del Pedido	3 días	mar 27/10/15	jue 29/10/15								
1359			Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	mar 27/10/15	mié 28/10/15	1356							
1360			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	mié 28/10/15	mié 28/10/15	1359							
1361			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	jue 29/10/15	jue 29/10/15	1360							
1362			Notificación de Pedido de Compra	0 días	jue 29/10/15	jue 29/10/15	1360,1361							
1363			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	jue 29/10/15	jue 29/10/15	1362							
1364			Recepción de los items	4 días	mar 27/10/15	vie 30/10/15								
1365			Entrega items en Almacén	1 día	mar 27/10/15	mar 27/10/15	1356							
1366			Recibido a satisfacción	3 días	mié 28/10/15	vie 30/10/15	1365							
1367			Fin recepción de items	0 días	vie 30/10/15	vie 30/10/15	1366							
1368			Trámite de pago	6 días	lun 02/11/15	lun 09/11/15								
1369			Envio documentos a Financiero	1 día	lun 02/11/15	lun 02/11/15	1367							
1370			Emisión de pago en Financiero	5 días	mar 03/11/15	lun 09/11/15	1369							
1371			Conclusión trámite licitación	0 días	lun 09/11/15	lun 09/11/15	1370							
1372			COMPRAS DIRECTAS	278,5 días	lun 08/12/14	lun 08/02/16								
1373			2015CD-000001-503 UGPH_Capacitación (Desde enero 2015, Con Objeción y con Revocatoria) \$89,780.000,00	40 días	lun 08/12/14	vie 13/02/15								
1374			Contratación	0,8 días	lun 08/12/14	lun 08/12/14								
1375			Contacto al Proveedor	0,5 días	lun 08/12/14	lun 08/12/14								
1376			Verificación de datos	0,1 días	lun 08/12/14	lun 08/12/14	1375							
1377			Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	0,1 días	lun 08/12/14	lun 08/12/14	1376							
1378			Adjudicación en firme	0,1 días	lun 08/12/14	lun 08/12/14	1377							
1379			Trámite del Pedido	3,2 días	lun 08/12/14	jue 11/12/14								
1380			Elaboración del Pedido de Compra	0,2 días	lun 08/12/14	lun 08/12/14	1378							
1381			Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	2 días	mar 09/12/14	mié 10/12/14	1380							
1382			Notificación de Pedido de Compra	1 día	jue 11/12/14	jue 11/12/14	1381							
1383			Ejecución	4 días	vie 12/12/14	mié 17/12/14								
1384			Realización del Evento	1 día	vie 12/12/14	vie 12/12/14	1382							
1385			Recibido a satisfacción	3 días	lun 15/12/14	mié 17/12/14	1384							
1386			Trámite de pago	32 días	jue 18/12/14	vie 13/02/15								

Proyecto: Cronograma de compra Fecha: mar 20/01/15	Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin	
	División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite	
	Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen		Hito inactivo		Resumen manual			
	Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo			

Página 40

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre								
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio	12 febrero	22 octubre	
1387			Envío documentos a Financiero	2 días	jue 18/12/14	vie 19/12/14	1385									
1388			Emisión de pago en Financiero	30 días	lun 05/01/15	vie 13/02/15	1387									
1389			Conclusión trámite de Contratación	0 días	vie 13/02/15	vie 13/02/15	1388									
1390			CONSULTORIAS DFOE_USG_DJ \$42,848.000,00 2015CD-000002-503 DFOE_Consultor Actuarial (Contratado para 01/02/15; Con Objeción y con Revocatoria) \$6,000.000,00	240 días	mar 16/12/14	lun 07/12/15										
1391				84 días	mié 17/12/14	mié 29/04/15										
1392			Elaboración de Cartel	5 días	mié 17/12/14	mar 06/01/15										
1393			Recepción Especificaciones técnicas y elaboracion del cartel (UGA)	2 días	mié 17/12/14	jue 18/12/14										
1394			Revisión Técnica de cartel	1 día	vie 19/12/14	vie 19/12/14	1393									
1395			Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	lun 05/01/15	lun 05/01/15	1394									
1396			Confección de cartel definitivo	1 día	mar 06/01/15	mar 06/01/15	1395									
1397			Invitación a participar en Mer- Link	0 días	mar 06/01/15	mar 06/01/15	1396									
1398			Recepción y estudio de ofertas	24 días	mar 06/01/15	lun 09/02/15										
1399			Invitación a participar	15 días	mar 06/01/15	mar 27/01/15										
1400			Envío de invitación	0 días	mar 06/01/15	mar 06/01/15	1397									
1401			Objeción al cartel	10 días	mié 07/01/15	mar 20/01/15	1400									
1402			Nuevo plazo para recibir ofertas	5 días	mié 21/01/15	mar 27/01/15	1401									
1403			Recepción y estudio de ofertas	9 días	mar 27/01/15	lun 09/02/15										
1404			Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	mar 27/01/15	mar 27/01/15	1402									
1405			Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	mar 27/01/15	mar 27/01/15	1404									
1406			Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	mié 28/01/15	lun 02/02/15	1405									
1407			Envío de prevenciones	0 días	lun 02/02/15	lun 02/02/15	1406									
1408			Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	mar 03/02/15	mié 04/02/15	1407									
1409			Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	jue 05/02/15	vie 06/02/15	1408									
1410			Elaboración de Informe Técnico	1 día	lun 09/02/15	lun 09/02/15	1409									
1411			Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	mar 10/02/15	mar 10/02/15	1410									
1412			Recurso de revocatoria	15 días	mié 11/02/15	mar 03/03/15										
1413			Plazo para recibir recurso	2 días	mié 11/02/15	jue 12/02/15	1411									
1414			Resolución de Recurso de revocatoria	10 días	vie 13/02/15	jue 26/02/15	1413									
1415			Adjudicación en firme	3 días	vie 27/02/15	mar 03/03/15	1414									
1416			Solicitud de garantía de cumplimiento y especies fiscales	0 días	mar 03/03/15	mar 03/03/15	1415									
1417			Presentación de timbres fiscales y garantía de cuimplimiento	0 días	mar 03/03/15	mar 03/03/15	1416									
1418			Trámite del Pedido	3 días	mié 04/03/15	vie 06/03/15										
1419			Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mié 04/03/15	mié 04/03/15	1415									
1420			Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	1 día	jue 05/03/15	jue 05/03/15	1419									

Proyecto: Cronograma de compra

Fecha: mar 20/01/15

TareaTareas externas

DivisiónHito externo

HitoTarea inactiva

ResumenHito inactivo

Resumen del proyectoResumen inactivo

Tarea manualTarea manual

Sólo duraciónSólo duración

Informe de resumen manualInforme de resumen manual

Resumen manualResumen manual


Sólo el comienzoSólo el comienzo

Sólo finSólo fin

Fecha límiteFecha límite

ProgresoProgreso

Página 41

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre						
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio	12 febrero
1421			Notificación de Pedido de Compra	1 día	vie 06/03/15	vie 06/03/15	1420							
1422			Recepción de los items	4 días	lun 09/03/15	jue 12/03/15								
1423			Entrega items en Almacén	1 día	lun 09/03/15	lun 09/03/15	1421							
1424			Recibido a satisfacción	3 días	mar 10/03/15	jue 12/03/15	1423							
1425			Trámite de pago	32 días	vie 13/03/15	mié 29/04/15								
1426			Envío documentos a Financiero	2 días	vie 13/03/15	lun 16/03/15	1424							
1427			Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 17/03/15	mié 29/04/15	1426							
1428			Conclusión trámite de Contratación	0 días	mié 29/04/15	mié 29/04/15	1427							
1429			2015CD-000003-503 DFOE Ingeniero Químico (Contratado al 05 de enero; Con Objeción y con Revocatoria) \$2,400.000,00	84 días	mar 16/12/14	mar 28/04/15								
1430			Elaboración de Cartel	5 días	mar 16/12/14	lun 05/01/15								
1431			Recepción Especificaciones técnicas y elaboracion del cartel (UGA)	2 días	mar 16/12/14	mié 17/12/14								
1432			Revisión Técnica de cartel	1 día	jue 18/12/14	jue 18/12/14	1431							
1433			Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	vie 19/12/14	vie 19/12/14	1432							
1434			Confección de cartel definitivo	1 día	lun 05/01/15	lun 05/01/15	1433							
1435			Invitación a participar en Mer- Link	0 días	lun 05/01/15	lun 05/01/15	1434							
1436			Recepción y estudio de ofertas	24 días	lun 05/01/15	vie 06/02/15								
1437			Invitación a participar	15 días	lun 05/01/15	lun 26/01/15								
1438			Envío de invitación	0 días	lun 05/01/15	lun 05/01/15	1435							
1439			Objeción al cartel	10 días	mar 06/01/15	lun 19/01/15	1438							
1440			Nuevo plazo para recibir ofertas	5 días	mar 20/01/15	lun 26/01/15	1439							
1441			Recepción y estudio de ofertas	9 días	lun 26/01/15	vie 06/02/15								
1442			Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 26/01/15	lun 26/01/15	1440							
1443			Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 26/01/15	lun 26/01/15	1442							
1444			Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	mar 27/01/15	vie 30/01/15	1443							
1445			Envío de prevenciones	0 días	vie 30/01/15	vie 30/01/15	1444							
1446			Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	lun 02/02/15	mar 03/02/15	1445							
1447			Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mié 04/02/15	jue 05/02/15	1446							
1448			Elaboración de Informe Técnico	1 día	vie 06/02/15	vie 06/02/15	1447							
1449			Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	lun 09/02/15	lun 09/02/15	1448							
1450			Recurso de revocatoria	15 días	mar 10/02/15	lun 02/03/15								
1451			Plazo para recibir recurso	2 días	mar 10/02/15	mié 11/02/15	1449							
1452			Resolución de Recurso de revocatoria	10 días	jue 12/02/15	mié 25/02/15	1451							
1453			Adjudicación en firme	3 días	jue 26/02/15	lun 02/03/15	1452							
1454			Solicitud de garantía de cumplimiento y especies fiscales	0 días	lun 02/03/15	lun 02/03/15	1453							

Proyecto: Cronograma de compra

Fecha: mar 20/01/15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual


Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 42

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre					
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio
1455			Presentación de timbres fiscales y garantía de cumplimiento	0 días	lun 02/03/15	lun 02/03/15	1454						
1456			Trámite del Pedido	3 días	mar 03/03/15	jue 05/03/15							
1457			Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 03/03/15	mar 03/03/15	1453						
1458			Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	1 día	mié 04/03/15	mié 04/03/15	1457						
1459			Notificación de Pedido de Compra	1 día	jue 05/03/15	jue 05/03/15	1458						
1460			Recepción de los items	4 días	vie 06/03/15	mié 11/03/15							
1461			Entrega items en Almacén	1 día	vie 06/03/15	vie 06/03/15	1459						
1462			Recibido a satisfacción	3 días	lun 09/03/15	mié 11/03/15	1461						
1463			Trámite de pago	32 días	jue 12/03/15	mar 28/04/15							
1464			Envío documentos a Financiero	2 días	jue 12/03/15	vie 13/03/15	1462						
1465			Emisión de pago en Financiero	30 días	lun 16/03/15	mar 28/04/15	1464						
1466			Conclusión trámite de Contratación	0 días	mar 28/04/15	mar 28/04/15	1465						
1467			2015CD-000004-503 DFOE Consultoría Geología (Contratado al 01 de julio; Con Objeción y con Revocatoria) \$7,800.000,00	84 días	lun 04/05/15	jue 27/08/15							
1468			Elaboración de Cartel	5 días	lun 04/05/15	vie 08/05/15							
1469			Recepción Especificaciones técnicas y elaboracion del cartel (UGA)	2 días	lun 04/05/15	mar 05/05/15							
1470			Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 06/05/15	mié 06/05/15	1469						
1471			Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 07/05/15	jue 07/05/15	1470						
1472			Confección de cartel definitivo	1 día	vie 08/05/15	vie 08/05/15	1471						
1473			Invitación a participar en Mer- Link	0 días	vie 08/05/15	vie 08/05/15	1472						
1474			Recepción y estudio de ofertas	24 días	vie 08/05/15	jue 11/06/15							
1475			Invitación a participar	15 días	vie 08/05/15	vie 29/05/15							
1476			Envío de invitación	0 días	vie 08/05/15	vie 08/05/15	1473						
1477			Objeción al cartel	10 días	lun 11/05/15	vie 22/05/15	1476						
1478			Nuevo plazo para recibir ofertas	5 días	lun 25/05/15	vie 29/05/15	1477						
1479			Recepción y estudio de ofertas	9 días	vie 29/05/15	jue 11/06/15							
1480			Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	vie 29/05/15	vie 29/05/15	1478						
1481			Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	vie 29/05/15	vie 29/05/15	1480						
1482			Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 01/06/15	jue 04/06/15	1481						
1483			Envío de prevenciones	0 días	jue 04/06/15	jue 04/06/15	1482						
1484			Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 05/06/15	lun 08/06/15	1483						
1485			Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 09/06/15	mié 10/06/15	1484						
1486			Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 11/06/15	jue 11/06/15	1485						
1487			Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 12/06/15	vie 12/06/15	1486						
1488			Recurso de revocatoria	15 días	lun 15/06/15	vie 03/07/15							

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: mar 20/01/15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual


Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 43

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre					
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio
1489			Plazo para recibir recurso	2 días	lun 15/06/15	mar 16/06/15	1487						
1490			Resolución de Recurso de revocatoria	10 días	mié 17/06/15	mar 30/06/15	1489						
1491			Adjudicación en firme	3 días	mié 01/07/15	vie 03/07/15	1490						
1492			Solicitud de garantía de cumplimiento y especies fiscales	0 días	vie 03/07/15	vie 03/07/15	1491						
1493			Presentación de timbres fiscales y garantía de cuimplimiento	0 días	vie 03/07/15	vie 03/07/15	1492						
1494			Trámite del Pedido	3 días	lun 06/07/15	mié 08/07/15							
1495			Elaboración del Pedido de Compra	1 día	lun 06/07/15	lun 06/07/15	1491						
1496			Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	1 día	mar 07/07/15	mar 07/07/15	1495						
1497			Notificación de Pedido de Compra	1 día	mié 08/07/15	mié 08/07/15	1496						
1498			Recepción de los items	4 días	jue 09/07/15	mar 14/07/15							
1499			Entrega items en Almacén	1 día	jue 09/07/15	jue 09/07/15	1497						
1500			Recibido a satisfacción	3 días	vie 10/07/15	mar 14/07/15	1499						
1501			Trámite de pago	32 días	mié 15/07/15	jue 27/08/15							
1502			Envio documentos a Financiero	2 días	mié 15/07/15	jue 16/07/15	1500						
1503			Emisión de pago en Financiero	30 días	vie 17/07/15	jue 27/08/15	1502						
1504			Conclusión trámite de Contratación	0 días	jue 27/08/15	jue 27/08/15	1503						
1505			2015CD-000005-503 DFOE Ingeniero Eléctrico (Contratado al 01 abril 2015; Con Objeción y con Revocatoria) \$8,700.000,00	84 días	lun 02/02/15	mar 02/06/15							
1506			Elaboración de Cartel	5 días	lun 02/02/15	vie 06/02/15							
1507			Recepción Especificaciones técnicas y elaboracion del cartel (UGA)	2 días	lun 02/02/15	mar 03/02/15							
1508			Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 04/02/15	mié 04/02/15	1507						
1509			Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 05/02/15	jue 05/02/15	1508						
1510			Confección de cartel definitivo	1 día	vie 06/02/15	vie 06/02/15	1509						
1511			Invitación a participar en Mer- Link	0 días	vie 06/02/15	vie 06/02/15	1510						
1512			Recepción y estudio de ofertas	24 días	vie 06/02/15	jue 12/03/15							
1513			Invitación a participar	15 días	vie 06/02/15	vie 27/02/15							
1514			Envío de invitación	0 días	vie 06/02/15	vie 06/02/15	1511						
1515			Objeción al cartel	10 días	lun 09/02/15	vie 20/02/15	1514						
1516			Nuevo plazo para recibir ofertas	5 días	lun 23/02/15	vie 27/02/15	1515						
1517			Recepción y estudio de ofertas	9 días	vie 27/02/15	jue 12/03/15							
1518			Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	vie 27/02/15	vie 27/02/15	1516						
1519			Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	vie 27/02/15	vie 27/02/15	1518						
1520			Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 02/03/15	jue 05/03/15	1519						
1521			Envio de prevenciones	0 días	jue 05/03/15	jue 05/03/15	1520						
1522			Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 06/03/15	lun 09/03/15	1521						

Proyecto: Cronograma de compra Fecha: mar 20/01/15	Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin	
	División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite	
	Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen		Hito inactivo		Resumen manual			
	Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo			

Página 44

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre					
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio
1523			Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 10/03/15	mié 11/03/15	1522						
1524			Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 12/03/15	jue 12/03/15	1523						
1525			Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 13/03/15	vie 13/03/15	1524						
1526			Recurso de revocatoria	15 días	lun 16/03/15	mar 07/04/15							
1527			Plazo para recibir recurso	2 días	lun 16/03/15	mar 17/03/15	1525						
1528			Resolución de Recurso de revocatoria	10 días	mié 18/03/15	mar 31/03/15	1527						
1529			Adjudicación en firme	3 días	mié 01/04/15	mar 07/04/15	1528						
1530			Solicitud de garantía de cumplimiento y especies fiscales	0 días	mar 07/04/15	mar 07/04/15	1529						
1531			Presentación de timbres fiscales y garantía de cuimplimiento	0 días	mar 07/04/15	mar 07/04/15	1530						
1532			Trámite del Pedido	3 días	mié 08/04/15	vie 10/04/15							
1533			Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mié 08/04/15	mié 08/04/15	1529						
1534			Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	1 día	jue 09/04/15	jue 09/04/15	1533						
1535			Notificación de Pedido de Compra	1 día	vie 10/04/15	vie 10/04/15	1534						
1536			Recepción de los items	4 días	lun 13/04/15	jue 16/04/15							
1537			Entrega items en Almacén	1 día	lun 13/04/15	lun 13/04/15	1535						
1538			Recibido a satisfacción	3 días	mar 14/04/15	jue 16/04/15	1537						
1539			Trámite de pago	32 días	vie 17/04/15	mar 02/06/15							
1540			Envío documentos a Financiero	2 días	vie 17/04/15	lun 20/04/15	1538						
1541			Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 21/04/15	mar 02/06/15	1540						
1542			Conclusión trámite de Contratación	0 días	mar 02/06/15	mar 02/06/15	1541						
1543			2015CD-000006-503 DFOE Consultoría SAF (Contratado al 15 de Abril; Con Objeción y con Revocatoria) \$2,000.000,00	84 días	lun 09/02/15	mar 09/06/15							
1544			Elaboración de Cartel	5 días	lun 09/02/15	vie 13/02/15							
1545			Recepción Especificaciones técnicas y elaboracion del cartel (UGA)	2 días	lun 09/02/15	mar 10/02/15							
1546			Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 11/02/15	mié 11/02/15	1545						
1547			Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 12/02/15	jue 12/02/15	1546						
1548			Confección de cartel definitivo	1 día	vie 13/02/15	vie 13/02/15	1547						
1549			Invitación a participar en Mer- Link	0 días	vie 13/02/15	vie 13/02/15	1548						
1550			Recepción y estudio de ofertas	24 días	vie 13/02/15	jue 19/03/15							
1551			Invitación a participar	15 días	vie 13/02/15	vie 06/03/15							
1552			Envío de invitación	0 días	vie 13/02/15	vie 13/02/15	1549						
1553			Objeción al cartel	10 días	lun 16/02/15	vie 27/02/15	1552						
1554			Nuevo plazo para recibir ofertas	5 días	lun 02/03/15	vie 06/03/15	1553						
1555			Recepción y estudio de ofertas	9 días	vie 06/03/15	jue 19/03/15							
1556			Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	vie 06/03/15	vie 06/03/15	1554						

Proyecto: Cronograma de compra

Fecha: mar 20/01/15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 45

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre							
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio	12 febrero	22 octubre
1557			Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	vie 06/03/15	vie 06/03/15	1556						06/03		
1558			Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 09/03/15	jue 12/03/15	1557								
1559			Envío de prevenciones	0 días	jue 12/03/15	jue 12/03/15	1558						12/03		
1560			Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 13/03/15	lun 16/03/15	1559								
1561			Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 17/03/15	mié 18/03/15	1560								
1562			Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 19/03/15	jue 19/03/15	1561								
1563			Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 20/03/15	vie 20/03/15	1562								
1564			Recurso de revocatoria	15 días	lun 23/03/15	mar 14/04/15									
1565			Plazo para recibir recurso	2 días	lun 23/03/15	mar 24/03/15	1563								
1566			Resolución de Recurso de revocatoria	10 días	mié 25/03/15	jue 09/04/15	1565								
1567			Adjudicación en firme	3 días	vie 10/04/15	mar 14/04/15	1566								
1568			Solicitud de garantía de cumplimiento y especies fiscales	0 días	mar 14/04/15	mar 14/04/15	1567						14/04		
1569			Presentación de timbres fiscales y garantía de cuimplimiento	0 días	mar 14/04/15	mar 14/04/15	1568						14/04		
1570			Trámite del Pedido	3 días	mié 15/04/15	vie 17/04/15									
1571			Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mié 15/04/15	mié 15/04/15	1567								
1572			Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	1 día	jue 16/04/15	jue 16/04/15	1571								
1573			Notificación de Pedido de Compra	1 día	vie 17/04/15	vie 17/04/15	1572								
1574			Recepción de los items	4 días	lun 20/04/15	jue 23/04/15									
1575			Entrega items en Almacén	1 día	lun 20/04/15	lun 20/04/15	1573								
1576			Recibido a satisfacción	3 días	mar 21/04/15	jue 23/04/15	1575								
1577			Trámite de pago	32 días	vie 24/04/15	mar 09/06/15									
1578			Envío documentos a Financiero	2 días	vie 24/04/15	lun 27/04/15	1576								
1579			Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 28/04/15	mar 09/06/15	1578								
1580			Conclusión trámite de Contratación	0 días	mar 09/06/15	mar 09/06/15	1579						09/06		
1581			2015CD-000006-503 DFOE Ingeniero Sanitario (Contratado al 15 de Abril; Con Objeción y con Revocatoria) \$4,500.000,00	84 días	lun 09/02/15	mar 09/06/15									
1582			Elaboración de Cartel	5 días	lun 09/02/15	vie 13/02/15									
1583			Recepción Especificaciones técnicas y elaboracion del cartel (UGA)	2 días	lun 09/02/15	mar 10/02/15									
1584			Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 11/02/15	mié 11/02/15	1583								
1585			Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 12/02/15	jue 12/02/15	1584								
1586			Confección de cartel definitivo	1 día	vie 13/02/15	vie 13/02/15	1585								
1587			Invitación a participar en Mer- Link	0 días	vie 13/02/15	vie 13/02/15	1586						13/02		
1588			Recepción y estudio de ofertas	24 días	vie 13/02/15	jue 19/03/15									
1589			Invitación a participar	15 días	vie 13/02/15	vie 06/03/15									
1590			Envío de invitación	0 días	vie 13/02/15	vie 13/02/15	1587						13/02		

Proyecto: Cronograma de compra

Fecha: mar 20/01/15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 46

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre					
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio
1591			Objeción al cartel	10 días	lun 16/02/15	vie 27/02/15	1590						
1592			Nuevo plazo para recibir ofertas	5 días	lun 02/03/15	vie 06/03/15	1591						
1593			Recepción y estudio de ofertas	9 días	vie 06/03/15	jue 19/03/15							
1594			Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	vie 06/03/15	vie 06/03/15	1592						
1595			Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	vie 06/03/15	vie 06/03/15	1594						
1596			Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 09/03/15	jue 12/03/15	1595						
1597			Envío de prevenciones	0 días	jue 12/03/15	jue 12/03/15	1596						
1598			Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 13/03/15	lun 16/03/15	1597						
1599			Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 17/03/15	mié 18/03/15	1598						
1600			Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 19/03/15	jue 19/03/15	1599						
1601			Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 20/03/15	vie 20/03/15	1600						
1602			Recurso de revocatoria	15 días	lun 23/03/15	mar 14/04/15							
1603			Plazo para recibir recurso	2 días	lun 23/03/15	mar 24/03/15	1601						
1604			Resolución de Recurso de revocatoria	10 días	mié 25/03/15	jue 09/04/15	1603						
1605			Adjudicación en firme	3 días	vie 10/04/15	mar 14/04/15	1604						
1606			Solicitud de garantía de cumplimiento y especies fiscales	0 días	mar 14/04/15	mar 14/04/15	1605						
1607			Presentación de timbres fiscales y garantía de cuimplimiento	0 días	mar 14/04/15	mar 14/04/15	1606						
1608			Trámite del Pedido	3 días	mié 15/04/15	vie 17/04/15							
1609			Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mié 15/04/15	mié 15/04/15	1605						
1610			Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	1 día	jue 16/04/15	jue 16/04/15	1609						
1611			Notificación de Pedido de Compra	1 día	vie 17/04/15	vie 17/04/15	1610						
1612			Recepción de los items	4 días	lun 20/04/15	jue 23/04/15							
1613			Entrega items en Almacén	1 día	lun 20/04/15	lun 20/04/15	1611						
1614			Recibido a satisfacción	3 días	mar 21/04/15	jue 23/04/15	1613						
1615			Trámite de pago	32 días	vie 24/04/15	mar 09/06/15							
1616			Envío documentos a Financiero	2 días	vie 24/04/15	lun 27/04/15	1614						
1617			Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 28/04/15	mar 09/06/15	1616						
1618			Conclusión trámite de Contratación	0 días	mar 09/06/15	mar 09/06/15	1617						
1619			2015CD-000006-503 DFOE Ingeniero Civil (Contratado al 15 de Abril; Con Objeción y con Revocatoria) \$5,400.000,00	84 días	lun 02/02/15	mar 02/06/15							
1620			Elaboración de Cartel	5 días	lun 02/02/15	vie 06/02/15							
1621			Recepción Especificaciones técnicas y elaboracion del cartel (UGA)	2 días	lun 02/02/15	mar 03/02/15							
1622			Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 04/02/15	mié 04/02/15	1621						
1623			Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 05/02/15	jue 05/02/15	1622						
1624			Confección de cartel definitivo	1 día	vie 06/02/15	vie 06/02/15	1623						

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: mar 20/01/15

TareaTareas externasTarea manualSólo fin

HitoHito externoSólo duraciónFecha límite

HitoTarea inactivaInforme de resumen manualProgreso

ResumenHito inactivoResumen manual

Resumen del proyectoResumen inactivoSólo el comienzo

Página 47

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre							
								3 diciembre	1 septiembre	11 mayo	18 enero	7 septiembr	05 junio	12 febrero	22 octubre
1625			Invitación a participar en Mer- Link	0 días	vie 06/02/15	vie 06/02/15	1624						06/02		
1626			Recepción y estudio de ofertas	24 días	vie 06/02/15	jue 12/03/15									
1627			Invitación a participar	15 días	vie 06/02/15	vie 27/02/15									
1628			Envío de invitación	0 días	vie 06/02/15	vie 06/02/15	1625						06/02		
1629			Objeción al cartel	10 días	lun 09/02/15	vie 20/02/15	1628								
1630			Nuevo plazo para recibir ofertas	5 días	lun 23/02/15	vie 27/02/15	1629								
1631			Recepción y estudio de ofertas	9 días	vie 27/02/15	jue 12/03/15									
1632			Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	vie 27/02/15	vie 27/02/15	1630						27/02		
1633			Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	vie 27/02/15	vie 27/02/15	1632						27/02		
1634			Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 02/03/15	jue 05/03/15	1633								
1635			Envio de prevenciones	0 días	jue 05/03/15	jue 05/03/15	1634						05/03		
1636			Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 06/03/15	lun 09/03/15	1635								
1637			Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 10/03/15	mié 11/03/15	1636								
1638			Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 12/03/15	jue 12/03/15	1637								
1639			Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 13/03/15	vie 13/03/15	1638								
1640			Recurso de revocatoria	15 días	lun 16/03/15	mar 07/04/15									
1641			Plazo para recibir recurso	2 días	lun 16/03/15	mar 17/03/15	1639								
1642			Resolución de Recurso de revocatoria	10 días	mié 18/03/15	mar 31/03/15	1641								
1643			Adjudicación en firme	3 días	mié 01/04/15	mar 07/04/15	1642								
1644			Solicitud de garantía de cumplimiento y especies fiscales	0 días	mar 07/04/15	mar 07/04/15	1643						07/04		
1645			Presentación de timbres fiscales y garantía de cuimplimiento	0 días	mar 07/04/15	mar 07/04/15	1644						07/04		
1646			Trámite del Pedido	3 días	mié 08/04/15	vie 10/04/15									
1647			Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mié 08/04/15	mié 08/04/15	1643								
1648			Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	1 día	jue 09/04/15	jue 09/04/15	1647								
1649			Notificación de Pedido de Compra	1 día	vie 10/04/15	vie 10/04/15	1648								
1650			Recepción de los items	4 días	lun 13/04/15	jue 16/04/15									
1651			Entrega items en Almacén	1 día	lun 13/04/15	lun 13/04/15	1649								
1652			Recibido a satisfacción	3 días	mar 14/04/15	jue 16/04/15	1651								
1653			Trámite de pago	32 días	vie 17/04/15	mar 02/06/15									
1654			Envio documentos a Financiero	2 días	vie 17/04/15	lun 20/04/15	1652								
1655			Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 21/04/15	mar 02/06/15	1654								
1656			Conclusión trámite de Contratación	0 días	mar 02/06/15	mar 02/06/15	1655						02/06		
1657			2015CD-000007-503 USG Consultoría Nutrición (contratado al 01/11/15 Con Objeción y con Revocatoria) \$1,												

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre							
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio	12 febrero	22 octubre
1659			Recepción Especificaciones técnicas y elaboracion del cartel (UGA)	2 días	lun 10/08/15	mar 11/08/15									
1660			Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 12/08/15	mié 12/08/15	1659								
1661			Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 13/08/15	jue 13/08/15	1660								
1662			Confección de cartel definitivo	1 día	vie 14/08/15	vie 14/08/15	1661								
1663			Invitación a participar en Mer- Link	0 días	vie 14/08/15	vie 14/08/15	1662								
1664			Recepción y estudio de ofertas	24 días	vie 14/08/15	vie 18/09/15									
1665			Invitación a participar	15 días	vie 14/08/15	vie 04/09/15									
1666			Envío de invitación	0 días	vie 14/08/15	vie 14/08/15	1663								
1667			Objeción al cartel	10 días	lun 17/08/15	vie 28/08/15	1666								
1668			Nuevo plazo para recibir ofertas	5 días	lun 31/08/15	vie 04/09/15	1667								
1669			Recepción y estudio de ofertas	9 días	vie 04/09/15	vie 18/09/15									
1670			Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	vie 04/09/15	vie 04/09/15	1668								
1671			Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	vie 04/09/15	vie 04/09/15	1670								
1672			Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 07/09/15	jue 10/09/15	1671								
1673			Envio de prevenciones	0 días	jue 10/09/15	jue 10/09/15	1672								
1674			Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 11/09/15	lun 14/09/15	1673								
1675			Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mié 16/09/15	jue 17/09/15	1674								
1676			Elaboración de Informe Técnico	1 día	vie 18/09/15	vie 18/09/15	1675								
1677			Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	lun 21/09/15	lun 21/09/15	1676								
1678			Recurso de revocatoria	15 días	mar 22/09/15	mar 13/10/15									
1679			Plazo para recibir recurso	2 días	mar 22/09/15	mié 23/09/15	1677								
1680			Resolución de Recurso de revocatoria	10 días	jue 24/09/15	mié 07/10/15	1679								
1681			Adjudicación en firme	3 días	jue 08/10/15	mar 13/10/15	1680								
1682			Solicitud de garantía de cumplimiento y especies fiscales	0 días	mar 13/10/15	mar 13/10/15	1681								
1683			Presentación de timbres fiscales y garantía de cuimplimiento	0 días	mar 13/10/15	mar 13/10/15	1682								
1684			Trámite del Pedido	3 días	mié 14/10/15	vie 16/10/15									
1685			Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mié 14/10/15	mié 14/10/15	1681								
1686			Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	1 día	jue 15/10/15	jue 15/10/15	1685								
1687			Notificación de Pedido de Compra	1 día	vie 16/10/15	vie 16/10/15	1686								
1688			Recepción de los items	4 días	lun 19/10/15	jue 22/10/15									
1689			Entrega items en Almacén	1 día	lun 19/10/15	lun 19/10/15	1687								
1690			Recibido a satisfacción	3 días	mar 20/10/15	jue 22/10/15	1689								
1691			Trámite de pago	32 días	vie 23/10/15	lun 07/12/15									
1692			Envio documentos a Financiero	2 días	vie 23/10/15	lun 26/10/15	1690								
1693			Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 27/10/15	lun 07/12/15	1692								

Proyecto: Cronograma de compra

Fecha: mar 20/01/15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

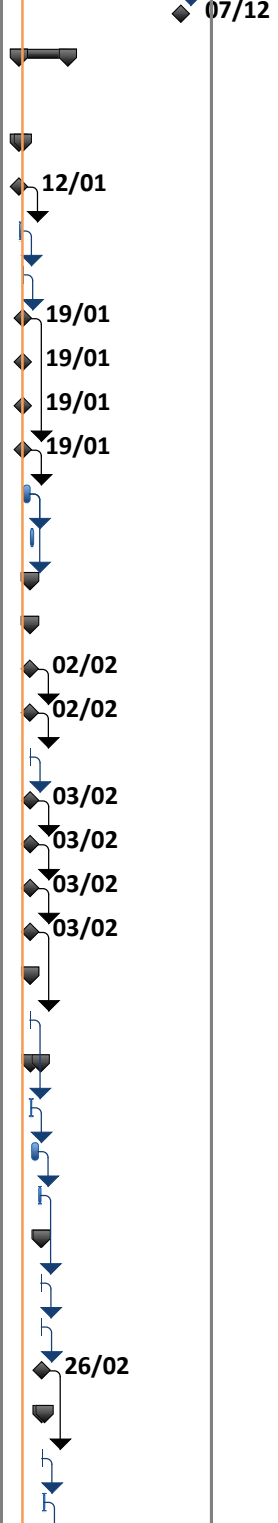
Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 49

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras								
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio	12 febrero	22 octubre
1694			Conclusión trámite de Contratación	0 días	lun 07/12/15	lun 07/12/15	1693								
1695			2015CD-000008-503 CGR_Tiquetes Aéreos (De enero a Dic 2015, Con Objeción y con Revocatoria) \$18,044.000,00	70 días	lun 12/01/15	mar 21/04/15									
1696			Elaboración de Cartel	6 días	lun 12/01/15	lun 19/01/15									
1697			Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 12/01/15	lun 12/01/15									
1698			Creación de Código en Mer Link	5 días	lun 12/01/15	vie 16/01/15	1697								
1699			Confección de cartel definitivo	1 día	lun 19/01/15	lun 19/01/15	1698								
1700			Invitación a participar en Mer- Link	0 días	lun 19/01/15	lun 19/01/15	1699								
1701			Recepción y estudio de ofertas	0 días	lun 19/01/15	lun 19/01/15									
1702			Invitación a participar	0 días	lun 19/01/15	lun 19/01/15									
1703			Envío de invitación	0 días	lun 19/01/15	lun 19/01/15	1700								
1704			Objeción al cartel	10 días	mar 20/01/15	lun 02/02/15	1703								
1705			Nuevo plazo para recibir ofertas	5 días	mar 03/02/15	lun 09/02/15	1704								
1706			Nuevo plazo para recibir ofertas	0,8 días	lun 02/02/15	mar 03/02/15	1704								
1707			Recepción y estudio de ofertas	0,8 días	lun 02/02/15	mar 03/02/15									
1708			Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 02/02/15	lun 02/02/15									
1709			Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 02/02/15	lun 02/02/15	1708								
1710			Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	0,8 días	mar 03/02/15	mar 03/02/15	1709								
1711			Envío de prevenciones	0 días	mar 03/02/15	mar 03/02/15	1710								
1712			Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	0 días	mar 03/02/15	mar 03/02/15	1711								
1713			Análisis de respuesta a prevenciones	0 días	mar 03/02/15	mar 03/02/15	1712								
1714			Elaboración de Informe Técnico	0 días	mar 03/02/15	mar 03/02/15	1713								
1715			Recomendación, adjudicación y comunicación	0,2 días	mar 03/02/15	mar 03/02/15									
1716			Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	0,2 días	mar 03/02/15	mar 03/02/15	1714								
1717			Recurso de revocatoria	15 días	mié 04/02/15	mar 24/02/15									
1718			Plazo para recibir recurso	2 días	mié 04/02/15	jue 05/02/15	1716								
1719			Resolución de Recurso de revocatoria	10 días	vie 06/02/15	jue 19/02/15	1718								
1720			Adjudicación en firme	3 días	vie 20/02/15	mar 24/02/15	1719								
1721			Trámite del Pedido	2 días	mié 25/02/15	jue 26/02/15									
1722			Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mié 25/02/15	mié 25/02/15	1720								
1723			Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	1 día	jue 26/02/15	jue 26/02/15	1722								
1724			Notificación de Pedido de Compra	0 días	jue 26/02/15	jue 26/02/15	1723								
1725			Recepción de los items	4 días	vie 27/02/15	mié 04/03/15									
1726			Entrega items en Almacén	1 día	vie 27/02/15	vie 27/02/15	1724								
1727			Recibido a satisfacción	3 días	lun 02/03/15	mié 04/03/15	1726								

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: mar 20/01/15

TareaTareas externas

DivisiónHito externo

HitoTarea inactiva

ResumenHito inactivo

Resumen del proyectoResumen inactivo

Tarea manualSólo duración

Informe de resumen manualInforme de resumen manual

Resumen manualResumen manual

Sólo el comienzoSólo el comienzo

Sólo finSólo fin

Fecha límiteFecha límite

ProgresoProgreso

Página 50

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre								
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio	12 febrero	22 octubre	
1728			Trámite de pago	32 días	jue 05/03/15	mar 21/04/15										
1729			Envío documentos a Financiero	2 días	jue 05/03/15	vie 06/03/15	1727									
1730			Emisión de pago en Financiero	30 días	lun 09/03/15	mar 21/04/15	1729									
1731			Conclusión trámite de Contratación	0 días	mar 21/04/15	mar 21/04/15	1730									
1732			2015CD-000009-503 USG_Mantenimiento de techo Edificio Anexo (Contratado al 30/01/15); Con Objeción y con Revocatoria \$5.000.000.00	96,5 días	lun 05/01/15	vie 22/05/15										
1733			Elaboración de Cartel	5,5 días	lun 05/01/15	lun 12/01/15										
1734			Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 05/01/15	lun 05/01/15										
1735			Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 05/01/15	mar 06/01/15	1734									
1736			Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 07/01/15	mié 07/01/15	1735									
1737			Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 08/01/15	jue 08/01/15	1736									
1738			Confección de cartel definitivo	1 día	vie 09/01/15	vie 09/01/15	1737									
1739			Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 12/01/15	lun 12/01/15	1738									
1740			Recepción y estudio de ofertas	24 días	lun 12/01/15	vie 13/02/15										
1741			Invitación a participar	15 días	lun 12/01/15	lun 02/02/15										
1742			Invitación	5 días	lun 12/01/15	lun 19/01/15	1739									
1743			Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 12/01/15	mar 13/01/15	1742CC									
1744			Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 13/01/15	mar 27/01/15	1743									
1745			Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 27/01/15	lun 02/02/15	1744									
1746			Recepción y estudio de ofertas	9 días	lun 02/02/15	vie 13/02/15										
1747			Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 02/02/15	lun 02/02/15	1745									
1748			Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 02/02/15	lun 02/02/15	1747									
1749			Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 02/02/15	vie 06/02/15	1748									
1750			Envío de prevenciones	0 días	vie 06/02/15	vie 06/02/15	1749									
1751			Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 06/02/15	mar 10/02/15	1750									
1752			Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 10/02/15	jue 12/02/15	1751									
1753			Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 12/02/15	vie 13/02/15	1752									
1754			Recomendación, adjudicación y comunicación	12 días	vie 13/02/15	mar 03/03/15										
1755			Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 13/02/15	lun 16/02/15	1753									
1756			Recurso de revocatoria	9 días	lun 16/02/15	vie 27/02/15										
1757			Plazo para recibir recurso	2 días	lun 16/02/15	mié 18/02/15	1755									
1758			Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 18/02/15	vie 20/02/15	1757									
1759			Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 20/02/15	mar 24/02/15	1758									
1760			Resolución de Recurso de revocatoria Art 136 RLCA	3 días	mar 24/02/15	vie 27/02/15	1759									
1761			Adjudicación en firme	2 días	vie 27/02/15	mar 03/03/15	1760									

Proyecto: Cronograma de compra

Fecha: mar 20/01/15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 51

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre								
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio	12 febrero	22 octubre	
1762			Trámite del Pedido	5 días	mar 03/03/15	mar 10/03/15										
1763			Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 03/03/15	mié 04/03/15	1761									
1764			Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 04/03/15	lun 09/03/15	1763									
1765			Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 09/03/15	mar 10/03/15	1764									
1766			Recepción de los items	18 días	mar 10/03/15	mar 07/04/15										
1767			Entrega items en Almacén	15 días	mar 10/03/15	mar 31/03/15	1765									
1768			Recibido a satisfacción	3 días	mar 31/03/15	mar 07/04/15	1767									
1769			Trámite de pago	32 días	mar 07/04/15	vie 22/05/15										
1770			Envío documentos a Financiero	2 días	mar 07/04/15	jue 09/04/15	1768									
1771			Emisión de pago en Financiero	30 días	jue 09/04/15	vie 22/05/15	1770									
1772			Conclusión trámite de Contratación	0 días	vie 22/05/15	vie 22/05/15	1771									
1773			2015CD-000010-503 "USG" Dispositivos de ahorro de energía (Contratado al 01/02/15; Con Objeción y con Revocatoria) ₡3.500.000.00	96,5 días	lun 05/01/15	vie 22/05/15										
1774			Elaboración de Cartel	5,5 días	lun 05/01/15	lun 12/01/15										
1775			Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 05/01/15	lun 05/01/15										
1776			Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 05/01/15	mar 06/01/15	1775									
1777			Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 07/01/15	mié 07/01/15	1776									
1778			Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 08/01/15	jue 08/01/15	1777									
1779			Confección de cartel definitivo	1 día	vie 09/01/15	vie 09/01/15	1778									
1780			Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 12/01/15	lun 12/01/15	1779									
1781			Recepción y estudio de ofertas	24 días	lun 12/01/15	vie 13/02/15										
1782			Invitación a participar	15 días	lun 12/01/15	lun 02/02/15										
1783			Invitación	5 días	lun 12/01/15	lun 19/01/15	1780									
1784			Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 12/01/15	mar 13/01/15	1783CC									
1785			Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 13/01/15	mar 27/01/15	1784									
1786			Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 27/01/15	lun 02/02/15	1785									
1787			Recepción y estudio de ofertas	9 días	lun 02/02/15	vie 13/02/15										
1788			Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 02/02/15	lun 02/02/15	1786									
1789			Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 02/02/15	lun 02/02/15	1788									
1790			Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 02/02/15	vie 06/02/15	1789									
1791			Envío de prevenciones	0 días	vie 06/02/15	vie 06/02/15	1790									
1792			Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 06/02/15	mar 10/02/15	1791									
1793			Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 10/02/15	jue 12/02/15	1792									
1794			Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 12/02/15	vie 13/02/15	1793									
1795			Recomendación, adjudicación y comunicación	12 días	vie 13/02/15	mar 03/03/15										

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: mar 20/01/15

TareaTareas externas

DivisiónHito externo

HitoTarea inactiva

ResumenHito inactivo

Resumen del proyectoResumen inactivo

Tarea manualTarea manual

Sólo duraciónSólo duración

Informe de resumen manualInforme de resumen manual

Resumen manualResumen manual


Sólo el comienzoSólo el comienzo

Sólo finSólo fin

Fecha límiteFecha límite

ProgresoProgreso

Página 52

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre					
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio
1796			Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 13/02/15	lun 16/02/15	1794						
1797			Recurso de revocatoria	9 días	lun 16/02/15	vie 27/02/15							
1798			Plazo para recibir recurso	2 días	lun 16/02/15	mié 18/02/15	1796						
1799			Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 18/02/15	vie 20/02/15	1798						
1800			Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 20/02/15	mar 24/02/15	1799						
1801			Resolución de Recurso de revocatoria Art 136 RLCA	3 días	mar 24/02/15	vie 27/02/15	1800						
1802			Adjudicación en firme	2 días	vie 27/02/15	mar 03/03/15	1801						
1803			Trámite del Pedido	5 días	mar 03/03/15	mar 10/03/15							
1804			Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 03/03/15	mié 04/03/15	1802						
1805			Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 04/03/15	lun 09/03/15	1804						
1806			Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 09/03/15	mar 10/03/15	1805						
1807			Recepción de los items	18 días	mar 10/03/15	mar 07/04/15							
1808			Entrega items en Almacén	15 días	mar 10/03/15	mar 31/03/15	1806						
1809			Recibido a satisfacción	3 días	mar 31/03/15	mar 07/04/15	1808						
1810			Trámite de pago	32 días	mar 07/04/15	vie 22/05/15							
1811			Envío documentos a Financiero	2 días	mar 07/04/15	jue 09/04/15	1809						
1812			Emisión de pago en Financiero	30 días	jue 09/04/15	vie 22/05/15	1811						
1813			Conclusión trámite de Contratación	0 días	vie 22/05/15	vie 22/05/15	1812						
1814			2015CD-000011-503 USG_Reparación de tuberías agua potable (Contratado al 01/04/15; Con Objeción y con Revocatoria) \$6,000.000,00	96,5 días	lun 16/02/15	vie 03/07/15							
1815			Elaboración de Cartel	5,5 días	lun 16/02/15	lun 23/02/15							
1816			Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 16/02/15	lun 16/02/15							
1817			Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 16/02/15	mar 17/02/15	1816						
1818			Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 18/02/15	mié 18/02/15	1817						
1819			Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 19/02/15	jue 19/02/15	1818						
1820			Confección de cartel definitivo	1 día	vie 20/02/15	vie 20/02/15	1819						
1821			Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 23/02/15	lun 23/02/15	1820						
1822			Recepción y estudio de ofertas	24 días	lun 23/02/15	vie 27/03/15							
1823			Invitación a participar	15 días	lun 23/02/15	lun 16/03/15							
1824			Invitación	5 días	lun 23/02/15	lun 02/03/15	1821						
1825			Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 23/02/15	mar 24/02/15	1824CC						
1826			Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 24/02/15	mar 10/03/15	1825						
1827			Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 10/03/15	lun 16/03/15	1826						
1828			Recepción y estudio de ofertas	9 días	lun 16/03/15	vie 27/03/15							
1829			Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 16/03/15	lun 16/03/15	1827						

Proyecto: Cronograma de compra

Fecha: mar 20/01/15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 53

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre						
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio	12 febrero
1830			Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 16/03/15	lun 16/03/15	1829					16/03		
1831			Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 16/03/15	vie 20/03/15	1830							
1832			Envío de prevenciones	0 días	vie 20/03/15	vie 20/03/15	1831					20/03		
1833			Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 20/03/15	mar 24/03/15	1832							
1834			Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 24/03/15	jue 26/03/15	1833							
1835			Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 26/03/15	vie 27/03/15	1834							
1836			Recomendación, adjudicación y comunicación	12 días	vie 27/03/15	jue 16/04/15								
1837			Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 27/03/15	lun 30/03/15	1835							
1838			Recurso de revocatoria	9 días	lun 30/03/15	mar 14/04/15								
1839			Plazo para recibir recurso	2 días	lun 30/03/15	mié 01/04/15	1837							
1840			Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 01/04/15	mar 07/04/15	1839							
1841			Plazo para audiencia inicial	2 días	mar 07/04/15	jue 09/04/15	1840							
1842			Resolución de Recurso de revocatoria Art 136 RLCA	3 días	jue 09/04/15	mar 14/04/15	1841							
1843			Adjudicación en firme	2 días	mar 14/04/15	jue 16/04/15	1842							
1844			Trámite del Pedido	5 días	jue 16/04/15	jue 23/04/15								
1845			Elaboración del Pedido de Compra	1 día	jue 16/04/15	vie 17/04/15	1843							
1846			Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	vie 17/04/15	mié 22/04/15	1845							
1847			Notificación de Pedido de Compra	1 día	mié 22/04/15	jue 23/04/15	1846							
1848			Recepción de los items	18 días	jue 23/04/15	mié 20/05/15								
1849			Entrega items en Almacén	15 días	jue 23/04/15	vie 15/05/15	1847							
1850			Recibido a satisfacción	3 días	vie 15/05/15	mié 20/05/15	1849							
1851			Trámite de pago	32 días	mié 20/05/15	vie 03/07/15								
1852			Envío documentos a Financiero	2 días	mié 20/05/15	vie 22/05/15	1850							
1853			Emisión de pago en Financiero	30 días	vie 22/05/15	vie 03/07/15	1852							
1854			Conclusión trámite de Contratación	0 días	vie 03/07/15	vie 03/07/15	1853					03/07		
1855			2015CD-0000012-503 Mantenimiento de Aires Acondicionados Generales (Con Objeción y con Revocatoria) \$2.000.000.00	96,5 días	lun 19/01/15	vie 05/06/15								
1856			Elaboración de Cartel	5,5 días	lun 19/01/15	lun 26/01/15								
1857			Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 19/01/15	lun 19/01/15						19/01		
1858			Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 19/01/15	mar 20/01/15	1857							
1859			Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 21/01/15	mié 21/01/15	1858							
1860			Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 22/01/15	jue 22/01/15	1859							
1861			Confección de cartel definitivo	1 día	vie 23/01/15	vie 23/01/15	1860							
1862			Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 26/01/15	lun 26/01/15	1861							
1863			Recepción y estudio de ofertas	24 días	lun 26/01/15	vie 27/02/15								

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: mar 20/01/15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 54

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre							
								3 diciembre	1 septiembre	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio	12 febrero	22 octubre
1864			Invitación a participar	15 días	lun 26/01/15	lun 16/02/15									
1865			Invitación	5 días	lun 26/01/15	lun 02/02/15	1862								
1866			Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 26/01/15	mar 27/01/15	1865CC								
1867			Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 27/01/15	mar 10/02/15	1866								
1868			Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 10/02/15	lun 16/02/15	1867								
1869			Recepción y estudio de ofertas	9 días	lun 16/02/15	vie 27/02/15									
1870			Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 16/02/15	lun 16/02/15	1868								
1871			Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 16/02/15	lun 16/02/15	1870								
1872			Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 16/02/15	vie 20/02/15	1871								
1873			Envío de prevenciones	0 días	vie 20/02/15	vie 20/02/15	1872								
1874			Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 20/02/15	mar 24/02/15	1873								
1875			Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 24/02/15	jue 26/02/15	1874								
1876			Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 26/02/15	vie 27/02/15	1875								
1877			Recomendación, adjudicación y comunicación	12 días	vie 27/02/15	mar 17/03/15									
1878			Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 27/02/15	lun 02/03/15	1876								
1879			Recurso de revocatoria	9 días	lun 02/03/15	vie 13/03/15									
1880			Plazo para recibir recurso	2 días	lun 02/03/15	mié 04/03/15	1878								
1881			Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 04/03/15	vie 06/03/15	1880								
1882			Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 06/03/15	mar 10/03/15	1881								
1883			Resolución de Recurso de revocatoria Art 136 RLCA	3 días	mar 10/03/15	vie 13/03/15	1882								
1884			Adjudicación en firme	2 días	vie 13/03/15	mar 17/03/15	1883								
1885			Trámite del Pedido	5 días	mar 17/03/15	mar 24/03/15									
1886			Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 17/03/15	mié 18/03/15	1884								
1887			Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 18/03/15	lun 23/03/15	1886								
1888			Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 23/03/15	mar 24/03/15	1887								
1889			Recepción de los items	18 días	mar 24/03/15	mar 21/04/15									
1890			Entrega items en Almacén	15 días	mar 24/03/15	jue 16/04/15	1888								
1891			Recibido a satisfacción	3 días	jue 16/04/15	mar 21/04/15	1890								
1892			Trámite de pago	32 días	mar 21/04/15	vie 05/06/15									
1893			Envío documentos a Financiero	2 días	mar 21/04/15	jue 23/04/15	1891								
1894			Emisión de pago en Financiero	30 días	jue 23/04/15	vie 05/06/15	1893								
1895			Conclusión trámite de Contratación	0 días	vie 05/06/15	vie 05/06/15	1894								
1896			2015CD-000013-503 Compra de persianas (Con Objeción y con Revocatoria) \$5.200.000.00)	96,5 días	lun 26/01/15	vie 12/06/15									
1897			Elaboración de Cartel	5,5 días	lun 26/01/15	lun 02/02/15									

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: mar 20/01/15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 55

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre					
								3 diciembre	1 septiembre	11 mayo	18 enero	7 septiembre	05 junio
1898			Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 26/01/15	lun 26/01/15							
1899			Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 26/01/15	mar 27/01/15	1898						
1900			Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 28/01/15	mié 28/01/15	1899						
1901			Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 29/01/15	jue 29/01/15	1900						
1902			Confección de cartel definitivo	1 día	vie 30/01/15	vie 30/01/15	1901						
1903			Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 02/02/15	lun 02/02/15	1902						
1904			Recepción y estudio de ofertas	24 días	lun 02/02/15	vie 06/03/15							
1905			Invitación a participar	15 días	lun 02/02/15	lun 23/02/15							
1906			Invitación	5 días	lun 02/02/15	lun 09/02/15	1903						
1907			Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 02/02/15	mar 03/02/15	1906CC						
1908			Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 03/02/15	mar 17/02/15	1907						
1909			Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 17/02/15	lun 23/02/15	1908						
1910			Recepción y estudio de ofertas	9 días	lun 23/02/15	vie 06/03/15							
1911			Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 23/02/15	lun 23/02/15	1909						
1912			Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 23/02/15	lun 23/02/15	1911						
1913			Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 23/02/15	vie 27/02/15	1912						
1914			Envío de prevenciones	0 días	vie 27/02/15	vie 27/02/15	1913						
1915			Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 27/02/15	mar 03/03/15	1914						
1916			Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 03/03/15	jue 05/03/15	1915						
1917			Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 05/03/15	vie 06/03/15	1916						
1918			Recomendación, adjudicación y comunicación	12 días	vie 06/03/15	mar 24/03/15							
1919			Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 06/03/15	lun 09/03/15	1917						
1920			Recurso de revocatoria	9 días	lun 09/03/15	vie 20/03/15							
1921			Plazo para recibir recurso	2 días	lun 09/03/15	mié 11/03/15	1919						
1922			Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 11/03/15	vie 13/03/15	1921						
1923			Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 13/03/15	mar 17/03/15	1922						
1924			Resolución de Recurso de revocatoria Art 136 RLCA	3 días	mar 17/03/15	vie 20/03/15	1923						
1925			Adjudicación en firme	2 días	vie 20/03/15	mar 24/03/15	1924						
1926			Trámite del Pedido	5 días	mar 24/03/15	mar 31/03/15							
1927			Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 24/03/15	mié 25/03/15	1925						
1928			Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 25/03/15	lun 30/03/15	1927						
1929			Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 30/03/15	mar 31/03/15	1928						
1930			Recepción de los items	18 días	mar 31/03/15	mar 28/04/15							
1931			Entrega items en Almacén	15 días	mar 31/03/15	jue 23/04/15	1929						
1932			Recibido a satisfacción	3 días	jue 23/04/15	mar 28/04/15	1931						

Proyecto: Cronograma de compra

Fecha: mar 20/01/15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 56

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre									
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio	12 febrero	22 octubre		
1933			Trámite de pago	32 días	mar 28/04/15	vie 12/06/15											
1934			Envío documentos a Financiero	2 días	mar 28/04/15	jue 30/04/15	1932										
1935			Emisión de pago en Financiero	30 días	jue 30/04/15	vie 12/06/15	1934										
1936			Conclusión trámite de Contratación	0 días	vie 12/06/15	vie 12/06/15	1935										
1937			2015CD-000014-503 Suministros Médicos y de seguridad ocupacional UGPH (Contratado al 01/05/15; Con Objeción y con Revocatoria) \$4,767.800,00	96,5 días	lun 16/02/15	vie 03/07/15											
1938			Elaboración de Cartel	5,5 días	lun 16/02/15	lun 23/02/15											
1939			Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 16/02/15	lun 16/02/15											
1940			Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 16/02/15	mar 17/02/15	1939										
1941			Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 18/02/15	mié 18/02/15	1940										
1942			Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 19/02/15	jue 19/02/15	1941										
1943			Confección de cartel definitivo	1 día	vie 20/02/15	vie 20/02/15	1942										
1944			Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 23/02/15	lun 23/02/15	1943										
1945			Recepción y estudio de ofertas	24 días	lun 23/02/15	vie 27/03/15											
1946			Invitación a participar	15 días	lun 23/02/15	lun 16/03/15											
1947			Invitación	5 días	lun 23/02/15	lun 02/03/15	1944										
1948			Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 23/02/15	mar 24/02/15	1947CC										
1949			Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 24/02/15	mar 10/03/15	1948										
1950			Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 10/03/15	lun 16/03/15	1949										
1951			Recepción y estudio de ofertas	9 días	lun 16/03/15	vie 27/03/15											
1952			Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 16/03/15	lun 16/03/15	1950										
1953			Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 16/03/15	lun 16/03/15	1952										
1954			Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 16/03/15	vie 20/03/15	1953										
1955			Envío de prevenciones	0 días	vie 20/03/15	vie 20/03/15	1954										
1956			Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 20/03/15	mar 24/03/15	1955										
1957			Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 24/03/15	jue 26/03/15	1956										
1958			Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 26/03/15	vie 27/03/15	1957										
1959			Recomendación, adjudicación y comunicación	12 días	vie 27/03/15	jue 16/04/15											
1960			Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 27/03/15	lun 30/03/15	1958										
1961			Recurso de revocatoria	9 días	lun 30/03/15	mar 14/04/15											
1962			Plazo para recibir recurso	2 días	lun 30/03/15	mié 01/04/15	1960										
1963			Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 01/04/15	mar 07/04/15	1962										
1964			Plazo para audiencia inicial	2 días	mar 07/04/15	jue 09/04/15	1963										
1965			Resolución de Recurso de revocatoria Art 136 RLCA	3 días	jue 09/04/15	mar 14/04/15	1964										
1966			Adjudicación en firme	2 días	mar 14/04/15	jue 16/04/15	1965										

Proyecto: Cronograma de compra

Fecha: mar 20/01/15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

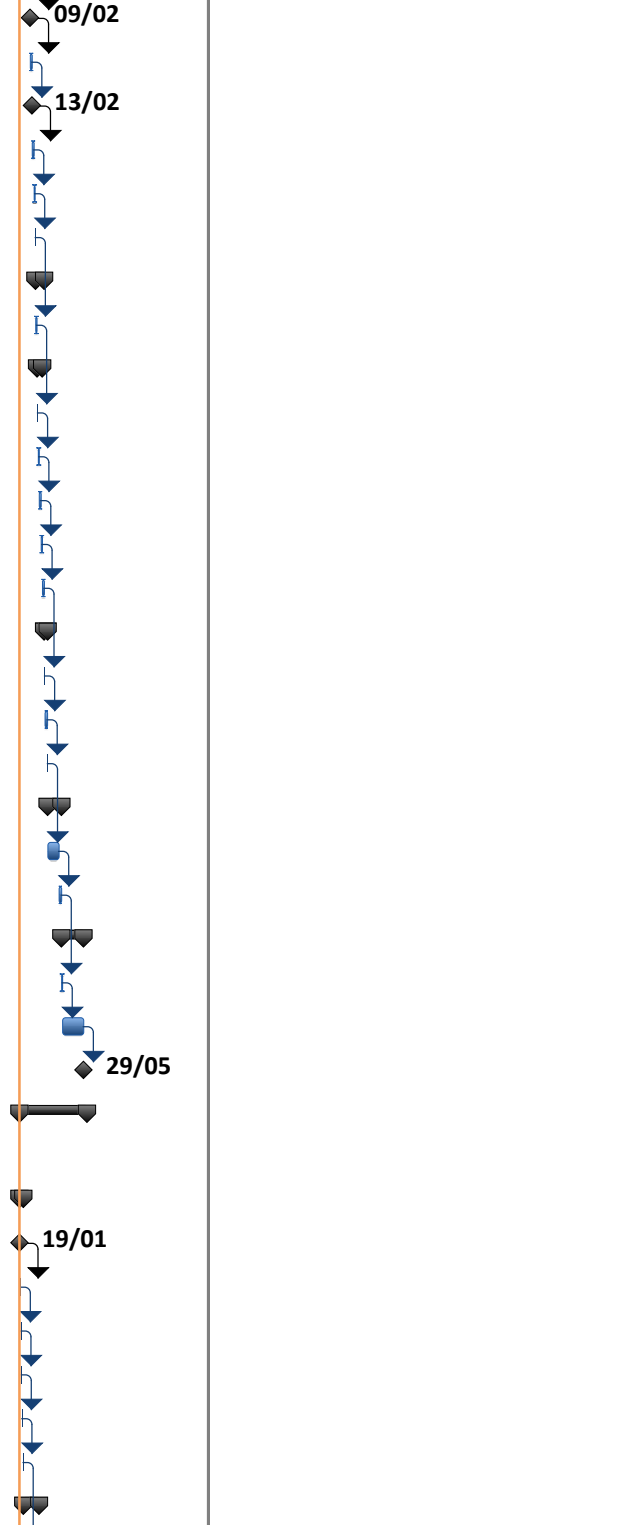
Sólo fin

Fecha límite

Progreso


Página 57

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre								
								3 diciembre	1 septiembre	11 mayo	18 enero	7 septiembre	05 junio	12 febrero	22 octubre	
2001			Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	mar 28/04/15	mié 29/04/15	1999									
2002			Recurso de revocatoria	9 días	mié 29/04/15	mié 13/05/15										
2003			Plazo para recibir recurso	2 días	mié 29/04/15	lun 04/05/15	2001									
2004			Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	lun 04/05/15	mié 06/05/15	2003									
2005			Plazo para audiencia inicial	2 días	mié 06/05/15	vie 08/05/15	2004									
2006			Resolución de Recurso de revocatoria Art 136 RLCA	3 días	vie 08/05/15	mié 13/05/15	2005									
2007			Adjudicación en firme	2 días	mié 13/05/15	vie 15/05/15	2006									
2008			Trámite del Pedido	5 días	vie 15/05/15	vie 22/05/15										
2009			Elaboración del Pedido de Compra	1 día	vie 15/05/15	lun 18/05/15	2007									
2010			Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	lun 18/05/15	jue 21/05/15	2009									
2011			Notificación de Pedido de Compra	1 día	jue 21/05/15	vie 22/05/15	2010									
2012			Recepción de los items	18 días	vie 22/05/15	mié 17/06/15										
2013			Entrega items en Almacén	15 días	vie 22/05/15	vie 12/06/15	2011									
2014			Recibido a satisfacción	3 días	vie 12/06/15	mié 17/06/15	2013									
2015			Trámite de pago	32 días	mié 17/06/15	vie 31/07/15										
2016			Envío documentos a Financiero	2 días	mié 17/06/15	vie 19/06/15	2014									
2017			Emisión de pago en Financiero	30 días	vie 19/06/15	vie 31/07/15	2016									
2018			Conclusión trámite de Contratación	0 días	vie 31/07/15	vie 31/07/15	2017									
2019			2015CD-000016-503 USG_Mantenimiento de Planta Electrica etc (Vence 02/2015; Con Objeción y con Revocatoria) \$2.400.000.00)	96,5 días	lun 12/01/15	vie 29/05/15										
2020			Elaboración de Cartel	5,5 días	lun 12/01/15	lun 19/01/15										
2021			Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 12/01/15	lun 12/01/15										
2022			Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 12/01/15	mar 13/01/15	2021									
2023			Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 14/01/15	mié 14/01/15	2022									
2024			Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 15/01/15	jue 15/01/15	2023									
2025			Confección de cartel definitivo	1 día	vie 16/01/15	vie 16/01/15	2024									
2026			Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 19/01/15	lun 19/01/15	2025									
2027			Recepción y estudio de ofertas	24 días	lun 19/01/15	vie 20/02/15										
2028			Invitación a participar	15 días	lun 19/01/15	lun 09/02/15										
2029			Invitación	5 días	lun 19/01/15	lun 26/01/15	2026									
2030			Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 19/01/15	mar 20/01/15	2029CC									
2031			Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 20/01/15	mar 03/02/15	2030									
2032			Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 03/02/15	lun 09/02/15	2031									
2033			Recepción y estudio de ofertas	9 días	lun 09/02/15	vie 20/02/15										
2034			Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 09/02/15	lun 09/02/15	2032									

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre											
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio	12 febrero	22 octubre				
2035			Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 09/02/15	lun 09/02/15	2034												
2036			Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 09/02/15	vie 13/02/15	2035												
2037			Envío de prevenciones	0 días	vie 13/02/15	vie 13/02/15	2036												
2038			Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 13/02/15	mar 17/02/15	2037												
2039			Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 17/02/15	jue 19/02/15	2038												
2040			Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 19/02/15	vie 20/02/15	2039												
2041			Recomendación, adjudicación y comunicación	12 días	vie 20/02/15	mar 10/03/15													
2042			Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 20/02/15	lun 23/02/15	2040												
2043			Recurso de revocatoria	9 días	lun 23/02/15	vie 06/03/15													
2044			Plazo para recibir recurso	2 días	lun 23/02/15	mié 25/02/15	2042												
2045			Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 25/02/15	vie 27/02/15	2044												
2046			Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 27/02/15	mar 03/03/15	2045												
2047			Resolución de Recurso de revocatoria Art 136 RLCA	3 días	mar 03/03/15	vie 06/03/15	2046												
2048			Adjudicación en firme	2 días	vie 06/03/15	mar 10/03/15	2047												
2049			Trámite del Pedido	5 días	mar 10/03/15	mar 17/03/15													
2050			Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 10/03/15	mié 11/03/15	2048												
2051			Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 11/03/15	lun 16/03/15	2050												
2052			Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 16/03/15	mar 17/03/15	2051												
2053			Recepción de los items	18 días	mar 17/03/15	mar 14/04/15													
2054			Entrega items en Almacén	15 días	mar 17/03/15	jue 09/04/15	2052												
2055			Recibido a satisfacción	3 días	jue 09/04/15	mar 14/04/15	2054												
2056			Trámite de pago	32 días	mar 14/04/15	vie 29/05/15													
2057			Envío documentos a Financiero	2 días	mar 14/04/15	jue 16/04/15	2055												
2058			Emisión de pago en Financiero	30 días	jue 16/04/15	vie 29/05/15	2057												
2059			Conclusión trámite de Contratación	0 días	vie 29/05/15	vie 29/05/15	2058												
2060			2015CD-000017-503 (Con Objeción y con Revocatoria) Mantenimiento de equipo que administra ancho de banda \$6.380.000.00	96,5 días	lun 19/01/15	vie 05/06/15													
2061			Elaboración de Cartel	5,5 días	lun 19/01/15	lun 26/01/15													
2062			Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 19/01/15	lun 19/01/15													
2063			Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 19/01/15	mar 20/01/15	2062												
2064			Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 21/01/15	mié 21/01/15	2063												
2065			Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 22/01/15	jue 22/01/15	2064												
2066			Confección de cartel definitivo	1 día	vie 23/01/15	vie 23/01/15	2065												
2067			Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 26/01/15	lun 26/01/15	2066												
2068			Recepción y estudio de ofertas	24 días	lun 26/01/15	vie 27/02/15													

Proyecto: Cronograma de compra Fecha: mar 20/01/15	Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin	
	División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite	
	Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen		Hito inactivo		Resumen manual			
	Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo			

Página 60

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre						
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio	12 febrero
2069			Invitación a participar	15 días	lun 26/01/15	lun 16/02/15								
2070			Invitación	5 días	lun 26/01/15	lun 02/02/15	2067							
2071			Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 26/01/15	mar 27/01/15	2070CC							
2072			Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 27/01/15	mar 10/02/15	2071							
2073			Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 10/02/15	lun 16/02/15	2072							
2074			Recepción y estudio de ofertas	9 días	lun 16/02/15	vie 27/02/15								
2075			Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 16/02/15	lun 16/02/15	2073							
2076			Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 16/02/15	lun 16/02/15	2075							
2077			Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 16/02/15	vie 20/02/15	2076							
2078			Envío de prevenciones	0 días	vie 20/02/15	vie 20/02/15	2077							
2079			Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 20/02/15	mar 24/02/15	2078							
2080			Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 24/02/15	jue 26/02/15	2079							
2081			Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 26/02/15	vie 27/02/15	2080							
2082			Recomendación, adjudicación y comunicación	12 días	vie 27/02/15	mar 17/03/15								
2083			Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 27/02/15	lun 02/03/15	2081							
2084			Recurso de revocatoria	9 días	lun 02/03/15	vie 13/03/15								
2085			Plazo para recibir recurso	2 días	lun 02/03/15	mié 04/03/15	2083							
2086			Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 04/03/15	vie 06/03/15	2085							
2087			Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 06/03/15	mar 10/03/15	2086							
2088			Resolución de Recurso de revocatoria Art 136 RLCA	3 días	mar 10/03/15	vie 13/03/15	2087							
2089			Adjudicación en firme	2 días	vie 13/03/15	mar 17/03/15	2088							
2090			Trámite del Pedido	5 días	mar 17/03/15	mar 24/03/15								
2091			Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 17/03/15	mié 18/03/15	2089							
2092			Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 18/03/15	lun 23/03/15	2091							
2093			Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 23/03/15	mar 24/03/15	2092							
2094			Recepción de los items	18 días	mar 24/03/15	mar 21/04/15								
2095			Entrega items en Almacén	15 días	mar 24/03/15	jue 16/04/15	2093							
2096			Recibido a satisfacción	3 días	jue 16/04/15	mar 21/04/15	2095							
2097			Trámite de pago	32 días	mar 21/04/15	vie 05/06/15								
2098			Envío documentos a Financiero	2 días	mar 21/04/15	jue 23/04/15	2096							
2099			Emisión de pago en Financiero	30 días	jue 23/04/15	vie 05/06/15	2098							
2100			Conclusión trámite de Contratación	0 días	vie 05/06/15	vie 05/06/15	2099							
2101			2015CD-0000018-503 Señalización Institucional (Contratacion al 01/06/15; Con Objeción y con Revocatoria) \$4,000.000,00	96,5 días	lun 20/04/15	mié 02/09/15								
2102			Elaboración de Cartel	5,5 días	lun 20/04/15	lun 27/04/15								

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: mar 20/01/15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre								
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio	12 febrero	22 octubre	
2138			Trámite de pago	32 días	lun 20/07/15	mié 02/09/15										
2139			Envío documentos a Financiero	2 días	lun 20/07/15	mié 22/07/15	2137									
2140			Emisión de pago en Financiero	30 días	mié 22/07/15	mié 02/09/15	2139									
2141			Conclusión trámite de Contratación	0 días	mié 02/09/15	mié 02/09/15	2140									
2142			2015CD-000019-503 (Con Objeción y con Revocatoria) Compra de Radios de Comunicación \$5.500.000.00	96,5 días	lun 29/06/15	jue 12/11/15										
2143			Elaboración de Cartel	5,5 días	lun 29/06/15	lun 06/07/15										
2144			Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 29/06/15	lun 29/06/15										
2145			Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 29/06/15	mar 30/06/15	2144									
2146			Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 01/07/15	mié 01/07/15	2145									
2147			Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 02/07/15	jue 02/07/15	2146									
2148			Confección de cartel definitivo	1 día	vie 03/07/15	vie 03/07/15	2147									
2149			Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 06/07/15	lun 06/07/15	2148									
2150			Recepción y estudio de ofertas	24 días	lun 06/07/15	vie 07/08/15										
2151			Invitación a participar	15 días	lun 06/07/15	lun 27/07/15										
2152			Invitación	5 días	lun 06/07/15	lun 13/07/15	2149									
2153			Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 06/07/15	mar 07/07/15	2152CC									
2154			Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 07/07/15	mar 21/07/15	2153									
2155			Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 21/07/15	lun 27/07/15	2154									
2156			Recepción y estudio de ofertas	9 días	lun 27/07/15	vie 07/08/15										
2157			Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 27/07/15	lun 27/07/15	2155									
2158			Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 27/07/15	lun 27/07/15	2157									
2159			Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 27/07/15	vie 31/07/15	2158									
2160			Envío de prevenciones	0 días	vie 31/07/15	vie 31/07/15	2159									
2161			Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 31/07/15	mar 04/08/15	2160									
2162			Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 04/08/15	jue 06/08/15	2161									
2163			Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 06/08/15	vie 07/08/15	2162									
2164			Recomendación, adjudicación y comunicación	12 días	vie 07/08/15	mar 25/08/15										
2165			Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 07/08/15	lun 10/08/15	2163									
2166			Recurso de revocatoria	9 días	lun 10/08/15	vie 21/08/15										
2167			Plazo para recibir recurso	2 días	lun 10/08/15	mié 12/08/15	2165									
2168			Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 12/08/15	vie 14/08/15	2167									
2169			Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 14/08/15	mar 18/08/15	2168									
2170			Resolución de Recurso de revocatoria Art 136 RLCA	3 días	mar 18/08/15	vie 21/08/15	2169									
2171			Adjudicación en firme	2 días	vie 21/08/15	mar 25/08/15	2170									

Proyecto: Cronograma de compra

Fecha: mar 20/01/15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 63

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre								
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio	12 febrero	22 octubre	
2172			Trámite del Pedido	5 días	mar 25/08/15	mar 01/09/15										
2173			Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 25/08/15	mié 26/08/15	2171									
2174			Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 26/08/15	lun 31/08/15	2173									
2175			Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 31/08/15	mar 01/09/15	2174									
2176			Recepción de los items	18 días	mar 01/09/15	lun 28/09/15										
2177			Entrega items en Almacén	15 días	mar 01/09/15	mié 23/09/15	2175									
2178			Recibido a satisfacción	3 días	mié 23/09/15	lun 28/09/15	2177									
2179			Trámite de pago	32 días	lun 28/09/15	jue 12/11/15										
2180			Envío documentos a Financiero	2 días	lun 28/09/15	mié 30/09/15	2178									
2181			Emisión de pago en Financiero	30 días	mié 30/09/15	jue 12/11/15	2180									
2182			Conclusión trámite de Contratación	0 días	jue 12/11/15	jue 12/11/15	2181									
2183			2015CD-0000020-503 UTI_HP Enclosure C7000_(Contrato vence el 29/09/15) (Con Objeción y con Revocatoria) \$4.000.000.00	96,5 días	lun 11/05/15	mié 23/09/15										
2184			Elaboración de Cartel	5,5 días	lun 11/05/15	lun 18/05/15										
2185			Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 11/05/15	lun 11/05/15										
2186			Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 11/05/15	mar 12/05/15	2185									
2187			Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 13/05/15	mié 13/05/15	2186									
2188			Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 14/05/15	jue 14/05/15	2187									
2189			Confección de cartel definitivo	1 día	vie 15/05/15	vie 15/05/15	2188									
2190			Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 18/05/15	lun 18/05/15	2189									
2191			Recepción y estudio de ofertas	24 días	lun 18/05/15	vie 19/06/15										
2192			Invitación a participar	15 días	lun 18/05/15	lun 08/06/15										
2193			Invitación	5 días	lun 18/05/15	lun 25/05/15	2190									
2194			Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 18/05/15	mar 19/05/15	2193CC									
2195			Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 19/05/15	mar 02/06/15	2194									
2196			Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 02/06/15	lun 08/06/15	2195									
2197			Recepción y estudio de ofertas	9 días	lun 08/06/15	vie 19/06/15										
2198			Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 08/06/15	lun 08/06/15	2196									
2199			Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 08/06/15	lun 08/06/15	2198									
2200			Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 08/06/15	vie 12/06/15	2199									
2201			Envío de prevenciones	0 días	vie 12/06/15	vie 12/06/15	2200									
2202			Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 12/06/15	mar 16/06/15	2201									
2203			Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 16/06/15	jue 18/06/15	2202									
2204			Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 18/06/15	vie 19/06/15	2203									
2205			Recomendación, adjudicación y comunicación	12 días	vie 19/06/15	mar 07/07/15										

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: mar 20/01/15

TareaTareas externas

DivisiónHito externo

HitoTarea inactiva

ResumenHito inactivo

Resumen del proyectoResumen inactivo

Tarea manualSólo duración

Informe de resumen manualResumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 64

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre								
								3 diciembre	1 septiembre	11 mayo	18 enero	7 septiembre	05 junio	12 febrero	22 octubre	
2206			Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 19/06/15	lun 22/06/15	2204									
2207			Recurso de revocatoria	9 días	lun 22/06/15	vie 03/07/15										
2208			Plazo para recibir recurso	2 días	lun 22/06/15	mié 24/06/15	2206									
2209			Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 24/06/15	vie 26/06/15	2208									
2210			Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 26/06/15	mar 30/06/15	2209									
2211			Resolución de Recurso de revocatoria Art 136 RLCA	3 días	mar 30/06/15	vie 03/07/15	2210									
2212			Adjudicación en firme	2 días	vie 03/07/15	mar 07/07/15	2211									
2213			Trámite del Pedido	5 días	mar 07/07/15	mar 14/07/15										
2214			Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 07/07/15	mié 08/07/15	2212									
2215			Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 08/07/15	lun 13/07/15	2214									
2216			Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 13/07/15	mar 14/07/15	2215									
2217			Recepción de los items	18 días	mar 14/07/15	vie 07/08/15										
2218			Entrega items en Almacén	15 días	mar 14/07/15	mar 04/08/15	2216									
2219			Recibido a satisfacción	3 días	mar 04/08/15	vie 07/08/15	2218									
2220			Trámite de pago	32 días	vie 07/08/15	mié 23/09/15										
2221			Envío documentos a Financiero	2 días	vie 07/08/15	mar 11/08/15	2219									
2222			Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 11/08/15	mié 23/09/15	2221									
2223			Conclusión trámite de Contratación	0 días	mié 23/09/15	mié 23/09/15	2222									
2224			2015CD-000021-503 UTI_Derecho de Uso de libros digitales y bases de datos jurídicas. (Contratado al 01/11/15; Con Objeción y con Revocatoria) \$3,900.000,00	96,5 días	lun 07/09/15	lun 08/02/16										
2225			Elaboración de Cartel	5,5 días	lun 07/09/15	lun 14/09/15										
2226			Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 07/09/15	lun 07/09/15										
2227			Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 07/09/15	mar 08/09/15	2226									
2228			Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 09/09/15	mié 09/09/15	2227									
2229			Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 10/09/15	jue 10/09/15	2228									
2230			Confección de cartel definitivo	1 día	vie 11/09/15	vie 11/09/15	2229									
2231			Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 14/09/15	lun 14/09/15	2230									
2232			Recepción y estudio de ofertas	24 días	lun 14/09/15	mar 20/10/15										
2233			Invitación a participar	15 días	lun 14/09/15	mar 06/10/15										
2234			Invitación	5 días	lun 14/09/15	mar 22/09/15	2231									
2235			Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 14/09/15	mié 16/09/15	2234CC									
2236			Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mié 16/09/15	mié 30/09/15	2235									

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre							
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio	12 febrero	22 octubre
2240			Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	mar 06/10/15	mar 06/10/15	2239								
2241			Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	mar 06/10/15	mar 13/10/15	2240								
2242			Envío de prevenciones	0 días	mar 13/10/15	mar 13/10/15	2241								
2243			Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	mar 13/10/15	jue 15/10/15	2242								
2244			Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	jue 15/10/15	lun 19/10/15	2243								
2245			Elaboración de Informe Técnico	1 día	lun 19/10/15	mar 20/10/15	2244								
2246			Recomendación, adjudicación y comunicación	12 días	mar 20/10/15	jue 05/11/15									
2247			Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	mar 20/10/15	mié 21/10/15	2245								
2248			Recurso de revocatoria	9 días	mié 21/10/15	mar 03/11/15									
2249			Plazo para recibir recurso	2 días	mié 21/10/15	vie 23/10/15	2247								
2250			Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	vie 23/10/15	mar 27/10/15	2249								
2251			Plazo para audiencia inicial	2 días	mar 27/10/15	jue 29/10/15	2250								
2252			Resolución de Recurso de revocatoria Art 136 RLCA	3 días	jue 29/10/15	mar 03/11/15	2251								
2253			Adjudicación en firme	2 días	mar 03/11/15	jue 05/11/15	2252								
2254			Trámite del Pedido	5 días	jue 05/11/15	jue 12/11/15									
2255			Elaboración del Pedido de Compra	1 día	jue 05/11/15	vie 06/11/15	2253								
2256			Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	vie 06/11/15	mié 11/11/15	2255								
2257			Notificación de Pedido de Compra	1 día	mié 11/11/15	jue 12/11/15	2256								
2258			Recepción de los items	18 días	jue 12/11/15	mar 08/12/15									
2259			Entrega items en Almacén	15 días	jue 12/11/15	jue 03/12/15	2257								
2260			Recibido a satisfacción	3 días	jue 03/12/15	mar 08/12/15	2259								
2261			Trámite de pago	32 días	mar 08/12/15	lun 08/02/16									
2262			Envío documentos a Financiero	2 días	mar 08/12/15	jue 10/12/15	2260								
2263			Emisión de pago en Financiero	30 días	jue 10/12/15	lun 08/02/16	2262								
2264			Conclusión trámite de Contratación	0 días	lun 08/02/16	lun 08/02/16	2263								
2265			2015CD-000022-503 USG_Mantenimiento de transformador etc (Vence 02/2015; Con Objeción y con Revocatoria) \$600.000.00)	96,5 días	lun 05/01/15	vie 22/05/15									
2266			Elaboración de Cartel	5,5 días	lun 05/01/15	lun 12/01/15									
2267			Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 05/01/15	lun 05/01/15									
2268			Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 05/01/15	mar 06/01/15	2267								
2269			Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 07/01/15	mié 07/01/15	2268								
2270			Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 08/01/15	jue 08/01/15	2269								
2271			Confección de cartel definitivo	1 día	vie 09/01/15	vie 09/01/15	2270								
2272			Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 12/01/15	lun 12/01/15	2271								
2273			Recepción y estudio de ofertas	24 días	lun 12/01/15	vie 13/02/15									

Proyecto: Cronograma de compra

Fecha: mar 20/01/15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 66

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre							
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio	12 febrero	22 octubre
2274			Invitación a participar	15 días	lun 12/01/15	lun 02/02/15									
2275			Invitación	5 días	lun 12/01/15	lun 19/01/15	2272								
2276			Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 12/01/15	mar 13/01/15	2275CC								
2277			Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 13/01/15	mar 27/01/15	2276								
2278			Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 27/01/15	lun 02/02/15	2277								
2279			Recepción y estudio de ofertas	9 días	lun 02/02/15	vie 13/02/15									
2280			Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 02/02/15	lun 02/02/15	2278								
2281			Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 02/02/15	lun 02/02/15	2280								
2282			Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 02/02/15	vie 06/02/15	2281								
2283			Envío de prevenciones	0 días	vie 06/02/15	vie 06/02/15	2282								
2284			Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 06/02/15	mar 10/02/15	2283								
2285			Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 10/02/15	jue 12/02/15	2284								
2286			Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 12/02/15	vie 13/02/15	2285								
2287			Recomendación, adjudicación y comunicación	12 días	vie 13/02/15	mar 03/03/15									
2288			Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 13/02/15	lun 16/02/15	2286								
2289			Recurso de revocatoria	9 días	lun 16/02/15	vie 27/02/15									
2290			Plazo para recibir recurso	2 días	lun 16/02/15	mié 18/02/15	2288								
2291			Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 18/02/15	vie 20/02/15	2290								
2292			Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 20/02/15	mar 24/02/15	2291								
2293			Resolución de Recurso de revocatoria Art 136 RLCA	3 días	mar 24/02/15	vie 27/02/15	2292								
2294			Adjudicación en firme	2 días	vie 27/02/15	mar 03/03/15	2293								
2295			Trámite del Pedido	5 días	mar 03/03/15	mar 10/03/15									
2296			Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 03/03/15	mié 04/03/15	2294								
2297			Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 04/03/15	lun 09/03/15	2296								
2298			Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 09/03/15	mar 10/03/15	2297								
2299			Recepción de los items	18 días	mar 10/03/15	mar 07/04/15									
2300			Entrega items en Almacén	15 días	mar 10/03/15	mar 31/03/15	2298								
2301			Recibido a satisfacción	3 días	mar 31/03/15	mar 07/04/15	2300								
2302			Trámite de pago	32 días	mar 07/04/15	vie 22/05/15									
2303			Envío documentos a Financiero	2 días	mar 07/04/15	jue 09/04/15	2301								
2304			Emisión de pago en Financiero	30 días	jue 09/04/15	vie 22/05/15	2303								
2305			Conclusión trámite de Contratación	0 días	vie 22/05/15	vie 22/05/15	2304								
2306			Artículo 201 RLCA	21 días	lun 05/01/15	lun 02/02/15									
2307			Contrato Adicional "USG_Cerramiento de oficinas" \$5.000.000,00 (Contratado al 01/02/15)	21 días	lun 05/01/15	lun 02/02/15									

Proyecto: Cronograma de compra

Fecha: mar 20/01/15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

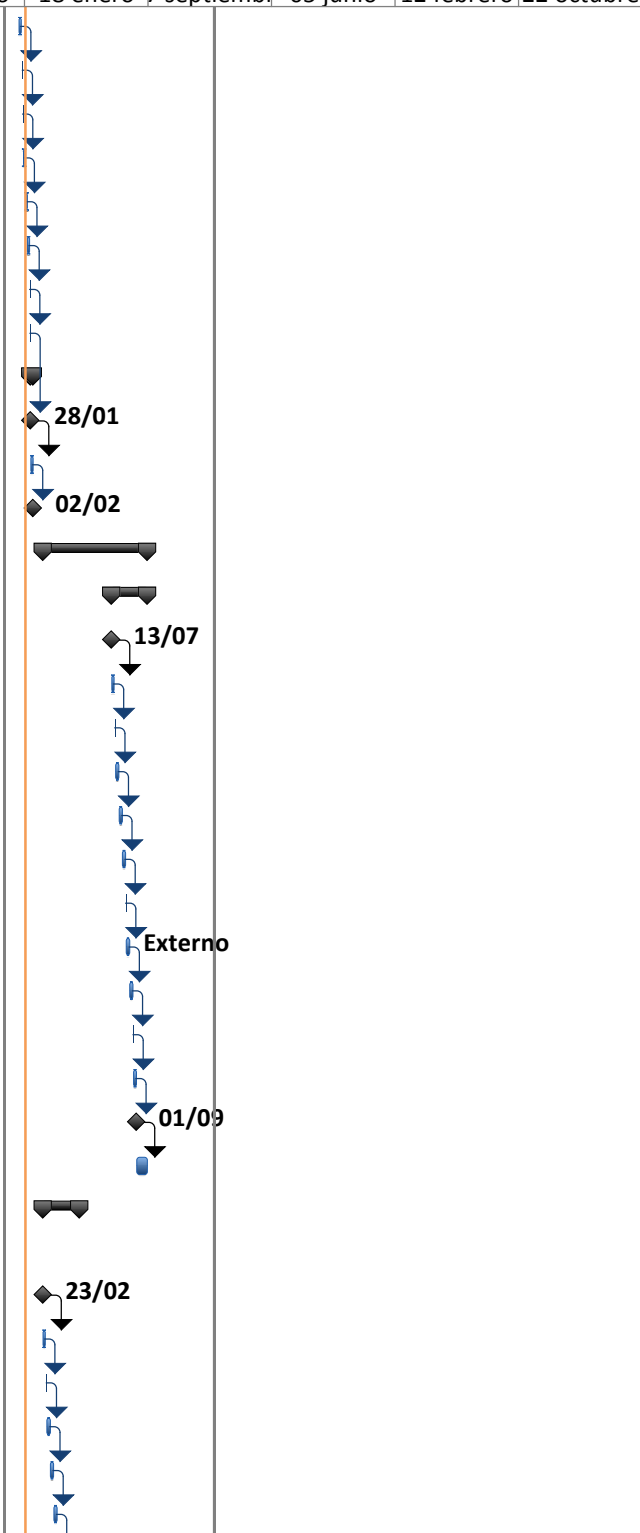
Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

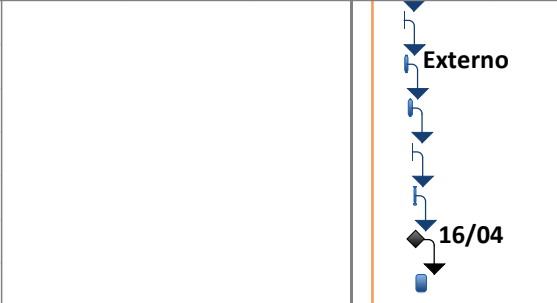
Progreso

Página 67

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre					
								3 diciembre	1 septiemb	11 mayo	18 enero	7 septiemb	05 junio
2308			Elaboración de solicitud de contratacion	5 días	lun 05/01/15	vie 09/01/15							
2309			Envío de solicitud a la USP	1 día	lun 12/01/15	lun 12/01/15	2308						
2310			Oficio a empresa preguntando si mantiene términos y condiciones	1 día	mar 13/01/15	mar 13/01/15	2309						
2311			Plazo para que la empresa conteste	3 días	mié 14/01/15	vie 16/01/15	2310						
2312			Elaboración de Resolución Administrativa	3 días	lun 19/01/15	mié 21/01/15	2311						
2313			Revisión y firma de Resolución	3 días	jue 22/01/15	lun 26/01/15	2312						
2314			Notificacion de resolución	1 día	mar 27/01/15	mar 27/01/15	2313						
2315			Elaboración de pedido de compra	1 día	mié 28/01/15	mié 28/01/15	2314						
2316			Recepción de los items	3 días	mié 28/01/15	lun 02/02/15							
2317			Entrega items en Almacén	0 días	mié 28/01/15	mié 28/01/15	2315						
2318			Recibido a satisfacción	3 días	jue 29/01/15	lun 02/02/15	2317						
2319			Fin recepción de items	0 días	lun 02/02/15	lun 02/02/15	2318						
2320			ARTÍCULO 131 RLCA	149 días	lun 23/02/15	mié 23/09/15							
2321			Mantenimiento de las UPS (Vence 10/2015)" \$19,500.000,00	52 días	lun 13/07/15	mié 23/09/15							
2322			Envío de de especificaciones Técnicas y estudios previos	0 días	lun 13/07/15	lun 13/07/15							
2323			Elaboracion de especificaciones técnicas	5 días	lun 13/07/15	vie 17/07/15	2322						
2324			Recepción Especificaciones técnicas	1 día	lun 20/07/15	lun 20/07/15	2323						
2325			Elaboracion del cartel	5 días	mar 21/07/15	lun 27/07/15	2324						
2326			Revisión Técnica de cartel	5 días	mar 28/07/15	lun 03/08/15	2325						
2327			Revisión Jurídica de cartel	5 días	mar 04/08/15	lun 10/08/15	2326						
2328			Confección de invitacion con Anexo de especificaciones tecnicas	1 día	mar 11/08/15	mar 11/08/15	2327						
2329			Elaboración y recepción de oferta	5 días	mié 12/08/15	mar 18/08/15	2328						
2330			Revisión de oferta Unidad Técnica	5 días	mié 19/08/15	mar 25/08/15	2329						
2331			Oficio de análisis Técnico	1 día	mié 26/08/15	mié 26/08/15	2330						
2332			Elaboración de Resolución	4 días	jue 27/08/15	mar 01/09/15	2331						
2333			Comunicación de Resolución	0 días	mar 01/09/15	mar 01/09/15	2332						
2334			Formalización y aprobación de contrato	15 días	mié 02/09/15	mié 23/09/15	2333						
2335			Mantenimiento de los Aires Acondicionados de Precisión (Vence 05/2015)" \$4,100.000,00	52 días	lun 23/02/15	vie 08/05/15							
2336			Envío de de especificaciones Técnicas y estudios previos	0 días	lun 23/02/15	lun 23/02/15							
2337			Elaboracion de especificaciones técnicas	5 días	lun 23/02/15	vie 27/02/15	2336						
2338			Recepción Especificaciones técnicas	1 día	lun 02/03/15	lun 02/03/15	2337						
2339			Elaboracion del cartel	5 días	mar 03/03/15	lun 09/03/15	2338						
2340			Revisión Técnica de cartel	5 días	mar 10/03/15	lun 16/03/15	2339						
2341			Revisión Jurídica de cartel	5 días	mar 17/03/15	lun 23/03/15	2340						

Proyecto: Cronograma de compra Fecha: mar 20/01/15	Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin	
	División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite	
	Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen		Hito inactivo		Resumen manual			
	Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo			

Página 68

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre						
								3 diciembre	4 septiembre	11 mayo	18 enero	7 septiembre	05 junio	12 febrero
2342			Confección de invitacion con Anexo de especificaciones tecnicas	1 día	mar 24/03/15	mar 24/03/15	2341							
2343			Elaboración y recepción de oferta	5 días	mié 25/03/15	mar 31/03/15	2342							
2344			Revisión de oferta Unidad Técnica	5 días	mié 01/04/15	jue 09/04/15	2343							
2345			Oficio de análisis Técnico	1 día	vie 10/04/15	vie 10/04/15	2344							
2346			Elaboración de Resolución	4 días	lun 13/04/15	jue 16/04/15	2345							
2347			Comunicación de Resolución	0 días	jue 16/04/15	jue 16/04/15	2346							
2348			Formalización y aprobación de contrato	15 días	vie 17/04/15	vie 08/05/15	2347							

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: mar 20/01/15

TareaTareas externas

DivisiónHito externo

HitoTarea inactiva

ResumenHito inactivo

Resumen del proyectoResumen inactivo

Tarea manualSólo duración

Informe de resumen manualResumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 69
