


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	4° trim	1er trin	2° trim	3er trin	4° trim	1er trin	2° trim	3er trin	4° trim	1er trin	2° trim	3er trin	4° trim
1		<b>CRONOGRAMAS COMPRAS CGR - 2018</b>	<b>338 días?</b>	<b>mar 14/11/17</b>	<b>jue 18/4/19</b>														
2		<b>LICITACIONES PÚBLICAS</b>	<b>291 días?</b>	<b>lun 11/12/17</b>	<b>lun 11/3/19</b>														
3		<b>UNIDAD DE GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO (UGPH)</b>	<b>277,5 días?</b>	<b>lun 11/12/17</b>	<b>mié 20/2/19</b>														
4		<b>2018LN-00002-503_UGPH_Contratación de una empresa que brinde el servicio médico para los funcionarios de la institución_Vence el 01/11/2018_ \$54,000.000/año; \$216.000.000/4 años</b>	<b>277,5 días?</b>	<b>lun 11/12/17</b>	<b>mié 20/2/19</b>														
5		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	lun 11/12/17	lun 11/12/17														
6		<b>Confección Documento complementario al cartel</b>	<b>17 días</b>	<b>lun 11/12/17</b>	<b>mié 17/1/18</b>														
7		Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 11/12/17	vie 15/12/17	5													
8		Revisión Jurídica de cartel UJI	7 días	lun 18/12/17	mié 10/1/18	7													
9		Revisión Técnica de cartel	7 días	lun 18/12/17	mié 10/1/18	7													
10		Incorporación de ajustes y confección de Documento complementario al cartel	5 días	jue 11/1/18	mié 17/1/18	9													
11		<b>Invitación a participar</b>	<b>11 días</b>	<b>jue 18/1/18</b>	<b>jue 1/2/18</b>														
12		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de Mer Link	5 días	jue 18/1/18	mié 24/1/18	10													
13		Elaboración de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	jue 25/1/18	mié 31/1/18	12													
14		Invitación a participar en Mer Link	1 día	jue 1/2/18	jue 1/2/18	13													
15		<b>Plazo para recibir ofertas</b>	<b>22 días</b>	<b>vie 2/2/18</b>	<b>lun 5/3/18</b>														
16		Plazo para recibir ofertas	22 días	vie 2/2/18	lun 5/3/18	14													
17		<b>Presentación de Objeción al cartel</b>	<b>7 días</b>	<b>jue 1/2/18</b>	<b>vie 9/2/18</b>														
18		Presentación de Objeción al cartel	7 días	jue 1/2/18	vie 9/2/18	14CC													
19		<b>Recurso de Objeción al Cartel</b>	<b>12 días</b>	<b>lun 12/2/18</b>	<b>mar 27/2/18</b>														
20		Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	lun 12/2/18	lun 12/2/18	18													
21		La DCA solicita expediente administrativo a la USP y solicita criterio técnico acerca del recursos en mención.	1 día	mar 13/2/18	mar 13/2/18	20													
22		Respuesta con el criterio de la UT a la USP para ser enviado a la DCA	2 días	mié 14/2/18	jue 15/2/18	21													
23		Respuesta de la USP para ser enviado a la DCA	1 día	vie 16/2/18	vie 16/2/18	22													
24		Remisión del criterio técnico a la DCA	0 días	jue 15/2/18	jue 15/2/18	22													
25		Confección de Resolución a la Objeción	5 días	vie 16/2/18	jue 22/2/18	24													
26		Comunicación de Resolución final por medio de Mer Link	3 días	vie 23/2/18	mar 27/2/18	25													
27		<b>Enmiendas al Cartel</b>	<b>10 días</b>	<b>mié 28/2/18</b>	<b>mar 13/3/18</b>														
28		Enmiendas al Cartel	10 días	mié 28/2/18	mar 13/3/18	26													
29		<b>Nuevo plazo para recibir ofertas</b>	<b>22 días</b>	<b>mié 14/3/18</b>	<b>vie 20/4/18</b>														
30		Nuevo plazo para recibir ofertas	22 días	mié 14/3/18	vie 20/4/18	28													
31		<b>Fecha máxima para adjudicar</b>	<b>88 días</b>	<b>lun 23/4/18</b>	<b>mar 28/8/18</b>														
32		Fecha máxima para adjudicar	88 días	lun 23/4/18	mar 28/8/18	30													
33		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>32 días</b>	<b>lun 23/4/18</b>	<b>mié 6/6/18</b>														
34		Apertura de ofertas	1 día	lun 23/4/18	lun 23/4/18	30													




Proyecto: Cronograma de comp  
 Fecha: lun 18/12/17

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

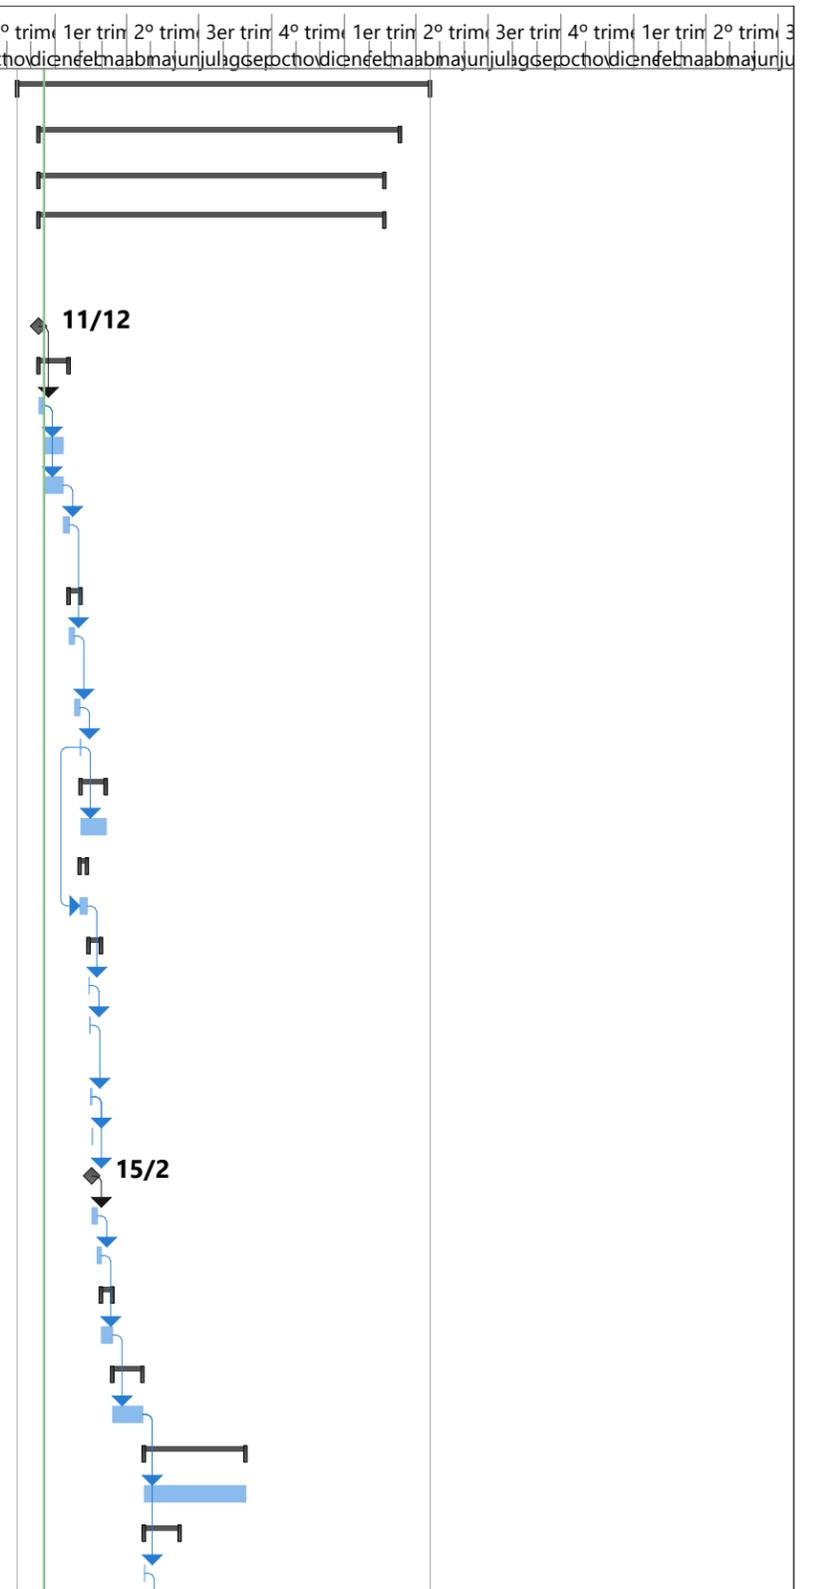



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Cronograma																
							4º trim oct	1er trin dic	2º trin ene	3er trin feb	4º trin mar	1er trin abr	2º trin may	3er trin jun	4º trin jul	1er trin ago	2º trin sep	3er trin oct					
102		Invitación a participar en Mer Link	1 día	mié 21/2/18	mié 21/2/18	101																	
103		<b>Plazo para recibir ofertas</b>	<b>22 días</b>	<b>jue 22/2/18</b>	<b>vie 23/3/18</b>																		
104		Plazo para recibir ofertas	22 días	jue 22/2/18	vie 23/3/18	102																	
105		<b>Presentacion de Objeción al cartel</b>	<b>7 días</b>	<b>mié 21/2/18</b>	<b>jue 1/3/18</b>																		
106		Presentacion de Objeción al cartel	7 días	mié 21/2/18	jue 1/3/18	102CC																	
107		<b>Recurso de Objeción al Cartel</b>	<b>12 días</b>	<b>vie 2/3/18</b>	<b>lun 19/3/18</b>																		
108		Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	vie 2/3/18	vie 2/3/18	106																	
109		La DCA solicita expediente administrativo a la USP y solicita criterio técnico acerca del recursos en mención.	1 día	lun 5/3/18	lun 5/3/18	108																	
110		Respuesta con el criterio de la UT a la USP para ser enviado a la DCA	2 días	mar 6/3/18	mié 7/3/18	109																	
111		Respuesta de la USP para ser enviado a la DCA	1 día	jue 8/3/18	jue 8/3/18	110																	
112		Remisión del criterio técnico a la DCA	0 días	mié 7/3/18	mié 7/3/18	110																	
113		Confeccion de Resolucion a la Objecion	5 días	jue 8/3/18	mié 14/3/18	112																	
114		Comunicación de Resolucion final por medio de Mer Link	3 días	jue 15/3/18	lun 19/3/18	113																	
115		<b>Enmiendas al Cartel</b>	<b>10 días</b>	<b>mar 20/3/18</b>	<b>lun 9/4/18</b>																		
116		Enmiendas al Cartel	10 días	mar 20/3/18	lun 9/4/18	114																	
117		<b>Nuevo plazo para recibir ofertas</b>	<b>22 días</b>	<b>mar 10/4/18</b>	<b>vie 11/5/18</b>																		
118		Nuevo plazo para recibir ofertas	22 días	mar 10/4/18	vie 11/5/18	116																	
119		<b>Fecha máxima para adjudicar</b>	<b>88 días</b>	<b>lun 14/5/18</b>	<b>lun 17/9/18</b>																		
120		Fecha máxima para adjudicar	88 días	lun 14/5/18	lun 17/9/18	118																	
121		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>32 días</b>	<b>lun 14/5/18</b>	<b>mar 26/6/18</b>																		
122		Apertura de ofertas	1 día	lun 14/5/18	lun 14/5/18	118																	
123		Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion de admisibilidad	1 día	mar 15/5/18	mar 15/5/18	122																	
124		Estudio y valoración de las ofertas (incluye reunión de admisibilidad)	10 días	mié 16/5/18	mar 29/5/18	123																	
125		Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenciones	0 días	mar 29/5/18	mar 29/5/18	124																	
126		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En Mer-Link)	5 días	mié 30/5/18	mar 5/6/18	125																	
127		Envío de las respuestas de proveedores a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	mar 5/6/18	mar 5/6/18	126																	
128		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	5 días	mié 6/6/18	mar 12/6/18	127																	
129		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	5 días	mié 13/6/18	mar 19/6/18	128																	
130		Elaboración de Informe de recomendación (UT)	5 días	mié 20/6/18	mar 26/6/18	129																	
131		<b>Recomendación, adjudicación y comunicación</b>	<b>16,5 días</b>	<b>mié 27/6/18</b>	<b>jue 19/7/18</b>																		
132		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mié 27/6/18	vie 29/6/18	130																	
133		Sesión de la Comision de Adjuducaciones	0,5 días	lun 2/7/18	lun 2/7/18	132																	
134		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	1 día	lun 2/7/18	mar 3/7/18	133																	
135		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mar 3/7/18	mié 4/7/18	134																	

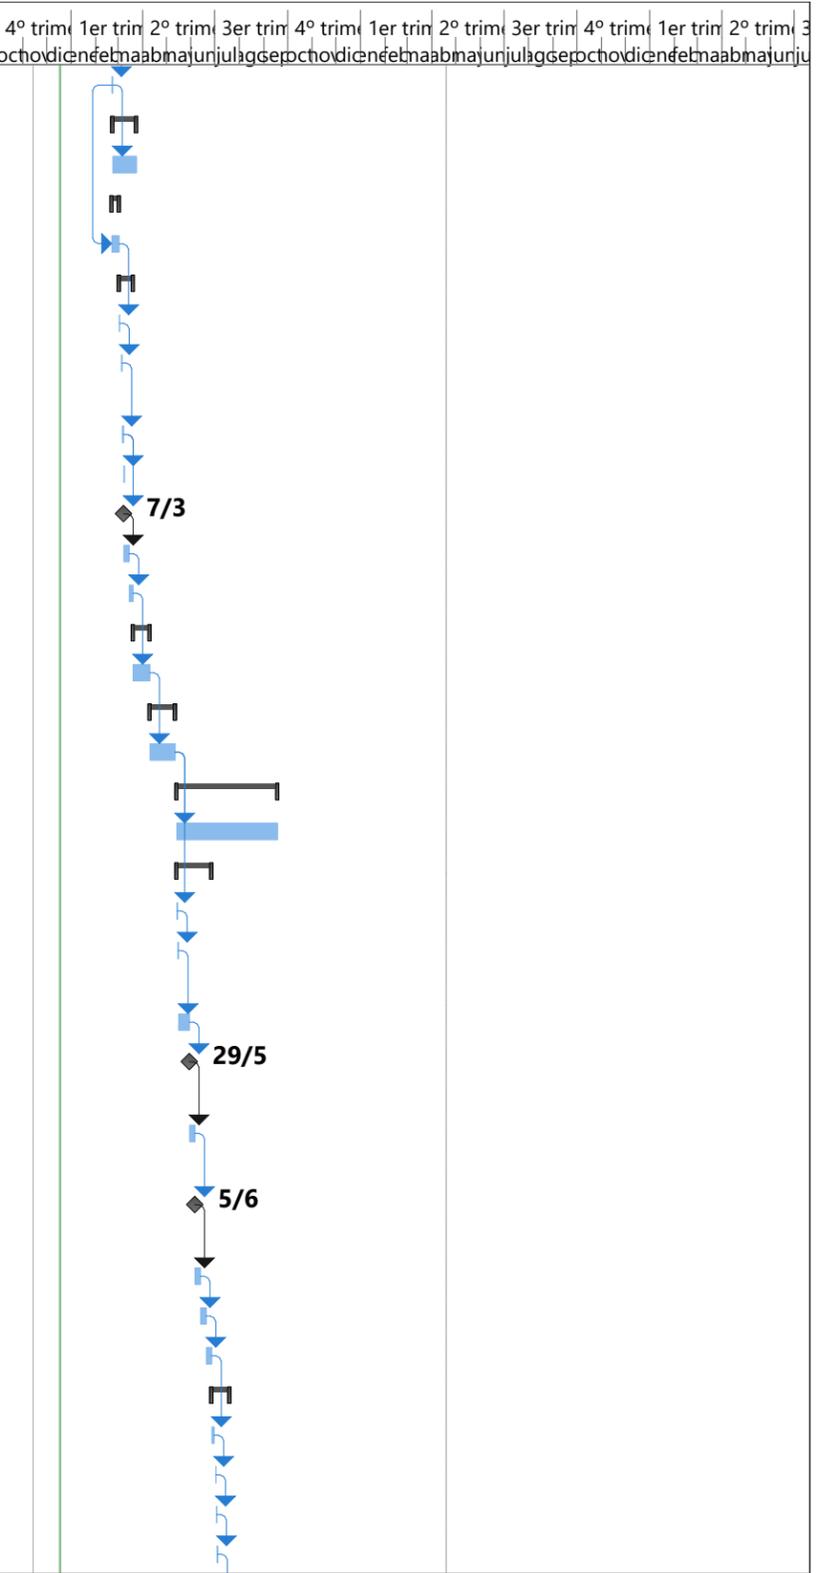


Proyecto: Cronograma de comp Fecha: lun 18/12/17	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			








Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	4° trim oct	1er trim nov	2° trim ene	3er trim feb	4° trim mar	1er trim abr	2° trim may	3er trim jun	4° trim jul	1er trim ago	2° trim sep	3er trim oct	4° trim nov	1er trim dic	
241		Aprobacion Interna de Contrato	10 días	mié 30/5/18	mar 12/6/18	240															
242		Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	mar 12/6/18	mar 12/6/18	241															
243		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>6 días</b>	<b>mié 13/6/18</b>	<b>mié 20/6/18</b>																
244		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	mié 13/6/18	jue 14/6/18	241															
245		Envío de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	jue 14/6/18	jue 14/6/18	244															
246		Visado de pedido en la UAF	3 días	vie 15/6/18	mar 19/6/18	245															
247		Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	mié 20/6/18	mié 20/6/18	246															
248		Notificación de Pedido de Compra	0 días	mié 20/6/18	mié 20/6/18	247;246															
249		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mié 20/6/18	mié 20/6/18	248															
250		<b>Recepción de los items</b>	<b>13 días</b>	<b>mié 13/6/18</b>	<b>vie 29/6/18</b>																
251		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mié 13/6/18	mar 26/6/18	241															
252		Recibido a satisfacción	3 días	mié 27/6/18	vie 29/6/18	251															
253		Fin recepción de items	0 días	vie 29/6/18	vie 29/6/18	252															
254		<b>Trámite de pago</b>	<b>36 días</b>	<b>lun 2/7/18</b>	<b>jue 23/8/18</b>																
255		Envío documentos a Financiero	1 día	lun 2/7/18	lun 2/7/18	253															
256		Emisión de pago en Financiero	5 días	mar 3/7/18	lun 9/7/18	255															
257		Pago de Tesorería Nacional	30 días	mar 10/7/18	jue 23/8/18	256															
258		Conclusión trámite licitación	0 días	jue 23/8/18	jue 23/8/18	257															
259		<b>2018LA-00005-503_UTI_Contratación de una empresa que brinde el mantenimiento de central telefónica_Contrato vence 19/08/2018_ \$32,116,000/año; \$124,464,000/4 años</b>	<b>164 días</b>	<b>lun 22/1/18</b>	<b>jue 20/9/18</b>																
260		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	lun 22/1/18	lun 22/1/18																
261		<b>Confección Documento complementario al cartel</b>	<b>17 días</b>	<b>lun 22/1/18</b>	<b>mar 13/2/18</b>																
262		Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 22/1/18	vie 26/1/18	260															
263		Revisión Jurídica de cartel UJI	7 días	lun 29/1/18	mar 6/2/18	262															
264		Revisión Técnica de cartel	7 días	lun 29/1/18	mar 6/2/18	262															
265		Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al cartel	5 días	mié 7/2/18	mar 13/2/18	264															
266		<b>Invitación a participar</b>	<b>28 días</b>	<b>mié 14/2/18</b>	<b>vie 23/3/18</b>																
267		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de Mer Link	5 días	mié 14/2/18	mar 20/2/18	265															
268		Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	mié 21/2/18	mar 27/2/18	267															
269		Invitación a participar en Mer Link	1 día	mié 28/2/18	mié 28/2/18	268															
270		Plazo para recibir ofertas	17 días	jue 1/3/18	vie 23/3/18	269															
271		<b>Recurso de Objeción al Cartel</b>	<b>17 días</b>	<b>jue 1/3/18</b>	<b>vie 23/3/18</b>																
272		Presentacion de Objeción al cartel	5 días	jue 1/3/18	mié 7/3/18	269															
273		Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	jue 8/3/18	jue 8/3/18	272															
274		Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	vie 9/3/18	vie 9/3/18	273															
275		Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	lun 12/3/18	vie 16/3/18	274															

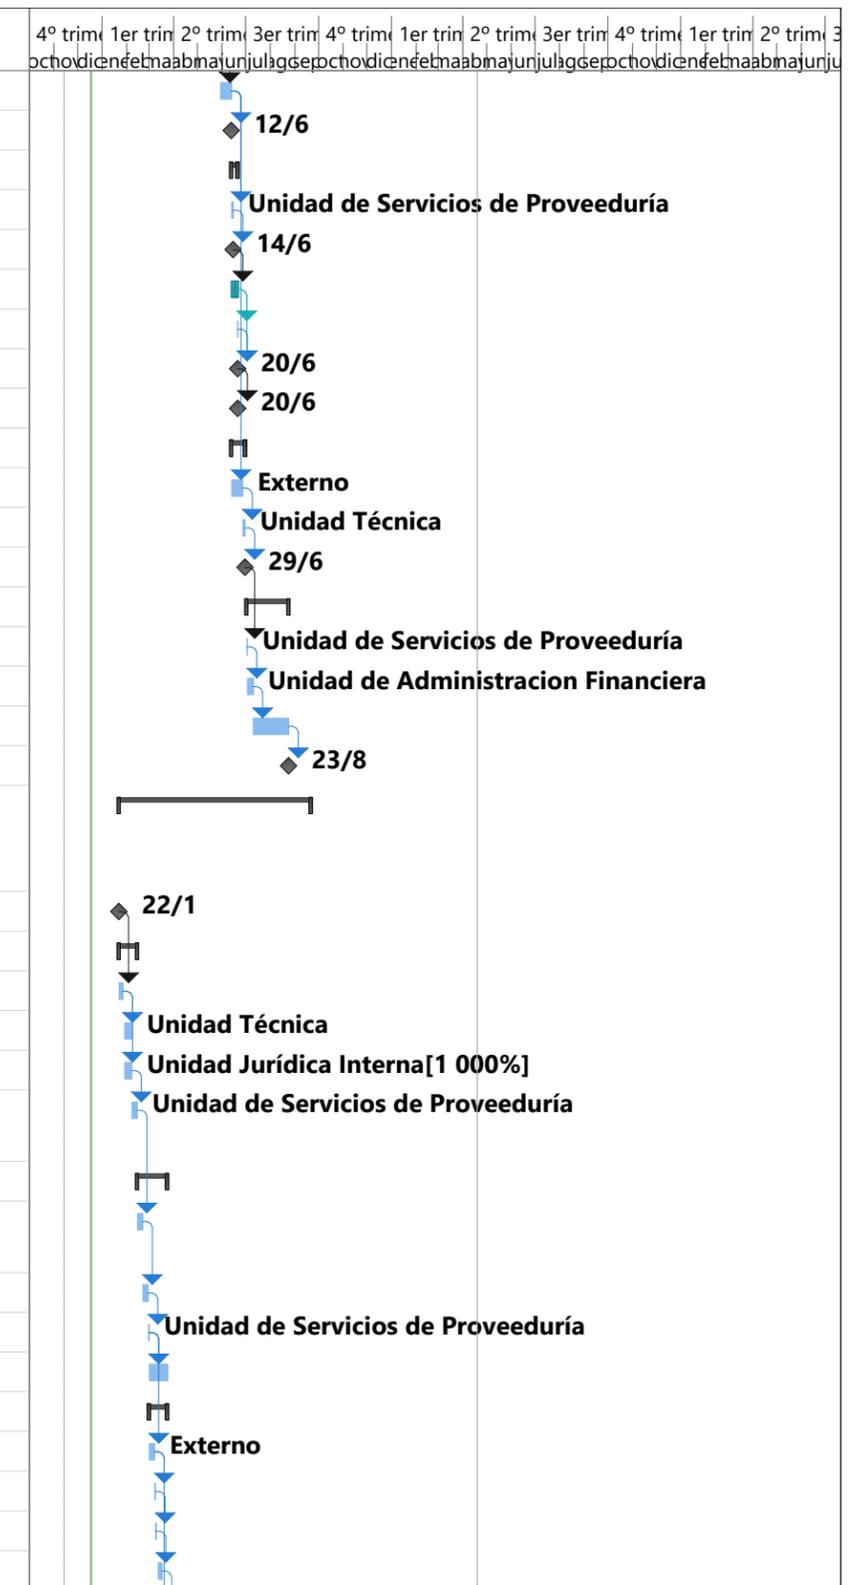

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: lun 18/12/17

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	4º trim 1er trim 2º trim 3er trim 4º trim 1er trim 2º trim 3er trim 4º trim 1er trim 2º trim 3															
							ochovdicenefebnaabmajunjulaggeochovdicenefebnaabmajunjulaggeochovdicenefebnaabmajunju															
276	→	Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	lun 19/3/18	jue 22/3/18	275																
277	→	Comunicación de Resolución final	1 día	vie 23/3/18	vie 23/3/18	276																
278	→	Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	jue 8/3/18	vie 23/3/18	272																
279	→	<b>Plazo para adjudicación</b>	<b>34 días</b>	<b>lun 2/4/18</b>	<b>lun 21/5/18</b>																	
280	→	Fecha máxima para adjudicar	34 días	lun 2/4/18	lun 21/5/18	278																
281	→	<b>Recepción de ofertas</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 23/3/18</b>	<b>lun 2/4/18</b>																	
282	→	Apertura de ofertas	0 días	vie 23/3/18	vie 23/3/18	278																
283	→	Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion para entrega de prevenciones Outlook)	1 día	lun 2/4/18	lun 2/4/18	282																
284	→	<b>Estudio y valoración de las ofertas.</b>	<b>17 días</b>	<b>mar 3/4/18</b>	<b>jue 26/4/18</b>	<b>283</b>																
285	→	Admisibiliidad de ofertas (incluye reunión de admisibilidad)	5 días	mar 3/4/18	lun 9/4/18	283																
286	→	Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenciones	1 día	mar 10/4/18	mar 10/4/18	285																
287	→	Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En Mer-Link)	5 días	jue 12/4/18	mié 18/4/18	286																
288	→	Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	mié 18/4/18	mié 18/4/18	287																
289	→	Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	jue 19/4/18	lun 23/4/18	288																
290	→	Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	mar 24/4/18	jue 26/4/18	289																
291	→	<b>Informe de recomendación</b>	<b>5 días</b>	<b>vie 27/4/18</b>	<b>vie 4/5/18</b>																	
292	→	Elaboración de Informe de recomendación	5 días	vie 27/4/18	vie 4/5/18	290																
293	→	<b>Recomendación, adjudicación y comunicación</b>	<b>11 días</b>	<b>lun 7/5/18</b>	<b>lun 21/5/18</b>																	
294	→	Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	lun 7/5/18	mié 9/5/18	292																
295	→	Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	jue 10/5/18	jue 10/5/18	294																
296	→	Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	jue 10/5/18	jue 10/5/18	295																
297	→	Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	vie 11/5/18	vie 11/5/18	296																
298	→	Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	lun 14/5/18	lun 14/5/18	297																
299	→	Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	mar 15/5/18	lun 21/5/18	298																
300	→	<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>25 días</b>	<b>mar 15/5/18</b>	<b>lun 18/6/18</b>																	
301	→	Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	mar 15/5/18	lun 21/5/18	298																
302	→	Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisibile (Art N°186 RLCA)	2 días	mar 22/5/18	mié 23/5/18	301																
303	→	Notificación al Adjudicatario del recurso en caso de ser admisible	0 días	mié 23/5/18	mié 23/5/18	302																
304	→	Plazo para recibir respuesta del adjudicatario (Art N°194 RLCA)	3 días	jue 24/5/18	lun 28/5/18	303																
305	→	Elaboracion de la resolucio final de la revocatoria (Art N°195 RLCA)	15 días	mar 29/5/18	lun 18/6/18	304																
306	→	Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	lun 18/6/18	lun 18/6/18	305																
307	→	<b>Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones</b>	<b>6 días</b>	<b>mar 19/6/18</b>	<b>mar 26/6/18</b>	<b>306</b>																
308	→	Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mar 19/6/18	mar 19/6/18																	
309	→	Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mar 19/6/18	mar 19/6/18	308																

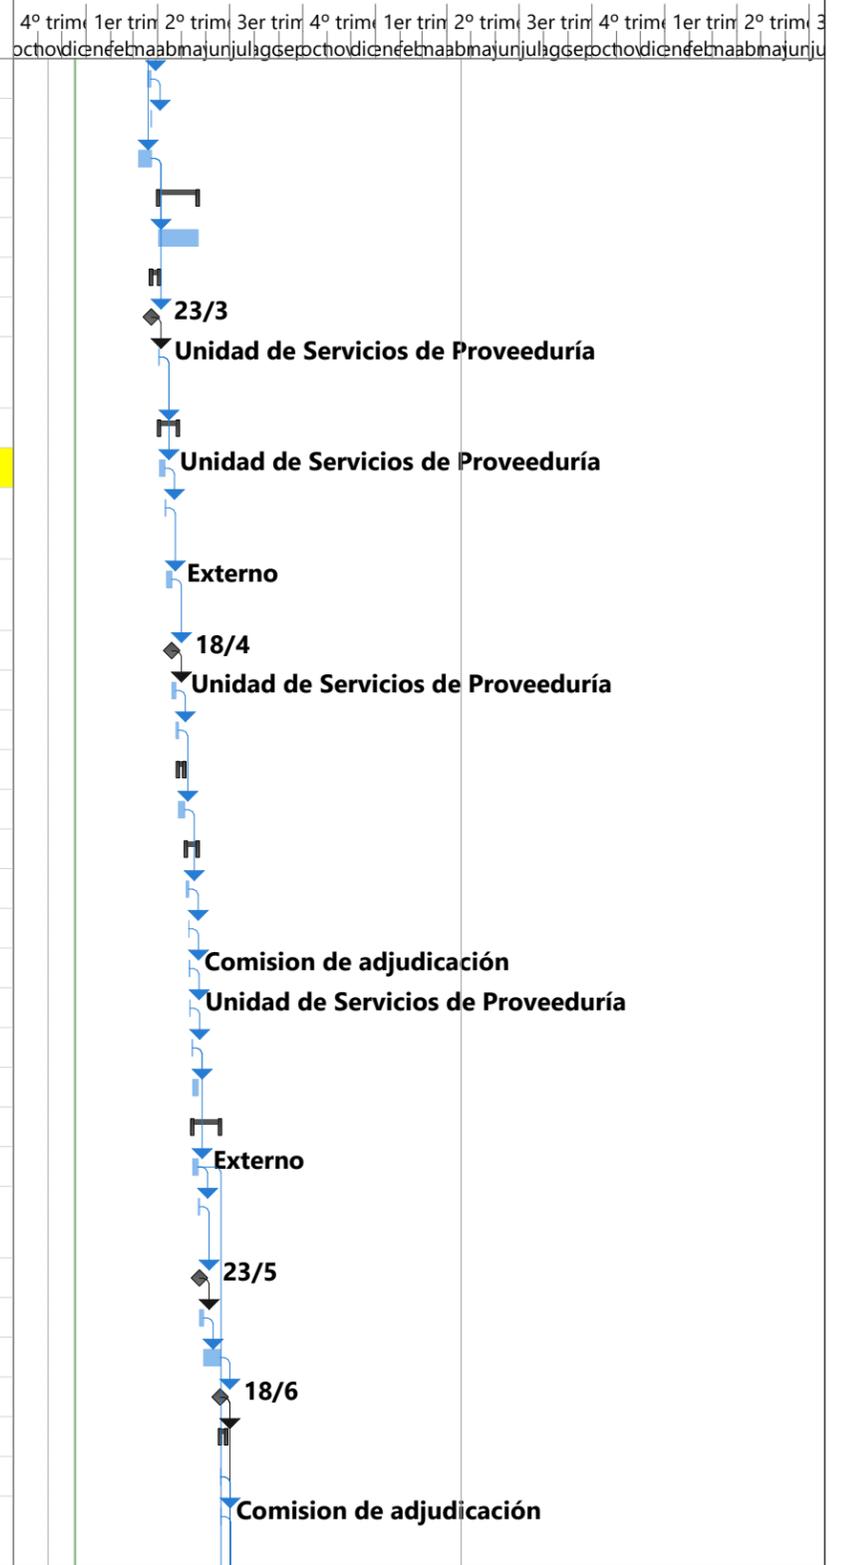


Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: lun 18/12/17

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			





Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	4° trim 1er trin 2° trim 3er trin 4° trim 1er trin 2° trim 3er trin 4° trim 1er trin 2° trim 3															
							ocho	die	no	ve	na	ab	ma	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
380		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisibile (Art N°186 RLCA)	2 días	jue 31/5/18	vie 1/6/18	379																
381		Notificación al Adjudicatario del recurso en caso de ser admisible	0 días	vie 1/6/18	vie 1/6/18	380																
382		Plazo para recibir respuesta del adjudicatario (Art N°194 RLCA)	3 días	lun 4/6/18	mié 6/6/18	381																
383		Elaboracion de la resolucio final de la revocatoria (Art N°195 RLCA)	15 días	jue 7/6/18	mié 27/6/18	382																
384		Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	mié 27/6/18	mié 27/6/18	383																
385		<b>Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones</b>	<b>6 días</b>	<b>jue 28/6/18</b>	<b>jue 5/7/18</b>	<b>384</b>																
386		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 28/6/18	jue 28/6/18																	
387		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 28/6/18	jue 28/6/18	386																
388		Adjudicación en firme	5 días	vie 29/6/18	jue 5/7/18	379;387																
389		<b>Trámite de contrato</b>	<b>16 días</b>	<b>jue 28/6/18</b>	<b>jue 19/7/18</b>																	
390		Elaboración del Contrato	5 días	jue 28/6/18	jue 5/7/18	386																
391		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	jue 28/6/18	jue 28/6/18	390CC																
392		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía, etc)	5 días	jue 28/6/18	jue 5/7/18	391																
393		Firma de contrato oferente	1 día	jue 28/6/18	jue 28/6/18	384																
394		Envío de contrato para firma Gerente de División de Apoyo	0 días	jue 28/6/18	jue 28/6/18	393																
395		Firma de contrato	5 días	vie 29/6/18	jue 5/7/18	394																
396		Envío de contrato a aprobación interna	0 días	jue 5/7/18	jue 5/7/18	393;395																
397		Aprobacion Interna de Contrato	10 días	vie 6/7/18	jue 19/7/18	396																
398		Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	jue 19/7/18	jue 19/7/18	397																
399		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>27 días</b>	<b>vie 15/6/18</b>	<b>lun 23/7/18</b>																	
400		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	vie 20/7/18	lun 23/7/18	397																
401		Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	lun 23/7/18	lun 23/7/18	400																
402		Visado de pedido en la UAF	3 días	vie 15/6/18	mar 19/6/18	401																
403		Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	mié 20/6/18	mié 20/6/18	402																
404		Notificación de Pedido de Compra	0 días	mié 20/6/18	mié 20/6/18	402;403																
405		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mié 20/6/18	mié 20/6/18	404																
406		<b>Recepción de los items</b>	<b>13 días</b>	<b>vie 20/7/18</b>	<b>jue 9/8/18</b>																	
407		Entrega de los bienes/servicios	10 días	vie 20/7/18	lun 6/8/18	397																
408		Recibido a satisfacción	3 días	mar 7/8/18	jue 9/8/18	407																
409		Fin recepción de items	0 días	jue 9/8/18	jue 9/8/18	408																
410		<b>Trámite de pago</b>	<b>36 días</b>	<b>vie 10/8/18</b>	<b>lun 1/10/18</b>																	
411		Envio documentos a Financiero	1 día	vie 10/8/18	vie 10/8/18	409																
412		Emisión de pago en Financiero	5 días	lun 13/8/18	lun 20/8/18	411																
413		Pago de Tesorería Nacional	30 días	mar 21/8/18	lun 1/10/18	412																
414		Conclusión trámite licitación	0 días	lun 1/10/18	lun 1/10/18	413																
415		<b>2018LA-000011-503_UTI_Reforzamiento de la plataforma \$61,000,000</b>	<b>164 días</b>	<b>lun 19/2/18</b>	<b>vie 19/10/18</b>																	

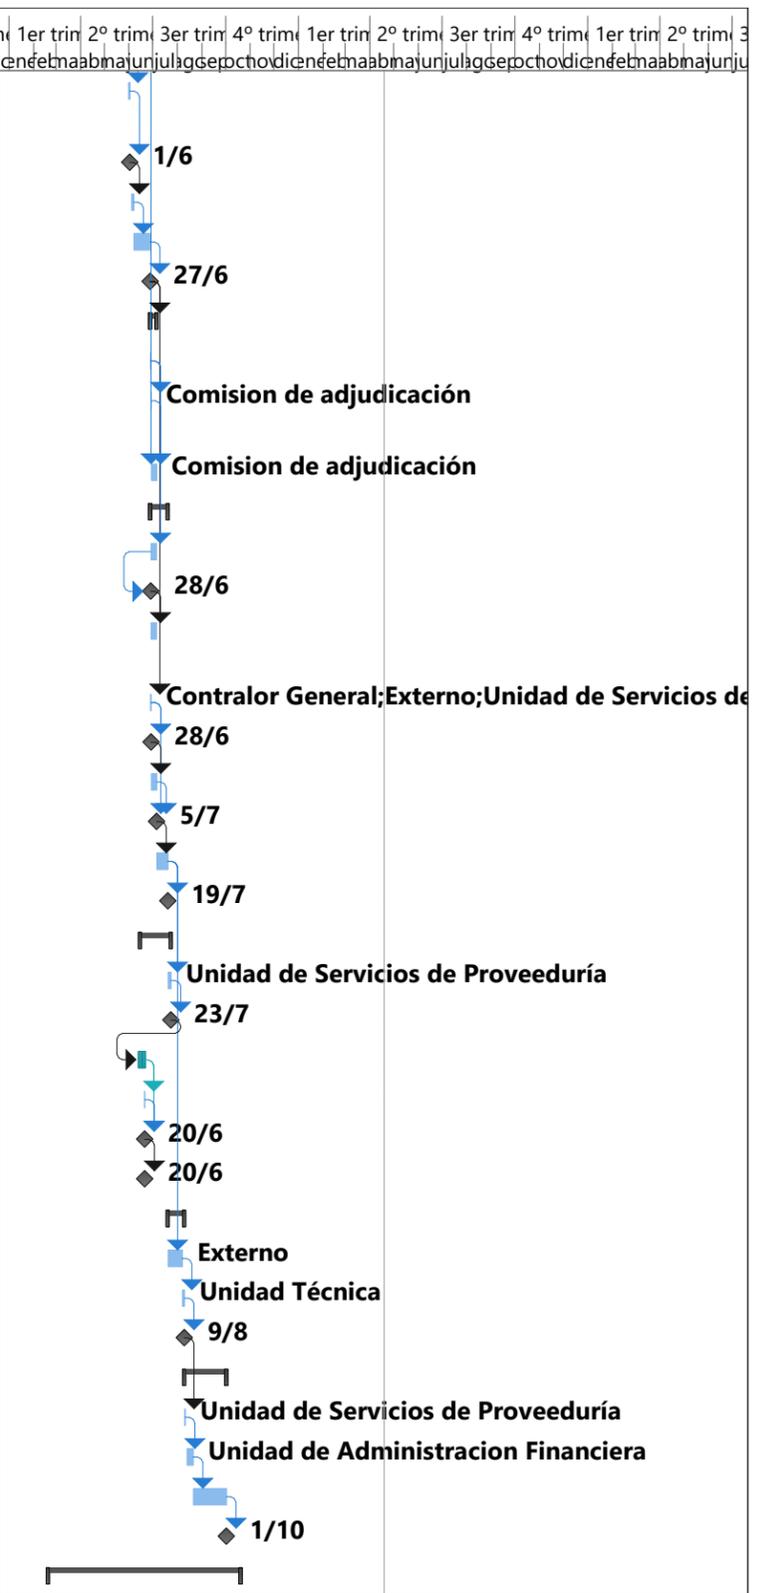


Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: lun 18/12/17

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			






Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	4º trim oct	1er trim nov	2º trim dic	3er trim ene	4º trim feb	1er trim mar	2º trim abr	3er trim may	4º trim jun	1er trim jul	2º trim ago	3er trim sep	4º trim oct	1er trim nov	2º trim dic	
486		Recibido a satisfacción	3 días	lun 27/8/18	mié 29/8/18	485																
487		Fin recepción de items	0 días	mié 29/8/18	mié 29/8/18	486																
488		<b>Trámite de pago</b>	<b>36 días</b>	<b>jue 30/8/18</b>	<b>vie 19/10/18</b>																	
489		Envío documentos a Financiero	1 día	jue 30/8/18	jue 30/8/18	487																
490		Emisión de pago en Financiero	5 días	vie 31/8/18	jue 6/9/18	489																
491		pago de Tesorería Nacional	30 días	vie 7/9/18	vie 19/10/18	490																
492		Conclusión trámite licitación	0 días	vie 19/10/18	vie 19/10/18	491																
493		<b>UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (USG)</b>	<b>326 días</b>	<b>jue 30/11/17</b>	<b>jue 18/4/19</b>																	
494		<b>2018LA-00002-503_USG_Estaciones modulares, sillas, mesas, escritorios, etc._Vence 2/11/2018_ \$8.820.000/año; \$35,280.000/4 años</b>	<b>164 días</b>	<b>lun 13/8/18</b>	<b>jue 18/4/19</b>																	
495		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	lun 13/8/18	lun 13/8/18																	
496		<b>Confección Documento complementario al cartel</b>	<b>17 días</b>	<b>lun 13/8/18</b>	<b>mié 5/9/18</b>																	
497		Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 13/8/18	lun 20/8/18	495																
498		Revisión Jurídica de cartel UJI	7 días	mar 21/8/18	mié 29/8/18	497																
499		Revisión Técnica de cartel	7 días	mar 21/8/18	mié 29/8/18	497																
500		Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al cartel	5 días	jue 30/8/18	mié 5/9/18	499																
501		<b>Invitación a participar</b>	<b>28 días</b>	<b>jue 6/9/18</b>	<b>mar 16/10/18</b>																	
502		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de Mer Link	5 días	jue 6/9/18	mié 12/9/18	500																
503		Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	jue 13/9/18	mié 19/9/18	502																
504		Invitación a participar en Mer Link	1 día	jue 20/9/18	jue 20/9/18	503																
505		Plazo para recibir ofertas	17 días	vie 21/9/18	mar 16/10/18	504																
506		<b>Recurso de Objeción al Cartel</b>	<b>17 días</b>	<b>vie 21/9/18</b>	<b>mar 16/10/18</b>																	
507		Presentacion de Objeción al cartel	5 días	vie 21/9/18	jue 27/9/18	504																
508		Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	vie 28/9/18	vie 28/9/18	507																
509		Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	lun 1/10/18	lun 1/10/18	508																
510		Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	mar 2/10/18	lun 8/10/18	509																
511		Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	mar 9/10/18	vie 12/10/18	510																
512		Comunicación de Resolución final	1 día	mar 16/10/18	mar 16/10/18	511																
513		Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	vie 28/9/18	mar 16/10/18	507																
514		<b>Plazo para adjudicación</b>	<b>34 días</b>	<b>mié 17/10/18</b>	<b>lun 3/12/18</b>																	
515		Fecha máxima para adjudicar	34 días	mié 17/10/18	lun 3/12/18	513																
516		<b>Recepción de ofertas</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 16/10/18</b>	<b>mié 17/10/18</b>																	
517		Apertura de ofertas	0 días	mar 16/10/18	mar 16/10/18	513																
518		Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion para entrega de prevenciones Outlook)	1 día	mié 17/10/18	mié 17/10/18	517																
519		<b>Estudio y valoración de las ofertas.</b>	<b>17 días</b>	<b>jue 18/10/18</b>	<b>vie 9/11/18</b>	<b>518</b>																
520		Admisibilidad de ofertas (incluye reunión de admisibilidad)	5 días	jue 18/10/18	mié 24/10/18	<b>518</b>																

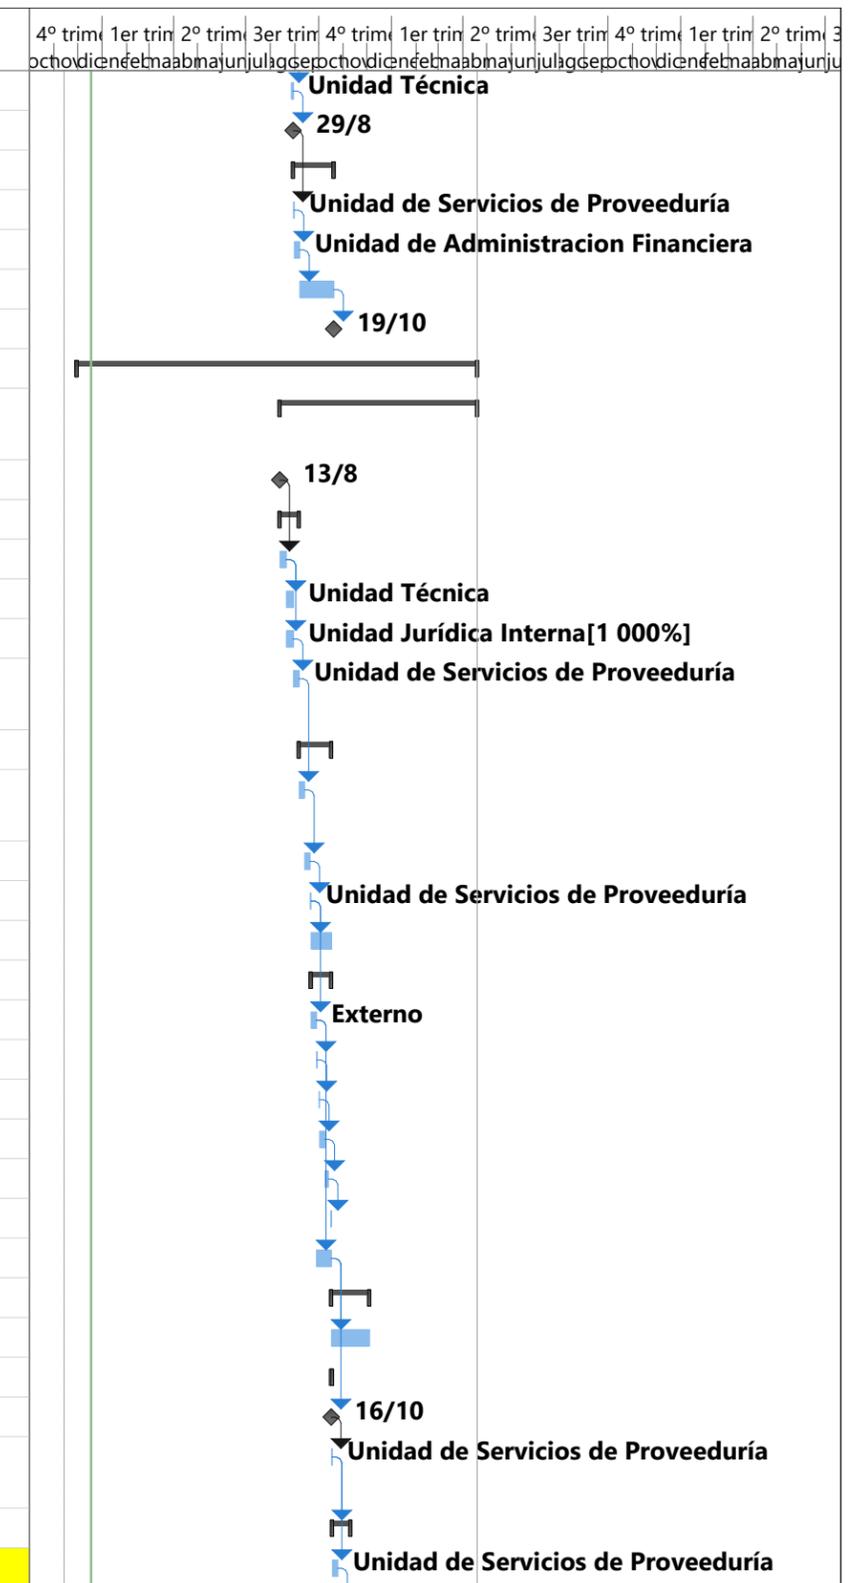

Proyecto: Cronograma de comp Fecha: lun 18/12/17	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	4° trim  1er trin  2° trim  3er trin  4° trim															
							4º trim	1er trin	2º trim	3er trin	4º trim	1er trin	2º trim	3er trin	4º trim	1er trin	2º trim	3er trin	4º trim	1er trin	2º trim	3er trin
521		Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenciones	1 día	jue 25/10/18	jue 25/10/18	520																
522		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En Mer-Link)	5 días	vie 26/10/18	jue 1/11/18	521																
523		Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	jue 1/11/18	jue 1/11/18	522																
524		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	vie 2/11/18	mar 6/11/18	523																
525		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	mié 7/11/18	vie 9/11/18	524																
526		<b>Informe de recomendación</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 12/11/18</b>	<b>vie 16/11/18</b>																	
527		Elaboración de Informe de recomendación	5 días	lun 12/11/18	vie 16/11/18	525																
528		<b>Recomendación, adjudicación y comunicación</b>	<b>11 días</b>	<b>lun 19/11/18</b>	<b>lun 3/12/18</b>																	
529		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	lun 19/11/18	mié 21/11/18	527																
530		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	jue 22/11/18	jue 22/11/18	529																
531		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	jue 22/11/18	jue 22/11/18	530																
532		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	vie 23/11/18	vie 23/11/18	531																
533		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	lun 26/11/18	lun 26/11/18	532																
534		Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	mar 27/11/18	lun 3/12/18	533																
535		<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>25 días</b>	<b>mar 27/11/18</b>	<b>jue 17/1/19</b>																	
536		Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	mar 27/11/18	lun 3/12/18	533																
537		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisibile (Art N°186 RLCA)	2 días	mar 4/12/18	mié 5/12/18	536																
538		Notificación al Adjudicatario del recurso en caso de ser admisible	0 días	mié 5/12/18	mié 5/12/18	537																
539		Plazo para recibir respuesta del adjudicatario (Art N°194 RLCA)	3 días	jue 6/12/18	lun 10/12/18	538																
540		Elaboracion de la resolucio final de la revocatoria (Art N°195 RLCA)	15 días	mar 11/12/18	jue 17/1/19	539																
541		Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	jue 17/1/19	jue 17/1/19	540																
542		<b>Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones</b>	<b>6 días</b>	<b>vie 18/1/19</b>	<b>vie 25/1/19</b>	<b>541</b>																
543		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	vie 18/1/19	vie 18/1/19																	
544		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	vie 18/1/19	vie 18/1/19	543																
545		Adjudicación en firme	5 días	lun 21/1/19	vie 25/1/19	536;544																
546		<b>Trámite de contrato</b>	<b>16 días</b>	<b>vie 18/1/19</b>	<b>vie 8/2/19</b>																	
547		Elaboración del Contrato	5 días	vie 18/1/19	vie 25/1/19	543																
548		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	vie 18/1/19	vie 18/1/19	547CC																
549		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	vie 18/1/19	vie 25/1/19	548																
550		Firma de contrato oferente	1 día	vie 18/1/19	vie 18/1/19	541																
551		Envío de contrato para firma Gerente de División de Apoyo	0 días	vie 18/1/19	vie 18/1/19	550																
552		Firma de contrato	5 días	lun 21/1/19	vie 25/1/19	551																
553		Envío de contrato a aprobación interna	0 días	vie 25/1/19	vie 25/1/19	550;552																
554		Aprobacion Interna de Contrato	10 días	lun 28/1/19	vie 8/2/19	553																

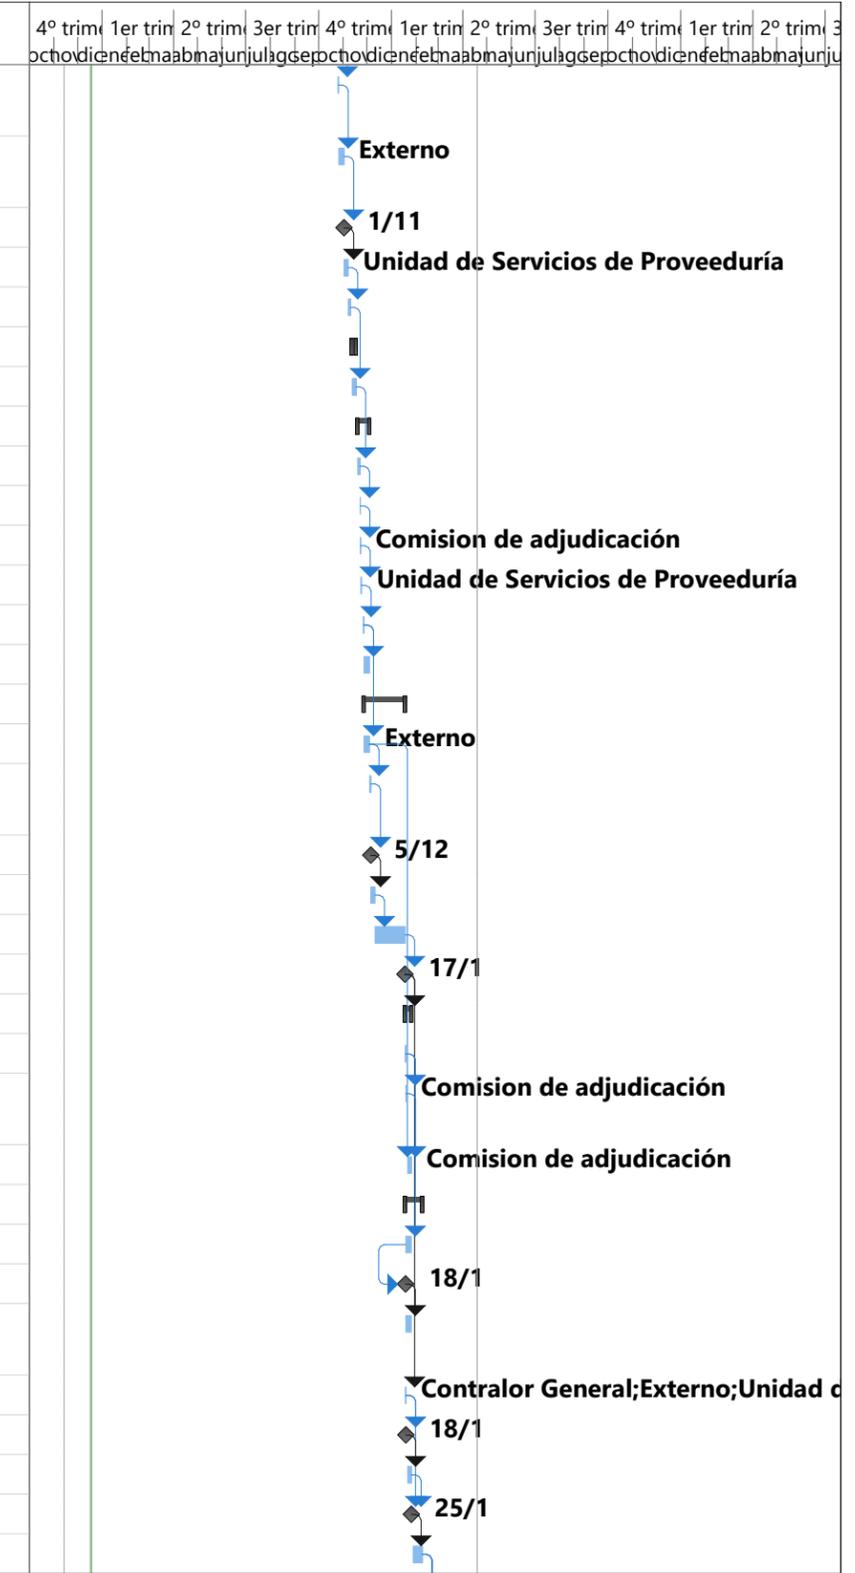


Proyecto: Cronograma de comp Fecha: lun 18/12/17	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			





Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	4° trim oct	1er trin nov	2° trin dic	3er trin ene	4° trin feb	1er trin mar	2° trin abr	3er trin may	4° trin jun	1er trin jul	2° trin ago	3er trin sep	4° trin oct	1er trin nov	2° trin dic	3er trin ene	4° trin feb	1er trin mar	2° trin abr	3er trin may	4° trin jun	
625		Elaboración del Contrato	5 días	lun 14/5/18	lun 21/5/18	621																						
626		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	lun 14/5/18	lun 14/5/18	625CC																						
627		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	lun 14/5/18	lun 21/5/18	626																						
628		Firma de contrato oferente	1 día	lun 14/5/18	lun 14/5/18	619																						
629		Envío de contrato para firma Gerente de División de Apoyo	0 días	lun 14/5/18	lun 14/5/18	628																						
630		Firma de contrato	5 días	mar 15/5/18	lun 21/5/18	629																						
631		Envío de contrato a aprobación interna	0 días	lun 21/5/18	lun 21/5/18	628;630																						
632		Aprobacion Interna de Contrato	10 días	mar 22/5/18	lun 4/6/18	631																						
633		Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	lun 4/6/18	lun 4/6/18	632																						
634		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>12 días</b>	<b>mar 5/6/18</b>	<b>mié 20/6/18</b>																							
635		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	mar 5/6/18	mié 6/6/18	632																						
636		Envío de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	mié 6/6/18	mié 6/6/18	635																						
637		Visado de pedido en la UAF	3 días	vie 15/6/18	mar 19/6/18	636																						
638		Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	mié 20/6/18	mié 20/6/18	637																						
639		Notificación de Pedido de Compra	0 días	mié 20/6/18	mié 20/6/18	637;638																						
640		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mié 20/6/18	mié 20/6/18	639																						
641		<b>Recepción de los items</b>	<b>13 días</b>	<b>mar 5/6/18</b>	<b>jue 21/6/18</b>																							
642		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 5/6/18	lun 18/6/18	632																						
643		Recibido a satisfacción	3 días	mar 19/6/18	jue 21/6/18	642																						
644		Fin recepción de items	0 días	jue 21/6/18	jue 21/6/18	643																						
645		<b>Trámite de pago</b>	<b>36 días</b>	<b>vie 22/6/18</b>	<b>mar 14/8/18</b>																							
646		Envío documentos a Financiero	1 día	vie 22/6/18	vie 22/6/18	644																						
647		Emisión de pago en Financiero	5 días	lun 25/6/18	vie 29/6/18	646																						
648		Pago de Tesorería Nacional	30 días	lun 2/7/18	mar 14/8/18	647																						
649		Conclusión trámite licitación	0 días	mar 14/8/18	mar 14/8/18	648																						
650		<b>2018LA-00008-503_USG_Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de Control de Accesos y compra de dispositivos por demanda_Vence 3/12/2017_ç9,000.000/año; 36,000.000/4 años</b>	<b>134 días</b>	<b>lun 15/1/18</b>	<b>mar 31/7/18</b>																							
651		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	lun 15/1/18	lun 15/1/18																							
652		<b>Confeción Documento complementario al cartel</b>	<b>17 días</b>	<b>lun 15/1/18</b>	<b>mar 6/2/18</b>																							
653		Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 15/1/18	vie 19/1/18	651																						
654		Revisión Jurídica de cartel UJI	7 días	lun 22/1/18	mar 30/1/18	653																						
655		Revisión Técnica de cartel	7 días	lun 22/1/18	mar 30/1/18	653																						
656		Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al cartel	5 días	mié 31/1/18	mar 6/2/18	655																						
657		<b>Invitación a participar</b>	<b>28 días</b>	<b>mié 7/2/18</b>	<b>vie 16/3/18</b>																							
658		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de Mer Link	5 días	mié 7/2/18	mar 13/2/18	656																						

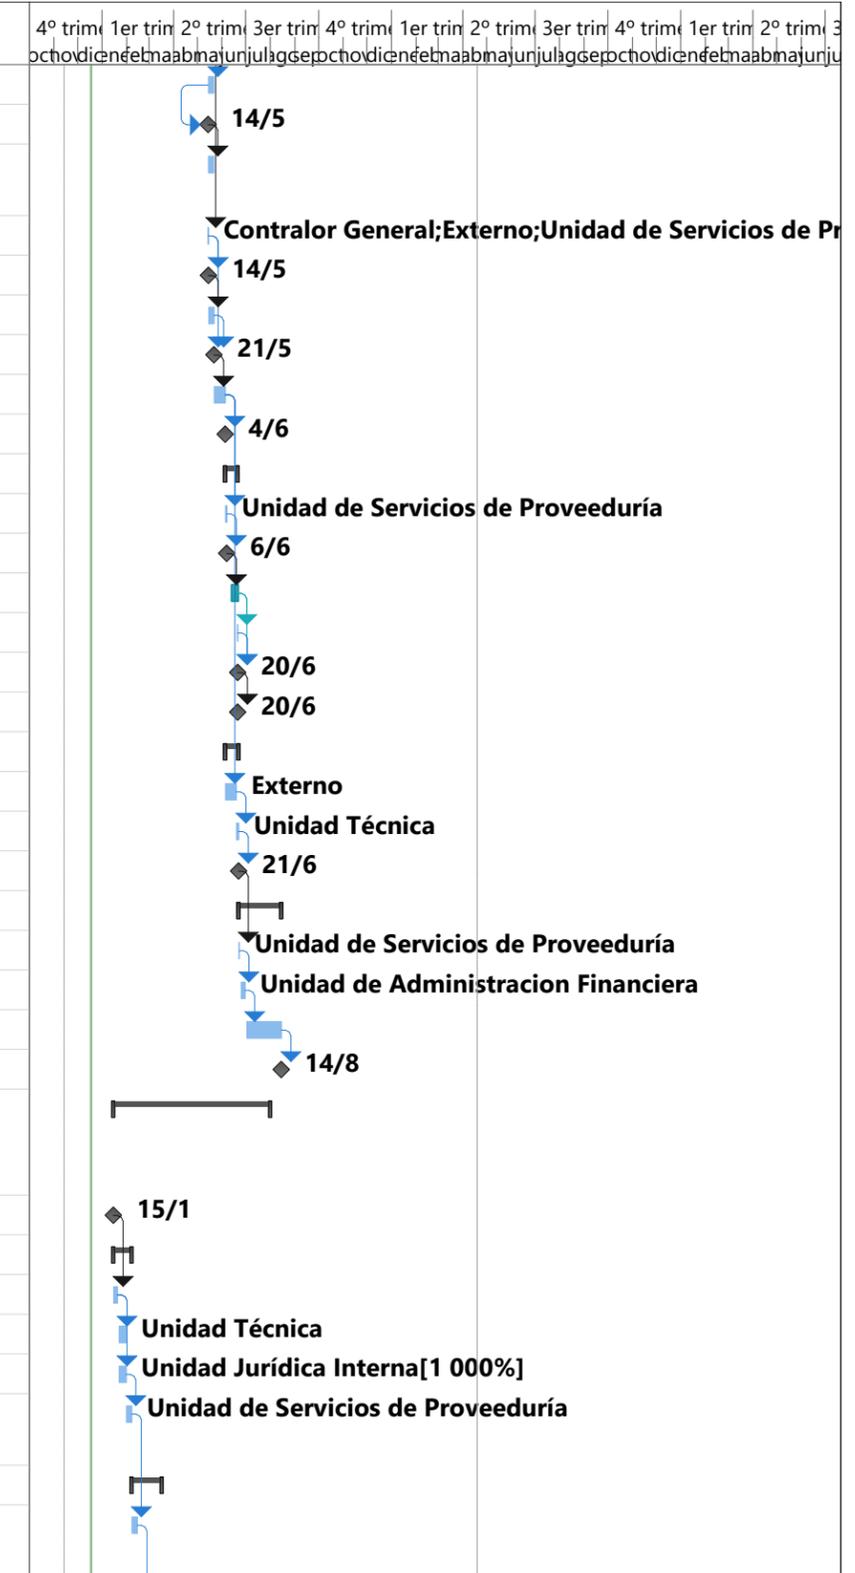

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: lun 18/12/17

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			








Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	4° trim 1er trin 2° trim 3er trin 4° trim 1er trin 2° trim 3er trin 4° trim 1er trin 2° trim 3											
							ochovdicenfebnabmajunjulaggeochovdicenfebnabmajunjulaggeochovdicenfebnabmajunju											
765		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mar 22/5/18	mar 22/5/18	764	<b>Unidad de Servicios de Proveduría</b>											
766		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	mié 23/5/18	mié 23/5/18	765												
767		Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	jue 24/5/18	mié 30/5/18	766												
768		<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>25 días</b>	<b>jue 24/5/18</b>	<b>mié 27/6/18</b>													
769		Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	jue 24/5/18	mié 30/5/18	766	<b>Externo</b>											
770		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisibile (Art N°186 RLCA)	2 días	jue 31/5/18	vie 1/6/18	769	1/6											
771		Notificación al Adjudicatario del recurso en caso de ser admisible	0 días	vie 1/6/18	vie 1/6/18	770												
772		Plazo para recibir respuesta del adjudicatario (Art N°194 RLCA)	3 días	lun 4/6/18	mié 6/6/18	771												
773		Elaboracion de la resolucio final de la revocatoria (Art N°195 RLCA)	15 días	jue 7/6/18	mié 27/6/18	772	27/6											
774		Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	mié 27/6/18	mié 27/6/18	773												
775		<b>Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones</b>	<b>6 días</b>	<b>jue 28/6/18</b>	<b>jue 5/7/18</b>	<b>774</b>												
776		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 28/6/18	jue 28/6/18		<b>Comision de adjudicación</b>											
777		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 28/6/18	jue 28/6/18	776	<b>Comision de adjudicación</b>											
778		Adjudicación en firme	5 días	vie 29/6/18	jue 5/7/18	769;777	28/6											
779		<b>Trámite de contrato</b>	<b>16 días</b>	<b>jue 28/6/18</b>	<b>jue 19/7/18</b>													
780		Elaboración del Contrato	5 días	jue 28/6/18	jue 5/7/18	776												
781		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	jue 28/6/18	jue 28/6/18	780CC												
782		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía, etc)	5 días	jue 28/6/18	jue 5/7/18	781	<b>Contralor General;Externo;Unidad de Servicios de</b>											
783		Firma de contrato oferente	1 día	jue 28/6/18	jue 28/6/18	774	28/6											
784		Envío de contrato para firma Gerente de División de Apoyo	0 días	jue 28/6/18	jue 28/6/18	783												
785		Firma de contrato	5 días	vie 29/6/18	jue 5/7/18	784	5/7											
786		Envío de contrato a aprobación interna	0 días	jue 5/7/18	jue 5/7/18	783;785	19/7											
787		Aprobacion Interna de Contrato	10 días	vie 6/7/18	jue 19/7/18	786												
788		Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	jue 19/7/18	jue 19/7/18	787												
789		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>27 días</b>	<b>vie 15/6/18</b>	<b>lun 23/7/18</b>		<b>Unidad de Servicios de Proveduría</b>											
790		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	vie 20/7/18	lun 23/7/18	787	23/7											
791		Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	lun 23/7/18	lun 23/7/18	790												
792		Visado de pedido en la UAF	3 días	vie 15/6/18	mar 19/6/18	791												
793		Devolución de pedido a Proveduría	1 día	mié 20/6/18	mié 20/6/18	792	20/6											
794		Notificación de Pedido de Compra	0 días	mié 20/6/18	mié 20/6/18	792;793	20/6											
795		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mié 20/6/18	mié 20/6/18	794												
796		<b>Recepción de los items</b>	<b>13 días</b>	<b>vie 20/7/18</b>	<b>jue 9/8/18</b>		<b>Externo</b>											
797		Entrega de los bienes/servicios	10 días	vie 20/7/18	lun 6/8/18	787	<b>Unidad Técnica</b>											
798		Recibido a satisfacción	3 días	mar 7/8/18	jue 9/8/18	797	9/8											
799		Fin recepción de items	0 días	jue 9/8/18	jue 9/8/18	798												
800		<b>Trámite de pago</b>	<b>6 días</b>	<b>vie 10/8/18</b>	<b>lun 20/8/18</b>													

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: lun 18/12/17

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	4º trim oct	1er trim nov	2º trim ene	3er trim feb	4º trim mar	1er trim abr	2º trim may	3er trim jun	4º trim jul	1er trim ago	2º trim sep	3er trim oct	4º trim nov	1er trim dic
801		Envío documentos a Financiero	1 día	vie 10/8/18	vie 10/8/18	799														
802		Emisión de pago en Financiero	5 días	lun 13/8/18	lun 20/8/18	801														
803		Conclusión trámite licitación	0 días	lun 20/8/18	lun 20/8/18	802														
804		<b>2018LA-000010-503_USG_Equipos para sistema de supresión de incendios por agente limpio. €26,100.000</b>	<b>134 días</b>	<b>mié 28/2/18</b>	<b>lun 17/9/18</b>															
805		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	mié 28/2/18	mié 28/2/18															
806		<b>Confección Documento complementario al cartel</b>	<b>17 días</b>	<b>mié 28/2/18</b>	<b>jue 22/3/18</b>															
807		Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	mié 28/2/18	mar 6/3/18	805														
808		Revisión Jurídica de cartel UJI	7 días	mié 7/3/18	jue 15/3/18	807														
809		Revisión Técnica de cartel	7 días	mié 7/3/18	jue 15/3/18	807														
810		Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al cartel	5 días	vie 16/3/18	jue 22/3/18	809														
811		<b>Invitación a participar</b>	<b>28 días</b>	<b>vie 23/3/18</b>	<b>jue 10/5/18</b>															
812		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de Mer Link	5 días	vie 23/3/18	jue 5/4/18	810														
813		Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	vie 6/4/18	vie 13/4/18	812														
814		Invitación a participar en Mer Link	1 día	lun 16/4/18	lun 16/4/18	813														
815		Plazo para recibir ofertas	17 días	mar 17/4/18	jue 10/5/18	814														
816		<b>Recurso de Objeción al Cartel</b>	<b>17 días</b>	<b>mar 17/4/18</b>	<b>jue 10/5/18</b>															
817		Presentacion de Objeción al cartel	5 días	mar 17/4/18	lun 23/4/18	814														
818		Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	mar 24/4/18	mar 24/4/18	817														
819		Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	mié 25/4/18	mié 25/4/18	818														
820		Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	jue 26/4/18	jue 3/5/18	819														
821		Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	vie 4/5/18	mié 9/5/18	820														
822		Comunicación de Resolución final	1 día	jue 10/5/18	jue 10/5/18	821														
823		Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	mar 24/4/18	jue 10/5/18	817														
824		<b>Plazo para adjudicación</b>	<b>34 días</b>	<b>vie 11/5/18</b>	<b>mié 27/6/18</b>															
825		Fecha máxima para adjudicar	34 días	vie 11/5/18	mié 27/6/18	823														
826		<b>Recepción de ofertas</b>	<b>1 día</b>	<b>jue 10/5/18</b>	<b>vie 11/5/18</b>															
827		Apertura de ofertas	0 días	jue 10/5/18	jue 10/5/18	823														
828		Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion para entrega de prevenciones Outlook)	1 día	vie 11/5/18	vie 11/5/18	827														
829		<b>Estudio y valoración de las ofertas.</b>	<b>17 días</b>	<b>lun 14/5/18</b>	<b>mar 5/6/18</b>	<b>828</b>														
830		Admisibiliidad de ofertas (incluye reunión de admisibilidad)	5 días	lun 14/5/18	vie 18/5/18	828														
831		Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenciones	1 día	lun 21/5/18	lun 21/5/18	830														
832		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En Mer-Link)	5 días	mar 22/5/18	lun 28/5/18	831														
833		Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	lun 28/5/18	lun 28/5/18	832														
834		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mar 29/5/18	jue 31/5/18	833														

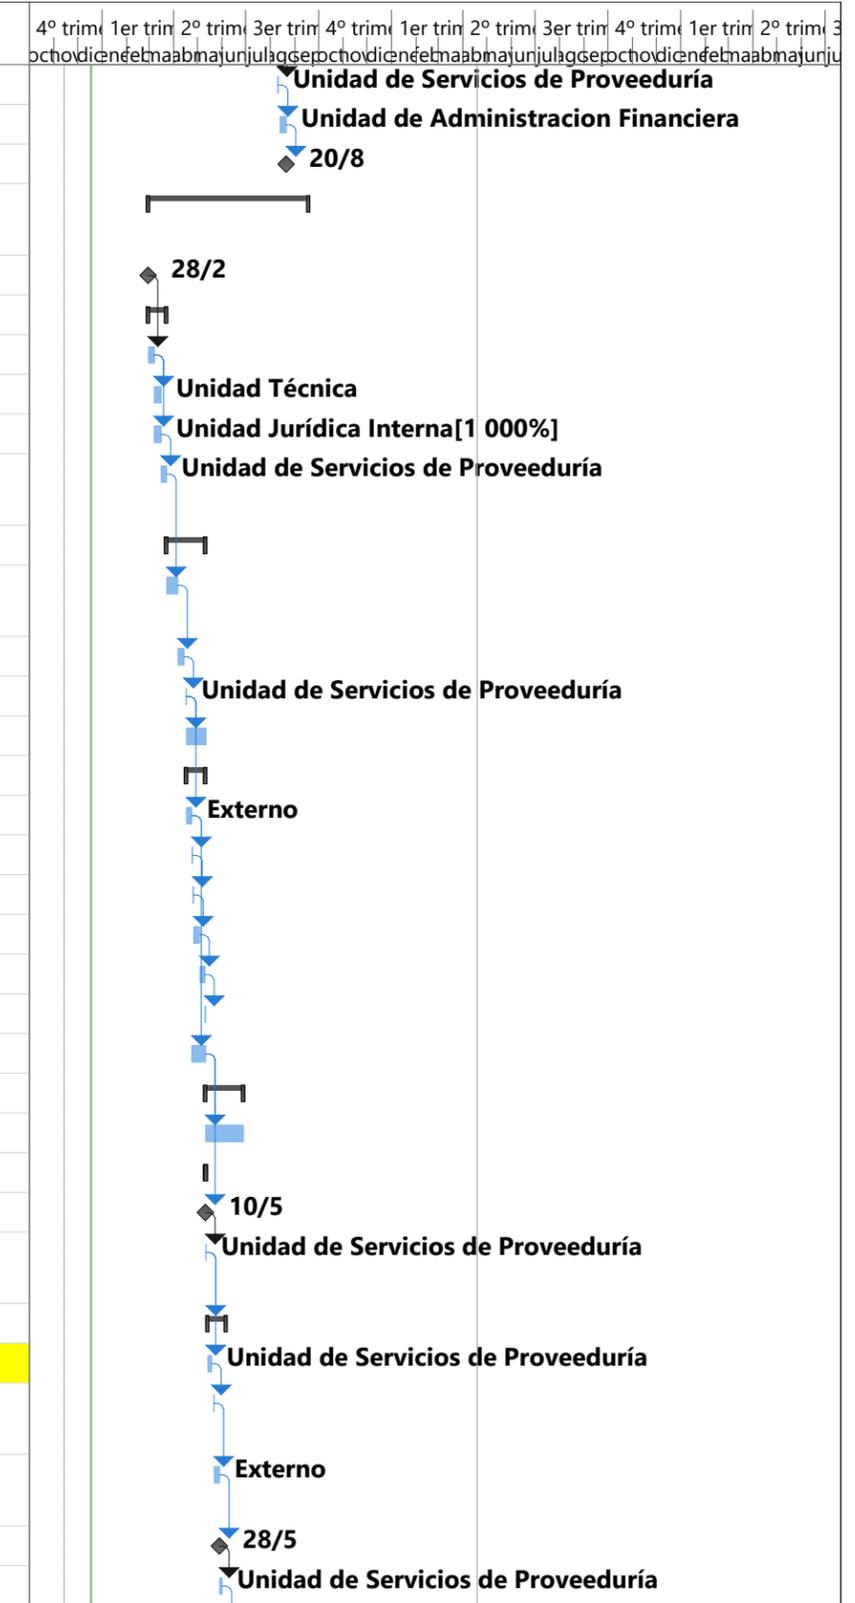

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: lun 18/12/17

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	4º trim	1er trim	2º trim	3er trim	4º trim	1er trim	2º trim	3er trim	4º trim	1er trim	2º trim	3er trim	4º trim
835		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	vie 1/6/18	mar 5/6/18	834													
836		<b>Informe de recomendación</b>	<b>5 días</b>	<b>mié 6/6/18</b>	<b>mar 12/6/18</b>														
837		Elaboración de Informe de recomendación	5 días	mié 6/6/18	mar 12/6/18	835													
838		<b>Recomendación, adjudicación y comunicación</b>	<b>11 días</b>	<b>mié 13/6/18</b>	<b>mié 27/6/18</b>														
839		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mié 13/6/18	vie 15/6/18	837													
840		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	lun 18/6/18	lun 18/6/18	839													
841		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	lun 18/6/18	lun 18/6/18	840													
842		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mar 19/6/18	mar 19/6/18	841													
843		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	mié 20/6/18	mié 20/6/18	842													
844		Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	jue 21/6/18	mié 27/6/18	843													
845		<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>25 días</b>	<b>jue 21/6/18</b>	<b>jue 26/7/18</b>														
846		Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	jue 21/6/18	mié 27/6/18	843													
847		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisibile (Art N°186 RLCA)	2 días	jue 28/6/18	vie 29/6/18	846													
848		Notificación al Adjudicatario del recurso en caso de ser admisible	0 días	vie 29/6/18	vie 29/6/18	847													
849		Plazo para recibir respuesta del adjudicatario (Art N°194 RLCA)	3 días	lun 2/7/18	mié 4/7/18	848													
850		Elaboracion de la resolucio final de la revocatoria (Art N°195 RLCA)	15 días	jue 5/7/18	jue 26/7/18	849													
851		Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	jue 26/7/18	jue 26/7/18	850													
852		<b>Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones</b>	<b>6 días</b>	<b>vie 27/7/18</b>	<b>lun 6/8/18</b>	<b>851</b>													
853		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	vie 27/7/18	vie 27/7/18														
854		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	vie 27/7/18	vie 27/7/18	853													
855		Adjudicación en firme	5 días	lun 30/7/18	lun 6/8/18	846;854													
856		<b>Trámite de contrato</b>	<b>16 días</b>	<b>vie 27/7/18</b>	<b>mar 21/8/18</b>														
857		Elaboración del Contrato	5 días	vie 27/7/18	lun 6/8/18	853													
858		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	vie 27/7/18	vie 27/7/18	857CC													
859		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	vie 27/7/18	lun 6/8/18	858													
860		Firma de contrato oferente	1 día	vie 27/7/18	vie 27/7/18	851													
861		Envío de contrato para firma Gerente de División de Apoyo	0 días	vie 27/7/18	vie 27/7/18	860													
862		Firma de contrato	5 días	lun 30/7/18	lun 6/8/18	861													
863		Envío de contrato a aprobación interna	0 días	lun 6/8/18	lun 6/8/18	860;862													
864		Aprobacion Interna de Contrato	10 días	mar 7/8/18	mar 21/8/18	863													
865		Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	mar 21/8/18	mar 21/8/18	864													
866		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>47 días</b>	<b>vie 15/6/18</b>	<b>jue 23/8/18</b>														
867		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	mié 22/8/18	jue 23/8/18	864													
868		Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	jue 23/8/18	jue 23/8/18	867													
869		Visado de pedido en la UAF	3 días	vie 15/6/18	mar 19/6/18	868													
870		Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	mié 20/6/18	mié 20/6/18	869													

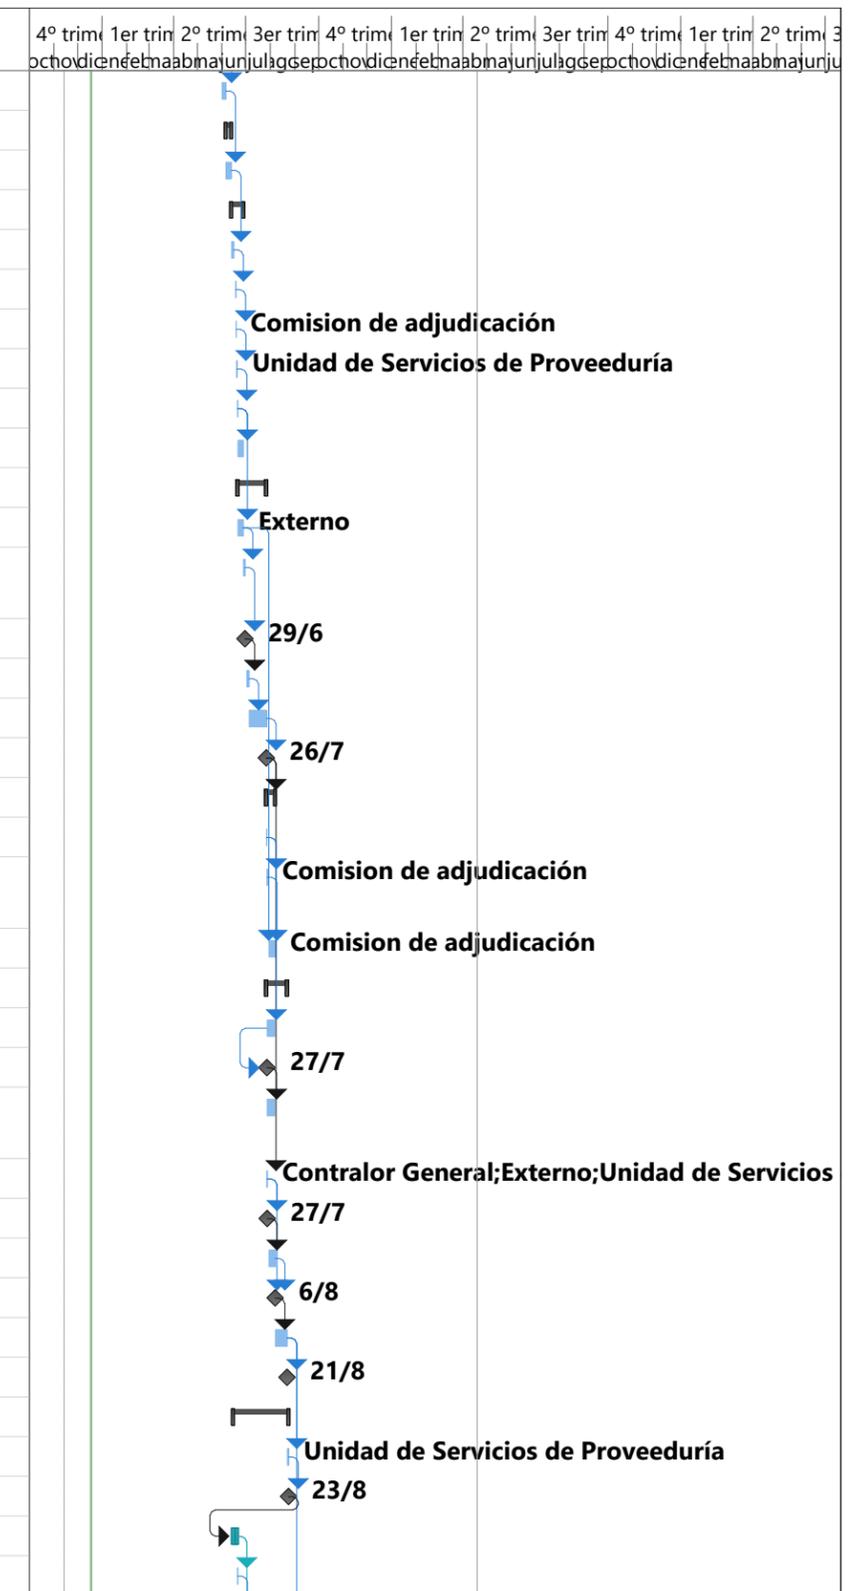


Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: lun 18/12/17

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	4º trim och	1er trim nov	2º trim ene	3er trim feb	4º trim mar	1er trim abr	2º trim may	3er trim jun	4º trim jul	1er trim ago	2º trim sep	3er trim oct	4º trim nov	1er trim dic	
906		Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion para entrega de prevenciones Outlook)	1 día	lun 19/3/18	lun 19/3/18	905															
907		<b>Estudio y valoración de las ofertas.</b>	<b>17 días</b>	<b>mar 20/3/18</b>	<b>jue 19/4/18</b>	<b>906</b>															
908		Admisibiliidad de ofertas (incluye reunión de admisibilidad)	5 días	mar 20/3/18	lun 2/4/18	906															
909		Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenciones	1 día	mar 3/4/18	mar 3/4/18	908															
910		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En Mer-Link)	5 días	mié 4/4/18	mar 10/4/18	909															
911		Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	mar 10/4/18	mar 10/4/18	910															
912		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	jue 12/4/18	lun 16/4/18	911															
913		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	mar 17/4/18	jue 19/4/18	912															
914		<b>Informe de recomendación</b>	<b>5 días</b>	<b>vie 20/4/18</b>	<b>jue 26/4/18</b>																
915		Elaboración de Informe de recomendación	5 días	vie 20/4/18	jue 26/4/18	913															
916		<b>Recomendación, adjudicación y comunicación</b>	<b>11 días</b>	<b>vie 27/4/18</b>	<b>lun 14/5/18</b>																
917		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	vie 27/4/18	mié 2/5/18	915															
918		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	jue 3/5/18	jue 3/5/18	917															
919		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	jue 3/5/18	jue 3/5/18	918															
920		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	vie 4/5/18	vie 4/5/18	919															
921		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	lun 7/5/18	lun 7/5/18	920															
922		Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	mar 8/5/18	lun 14/5/18	921															
923		<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>25 días</b>	<b>mar 8/5/18</b>	<b>lun 11/6/18</b>																
924		Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	mar 8/5/18	lun 14/5/18	921															
925		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisibile (Art N°186 RLCA)	2 días	mar 15/5/18	mié 16/5/18	924															
926		Notificación al Adjudicatario del recurso en caso de ser admisible	0 días	mié 16/5/18	mié 16/5/18	925															
927		Plazo para recibir respuesta del adjudicatario (Art N°194 RLCA)	3 días	jue 17/5/18	lun 21/5/18	926															
928		Elaboracion de la resolucio final de la revocatoria (Art N°195 RLCA)	15 días	mar 22/5/18	lun 11/6/18	927															
929		Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	lun 11/6/18	lun 11/6/18	928															
930		<b>Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones</b>	<b>6 días</b>	<b>mar 12/6/18</b>	<b>mar 19/6/18</b>	<b>929</b>															
931		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mar 12/6/18	mar 12/6/18																
932		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mar 12/6/18	mar 12/6/18	931															
933		Adjudicación en firme	5 días	mié 13/6/18	mar 19/6/18	924;932															
934		<b>Trámite de contrato</b>	<b>16 días</b>	<b>mar 12/6/18</b>	<b>mar 3/7/18</b>																
935		Elaboración del Contrato	5 días	mar 12/6/18	mar 19/6/18	931															
936		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	mar 12/6/18	mar 12/6/18	935CC															
937		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	mar 12/6/18	mar 19/6/18	936															
938		Firma de contrato oferente	1 día	mar 12/6/18	mar 12/6/18	929															
939		Envío de contrato para firma Gerente de División de Apoyo	0 días	mar 12/6/18	mar 12/6/18	938															

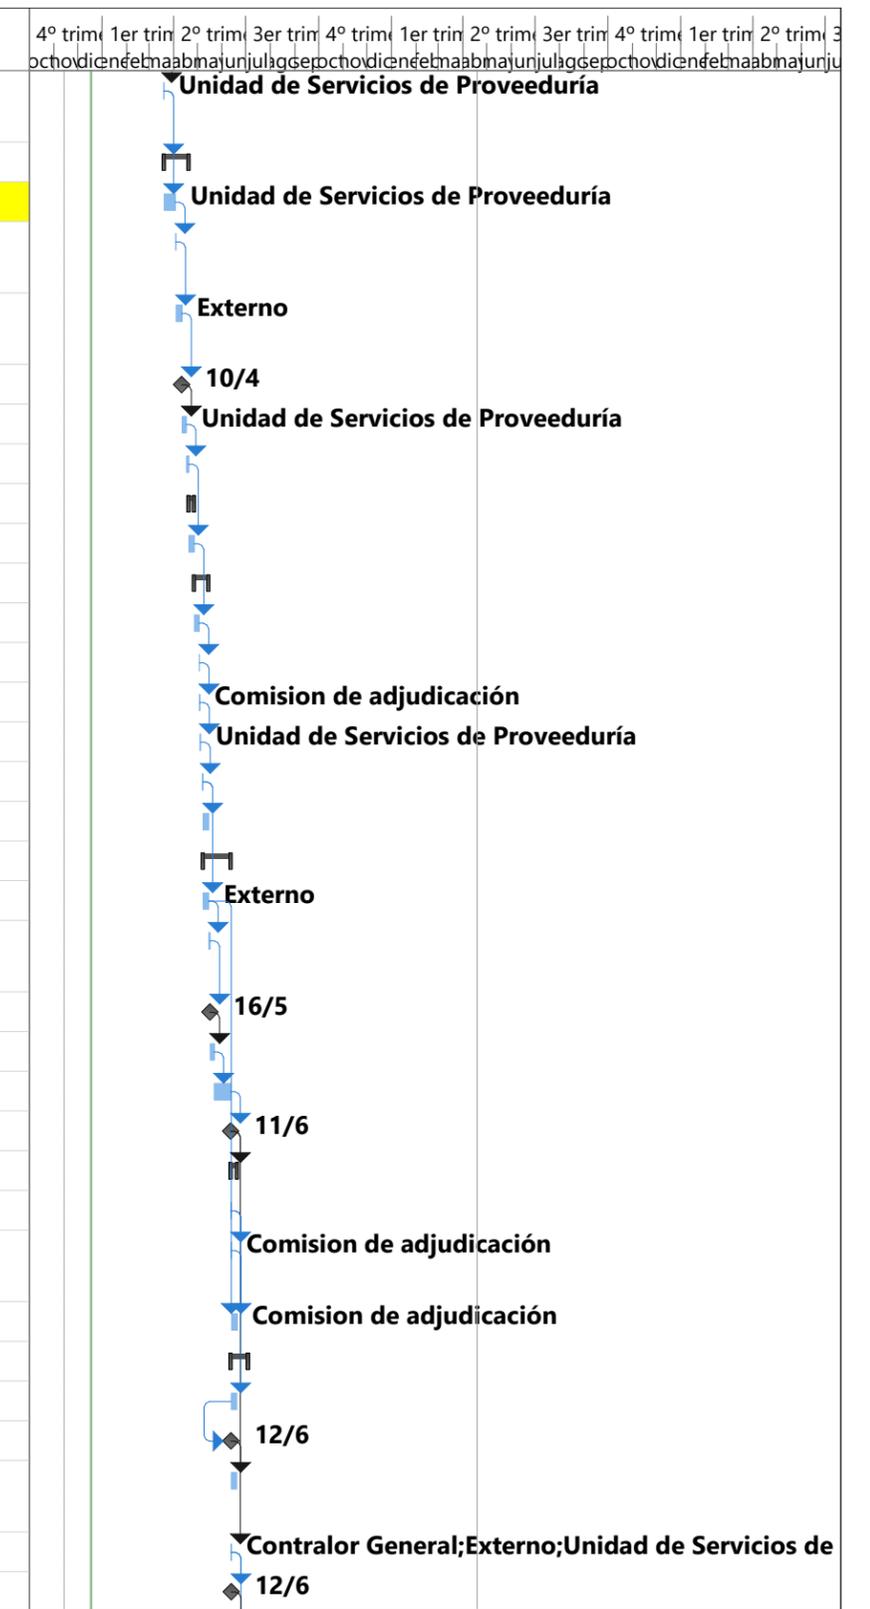

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: lun 18/12/17

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	4° trim oct	1er trim nov	2° trim dic	3er trim ene	4° trim feb	1er trim mar	2° trim abr	3er trim may	4° trim jun	1er trim jul	2° trim ago	3er trim sep	4° trim oct	1er trim nov	2° trim dic	
940		Firma de contrato	5 días	mié 13/6/18	mar 19/6/18	939																
941		Envío de contrato a aprobación interna	0 días	mar 19/6/18	mar 19/6/18	938;940																
942		Aprobacion Interna de Contrato	10 días	mié 20/6/18	mar 3/7/18	941																
943		Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	mar 3/7/18	mar 3/7/18	942																
944		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>15 días</b>	<b>vie 15/6/18</b>	<b>jue 5/7/18</b>																	
945		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	mié 4/7/18	jue 5/7/18	942																
946		Envío de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	jue 5/7/18	jue 5/7/18	945																
947		Visado de pedido en la UAF	3 días	vie 15/6/18	mar 19/6/18	946																
948		Devolución de pedido a Proveduría	1 día	mié 20/6/18	mié 20/6/18	947																
949		Notificación de Pedido de Compra	0 días	mié 20/6/18	mié 20/6/18	947;948																
950		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mié 20/6/18	mié 20/6/18	949																
951		<b>Recepción de los items</b>	<b>13 días</b>	<b>mié 4/7/18</b>	<b>vie 20/7/18</b>																	
952		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mié 4/7/18	mar 17/7/18	942																
953		Recibido a satisfacción	3 días	mié 18/7/18	vie 20/7/18	952																
954		Fin recepción de items	0 días	vie 20/7/18	vie 20/7/18	953																
955		<b>Trámite de pago</b>	<b>6 días</b>	<b>lun 23/7/18</b>	<b>mar 31/7/18</b>																	
956		Envío documentos a Financiero	1 día	lun 23/7/18	lun 23/7/18	954																
957		Emisión de pago en Financiero	5 días	mar 24/7/18	mar 31/7/18	956																
958		Conclusión trámite licitación	0 días	mar 31/7/18	mar 31/7/18	957																
959		<b>EJECUCIÓN CONTRACTUAL LICITACIÓN ABREVIADA (CENTRO DE CAPACITACIÓN)</b>	<b>103,5 días</b>	<b>lun 12/2/18</b>	<b>lun 16/7/18</b>																	
960		<b>2017PR-000002-0005400001_CC_VIII Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Públic_(a realizarse la 3ra semana de agosto)_c20,000.000</b>	<b>103,5 días</b>	<b>lun 12/2/18</b>	<b>lun 16/7/18</b>																	
961		<b>Elaboración de Cartel</b>	<b>5,5 días</b>	<b>lun 12/2/18</b>	<b>lun 19/2/18</b>																	
962		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 12/2/18	lun 12/2/18																	
963		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 12/2/18	mar 13/2/18	962																
964		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 14/2/18	mié 14/2/18	963																
965		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 15/2/18	jue 15/2/18	964																
966		Confeción de cartel definitivo	1 día	vie 16/2/18	vie 16/2/18	965																
967		Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 19/2/18	lun 19/2/18	966																
968		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>26 días</b>	<b>lun 19/2/18</b>	<b>mar 3/4/18</b>																	
969		<b>Invitación a participar</b>	<b>15 días</b>	<b>lun 19/2/18</b>	<b>lun 12/3/18</b>																	
970		Plazo para revibir ofertas	5 días	lun 19/2/18	lun 26/2/18	967																
971		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 19/2/18	mar 20/2/18	970CC																
972		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 20/2/18	mar 6/3/18	971																
973		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 6/3/18	lun 12/3/18	972																
974		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>11 días</b>	<b>lun 12/3/18</b>	<b>mar 3/4/18</b>																	
975		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 12/3/18	lun 12/3/18	973																
976		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 12/3/18	lun 12/3/18	975																

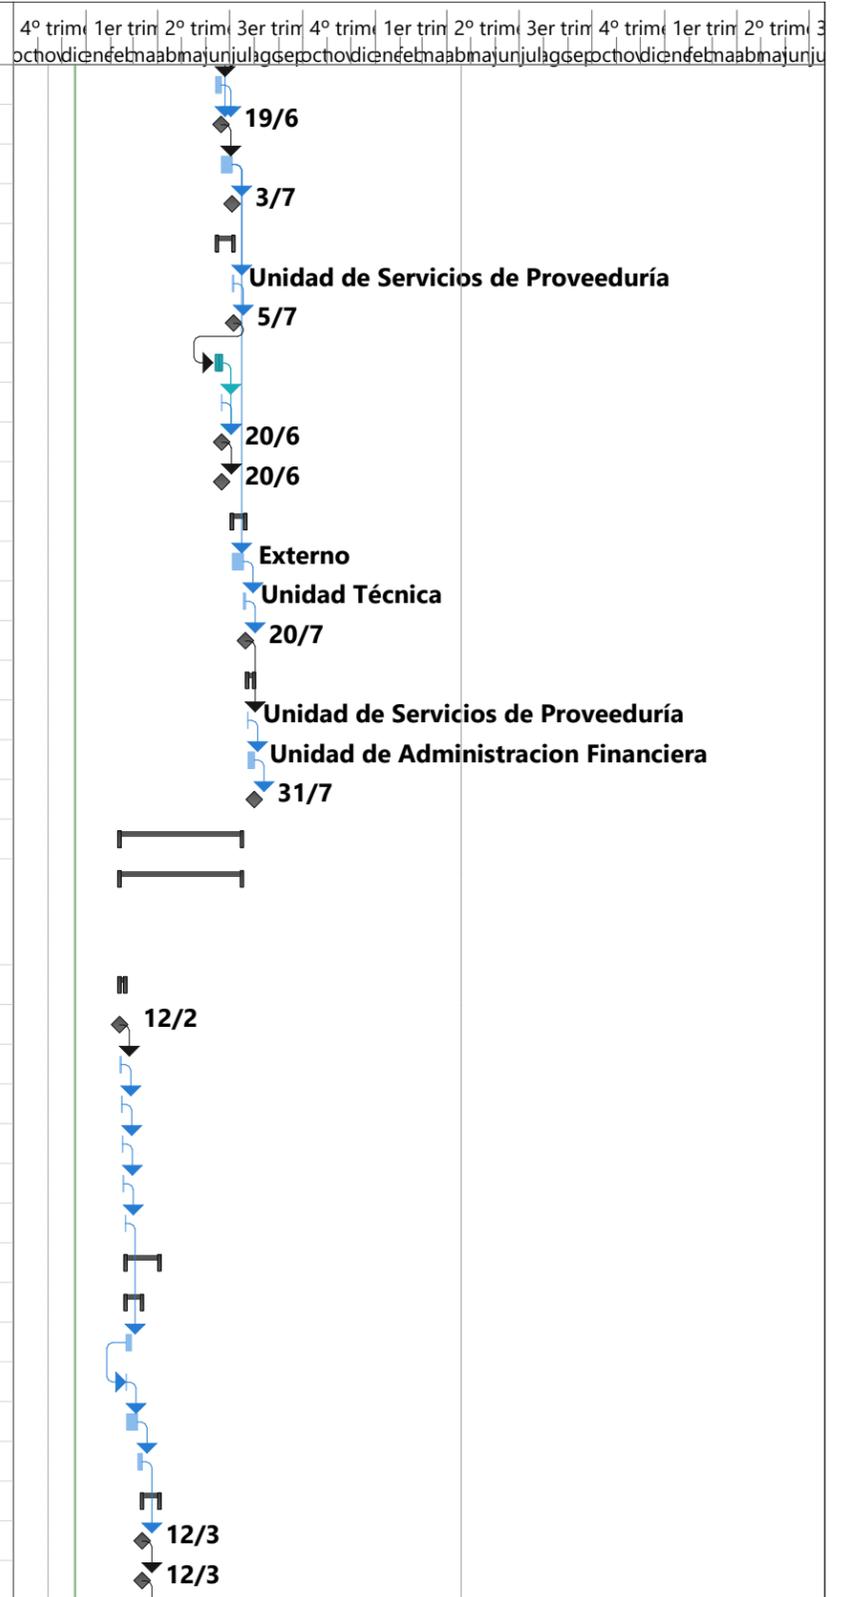

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: lun 18/12/17

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	4° trim 1er trim 2° trim 3er trim 4° trim 1er trim 2° trim 3er trim 4° trim 1er trim 2° trim 3er trim 4° trim															
							ochovdiceneftnaabmajunjulaggepochovdiceneftnaabmajunjulaggepochovdiceneftnaabmajunju															
977		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 12/3/18	vie 16/3/18	976																
978		Envío de prevenciones	0 días	vie 16/3/18	vie 16/3/18	977																
979		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 16/3/18	mar 20/3/18	978																
980		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 20/3/18	jue 22/3/18	979																
981		Elaboración de Informe Técnico	3 días	jue 22/3/18	mar 3/4/18	980																
982		<b>Recomendación, adjudicación y comunicación</b>	<b>6 días</b>	<b>mar 3/4/18</b>	<b>jue 12/4/18</b>																	
983		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mar 3/4/18	vie 6/4/18	981																
984		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	vie 6/4/18	vie 6/4/18	983																
985		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	lun 9/4/18	lun 9/4/18	984																
986		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	lun 9/4/18	mar 10/4/18	985																
987		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	mar 10/4/18	jue 12/4/18	986																
988		<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>11 días</b>	<b>jue 12/4/18</b>	<b>vie 27/4/18</b>																	
989		Plazo para recibir recurso	2 días	jue 12/4/18	lun 16/4/18	987																
990		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	lun 16/4/18	mié 18/4/18	989																
991		Plazo para audiencia inicial	2 días	mié 18/4/18	vie 20/4/18	990																
992		Resolución de Recurso de revocatoria Art 136 RLCA	3 días	vie 20/4/18	mié 25/4/18	991																
993		Adjudicación en firme	2 días	mié 25/4/18	vie 27/4/18	992																
994		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>5 días</b>	<b>vie 27/4/18</b>	<b>lun 7/5/18</b>																	
995		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	vie 27/4/18	lun 30/4/18	993																
996		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	lun 30/4/18	vie 4/5/18	995																
997		Notificación de Pedido de Compra	1 día	vie 4/5/18	lun 7/5/18	996																
998		<b>Recepción de los items</b>	<b>18 días</b>	<b>lun 7/5/18</b>	<b>jue 31/5/18</b>																	
999		Entrega de los bienes/servicios	15 días	lun 7/5/18	lun 28/5/18	997																
1000		Recibido a satisfacción	3 días	lun 28/5/18	jue 31/5/18	999																
1001		<b>Trámite de pago</b>	<b>32 días</b>	<b>jue 31/5/18</b>	<b>lun 16/7/18</b>																	
1002		Envío documentos a Financiero	2 días	jue 31/5/18	lun 4/6/18	1000																
1003		Emisión de pago en Financiero	30 días	lun 4/6/18	lun 16/7/18	1002																
1004		Conclusión trámite de Contratación	0 días	lun 16/7/18	lun 16/7/18	1003																
1005		<b>COMPRAS DIRECTAS</b>	<b>174 días</b>	<b>vie 8/12/17</b>	<b>jue 6/9/18</b>																	
1006		<b>UNIDAD DE GESTIÓN DE POTENCIAL HUMANO (UGPH)</b>	<b>40 días</b>	<b>lun 8/1/18</b>	<b>vie 2/3/18</b>																	
1007		<b>2017CD-000001-503 UGPH_Capacitación (De enero a diciembre 2017, Con Revocatoria)</b>	<b>40 días</b>	<b>lun 8/1/18</b>	<b>vie 2/3/18</b>																	
		<b>€92,400.000,00</b>																				
1008		<b>Contratación</b>	<b>0,8 días</b>	<b>lun 8/1/18</b>	<b>lun 8/1/18</b>																	
1009		Contacto al Proveedor	0,5 días	lun 8/1/18	lun 8/1/18																	
1010		Verificación de datos	0,1 días	lun 8/1/18	lun 8/1/18	1009																
1011		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	0,1 días	lun 8/1/18	lun 8/1/18	1010																
1012		Adjudicación en firme	0,1 días	lun 8/1/18	lun 8/1/18	1011																

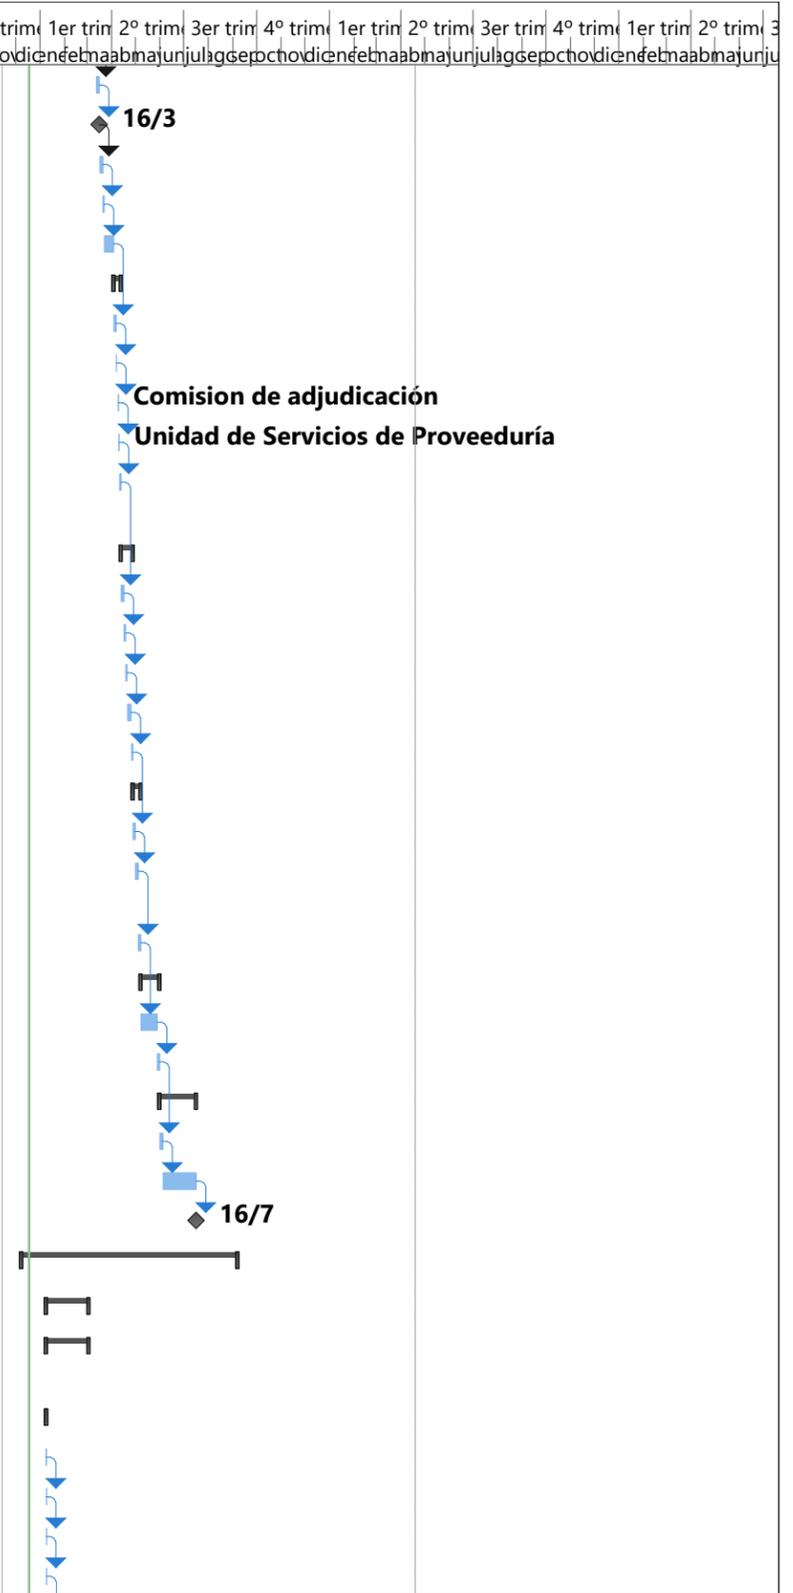

Proyecto: Cronograma de comp  
 Fecha: lun 18/12/17


Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	4° trim	1er trim	2° trim	3er trim	4° trim	1er trim	2° trim	3er trim	4° trim	1er trim	2° trim	3er trim	4° trim
1013		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>3,2 días</b>	<b>lun 8/1/18</b>	<b>jue 11/1/18</b>														
1014		Elaboración del Pedido de Compra	0,2 días	lun 8/1/18	lun 8/1/18	1012													
1015		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	2 días	mar 9/1/18	mié 10/1/18	1014													
1016		Notificación de Pedido de Compra	1 día	jue 11/1/18	jue 11/1/18	1015													
1017		<b>Ejecución</b>	<b>4 días</b>	<b>vie 12/1/18</b>	<b>mié 17/1/18</b>														
1018		Realización del Evento	1 día	vie 12/1/18	vie 12/1/18	1016													
1019		Recibido a satisfacción	3 días	lun 15/1/18	mié 17/1/18	1018													
1020		<b>Trámite de pago</b>	<b>32 días</b>	<b>jue 18/1/18</b>	<b>vie 2/3/18</b>														
1021		Envío documentos a Financiero	2 días	jue 18/1/18	vie 19/1/18	1019													
1022		Emisión de pago en Financiero	30 días	lun 22/1/18	vie 2/3/18	1021													
1023		Conclusión trámite de Contratación	0 días	vie 2/3/18	vie 2/3/18	1022													
1024		<b>UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (USG)</b>	<b>107,5 días</b>	<b>mié 31/1/18</b>	<b>mar 10/7/18</b>														
1025		<b>2018CD-00003-503_USG_Solución de control del Sistema de supresión de incendio del edificio principal_ ₡16,240.000</b>	<b>76,5 días</b>	<b>jue 15/3/18</b>	<b>mar 10/7/18</b>														
1026		<b>Elaboración de Cartel</b>	<b>5,5 días</b>	<b>jue 15/3/18</b>	<b>jue 22/3/18</b>														
1027		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	jue 15/3/18	jue 15/3/18														
1028		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	jue 15/3/18	vie 16/3/18	1027													
1029		Revisión Técnica de cartel	1 día	lun 19/3/18	lun 19/3/18	1028													
1030		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	mar 20/3/18	mar 20/3/18	1029													
1031		Confección de cartel definitivo	1 día	mié 21/3/18	mié 21/3/18	1030													
1032		Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	jue 22/3/18	jue 22/3/18	1031													
1033		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>jue 22/3/18</b>	<b>jue 12/4/18</b>														
1034		<b>Invitación a participar</b>	<b>5 días</b>	<b>jue 22/3/18</b>	<b>jue 5/4/18</b>														
1035		Invitación	5 días	jue 22/3/18	jue 5/4/18	1032													
1036		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	0 días	jue 22/3/18	jue 22/3/18	1035CC													
1037		Resolver recurso de Objeción al cartel	0 días	jue 22/3/18	jue 22/3/18	1036													
1038		Nuevo plazo para recibir ofertas	0 días	jue 22/3/18	jue 22/3/18	1037													
1039		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>jue 22/3/18</b>	<b>jue 12/4/18</b>														
1040		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	jue 22/3/18	jue 22/3/18	1038													
1041		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	jue 22/3/18	jue 22/3/18	1040													
1042		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	jue 22/3/18	mié 4/4/18	1041													
1043		Envío de prevenciones	0 días	mié 4/4/18	mié 4/4/18	1042													
1044		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	mié 4/4/18	vie 6/4/18	1043													
1045		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	vie 6/4/18	mar 10/4/18	1044													
1046		Elaboración de Informe Técnico	1 día	mar 10/4/18	jue 12/4/18	1045													
1047		<b>Recomendación, adjudicación y comunicación</b>	<b>1 día</b>	<b>jue 12/4/18</b>	<b>vie 13/4/18</b>														
1048		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	jue 12/4/18	vie 13/4/18	1046													
1049		<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>11 días</b>	<b>vie 13/4/18</b>	<b>lun 30/4/18</b>														
1050		Plazo para recibir recurso	2 días	vie 13/4/18	mar 17/4/18	1048													

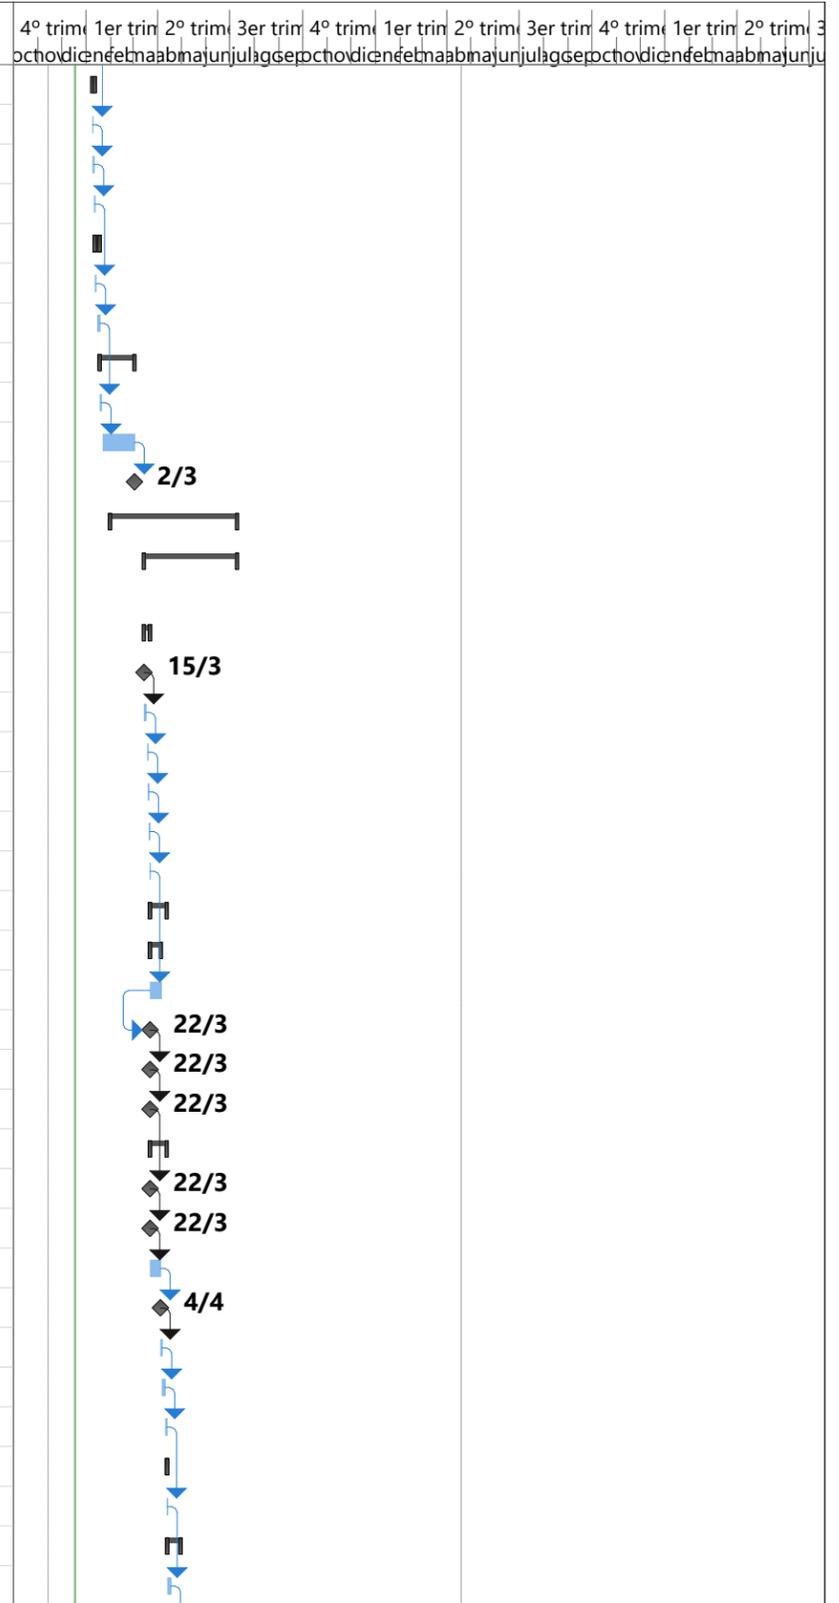

Proyecto: Cronograma de comp Fecha: lun 18/12/17	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	4° trim	1er trim	2° trim	3er trim	4° trim	1er trim	2° trim	3er trim	4° trim	1er trim	2° trim	3er trim	4° trim
1051		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mar 17/4/18	jue 19/4/18	1050													
1052		Plazo para audiencia inicial	2 días	jue 19/4/18	lun 23/4/18	1051													
1053		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	lun 23/4/18	jue 26/4/18	1052													
1054		Adjudicación en firme	2 días	jue 26/4/18	lun 30/4/18	1053													
1055		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 30/4/18</b>	<b>mar 8/5/18</b>														
1056		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	lun 30/4/18	mié 2/5/18	1054													
1057		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 2/5/18	lun 7/5/18	1056													
1058		Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 7/5/18	mar 8/5/18	1057													
1059		<b>Recepción de los items</b>	<b>13 días</b>	<b>mar 8/5/18</b>	<b>vie 25/5/18</b>														
1060		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 8/5/18	mar 22/5/18	1058													
1061		Recibido a satisfacción	3 días	mar 22/5/18	vie 25/5/18	1060													
1062		<b>Trámite de pago</b>	<b>32 días</b>	<b>vie 25/5/18</b>	<b>mar 10/7/18</b>														
1063		Envío documentos a Financiero	2 días	vie 25/5/18	mar 29/5/18	1061													
1064		Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 29/5/18	mar 10/7/18	1063													
1065		Conclusión trámite de Contratación	0 días	mar 10/7/18	mar 10/7/18	1064													
1066		<b>2018CD-00004-503_USG_Aquisición y mantenimiento de unidades de aire acondicionado_Vence 22/11/2017_€500.000/año; €2,000.000/4 años</b>	<b>76,5 días</b>	<b>mié 31/1/18</b>	<b>lun 28/5/18</b>														
1067		<b>Elaboración de Cartel</b>	<b>5,5 días</b>	<b>mié 31/1/18</b>	<b>mié 7/2/18</b>														
1068		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	mié 31/1/18	mié 31/1/18														
1069		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	mié 31/1/18	jue 1/2/18	1068													
1070		Revisión Técnica de cartel	1 día	vie 2/2/18	vie 2/2/18	1069													
1071		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	lun 5/2/18	lun 5/2/18	1070													
1072		Confección de cartel definitivo	1 día	mar 6/2/18	mar 6/2/18	1071													
1073		Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	mié 7/2/18	mié 7/2/18	1072													
1074		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>mié 7/2/18</b>	<b>mar 20/2/18</b>														
1075		<b>Invitación a participar</b>	<b>5 días</b>	<b>mié 7/2/18</b>	<b>mié 14/2/18</b>														
1076		Invitación	5 días	mié 7/2/18	mié 14/2/18	1073													
1077		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	0 días	mié 7/2/18	mié 7/2/18	1076CC													
1078		Resolver recurso de Objeción al cartel	0 días	mié 7/2/18	mié 7/2/18	1077													
1079		Nuevo plazo para recibir ofertas	0 días	mié 7/2/18	mié 7/2/18	1078													
1080		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>mié 7/2/18</b>	<b>mar 20/2/18</b>														
1081		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	mié 7/2/18	mié 7/2/18	1079													
1082		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	mié 7/2/18	mié 7/2/18	1081													
1083		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	mié 7/2/18	mar 13/2/18	1082													
1084		Envío de prevenciones	0 días	mar 13/2/18	mar 13/2/18	1083													
1085		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	mar 13/2/18	jue 15/2/18	1084													
1086		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	jue 15/2/18	lun 19/2/18	1085													
1087		Elaboración de Informe Técnico	1 día	lun 19/2/18	mar 20/2/18	1086													
1088		<b>Recomendación, adjudicación y comunicación</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 20/2/18</b>	<b>mié 21/2/18</b>														

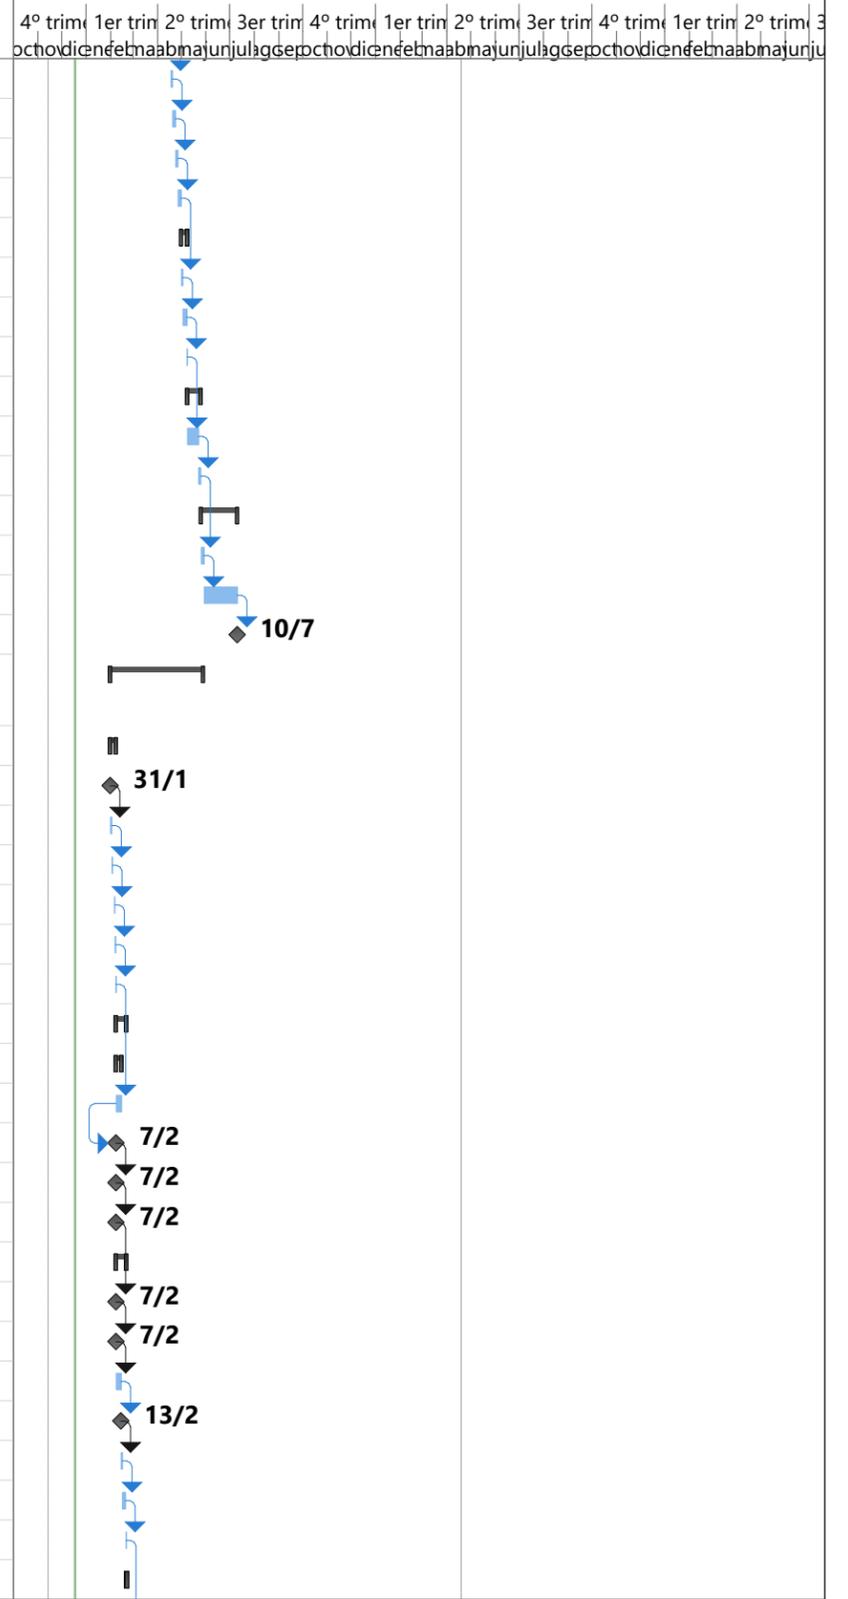


Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: lun 18/12/17

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	4° trim 1er trim 2° trim 3er trim 4° trim															
							ochovdicenfebmaabmajunjulaggepochoxdiceneftnaabmajunjulaggepochoxdiceneftnaabmajunju															
1126		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	mié 28/2/18	vie 2/3/18	1125																
1127		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	vie 2/3/18	mar 6/3/18	1126																
1128		Elaboración de Informe Técnico	1 día	mar 6/3/18	mié 7/3/18	1127																
1129		<b>Recomendación, adjudicación y comunicación</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 7/3/18</b>	<b>jue 8/3/18</b>																	
1130		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	mié 7/3/18	jue 8/3/18	1128																
1131		<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>11 días</b>	<b>jue 8/3/18</b>	<b>vie 23/3/18</b>																	
1132		Plazo para recibir recurso	2 días	jue 8/3/18	lun 12/3/18	1130																
1133		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	lun 12/3/18	mié 14/3/18	1132																
1134		Plazo para audiencia inicial	2 días	mié 14/3/18	vie 16/3/18	1133																
1135		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	vie 16/3/18	mié 21/3/18	1134																
1136		Adjudicación en firme	2 días	mié 21/3/18	vie 23/3/18	1135																
1137		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>5 días</b>	<b>vie 23/3/18</b>	<b>vie 6/4/18</b>																	
1138		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	vie 23/3/18	lun 2/4/18	1136																
1139		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	lun 2/4/18	jue 5/4/18	1138																
1140		Notificación de Pedido de Compra	1 día	jue 5/4/18	vie 6/4/18	1139																
1141		<b>Recepción de los items</b>	<b>13 días</b>	<b>vie 6/4/18</b>	<b>jue 26/4/18</b>																	
1142		Entrega de los bienes/servicios	10 días	vie 6/4/18	lun 23/4/18	1140																
1143		Recibido a satisfacción	3 días	lun 23/4/18	jue 26/4/18	1142																
1144		<b>Trámite de pago</b>	<b>32 días</b>	<b>jue 26/4/18</b>	<b>mar 12/6/18</b>																	
1145		Envío documentos a Financiero	2 días	jue 26/4/18	lun 30/4/18	1143																
1146		Emisión de pago en Financiero	30 días	lun 30/4/18	mar 12/6/18	1145																
1147		Conclusión trámite de Contratación	0 días	mar 12/6/18	mar 12/6/18	1146																
1148		<b>UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (UTI)</b>	<b>86,5 días</b>	<b>lun 2/4/18</b>	<b>lun 6/8/18</b>																	
1149		<b>2018CD-00006-0005400001_UTI_Contrato de mantenimiento preventivo y continuidad de servicio a los equipos ORACLE T2000 dos Brocade 300 y un switch brocade200E;_Vence el 25/11/2018 y 12/02/2018_¢ 12,248.000 /4 años; ¢ 3,062.000/año</b>	<b>81,5 días</b>	<b>lun 2/4/18</b>	<b>vie 27/7/18</b>																	
1150		<b>Elaboración de Cartel</b>	<b>5,5 días</b>	<b>lun 2/4/18</b>	<b>lun 9/4/18</b>																	
1151		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 2/4/18	lun 2/4/18																	
1152		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 2/4/18	mar 3/4/18	1151																
1153		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 4/4/18	mié 4/4/18	1152																
1154		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 5/4/18	jue 5/4/18	1153																
1155		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 6/4/18	vie 6/4/18	1154																
1156		Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 9/4/18	lun 9/4/18	1155																
1157		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>lun 9/4/18</b>	<b>lun 23/4/18</b>																	
1158		<b>Invitación a participar</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 9/4/18</b>	<b>mar 17/4/18</b>																	
1159		Invitación	5 días	lun 9/4/18	mar 17/4/18	1156																
1160		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	0 días	lun 9/4/18	lun 9/4/18	1159CC																
1161		Resolver recurso de Objeción al cartel	0 días	lun 9/4/18	lun 9/4/18	1160																

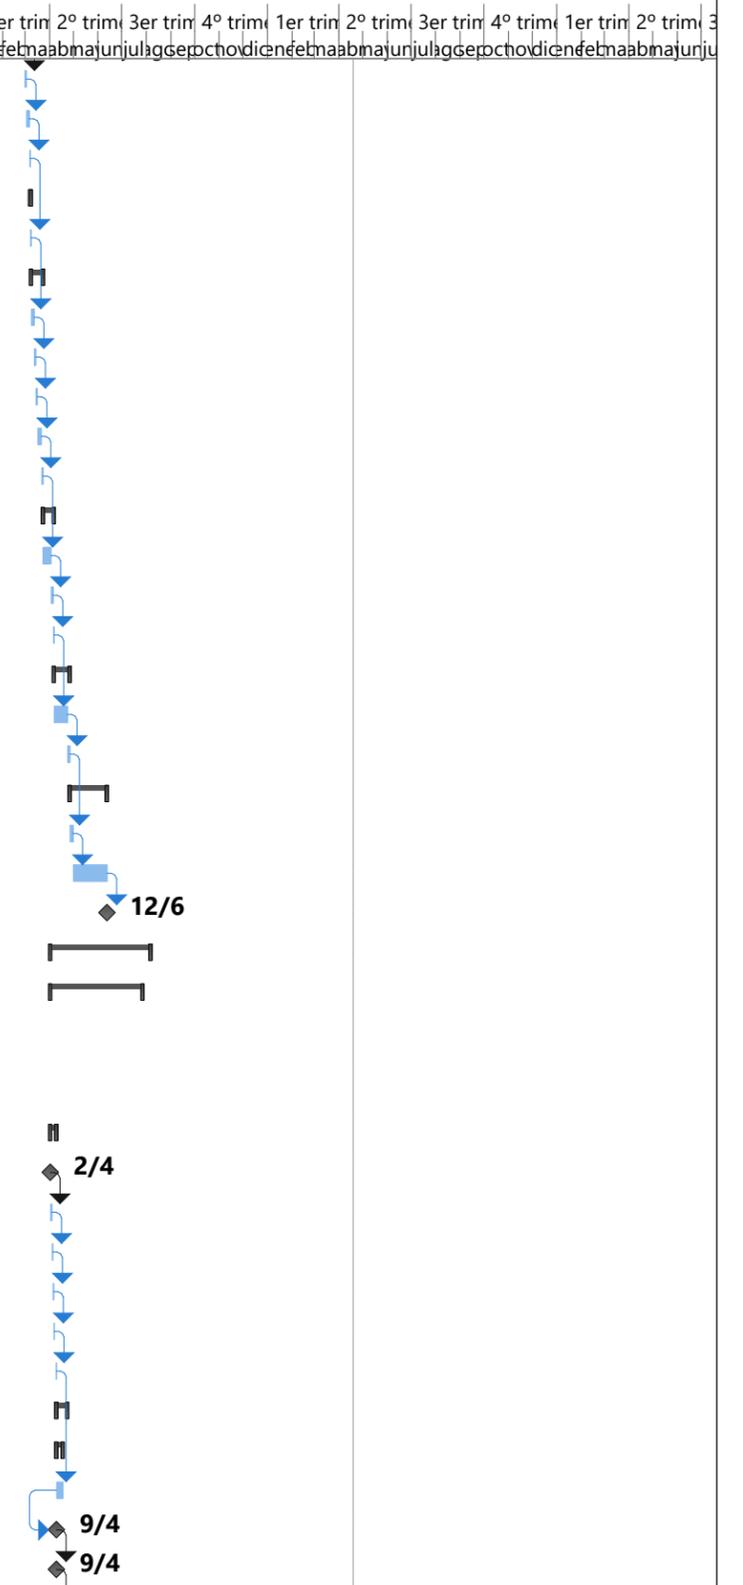


Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: lun 18/12/17

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			





Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	4º trim 1er trin 2º trim 3er trin 4º trim 1er trin 2º trim 3er trin 4º trim 1er trin 2º trim 3															
							ochovdicnefebnaabmajunjulaggepochovdicnefebnaabmajunjulaggepochovdicnefebnaabmajunju															
1237		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 18/1/18	jue 18/1/18	1236																
1238		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 19/1/18	vie 19/1/18	1237																
1239		Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 22/1/18	lun 22/1/18	1238																
1240		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>lun 22/1/18</b>	<b>vie 2/2/18</b>																	
1241		<b>Invitación a participar</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 22/1/18</b>	<b>lun 29/1/18</b>																	
1242		Invitación	5 días	lun 22/1/18	lun 29/1/18	1239																
1243		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	0 días	lun 22/1/18	lun 22/1/18	1242CC																
1244		Resolver recurso de Objeción al cartel	0 días	lun 22/1/18	lun 22/1/18	1243																
1245		Nuevo plazo para recibir ofertas	0 días	lun 22/1/18	lun 22/1/18	1244																
1246		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>lun 22/1/18</b>	<b>vie 2/2/18</b>																	
1247		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 22/1/18	lun 22/1/18	1245																
1248		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 22/1/18	lun 22/1/18	1247																
1249		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 22/1/18	vie 26/1/18	1248																
1250		Envío de prevenciones	0 días	vie 26/1/18	vie 26/1/18	1249																
1251		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 26/1/18	mar 30/1/18	1250																
1252		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 30/1/18	jue 1/2/18	1251																
1253		Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 1/2/18	vie 2/2/18	1252																
1254		<b>Recomendación, adjudicación y comunicación</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 2/2/18</b>	<b>lun 5/2/18</b>																	
1255		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 2/2/18	lun 5/2/18	1253																
1256		<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>11 días</b>	<b>lun 5/2/18</b>	<b>mar 20/2/18</b>																	
1257		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 5/2/18	mié 7/2/18	1255																
1258		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 7/2/18	vie 9/2/18	1257																
1259		Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 9/2/18	mar 13/2/18	1258																
1260		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	mar 13/2/18	vie 16/2/18	1259																
1261		Adjudicación en firme	2 días	vie 16/2/18	mar 20/2/18	1260																
1262		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>5 días</b>	<b>mar 20/2/18</b>	<b>mar 27/2/18</b>																	
1263		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 20/2/18	mié 21/2/18	1261																
1264		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 21/2/18	lun 26/2/18	1263																
1265		Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 26/2/18	mar 27/2/18	1264																
1266		<b>Recepción de los items</b>	<b>18 días</b>	<b>mar 27/2/18</b>	<b>vie 23/3/18</b>																	
1267		Entrega de los bienes/servicios	15 días	mar 27/2/18	mar 20/3/18	1265																
1268		Recibido a satisfacción	3 días	mar 20/3/18	vie 23/3/18	1267																
1269		<b>Trámite de pago</b>	<b>32 días</b>	<b>vie 23/3/18</b>	<b>jue 17/5/18</b>																	
1270		Envío documentos a Financiero	2 días	vie 23/3/18	mar 3/4/18	1268																
1271		Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 3/4/18	jue 17/5/18	1270																
1272		Conclusión trámite de Contratación	0 días	jue 17/5/18	jue 17/5/18	1271																
1273		<b>2018CD-00008-503_USI_Máquina enmicadora eléctrica para Publicaciones_Envian especificaciones en 2017_€100.000</b>	<b>81,5 días</b>	<b>lun 18/12/17</b>	<b>vie 4/5/18</b>																	
1274		<b>Elaboración de Cartel</b>	<b>5,5 días</b>	<b>lun 18/12/17</b>	<b>mar 9/1/18</b>																	

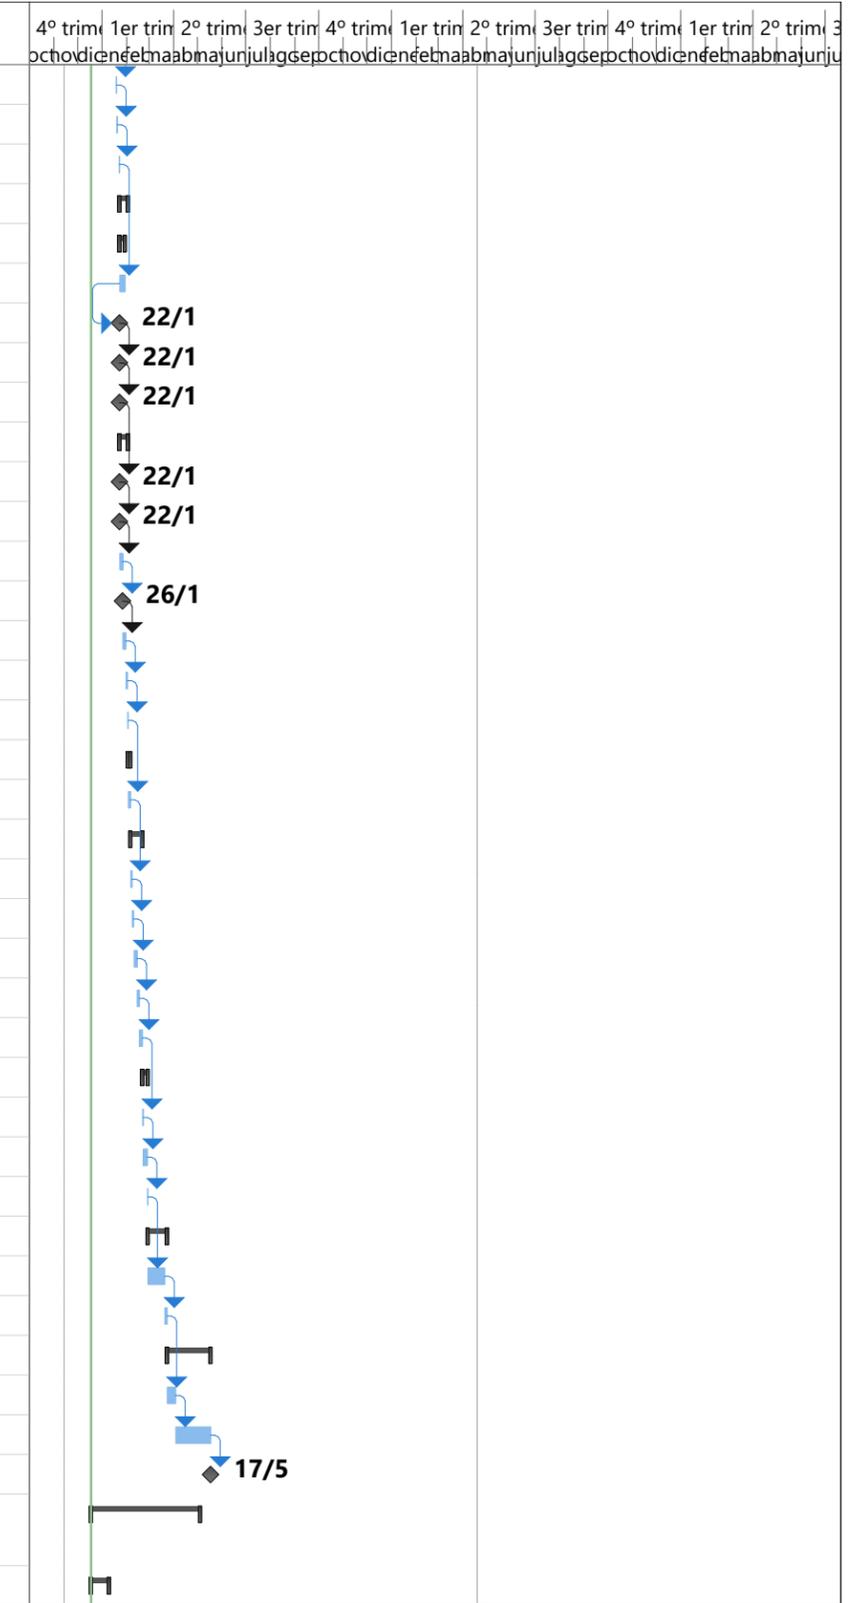

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: lun 18/12/17

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	4° trim 1er trin 2° trim 3er trin 4° trim 1er trin 2° trim 3er trin 4° trim 1er trin 2° trim 3											
							ochovdicnefebmaabmajunjulaggepochovdicnefebmaabmajunjulaggepochovdicnefebmaabmajunjul											
1275		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 18/12/17	lun 18/12/17		18/12											
1276		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 18/12/17	mar 19/12/17	1275												
1277		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 20/12/17	mié 20/12/17	1276												
1278		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 21/12/17	jue 21/12/17	1277												
1279		Confección de cartel definitivo	1 día	lun 8/1/18	lun 8/1/18	1278												
1280		Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	mar 9/1/18	mar 9/1/18	1279												
1281		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>mar 9/1/18</b>	<b>lun 22/1/18</b>													
1282		<b>Invitación a participar</b>	<b>5 días</b>	<b>mar 9/1/18</b>	<b>mar 16/1/18</b>													
1283		Invitación	5 días	mar 9/1/18	mar 16/1/18	1280												
1284		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	0 días	mar 9/1/18	mar 9/1/18	1283CC	9/1											
1285		Resolver recurso de Objeción al cartel	0 días	mar 9/1/18	mar 9/1/18	1284	9/1											
1286		Nuevo plazo para recibir ofertas	0 días	mar 9/1/18	mar 9/1/18	1285	9/1											
1287		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>mar 9/1/18</b>	<b>lun 22/1/18</b>													
1288		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	mar 9/1/18	mar 9/1/18	1286	9/1											
1289		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	mar 9/1/18	mar 9/1/18	1288	9/1											
1290		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	mar 9/1/18	lun 15/1/18	1289												
1291		Envío de prevenciones	0 días	lun 15/1/18	lun 15/1/18	1290	15/1											
1292		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	lun 15/1/18	mié 17/1/18	1291												
1293		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mié 17/1/18	vie 19/1/18	1292												
1294		Elaboración de Informe Técnico	1 día	vie 19/1/18	lun 22/1/18	1293												
1295		<b>Recomendación, adjudicación y comunicación</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 22/1/18</b>	<b>mar 23/1/18</b>													
1296		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	lun 22/1/18	mar 23/1/18	1294												
1297		<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>11 días</b>	<b>mar 23/1/18</b>	<b>mié 7/2/18</b>													
1298		Plazo para recibir recurso	2 días	mar 23/1/18	jue 25/1/18	1296												
1299		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	jue 25/1/18	lun 29/1/18	1298												
1300		Plazo para audiencia inicial	2 días	lun 29/1/18	mié 31/1/18	1299												
1301		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	mié 31/1/18	lun 5/2/18	1300												
1302		Adjudicación en firme	2 días	lun 5/2/18	mié 7/2/18	1301												
1303		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>5 días</b>	<b>mié 7/2/18</b>	<b>mié 14/2/18</b>													
1304		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mié 7/2/18	jue 8/2/18	1302												
1305		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	jue 8/2/18	mar 13/2/18	1304												
1306		Notificación de Pedido de Compra	1 día	mar 13/2/18	mié 14/2/18	1305												
1307		<b>Recepción de los items</b>	<b>18 días</b>	<b>mié 14/2/18</b>	<b>lun 12/3/18</b>													
1308		Entrega de los bienes/servicios	15 días	mié 14/2/18	mié 7/3/18	1306												
1309		Recibido a satisfacción	3 días	mié 7/3/18	lun 12/3/18	1308												
1310		<b>Trámite de pago</b>	<b>32 días</b>	<b>lun 12/3/18</b>	<b>vie 4/5/18</b>													
1311		Envío documentos a Financiero	2 días	lun 12/3/18	mié 14/3/18	1309												
1312		Emisión de pago en Financiero	30 días	mié 14/3/18	vie 4/5/18	1311												

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: lun 18/12/17

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	4° trim 1er trin 2° trim 3er trin 4° trim 1er trin 2° trim 3er trin 4° trim 1er trin 2° trim 3											
							ochovdicnefebnaabmajunjulaggepochovdicnefebnaabmajunjulaggepochovdicnefebnaabmajunju			ochovdicnefebnaabmajunjulaggepochovdicnefebnaabmajunjulaggepochovdicnefebnaabmajunju			ochovdicnefebnaabmajunjulaggepochovdicnefebnaabmajunjulaggepochovdicnefebnaabmajunju			ochovdicnefebnaabmajunjulaggepochovdicnefebnaabmajunjulaggepochovdicnefebnaabmajunju		
1313		Conclusión trámite de Contratación	0 días	vie 4/5/18	vie 4/5/18	1312	4/5											
1314		<b>CENTRO DE CAPACITACIÓN (CC)</b>	<b>81,5 días</b>	<b>lun 18/12/17</b>	<b>vie 4/5/18</b>		18/12											
1315		<b>2018CD-00009-503_CC_Caterin Service 9 eventos(Contratado al 15/03/2018)_ €3,500.000</b>	<b>81,5 días</b>	<b>lun 18/12/17</b>	<b>vie 4/5/18</b>		9/1											
1316		<b>Elaboración de Cartel</b>	<b>5,5 días</b>	<b>lun 18/12/17</b>	<b>mar 9/1/18</b>		9/1											
1317		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 18/12/17	lun 18/12/17		9/1											
1318		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 18/12/17	mar 19/12/17	1317	9/1											
1319		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 20/12/17	mié 20/12/17	1318	9/1											
1320		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 21/12/17	jue 21/12/17	1319	9/1											
1321		Confección de cartel definitivo	1 día	lun 8/1/18	lun 8/1/18	1320	9/1											
1322		Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	mar 9/1/18	mar 9/1/18	1321	9/1											
1323		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>mar 9/1/18</b>	<b>lun 22/1/18</b>		15/1											
1324		<b>Invitación a participar</b>	<b>5 días</b>	<b>mar 9/1/18</b>	<b>mar 16/1/18</b>													
1325		Invitación	5 días	mar 9/1/18	mar 16/1/18	1322												
1326		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	0 días	mar 9/1/18	mar 9/1/18	1325CC												
1327		Resolver recurso de Objeción al cartel	0 días	mar 9/1/18	mar 9/1/18	1326												
1328		Nuevo plazo para recibir ofertas	0 días	mar 9/1/18	mar 9/1/18	1327												
1329		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>mar 9/1/18</b>	<b>lun 22/1/18</b>													
1330		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	mar 9/1/18	mar 9/1/18	1328												
1331		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	mar 9/1/18	mar 9/1/18	1330												
1332		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	mar 9/1/18	lun 15/1/18	1331												
1333		Envío de prevenciones	0 días	lun 15/1/18	lun 15/1/18	1332												
1334		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	lun 15/1/18	mié 17/1/18	1333												
1335		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mié 17/1/18	vie 19/1/18	1334												
1336		Elaboración de Informe Técnico	1 día	vie 19/1/18	lun 22/1/18	1335												
1337		<b>Recomendación, adjudicación y comunicación</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 22/1/18</b>	<b>mar 23/1/18</b>													
1338		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	lun 22/1/18	mar 23/1/18	1336												
1339		<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>11 días</b>	<b>mar 23/1/18</b>	<b>mié 7/2/18</b>													
1340		Plazo para recibir recurso	2 días	mar 23/1/18	jue 25/1/18	1338												
1341		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	jue 25/1/18	lun 29/1/18	1340												
1342		Plazo para audiencia inicial	2 días	lun 29/1/18	mié 31/1/18	1341												
1343		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	mié 31/1/18	lun 5/2/18	1342												
1344		Adjudicación en firme	2 días	lun 5/2/18	mié 7/2/18	1343												
1345		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>5 días</b>	<b>mié 7/2/18</b>	<b>mié 14/2/18</b>													
1346		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mié 7/2/18	jue 8/2/18	1344												
1347		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	jue 8/2/18	mar 13/2/18	1346												
1348		Notificación de Pedido de Compra	1 día	mar 13/2/18	mié 14/2/18	1347												
1349		<b>Recepción de los items</b>	<b>18 días</b>	<b>mié 14/2/18</b>	<b>lun 12/3/18</b>													
1350		Entrega de los bienes/servicios	15 días	mié 14/2/18	mié 7/3/18	1348												

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: lun 18/12/17

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	4° trim	1er trim	2° trim	3er trim	4° trim	1er trim	2° trim	3er trim	4° trim	1er trim	2° trim	3er trim	4° trim
1389		<b>Recepción de los items</b>	<b>4 días</b>	<b>jue 8/2/18</b>	<b>mar 13/2/18</b>														
1390		Entrega de los bienes/servicios	1 día	jue 8/2/18	jue 8/2/18	1388													
1391		Recibido a satisfacción	3 días	vie 9/2/18	mar 13/2/18	1390													
1392		<b>Trámite de pago</b>	<b>32 días</b>	<b>mié 14/2/18</b>	<b>jue 5/4/18</b>														
1393		Envío documentos a Financiero	2 días	mié 14/2/18	jue 15/2/18	1391													
1394		Emisión de pago en Financiero	30 días	vie 16/2/18	jue 5/4/18	1393													
1395		Conclusión trámite de Contratación	0 días	jue 5/4/18	jue 5/4/18	1394													
1396		<b>2018CD-0000011-503 DFOE_Consultor Minería de datos y big data (Inicia 28/2/18; Con Revocatoria) \$2,100.000,00</b>	<b>69 días</b>	<b>mié 28/2/18</b>	<b>mié 13/6/18</b>														
1397		<b>Elaboración de Cartel</b>	<b>5 días</b>	<b>mié 28/2/18</b>	<b>mar 6/3/18</b>														
1398		Recepción Especificaciones técnicas y elaboracion del cartel (UGA)	2 días	mié 28/2/18	jue 1/3/18														
1399		Revisión Técnica de cartel	1 día	vie 2/3/18	vie 2/3/18	1398													
1400		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	lun 5/3/18	lun 5/3/18	1399													
1401		Confección de cartel definitivo	1 día	mar 6/3/18	mar 6/3/18	1400													
1402		Invitación a participar en Mer- Link	0 días	mar 6/3/18	mar 6/3/18	1401													
1403		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>mar 6/3/18</b>	<b>lun 19/3/18</b>														
1404		<b>Invitación a participar</b>	<b>0 días</b>	<b>mar 6/3/18</b>	<b>mar 6/3/18</b>														
1405		Envío de invitación	0 días	mar 6/3/18	mar 6/3/18	1402													
1406		Objeción al cartel	0 días	mar 6/3/18	mar 6/3/18	1405													
1407		Nuevo plazo para recibir ofertas	0 días	mar 6/3/18	mar 6/3/18	1406													
1408		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>mar 6/3/18</b>	<b>lun 19/3/18</b>														
1409		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	mar 6/3/18	mar 6/3/18	1407													
1410		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	mar 6/3/18	mar 6/3/18	1409													
1411		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	mié 7/3/18	lun 12/3/18	1410													
1412		Envío de prevenciones	0 días	lun 12/3/18	lun 12/3/18	1411													
1413		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	mar 13/3/18	mié 14/3/18	1412													
1414		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	jue 15/3/18	vie 16/3/18	1413													
1415		Elaboración de Informe Técnico	1 día	lun 19/3/18	lun 19/3/18	1414													
1416		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	mar 20/3/18	mar 20/3/18	1415													
1417		<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>15 días</b>	<b>mié 21/3/18</b>	<b>mié 18/4/18</b>														
1418		Plazo para recibir recurso	2 días	mié 21/3/18	jue 22/3/18	1416													
1419		Resolución de Recurso de revocatoria	10 días	vie 23/3/18	vie 13/4/18	1418													
1420		Adjudicación en firme	3 días	lun 16/4/18	mié 18/4/18	1419													
1421		Solicitud de garantía de cumplimiento y especies fiscales	0 días	mié 18/4/18	mié 18/4/18	1420													
1422		Presentación de timbres fiscales y garantía de cumplimiento	0 días	mié 18/4/18	mié 18/4/18	1421													
1423		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>3 días</b>	<b>jue 19/4/18</b>	<b>lun 23/4/18</b>														
1424		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	jue 19/4/18	jue 19/4/18	1423													
1425		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	1 día	vie 20/4/18	vie 20/4/18	1424													
1426		Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 23/4/18	lun 23/4/18	1425													

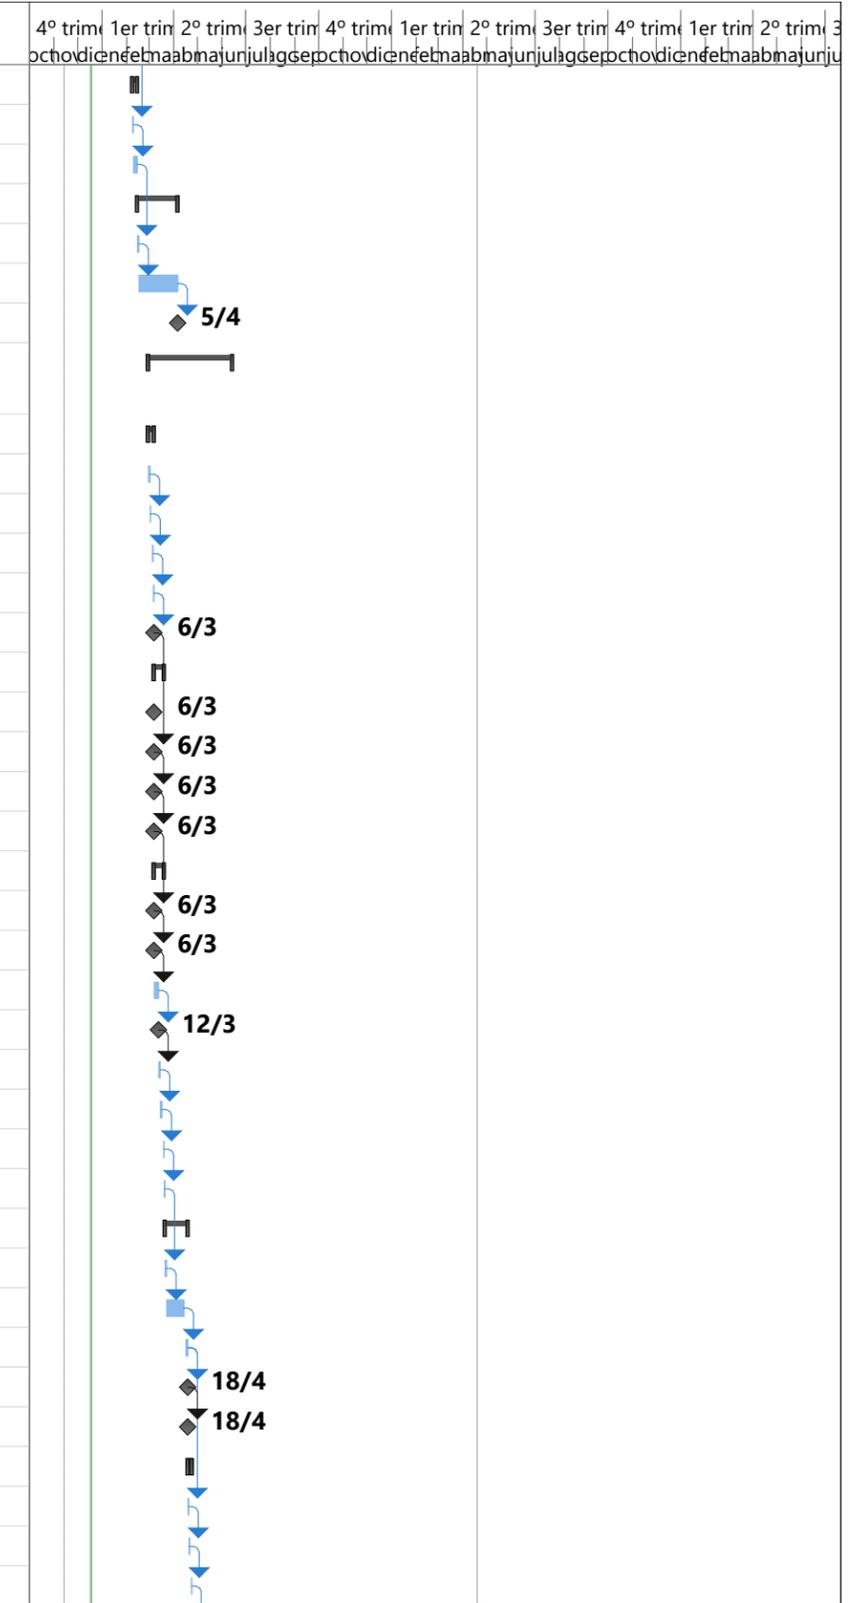


Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: lun 18/12/17

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		solo fin		Tareas externas		Hito externo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Tareas externas		Progreso manual		Progreso			
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		solo fin		Progreso manual		Progreso			
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		solo fin		Tareas externas		Progreso manual		Progreso			




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	4° trim och	1er trin x	2° trim fe	3er trin bna	4° trim jun	1er trin jul	2° trim ag	3er trin go	4° trim o	1er trin c	2° trim di	3er trin e	4° trim na	1er trin b	2° trim a	3er trin jun	4° trim jul	
1465	➔	<b>Recepción de los items</b>	<b>4 días</b>	<b>lun 16/7/18</b>	<b>jue 19/7/18</b>																			
1466	➔	Entrega de los bienes/servicios	1 día	lun 16/7/18	lun 16/7/18	1464																		
1467	➔	Recibido a satisfacción	3 días	mar 17/7/18	jue 19/7/18	1466																		
1468	➔	<b>Trámite de pago</b>	<b>32 días</b>	<b>vie 20/7/18</b>	<b>jue 6/9/18</b>																			
1469	➔	Envío documentos a Financiero	2 días	vie 20/7/18	lun 23/7/18	1467																		
1470	➔	Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 24/7/18	jue 6/9/18	1469																		
1471	➔	Conclusión trámite de Contratación	0 días	jue 6/9/18	jue 6/9/18	1470																		
1472	➔	<b>2018CD-0000013-503 DFOE_Consultor Economista-Desarrollo sostenible (Inicia 20/12/17; Con Revocatoria) \$4,250.000,00</b>	<b>69 días</b>	<b>mié 30/5/18</b>	<b>jue 6/9/18</b>																			
1473	➔	<b>Elaboración de Cartel</b>	<b>5 días</b>	<b>mié 30/5/18</b>	<b>mar 5/6/18</b>																			
1474	➔	Recepción Especificaciones técnicas y elaboracion del cartel (UGA)	2 días	mié 30/5/18	jue 31/5/18																			
1475	➔	Revisión Técnica de cartel	1 día	vie 1/6/18	vie 1/6/18	1474																		
1476	➔	Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	lun 4/6/18	lun 4/6/18	1475																		
1477	➔	Confección de cartel definitivo	1 día	mar 5/6/18	mar 5/6/18	1476																		
1478	➔	Invitación a participar en Mer- Link	0 días	mar 5/6/18	mar 5/6/18	1477																		
1479	➔	<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>mar 5/6/18</b>	<b>lun 18/6/18</b>																			
1480	➔	<b>Invitación a participar</b>	<b>0 días</b>	<b>mar 5/6/18</b>	<b>mar 5/6/18</b>																			
1481	➔	Envío de invitación	0 días	mar 5/6/18	mar 5/6/18	1478																		
1482	➔	Objeción al cartel	0 días	mar 5/6/18	mar 5/6/18	1481																		
1483	➔	Nuevo plazo para recibir ofertas	0 días	mar 5/6/18	mar 5/6/18	1482																		
1484	➔	<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>mar 5/6/18</b>	<b>lun 18/6/18</b>																			
1485	➔	Apertura de ofertas Mer-Link	0 días	mar 5/6/18	mar 5/6/18	1483																		
1486	➔	Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	mar 5/6/18	mar 5/6/18	1485																		
1487	➔	Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	mié 6/6/18	lun 11/6/18	1486																		
1488	➔	Envío de prevenciones	0 días	lun 11/6/18	lun 11/6/18	1487																		
1489	➔	Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	mar 12/6/18	mié 13/6/18	1488																		
1490	➔	Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	jue 14/6/18	vie 15/6/18	1489																		
1491	➔	Elaboración de Informe Técnico	1 día	lun 18/6/18	lun 18/6/18	1490																		
1492	➔	Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	mar 19/6/18	mar 19/6/18	1491																		
1493	➔	<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>15 días</b>	<b>mié 20/6/18</b>	<b>mar 10/7/18</b>																			
1494	➔	Plazo para recibir recurso	2 días	mié 20/6/18	jue 21/6/18	1492																		
1495	➔	Resolución de Recurso de revocatoria	10 días	vie 22/6/18	jue 5/7/18	1494																		
1496	➔	Adjudicación en firme	3 días	vie 6/7/18	mar 10/7/18	1495																		
1497	➔	Solicitud de garantía de cumplimiento y especies fiscales	0 días	mar 10/7/18	mar 10/7/18	1496																		
1498	➔	Presentación de timbres fiscales y garantía de cumplimiento	0 días	mar 10/7/18	mar 10/7/18	1497																		
1499	➔	<b>Trámite del Pedido</b>	<b>3 días</b>	<b>mié 11/7/18</b>	<b>vie 13/7/18</b>																			
1500	➔	Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mié 11/7/18	mié 11/7/18	1499																		
1501	➔	Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	1 día	jue 12/7/18	jue 12/7/18	1500																		
1502	➔	Notificación de Pedido de Compra	1 día	vie 13/7/18	vie 13/7/18	1501																		

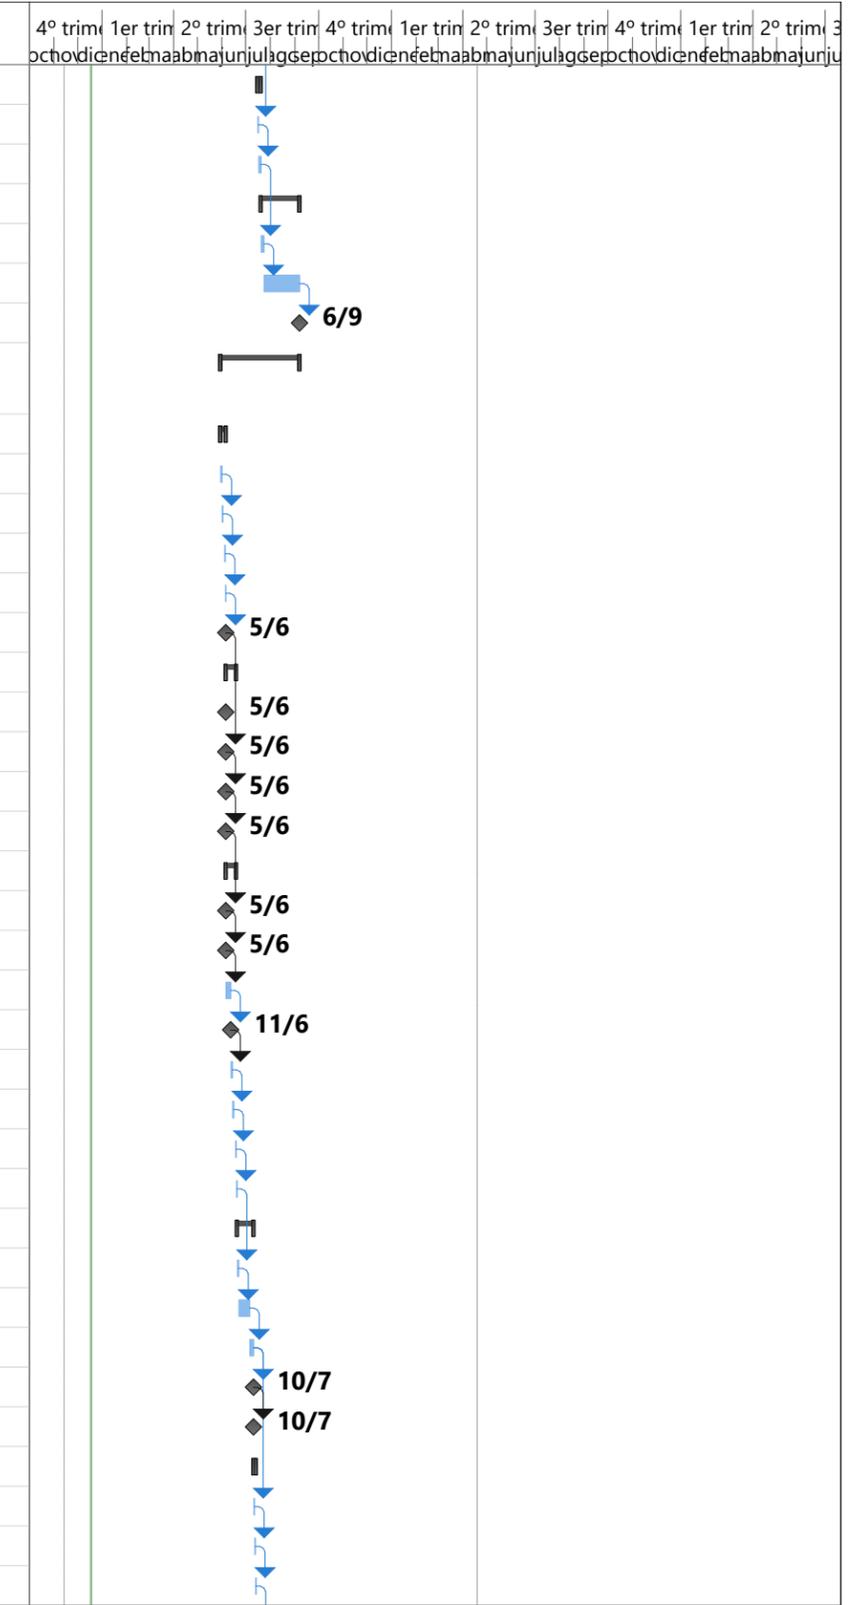

Proyecto: Cronograma de comp Fecha: lun 18/12/17	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	4° trim och	1er trin di	2° trin ene	3er trin feb	4° trin mar	1er trin abr	2° trin may	3er trin jun	4° trin jul	1er trin ago	2° trin sep	3er trin oct	4° trin nov	1er trin dic
1541		<b>Recepción de los items</b>	<b>4 días</b>	<b>jue 8/2/18</b>	<b>mar 13/2/18</b>															
1542		Entrega de los bienes/servicios	1 día	jue 8/2/18	jue 8/2/18	1540														
1543		Recibido a satisfacción	3 días	vie 9/2/18	mar 13/2/18	1542														
1544		<b>Trámite de pago</b>	<b>32 días</b>	<b>mié 14/2/18</b>	<b>jue 5/4/18</b>															
1545		Envío documentos a Financiero	2 días	mié 14/2/18	jue 15/2/18	1543														
1546		Emisión de pago en Financiero	30 días	vie 16/2/18	jue 5/4/18	1545														
1547		Conclusión trámite de Contratación	0 días	jue 5/4/18	jue 5/4/18	1546														
1548		<b>2018CD-0000015-503 DFOE_Consultor Presupuesto por resultados (Inicia el 28/02/18; Con Revocatoria) \$3,000.000,00</b>	<b>69 días</b>	<b>mié 30/5/18</b>	<b>jue 6/9/18</b>															
1549		<b>Elaboración de Cartel</b>	<b>5 días</b>	<b>mié 30/5/18</b>	<b>mar 5/6/18</b>															
1550		Recepción Especificaciones técnicas y elaboracion del cartel (UGA)	2 días	mié 30/5/18	jue 31/5/18															
1551		Revisión Técnica de cartel	1 día	vie 1/6/18	vie 1/6/18	1550														
1552		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	lun 4/6/18	lun 4/6/18	1551														
1553		Confección de cartel definitivo	1 día	mar 5/6/18	mar 5/6/18	1552														
1554		Invitación a participar en Mer- Link	0 días	mar 5/6/18	mar 5/6/18	1553														
1555		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>mar 5/6/18</b>	<b>lun 18/6/18</b>															
1556		<b>Invitación a participar</b>	<b>0 días</b>	<b>mar 5/6/18</b>	<b>mar 5/6/18</b>															
1557		Envío de invitación	0 días	mar 5/6/18	mar 5/6/18	1554														
1558		Objeción al cartel	0 días	mar 5/6/18	mar 5/6/18	1557														
1559		Nuevo plazo para recibir ofertas	0 días	mar 5/6/18	mar 5/6/18	1558														
1560		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>mar 5/6/18</b>	<b>lun 18/6/18</b>															
1561		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	mar 5/6/18	mar 5/6/18	1559														
1562		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	mar 5/6/18	mar 5/6/18	1561														
1563		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	mié 6/6/18	lun 11/6/18	1562														
1564		Envío de prevenciones	0 días	lun 11/6/18	lun 11/6/18	1563														
1565		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	mar 12/6/18	mié 13/6/18	1564														
1566		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	jue 14/6/18	vie 15/6/18	1565														
1567		Elaboración de Informe Técnico	1 día	lun 18/6/18	lun 18/6/18	1566														
1568		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	mar 19/6/18	mar 19/6/18	1567														
1569		<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>15 días</b>	<b>mié 20/6/18</b>	<b>mar 10/7/18</b>															
1570		Plazo para recibir recurso	2 días	mié 20/6/18	jue 21/6/18	1568														
1571		Resolución de Recurso de revocatoria	10 días	vie 22/6/18	jue 5/7/18	1570														
1572		Adjudicación en firme	3 días	vie 6/7/18	mar 10/7/18	1571														
1573		Solicitud de garantía de cumplimiento y especies fiscales	0 días	mar 10/7/18	mar 10/7/18	1572														
1574		Presentación de timbres fiscales y garantía de cumplimiento	0 días	mar 10/7/18	mar 10/7/18	1573														
1575		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>3 días</b>	<b>mié 11/7/18</b>	<b>vie 13/7/18</b>															
1576		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mié 11/7/18	mié 11/7/18	1572														
1577		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	1 día	jue 12/7/18	jue 12/7/18	1576														
1578		Notificación de Pedido de Compra	1 día	vie 13/7/18	vie 13/7/18	1577														

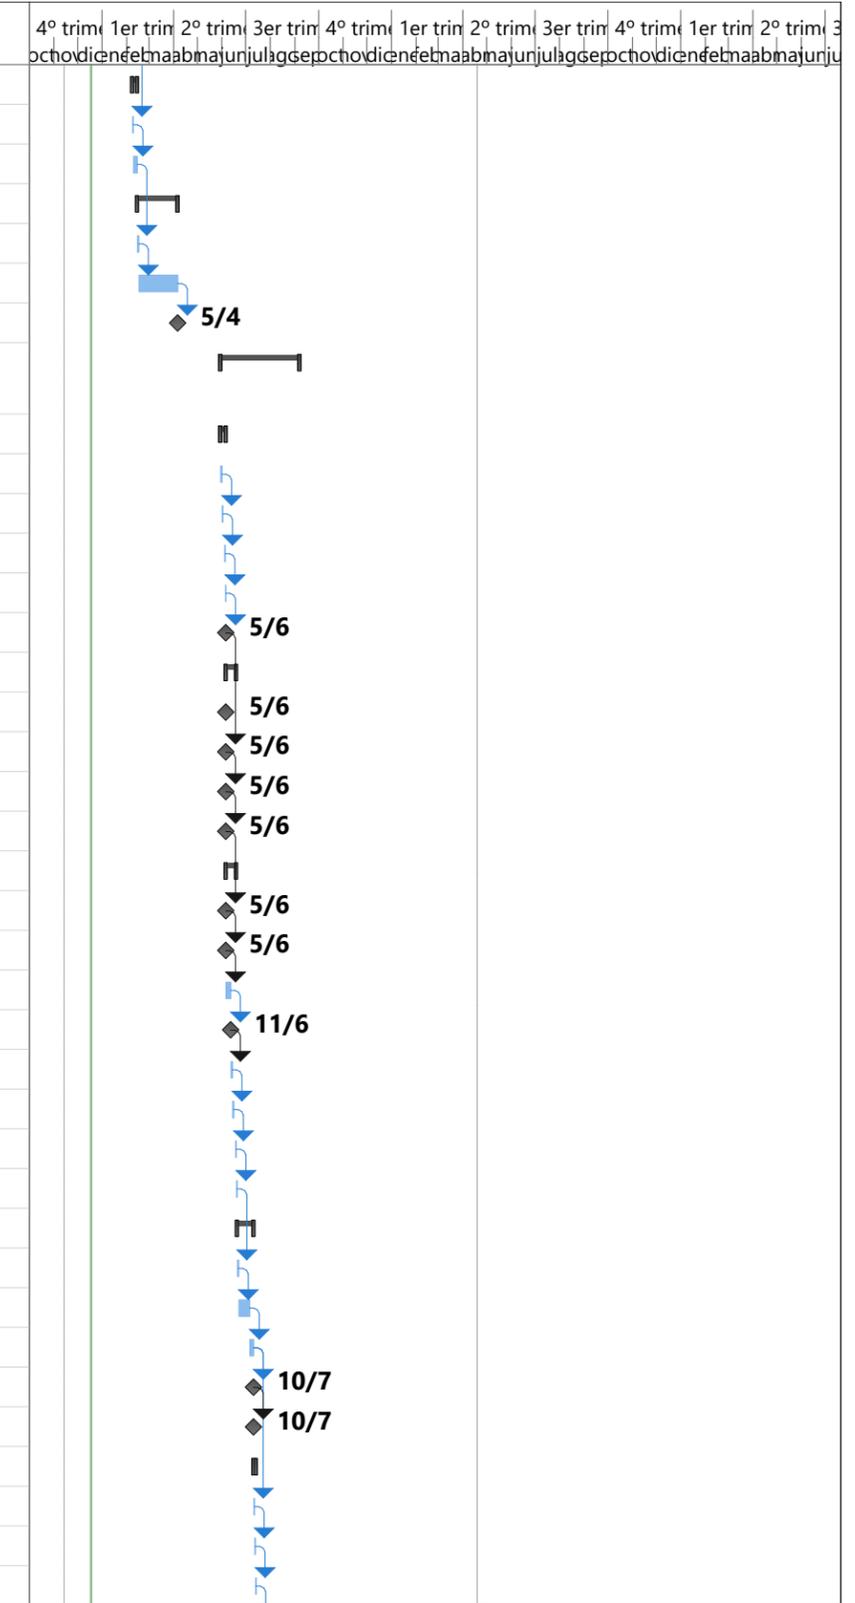

Proyecto: Cronograma de comp Fecha: lun 18/12/17	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	4° trim oct	1er trim nov	2° trim ene	3er trim feb	4° trim mar	1er trim abr	2° trim may	3er trim jun	4° trim jul	1er trim ago	2° trim sep	3er trim oct	4° trim nov	1er trim dic
1617		<b>Recepción de los items</b>	<b>4 días</b>	<b>jue 8/2/18</b>	<b>mar 13/2/18</b>															
1618		Entrega de los bienes/servicios	1 día	jue 8/2/18	jue 8/2/18	1616														
1619		Recibido a satisfacción	3 días	vie 9/2/18	mar 13/2/18	1618														
1620		<b>Trámite de pago</b>	<b>32 días</b>	<b>mié 14/2/18</b>	<b>jue 5/4/18</b>															
1621		Envío documentos a Financiero	2 días	mié 14/2/18	jue 15/2/18	1619														
1622		Emisión de pago en Financiero	30 días	vie 16/2/18	jue 5/4/18	1621														
1623		Conclusión trámite de Contratación	0 días	jue 5/4/18	jue 5/4/18	1622														
1624		<b>DIVISIÓN JURÍDICA</b>	<b>85,5 días</b>	<b>lun 22/1/18</b>	<b>mié 30/5/18</b>															
1625		<b>2018CD-000010-503_DJ_Servicios de filología_ Contrato vence en abril 2018_ ¢500.000/año; ¢2,000.000/4 años</b>	<b>85,5 días</b>	<b>lun 22/1/18</b>	<b>mié 30/5/18</b>															
1626		<b>Elaboración de Cartel</b>	<b>5,5 días</b>	<b>lun 22/1/18</b>	<b>lun 29/1/18</b>															
1627		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 22/1/18	lun 22/1/18															
1628		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 22/1/18	mar 23/1/18	1627														
1629		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 24/1/18	mié 24/1/18	1628														
1630		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 25/1/18	jue 25/1/18	1629														
1631		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 26/1/18	vie 26/1/18	1630														
1632		Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 29/1/18	lun 29/1/18	1631														
1633		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>13 días</b>	<b>lun 29/1/18</b>	<b>jue 15/2/18</b>															
1634		<b>Invitación a participar</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 29/1/18</b>	<b>lun 5/2/18</b>															
1635		Invitación	5 días	lun 29/1/18	lun 5/2/18	1632														
1636		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	0 días	lun 29/1/18	lun 29/1/18	1635CC														
1637		Resolver recurso de Objeción al cartel	0 días	lun 29/1/18	lun 29/1/18	1636														
1638		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	lun 29/1/18	vie 2/2/18	1637														
1639		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>vie 2/2/18</b>	<b>jue 15/2/18</b>															
1640		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	vie 2/2/18	vie 2/2/18	1638														
1641		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	vie 2/2/18	vie 2/2/18	1640														
1642		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	vie 2/2/18	jue 8/2/18	1641														
1643		Envío de prevenciones	0 días	jue 8/2/18	jue 8/2/18	1642														
1644		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	jue 8/2/18	lun 12/2/18	1643														
1645		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	lun 12/2/18	mié 14/2/18	1644														
1646		Elaboración de Informe Técnico	1 día	mié 14/2/18	jue 15/2/18	1645														
1647		<b>Recomendación, adjudicación y comunicación</b>	<b>12 días</b>	<b>jue 15/2/18</b>	<b>lun 5/3/18</b>															
1648		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	jue 15/2/18	vie 16/2/18	1646														
1649		<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>9 días</b>	<b>vie 16/2/18</b>	<b>jue 1/3/18</b>															
1650		Plazo para recibir recurso	2 días	vie 16/2/18	mar 20/2/18	1648														
1651		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mar 20/2/18	jue 22/2/18	1650														
1652		Plazo para audiencia inicial	2 días	jue 22/2/18	lun 26/2/18	1651														
1653		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	lun 26/2/18	jue 1/3/18	1652														
1654		Adjudicación en firme	2 días	jue 1/3/18	lun 5/3/18	1653														

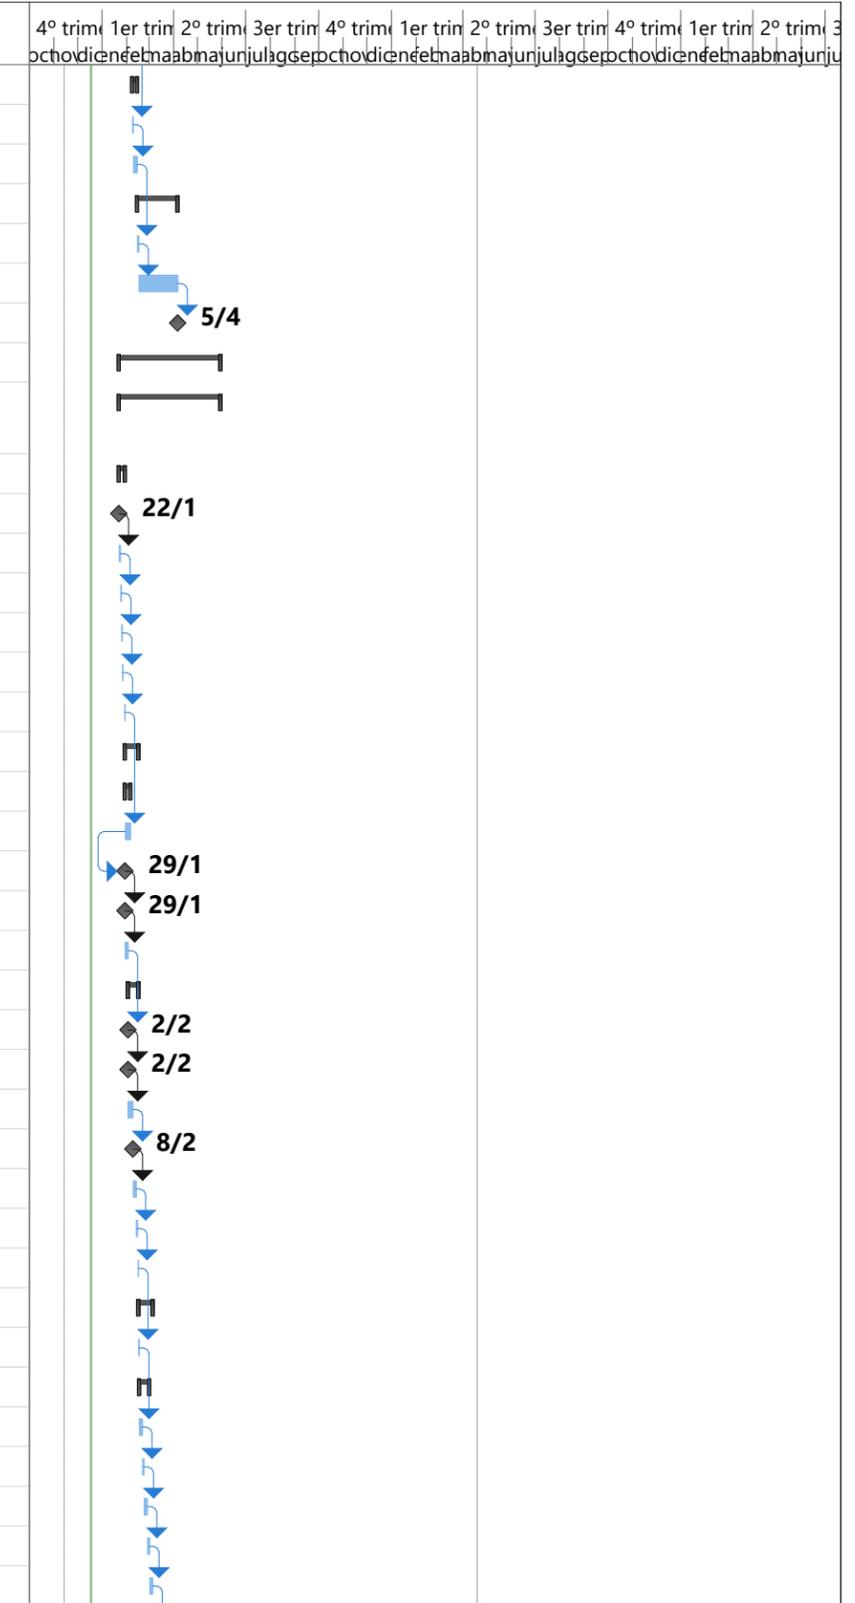

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: lun 18/12/17

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			












Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	4° trim 1er trin 2° trim 3er trin 4° trim 1er trin 2° trim 3er trin 4° trim 1er trin 2° trim 3															
							ochovdicnefebnaabmajunjulaggepochovdicnefebnaabmajunjulaggepochovdicnefebnaabmajunju			ochovdicnefebnaabmajunjulaggepochovdicnefebnaabmajunjulaggepochovdicnefebnaabmajunju			ochovdicnefebnaabmajunjulaggepochovdicnefebnaabmajunjulaggepochovdicnefebnaabmajunju			ochovdicnefebnaabmajunjulaggepochovdicnefebnaabmajunjulaggepochovdicnefebnaabmajunju						
1836		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	mié 31/1/18	jue 1/2/18	1834																
1837		Envío de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	jue 1/2/18	jue 1/2/18	1836																
1838		Visado de pedido en la UAF	3 días	vie 2/2/18	mar 6/2/18	1837																
1839		Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	mié 7/2/18	mié 7/2/18	1838																
1840		Notificación de Pedido de Compra	0 días	mié 7/2/18	mié 7/2/18	1839																
1841		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mié 7/2/18	mié 7/2/18	1840																
1842		<b>Recepción de los items</b>	<b>3 días</b>	<b>mié 15/11/17</b>	<b>lun 20/11/17</b>																	
1843		Entrega de los bienes/servicios	0 días	mié 15/11/17	mié 15/11/17																	
1844		Recibido a satisfacción	3 días	mié 15/11/17	lun 20/11/17	1843																
1845		Fin recepción de items	0 días	lun 20/11/17	lun 20/11/17	1844																
1846		<b>2017CD-000005-0005400001_ DFOE_Consultor Lean Six Sigma (Inicia 15/12/18)</b> <b>€2,640.000,00</b>	<b>26 días</b>	<b>lun 15/1/18</b>	<b>lun 19/2/18</b>																	
1847		Elaboración de solicitud de contratacion	5 días	lun 15/1/18	vie 19/1/18																	
1848		Envío de solicitud a la USP	1 día	lun 22/1/18	lun 22/1/18	1847																
1849		Oficio a empresa preguntando si mantiene términos y condiciones	1 día	mar 23/1/18	mar 23/1/18	1848																
1850		Plazo para que la empresa conteste	3 días	mié 24/1/18	vie 26/1/18	1849																
1851		Elaboración de Resolución Administrativa	3 días	lun 29/1/18	mié 31/1/18	1850																
1852		Revisión y firma de Resolución	3 días	jue 1/2/18	lun 5/2/18	1851																
1853		Notificacion de resolución	1 día	mar 6/2/18	mar 6/2/18	1852																
1854		<b>Pedido de compra</b>	<b>6 días</b>	<b>mié 7/2/18</b>	<b>mié 14/2/18</b>																	
1861		<b>Recepción de los items</b>	<b>3 días</b>	<b>mié 14/2/18</b>	<b>lun 19/2/18</b>																	
1862		Entrega de los bienes/servicios	0 días	mié 14/2/18	mié 14/2/18	1860;1841																
1863		Recibido a satisfacción	3 días	jue 15/2/18	lun 19/2/18	1862																
1864		Fin recepción de items	0 días	lun 19/2/18	lun 19/2/18	1863																
1865		<b>REGLAMENTO DE ESPECIALISTAS AUTORIZADO POR LA DCA</b>	<b>17 días</b>	<b>lun 8/1/18</b>	<b>mar 30/1/18</b>																	

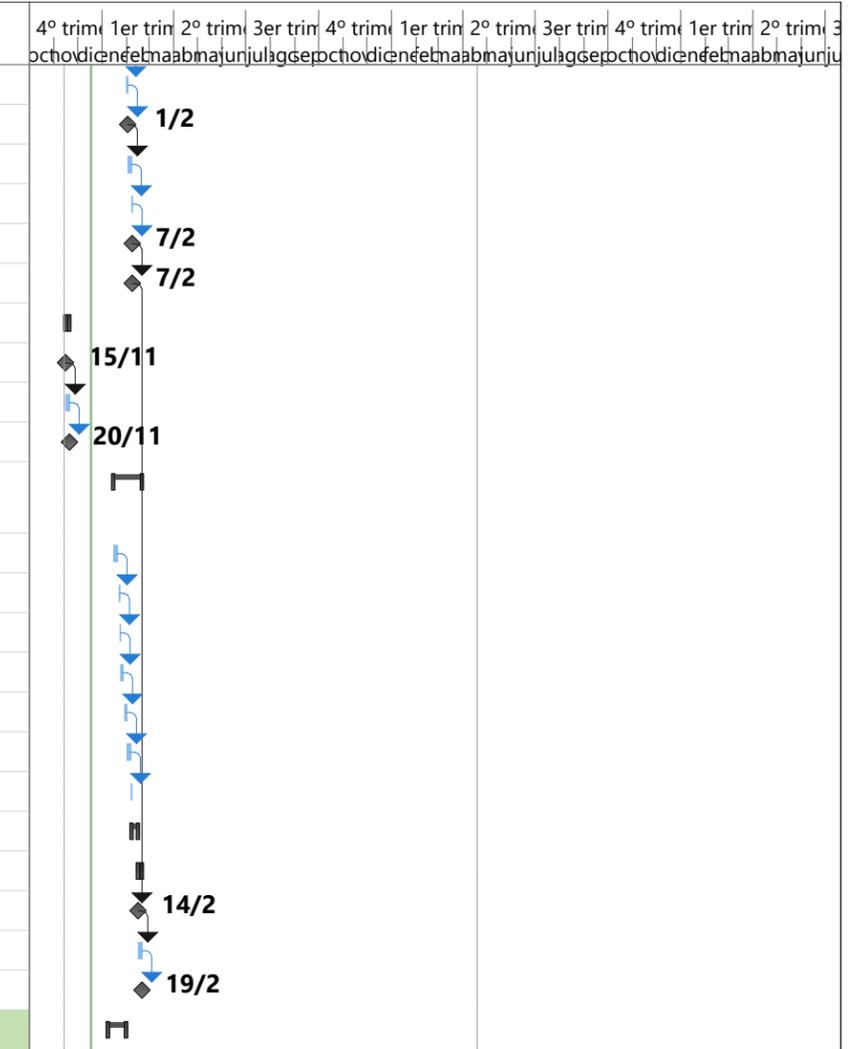

Proyecto: Cronograma de comp Fecha: lun 18/12/17	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			
