





Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre				1er semestre				1er semestre				
							jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr	jul
35		Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion de admisibilidad	1 día	vie 29/3/19	vie 29/3/19	34													
36		Estudio y valoración de las ofertas (incluye reunión de admisibilidad)	10 días	lun 1/4/19	lun 22/4/19	35													
37		Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenciones	0 días	lun 22/4/19	lun 22/4/19	36													
38		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En Mer-Link)	5 días	mar 23/4/19	lun 29/4/19	37													
39		Envío de las respuestas de proveedores a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	lun 29/4/19	lun 29/4/19	38													
40		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	5 días	mar 30/4/19	mar 7/5/19	39													
41		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	5 días	mié 8/5/19	mar 14/5/19	40													
42		Elaboración de Informe de recomendación (UT)	5 días	mié 15/5/19	mar 21/5/19	41													
43		<b>Recomendación, adjudicación y comunicación</b>	<b>16,5 días</b>	<b>mié 22/5/19</b>	<b>jue 13/6/19</b>														
44		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mié 22/5/19	vie 24/5/19	42													
45		Sesión de la Comision de Adjuducaciones	0,5 días	lun 27/5/19	lun 27/5/19	44													
46		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	1 día	lun 27/5/19	mar 28/5/19	45													
47		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mar 28/5/19	mié 29/5/19	46													
48		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicación (Mer Link)	1 día	mié 29/5/19	jue 30/5/19	47													
49		Firmeza del acto de adjudicación	10 días	jue 30/5/19	jue 13/6/19	48													
50		<b>Plazo para recibir recurso (Art 182 RLCA)</b>	<b>10 días</b>	<b>jue 30/5/19</b>	<b>jue 13/6/19</b>														
51		Plazo para recibir recurso (Art 182 RLCA)	10 días	jue 30/5/19	jue 13/6/19	48													
52		<b>Recurso de apelación (DCA)</b>	<b>55 días?</b>	<b>jue 13/6/19</b>	<b>mar 3/9/19</b>														
53		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisibile (Art 177 RLCA)	1 día?	jue 13/6/19	vie 14/6/19	51													
54		Notificacion al Adjudicatario y a la administración del recurso	1 día	vie 14/6/19	lun 17/6/19	53													
55		Plazo para recibir respuesta del adjudicatario y de la administración (Art190 RLCA)	10 días	lun 17/6/19	lun 1/7/19	54													
56		Elaboracion de la resolucion final de la apelación	40 días	lun 1/7/19	jue 29/8/19	55													
57		Notificacion de la resolución (Mer Link)	3 días	jue 29/8/19	mar 3/9/19	56													
58		<b>Comisión de adjudicaciones</b>	<b>16,5 días?</b>	<b>mar 3/9/19</b>	<b>mié 25/9/19</b>														
59		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mar 3/9/19	vie 6/9/19	57													
60		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	vie 6/9/19	vie 6/9/19	59													
61		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	1 día	lun 9/9/19	lun 9/9/19	60													
62		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día?	mar 10/9/19	mar 10/9/19	61													
63		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicación (Mer Link)	1 día	mié 11/9/19	mié 11/9/19	62													
64		Adjudicación en firme	10 días	jue 12/9/19	mié 25/9/19	63													
65		<b>Trámite de contrato</b>	<b>26 días</b>	<b>jue 26/9/19</b>	<b>jue 31/10/19</b>														
66		Elaboración del Contrato	5 días	jue 26/9/19	mié 2/10/19	64													

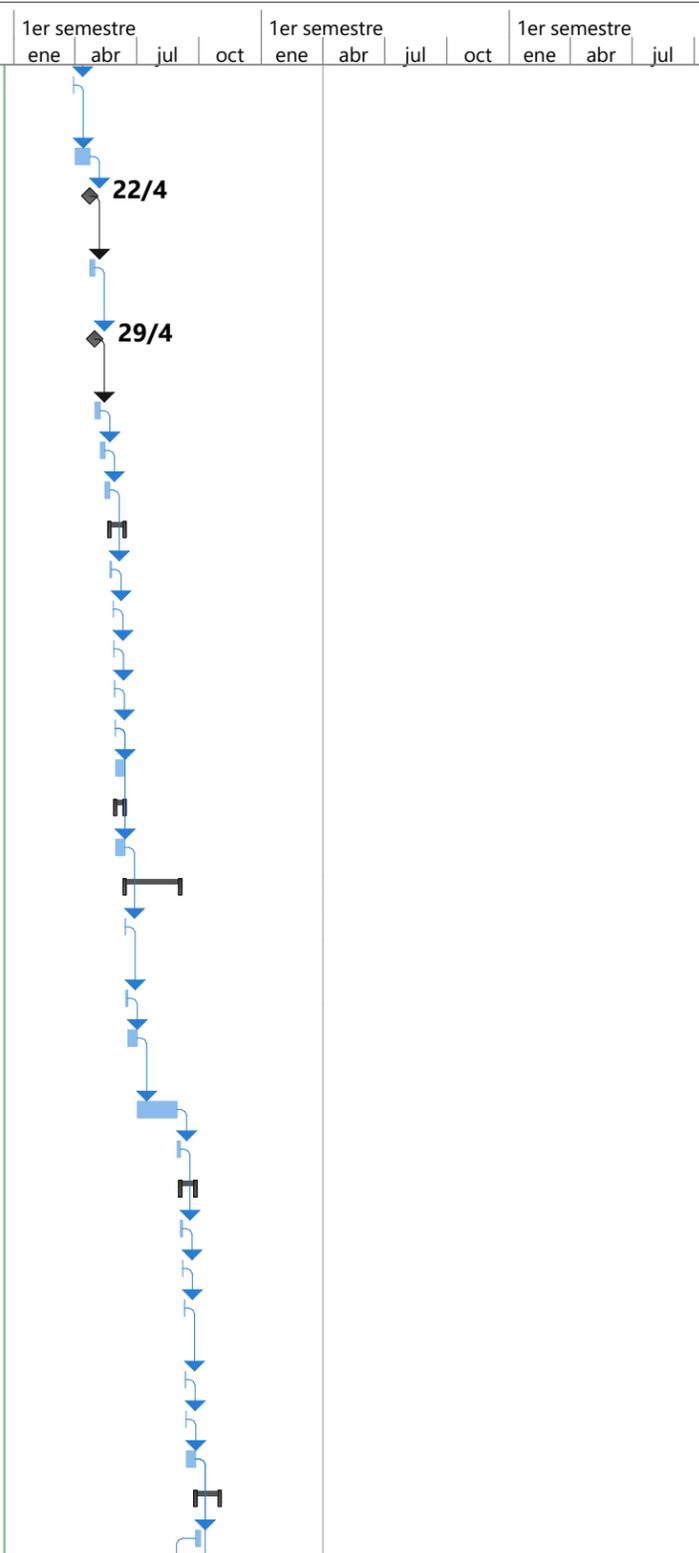

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: mar 18/12/18

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre		1er semestre		1er semestre	
							ene	abr	ene	abr	ene	abr
67		Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	jue 26/9/19	jue 26/9/19	66CC						
68		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	vie 27/9/19	jue 3/10/19	67						
69		Firma de contrato oferente	3 días	vie 4/10/19	mar 8/10/19	64;68						
70		Envío de contrato para firma a Gerencia de Gestión de Apoyo	1 día	mié 9/10/19	mié 9/10/19	69						
71		Firma de contrato	5 días	jue 10/10/19	mié 16/10/19	70						
72		Envío de contrato a Refrendo Interno a la UJI	1 día	jue 17/10/19	jue 17/10/19	71						
73		Refrendo del Contrato	10 días	vie 18/10/19	jue 31/10/19	72						
74		Comunicación a la (las) empresa del refendo del contrato y orden de inicio	0 días	jue 31/10/19	jue 31/10/19	73						
75		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>5 días</b>	<b>vie 1/11/19</b>	<b>jue 7/11/19</b>							
76		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	vie 1/11/19	lun 4/11/19	74						
77		Envío de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	lun 4/11/19	lun 4/11/19	76						
78		Devolución de pedido a Proveeduría	3 días	mar 5/11/19	jue 7/11/19	77						
79		Notificación de Pedido de Compra	0 días	jue 7/11/19	jue 7/11/19	78						
80		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	jue 7/11/19	jue 7/11/19	79						
81		<b>Recepción de los items</b>	<b>4 días</b>	<b>jue 7/11/19</b>	<b>mié 13/11/19</b>							
82		Trámite de exoneración de bienes	0 días	jue 7/11/19	jue 7/11/19	80						
83		Entrega de los bienes/servicios	1 día	vie 8/11/19	vie 8/11/19	82						
84		Recibido a satisfacción	3 días	lun 11/11/19	mié 13/11/19	83						
85		Fin recepción de items	0 días	mié 13/11/19	mié 13/11/19	84						
86		<b>Trámite de pago</b>	<b>36 días</b>	<b>jue 14/11/19</b>	<b>jue 16/1/20</b>							
87		Envío documentos a Financiero	1 día	jue 14/11/19	jue 14/11/19	85						
88		Emisión de pago en Financiero	5 días	vie 15/11/19	jue 21/11/19	87						
89		Pago de Tesorería Nacional	30 días	vie 22/11/19	jue 16/1/20	88						
90		Conclusión trámite licitación	0 días	jue 16/1/20	jue 16/1/20	89						
91		<b>UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (UTI)</b>	<b>283 días?</b>	<b>vie 1/2/19</b>	<b>mar 31/3/20</b>							
92		<b>2019LN-000002-0005400001; Compra de equipos para la implementación de una nube privada; invitar en diciembre 2018, €119,205.000 / 1er año</b>	<b>283 días?</b>	<b>vie 1/2/19</b>	<b>mar 31/3/20</b>							
93		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	vie 1/2/19	vie 1/2/19							
94		<b>Confección Documento complementario al cartel</b>	<b>17 días</b>	<b>vie 1/2/19</b>	<b>lun 25/2/19</b>							
95		Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	vie 1/2/19	jue 7/2/19	93						
96		Revisión Jurídica de cartel UJI	7 días	vie 8/2/19	lun 18/2/19	95						
97		Revisión Técnica de cartel	7 días	vie 8/2/19	lun 18/2/19	95						
98		Incorporación de ajustes y confección de Documento complementario al cartel	5 días	mar 19/2/19	lun 25/2/19	97						
99		<b>Invitación a participar</b>	<b>11 días</b>	<b>mar 26/2/19</b>	<b>mar 12/3/19</b>							
100		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de Mer Link	5 días	mar 26/2/19	lun 4/3/19	98						
101		Elaboración de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	mar 5/3/19	lun 11/3/19	100						

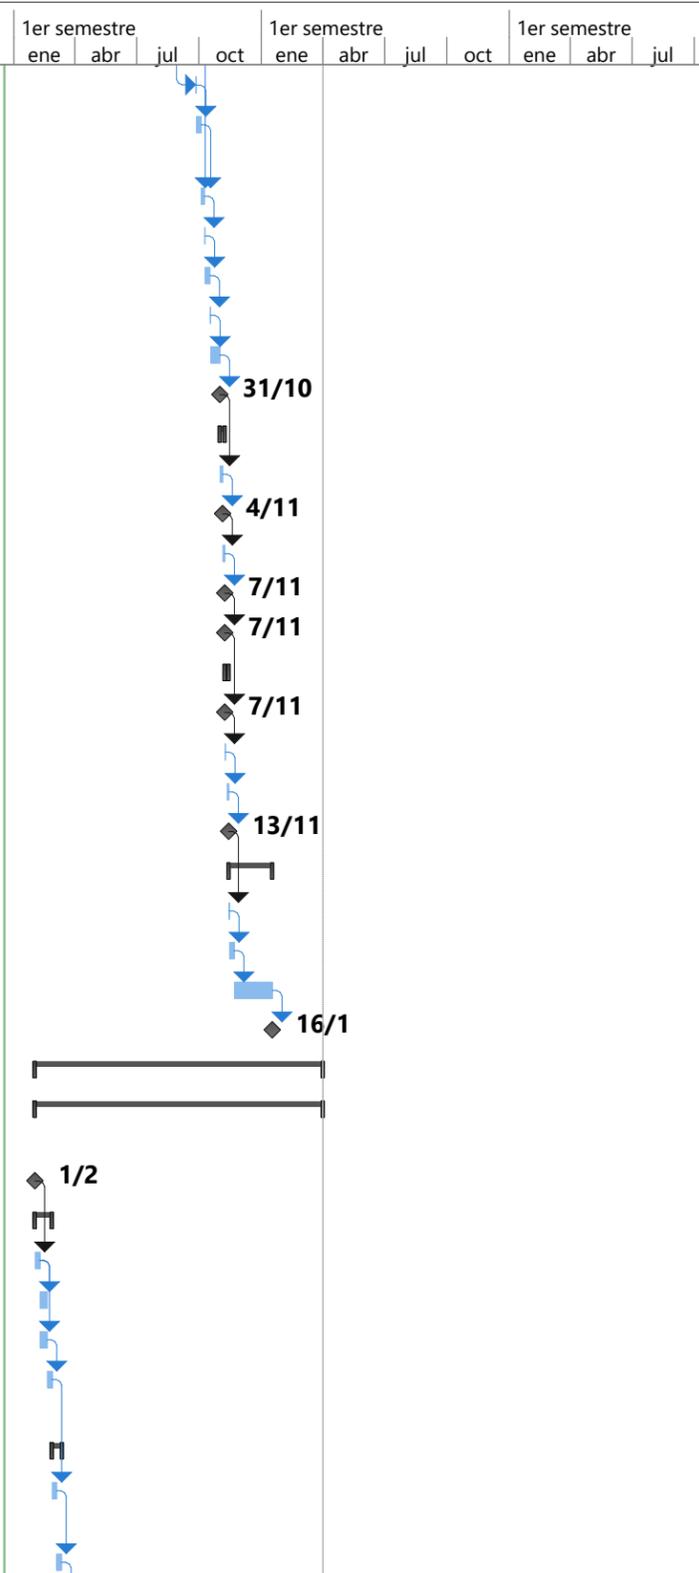

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: mar 18/12/18

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	jul		1er semestre		1er semestre		1er semestre				
							oct	ene	abr	ene	abr	ene	abr	jul			
102		Invitación a participar en Mer Link	1 día	mar 12/3/19	mar 12/3/19	101											
103		<b>Plazo para recibir ofertas</b>	<b>22 días</b>	<b>mié 13/3/19</b>	<b>vie 12/4/19</b>												
104		Plazo para recibir ofertas	22 días	mié 13/3/19	vie 12/4/19	102											
105		<b>Presentacion de Objeción al cartel</b>	<b>7 días</b>	<b>mar 12/3/19</b>	<b>mié 20/3/19</b>												
106		Presentacion de Objeción al cartel	7 días	mar 12/3/19	mié 20/3/19	102CC											
107		<b>Recurso de Objeción al Cartel</b>	<b>12 días</b>	<b>jue 21/3/19</b>	<b>vie 5/4/19</b>												
108		Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	jue 21/3/19	jue 21/3/19	106											
109		La DCA solicita expediente administrativo a la USP y solicita criterio técnico acerca del recursos en mención.	1 día	vie 22/3/19	vie 22/3/19	108											
110		Respuesta con el criterio de la UT a la USP para ser enviado a la DCA	2 días	lun 25/3/19	mar 26/3/19	109											
111		Respuesta de la USP para ser enviado a la DCA	1 día	mié 27/3/19	mié 27/3/19	110											
112		Remisión del criterio técnico a la DCA	0 días	mar 26/3/19	mar 26/3/19	110											
113		Confeccion de Resolucion a la Objecion	5 días	mié 27/3/19	mar 2/4/19	112											
114		Comunicación de Resolucion final por medio de Mer Link	3 días	mié 3/4/19	vie 5/4/19	113											
115		<b>Enmiendas al Cartel</b>	<b>10 días</b>	<b>lun 8/4/19</b>	<b>lun 29/4/19</b>												
116		Enmiendas al Cartel	10 días	lun 8/4/19	lun 29/4/19	114											
117		<b>Nuevo plazo para recibir ofertas</b>	<b>22 días</b>	<b>mar 30/4/19</b>	<b>jue 30/5/19</b>												
118		Nuevo plazo para recibir ofertas	22 días	mar 30/4/19	jue 30/5/19	116											
119		<b>Fecha máxima para adjudicar</b>	<b>88 días</b>	<b>vie 31/5/19</b>	<b>vie 4/10/19</b>												
120		Fecha máxima para adjudicar	88 días	vie 31/5/19	vie 4/10/19	118											
121		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>32 días</b>	<b>vie 31/5/19</b>	<b>lun 15/7/19</b>												
122		Apertura de ofertas	1 día	vie 31/5/19	vie 31/5/19	118											
123		Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion de admisibilidad	1 día	lun 3/6/19	lun 3/6/19	122											
124		Estudio y valoración de las ofertas (incluye reunión de admisibilidad)	10 días	mar 4/6/19	lun 17/6/19	123											
125		Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenciones	0 días	lun 17/6/19	lun 17/6/19	124											
126		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En Mer-Link)	5 días	mar 18/6/19	lun 24/6/19	125											
127		Envío de las respuestas de proveedores a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	lun 24/6/19	lun 24/6/19	126											
128		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	5 días	mar 25/6/19	lun 1/7/19	127											
129		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	5 días	mar 2/7/19	lun 8/7/19	128											
130		Elaboración de Informe de recomendación (UT)	5 días	mar 9/7/19	lun 15/7/19	129											
131		<b>Recomendación, adjudicación y comunicación</b>	<b>16,5 días</b>	<b>mar 16/7/19</b>	<b>vie 9/8/19</b>												
132		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mar 16/7/19	jue 18/7/19	130											
133		Sesión de la Comision de Adjuducaciones	0,5 días	vie 19/7/19	vie 19/7/19	132											
134		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	1 día	vie 19/7/19	lun 22/7/19	133											
135		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	lun 22/7/19	mar 23/7/19	134											

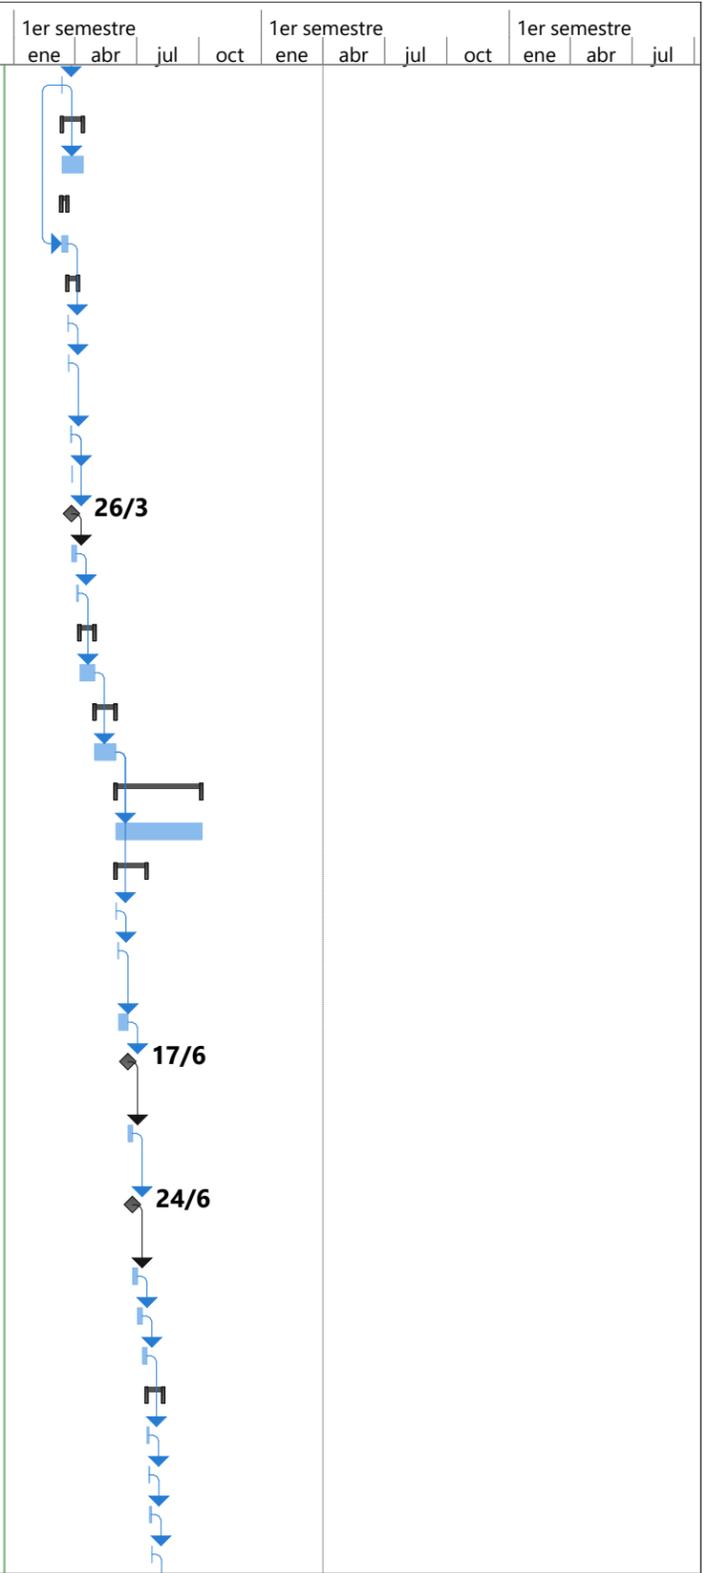

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: mar 18/12/18

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre		1er semestre		1er semestre	
							ene	abr	ene	abr	ene	abr
136		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicación (Mer Link)	1 día	mar 23/7/19	mié 24/7/19	135						
137		Firmeza del acto de adjudicación	10 días	mié 24/7/19	vie 9/8/19	136						
138		<b>Plazo para recibir recurso (Art 182 RLCA)</b>	<b>10 días</b>	<b>mié 24/7/19</b>	<b>vie 9/8/19</b>							
139		Plazo para recibir recurso (Art 182 RLCA)	10 días	mié 24/7/19	vie 9/8/19	136						
140		<b>Recurso de apelación (DCA)</b>	<b>55 días?</b>	<b>vie 9/8/19</b>	<b>lun 28/10/19</b>							
141		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisibile (Art 177 RLCA)	1 día?	vie 9/8/19	lun 12/8/19	139						
142		Notificacion al Adjudicatario y a la administración del recurso	1 día	lun 12/8/19	mar 13/8/19	141						
143		Plazo para recibir respuesta del adjudicatario y de la administración (Art190 RLCA)	10 días	mar 13/8/19	mié 28/8/19	142						
144		Elaboracion de la resolucio final de la apelación	40 días	mié 28/8/19	mié 23/10/19	143						
145		Notificacion de la resolución (Mer Link)	3 días	mié 23/10/19	lun 28/10/19	144						
146		<b>Comisión de adjudicaciones</b>	<b>16,5 días?</b>	<b>lun 28/10/19</b>	<b>mar 19/11/19</b>							
147		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	lun 28/10/19	jue 31/10/19	145						
148		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 31/10/19	jue 31/10/19	147						
149		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	1 día	vie 1/11/19	vie 1/11/19	148						
150		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día?	lun 4/11/19	lun 4/11/19	149						
151		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicación (Mer Link)	1 día	mar 5/11/19	mar 5/11/19	150						
152		Adjudicación en firme	10 días	mié 6/11/19	mar 19/11/19	151						
153		<b>Trámite de contrato</b>	<b>26 días</b>	<b>mié 20/11/19</b>	<b>mié 8/1/20</b>							
154		Elaboración del Contrato	5 días	mié 20/11/19	mar 26/11/19	152						
155		Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	mié 20/11/19	mié 20/11/19	154CC						
156		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	jue 21/11/19	mié 27/11/19	155						
157		Firma de contrato oferente	3 días	jue 28/11/19	lun 2/12/19	152;156						
158		Envío de contrato para firma a Gerencia de Gestión de Apoyo	1 día	mar 3/12/19	mar 3/12/19	157						
159		Firma de contrato	5 días	mié 4/12/19	mar 10/12/19	158						
160		Envío de contrato a Refrendo Interno a la UJI	1 día	mié 11/12/19	mié 11/12/19	159						
161		Refrendo del Contrato	10 días	jue 12/12/19	mié 8/1/20	160						
162		Comunicación a la (las) empresa del refendo del contrato y orden de inicio	0 días	mié 8/1/20	mié 8/1/20	161						8/1
163		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>5 días</b>	<b>jue 9/1/20</b>	<b>mié 15/1/20</b>							
164		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	jue 9/1/20	vie 10/1/20	162						
165		Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	vie 10/1/20	vie 10/1/20	164						10/1
166		Devolución de pedido a Proveeduría	3 días	lun 13/1/20	mié 15/1/20	165						
167		Notificación de Pedido de Compra	0 días	mié 15/1/20	mié 15/1/20	166						15/1
168		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mié 15/1/20	mié 15/1/20	167						15/1
169		<b>Recepción de los items</b>	<b>18 días</b>	<b>jue 16/1/20</b>	<b>lun 10/2/20</b>							
170		<b>Trámite de exoneración de bienes</b>	<b>10 días</b>	<b>jue 16/1/20</b>	<b>mié 29/1/20</b>	<b>168</b>						

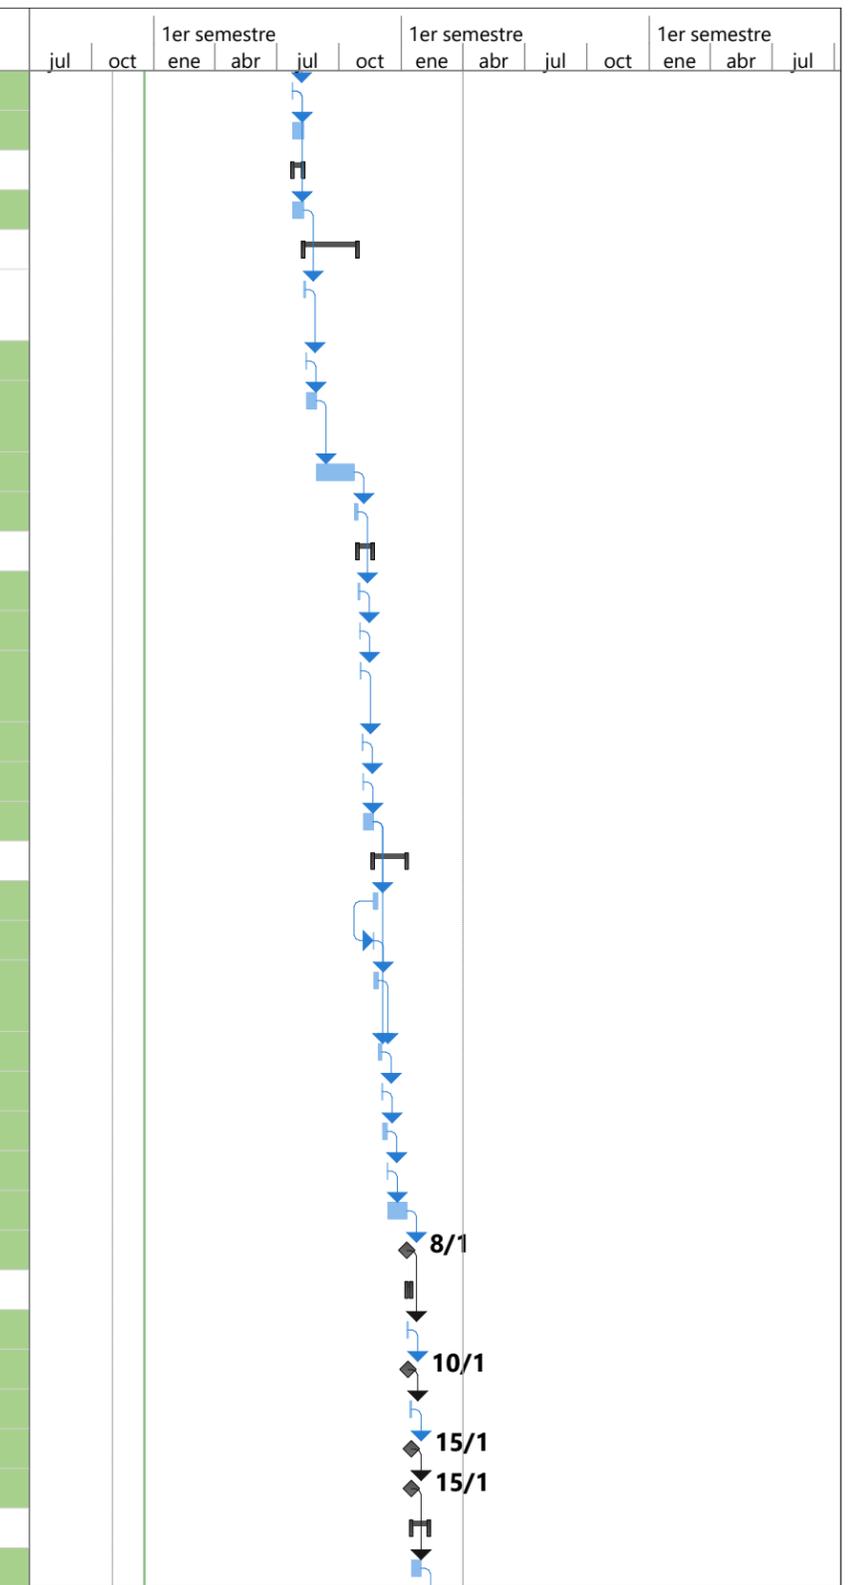


Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: mar 18/12/18

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre			1er semestre			1er semestre					
							ene	abr	jul	ene	abr	jul	ene	abr	jul			
205		Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion para entrega de prevenciones Outlook)	1 día	lun 18/2/19	lun 18/2/19	204												
206		<b>Estudio y valoración de las ofertas.</b>	<b>17 días</b>	<b>mar 19/2/19</b>	<b>mié 13/3/19</b>	<b>205</b>												
207		Admisibiliidad de ofertas (incluye reunión de admisibilidad)	5 días	mar 19/2/19	lun 25/2/19	205												
208		Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenciones	1 día	mar 26/2/19	mar 26/2/19	207												
209		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En Mer-Link)	5 días	mié 27/2/19	mar 5/3/19	208												
210		Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	mar 5/3/19	mar 5/3/19	209												
211		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mié 6/3/19	vie 8/3/19	210												
212		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	lun 11/3/19	mié 13/3/19	211												
213		<b>Informe de recomendación</b>	<b>5 días</b>	<b>jue 14/3/19</b>	<b>mié 20/3/19</b>													
214		Elaboración de Informe de recomendación	5 días	jue 14/3/19	mié 20/3/19	212												
215		<b>Recomendación, adjudicación y comunicación</b>	<b>11 días</b>	<b>jue 21/3/19</b>	<b>jue 4/4/19</b>													
216		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	jue 21/3/19	lun 25/3/19	214												
217		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mar 26/3/19	mar 26/3/19	216												
218		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mar 26/3/19	mar 26/3/19	217												
219		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mié 27/3/19	mié 27/3/19	218												
220		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	jue 28/3/19	jue 28/3/19	219												
221		Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	vie 29/3/19	jue 4/4/19	220												
222		<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>25 días</b>	<b>vie 29/3/19</b>	<b>lun 13/5/19</b>													
223		Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	vie 29/3/19	jue 4/4/19	220												
224		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisibile (Art N°186 RLCA)	2 días	vie 5/4/19	lun 8/4/19	223												
225		Notificación al Adjudicatario del recurso en caso de ser admisible	0 días	lun 8/4/19	lun 8/4/19	224												
226		Plazo para recibir respuesta del adjudicatario (Art N°194 RLCA)	3 días	mar 9/4/19	vie 12/4/19	225												
227		Elaboracion de la resolucio final de la revocatoria (Art N°195 RLCA)	15 días	lun 22/4/19	lun 13/5/19	226												
228		Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	lun 13/5/19	lun 13/5/19	227												
229		<b>Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones</b>	<b>6 días</b>	<b>mar 14/5/19</b>	<b>mar 21/5/19</b>	<b>228</b>												
230		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mar 14/5/19	mar 14/5/19													
231		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mar 14/5/19	mar 14/5/19	230												
232		Adjudicación en firme	5 días	mié 15/5/19	mar 21/5/19	223;231												
233		<b>Trámite de contrato</b>	<b>16 días</b>	<b>mar 14/5/19</b>	<b>mar 4/6/19</b>													
234		Elaboración del Contrato	5 días	mar 14/5/19	mar 21/5/19	230												
235		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	mar 14/5/19	mar 14/5/19	234CC												
236		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	mar 14/5/19	mar 21/5/19	235												
237		Firma de contrato oferente	1 día	mar 14/5/19	mar 14/5/19	228												

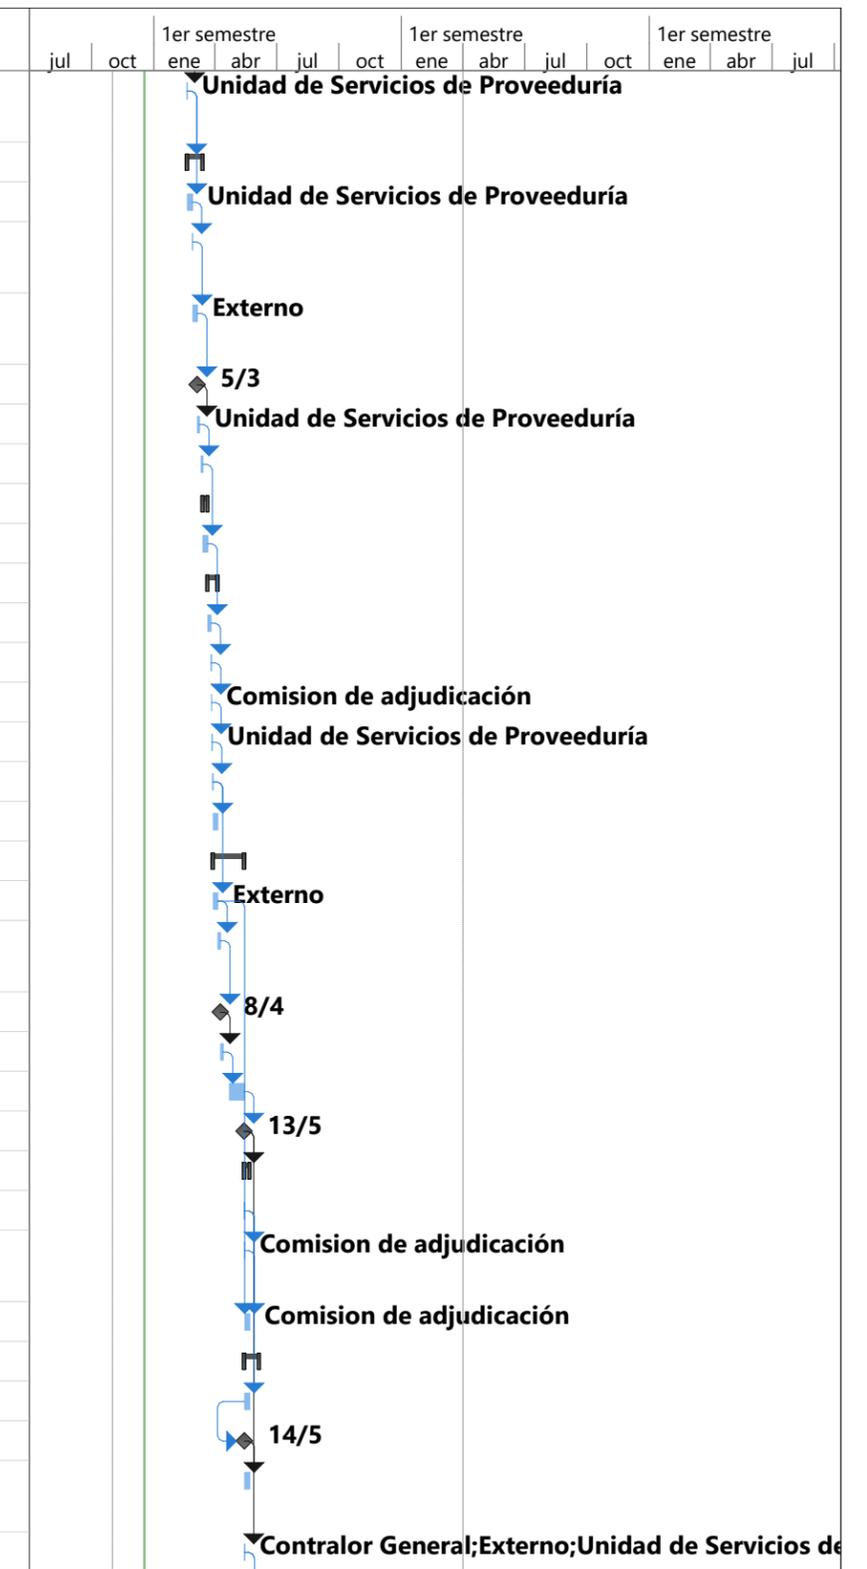


Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: mar 18/12/18

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			





Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre															
							jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr	jul			
309		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 31/7/19	mié 31/7/19																	
310		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 31/7/19	mié 31/7/19	309																
311		Adjudicación en firme	5 días	jue 1/8/19	jue 8/8/19	302;310																
312		<b>Trámite de contrato</b>	<b>16 días</b>	<b>mié 31/7/19</b>	<b>vie 23/8/19</b>																	
313		Elaboración del Contrato	5 días	mié 31/7/19	jue 8/8/19	309																
314		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	mié 31/7/19	mié 31/7/19	313CC																
315		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	mié 31/7/19	jue 8/8/19	314																
316		Firma de contrato oferente	1 día	mié 31/7/19	mié 31/7/19	307																
317		Envío de contrato para firma Gerente de División de Apoyo	0 días	mié 31/7/19	mié 31/7/19	316																
318		Firma de contrato	5 días	jue 1/8/19	jue 8/8/19	317																
319		Envío de contrato a aprobación interna	0 días	jue 8/8/19	jue 8/8/19	316;318																
320		Aprobación Interna de Contrato	10 días	vie 9/8/19	vie 23/8/19	319																
321		Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	vie 23/8/19	vie 23/8/19	320																
322		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>6 días</b>	<b>lun 26/8/19</b>	<b>lun 2/9/19</b>																	
323		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	lun 26/8/19	mar 27/8/19	320																
324		Envío de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	mar 27/8/19	mar 27/8/19	323																
325		Visado de pedido en la UAF	3 días	mié 28/8/19	vie 30/8/19	324																
326		Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	lun 2/9/19	lun 2/9/19	325																
327		Notificación de Pedido de Compra	0 días	lun 2/9/19	lun 2/9/19	325;326																
328		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	lun 2/9/19	lun 2/9/19	327																
329		<b>Recepción de los items</b>	<b>23 días</b>	<b>mar 3/9/19</b>	<b>jue 3/10/19</b>																	
330		<b>Exoneración</b>	<b>10 días</b>	mar 3/9/19	lun 16/9/19	328																
331		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 17/9/19	lun 30/9/19	330																
332		Recibido a satisfacción	3 días	mar 1/10/19	jue 3/10/19	331																
333		Fin recepción de items	0 días	jue 3/10/19	jue 3/10/19	332																
334		<b>Trámite de pago</b>	<b>36 días</b>	<b>vie 4/10/19</b>	<b>vie 22/11/19</b>																	
335		Envío documentos a Financiero	1 día	vie 4/10/19	vie 4/10/19	333																
336		Emisión de pago en Financiero	5 días	lun 7/10/19	vie 11/10/19	335																
337		Pago de Tesorería Nacional	30 días	lun 14/10/19	vie 22/11/19	336																
338		Conclusión trámite licitación	0 días	vie 22/11/19	vie 22/11/19	337																
339		<b>2019LA-000004-000540-0001; Analizador de equipos de red; Contratado a junio 2019; €20,000.000 / 2019</b>	<b>150 días</b>	<b>vie 14/12/18</b>	<b>mié 7/8/19</b>																	
340		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	vie 14/12/18	vie 14/12/18																	
341		<b>Confección Documento complementario al cartel</b>	<b>17 días</b>	<b>vie 14/12/18</b>	<b>lun 21/1/19</b>																	
342		Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	vie 14/12/18	jue 20/12/18	340																
343		Revisión Jurídica de cartel UJI	5 días	vie 21/12/18	jue 10/1/19	342																
344		Revisión Técnica de cartel	7 días	vie 21/12/18	lun 14/1/19	342																

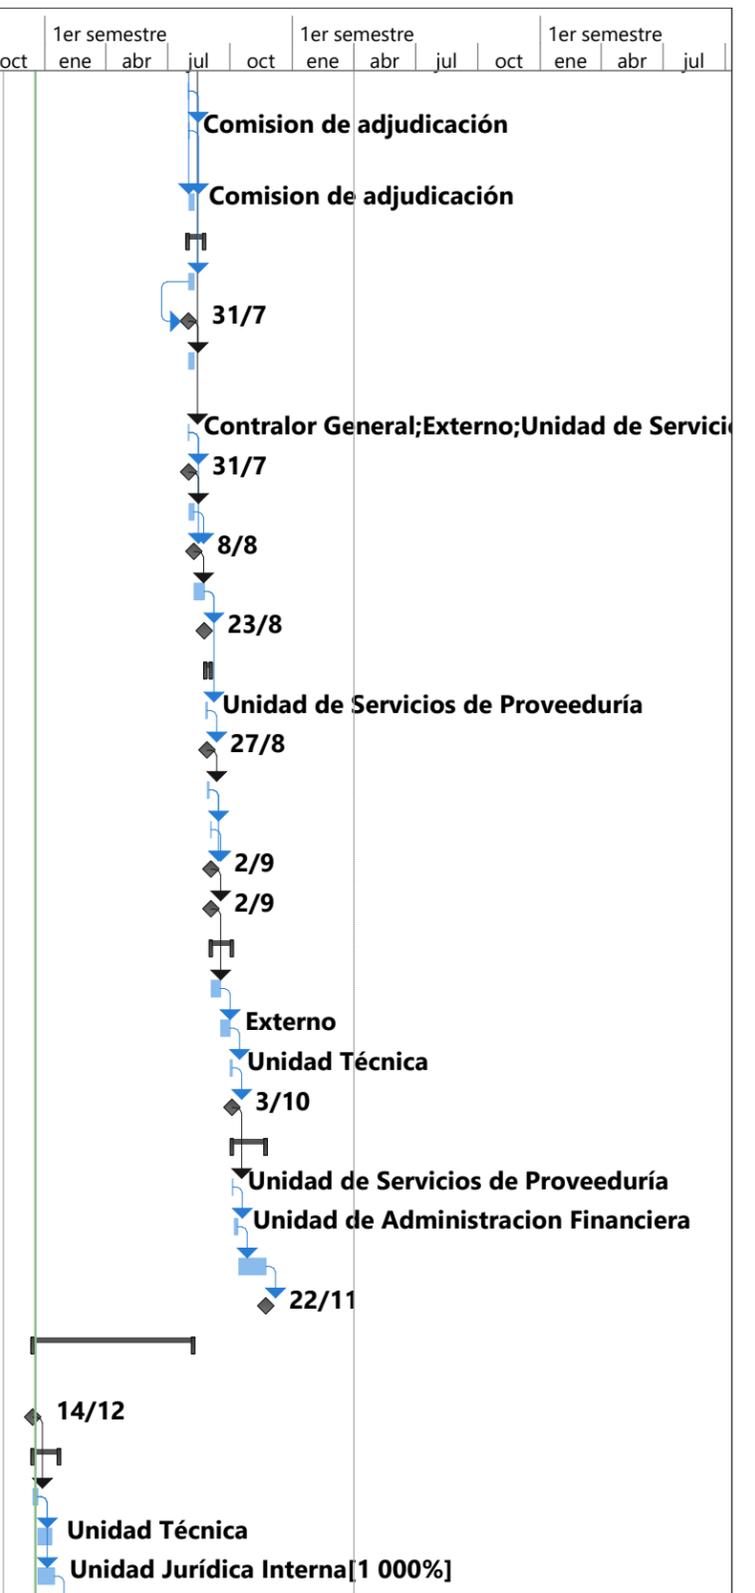


Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: mar 18/12/18

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre															
							jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr	jul			
379		Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	vie 12/4/19	jue 25/4/19	378																
380		<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>25 días</b>	<b>vie 12/4/19</b>	<b>vie 24/5/19</b>																	
381		Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	vie 12/4/19	jue 25/4/19	378																
382		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisibile (Art N°186 RLCA)	2 días	vie 26/4/19	lun 29/4/19	381																
383		Notificación al Adjudicatario del recurso en caso de ser admisible	0 días	lun 29/4/19	lun 29/4/19	382																
384		Plazo para recibir respuesta del adjudicatario (Art N°194 RLCA)	3 días	mar 30/4/19	vie 3/5/19	383																
385		Elaboracion de la resolucioin final de la revocatoria (Art N°195 RLCA)	15 días	lun 6/5/19	vie 24/5/19	384																
386		Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	vie 24/5/19	vie 24/5/19	385																
387		<b>Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones</b>	<b>6 días</b>	<b>lun 27/5/19</b>	<b>lun 3/6/19</b>	<b>386</b>																
388		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	lun 27/5/19	lun 27/5/19																	
389		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	lun 27/5/19	lun 27/5/19	388																
390		Adjudicación en firme	5 días	mar 28/5/19	lun 3/6/19	381;389																
391		<b>Trámite de contrato</b>	<b>16 días</b>	<b>lun 27/5/19</b>	<b>lun 17/6/19</b>																	
392		Elaboración del Contrato	5 días	lun 27/5/19	lun 3/6/19	388																
393		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	lun 27/5/19	lun 27/5/19	392CC																
394		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	lun 27/5/19	lun 3/6/19	393																
395		Firma de contrato oferente	1 día	lun 27/5/19	lun 27/5/19	386																
396		Envío de contrato para firma Gerente de División de Apoyo	0 días	lun 27/5/19	lun 27/5/19	395																
397		Firma de contrato	5 días	mar 28/5/19	lun 3/6/19	396																
398		Envío de contrato a aprobación interna	0 días	lun 3/6/19	lun 3/6/19	395;397																
399		Aprobacion Interna de Contrato	10 días	mar 4/6/19	lun 17/6/19	398																
400		Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	lun 17/6/19	lun 17/6/19	399																
401		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>6 días</b>	<b>mar 18/6/19</b>	<b>mar 25/6/19</b>																	
402		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	mar 18/6/19	mié 19/6/19	399																
403		Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	mié 19/6/19	mié 19/6/19	402																
404		Visado de pedido en la UAF	3 días	jue 20/6/19	lun 24/6/19	403																
405		Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	mar 25/6/19	mar 25/6/19	404																
406		Notificación de Pedido de Compra	0 días	mar 25/6/19	mar 25/6/19	404;405																
407		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mar 25/6/19	mar 25/6/19	406																
408		<b>Recepción de los items</b>	<b>23 días</b>	<b>mié 26/6/19</b>	<b>lun 29/7/19</b>																	
409		<b>Exoneración</b>	<b>10 días</b>	mié 26/6/19	mar 9/7/19	407																
410		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mié 10/7/19	mar 23/7/19	409																
411		Recibido a satisfacción	3 días	mié 24/7/19	lun 29/7/19	410																
412		Fin recepción de items	0 días	lun 29/7/19	lun 29/7/19	411																
413		<b>Trámite de pago</b>	<b>6 días</b>	<b>mar 30/7/19</b>	<b>mié 7/8/19</b>																	
414		Envio documentos a Financiero	1 día	mar 30/7/19	mar 30/7/19	412																

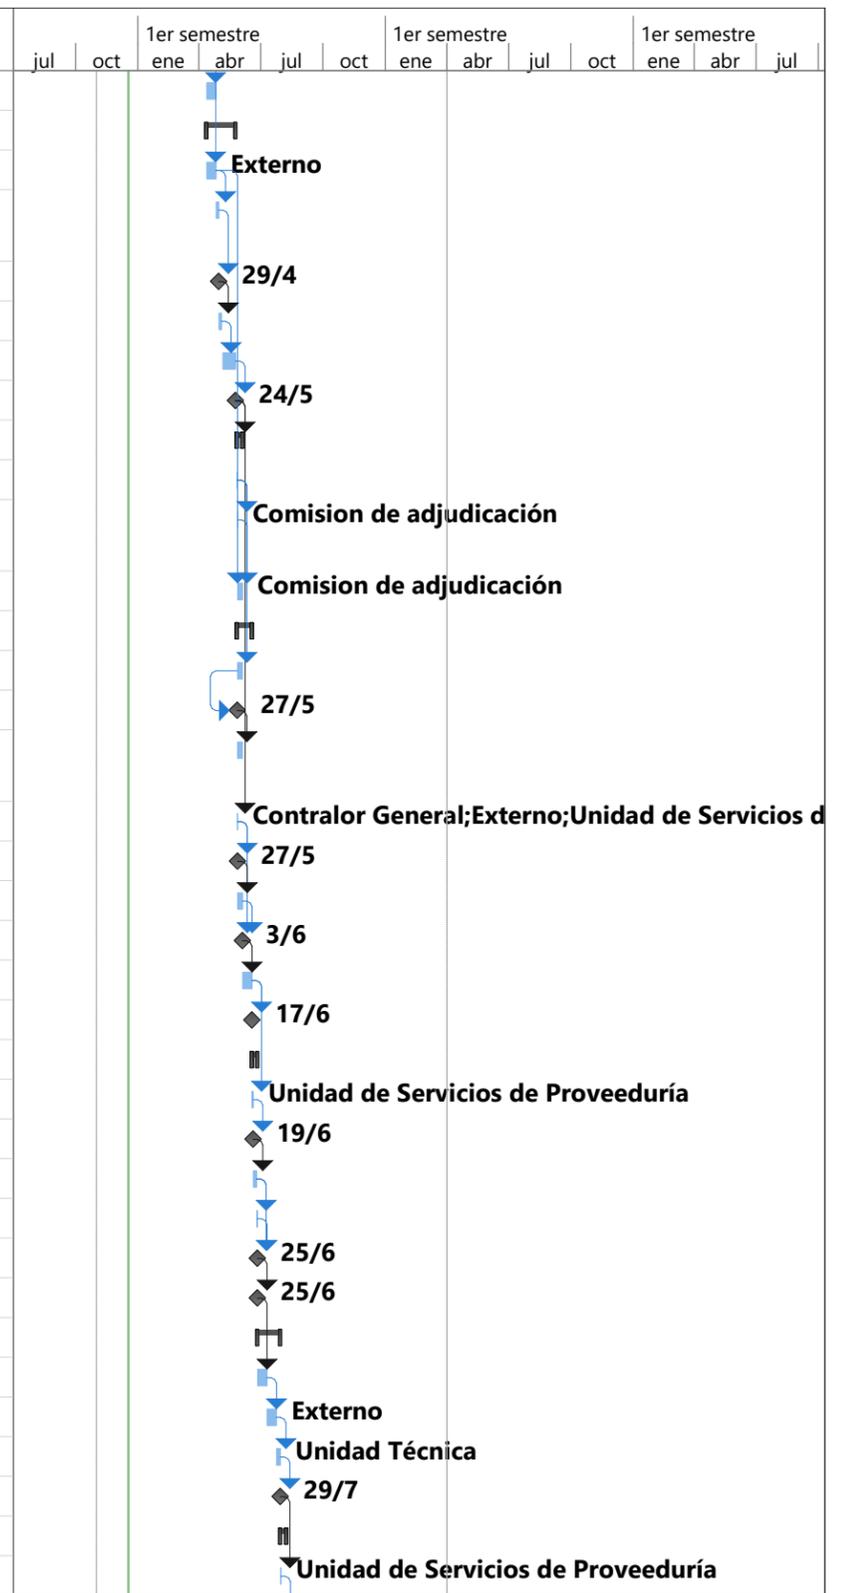

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: mar 18/12/18


Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			







Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre			1er semestre			1er semestre				
							ene	abr	jul	ene	abr	jul	ene	abr	jul		
519		Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion para entrega de prevenciones Outlook)	1 día	lun 25/2/19	lun 25/2/19	518											
520		<b>Estudio y valoración de las ofertas.</b>	<b>17 días</b>	<b>mar 26/2/19</b>	<b>mié 20/3/19</b>	<b>519</b>											
521		Admisibiliidad de ofertas (incluye reunión de admisibilidad)	5 días	mar 26/2/19	lun 4/3/19	519											
522		Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenciones	1 día	mar 5/3/19	mar 5/3/19	521											
523		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En Mer-Link)	5 días	mié 6/3/19	mar 12/3/19	522											
524		Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	mar 12/3/19	mar 12/3/19	523											
525		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mié 13/3/19	vie 15/3/19	524											
526		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	lun 18/3/19	mié 20/3/19	525											
527		<b>Informe de recomendación</b>	<b>5 días</b>	<b>jue 21/3/19</b>	<b>mié 27/3/19</b>												
528		Elaboración de Informe de recomendación	5 días	jue 21/3/19	mié 27/3/19	526											
529		<b>Recomendación, adjudicación y comunicación</b>	<b>11 días</b>	<b>jue 28/3/19</b>	<b>vie 12/4/19</b>												
530		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	jue 28/3/19	lun 1/4/19	528											
531		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mar 2/4/19	mar 2/4/19	530											
532		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mar 2/4/19	mar 2/4/19	531											
533		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mié 3/4/19	mié 3/4/19	532											
534		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	jue 4/4/19	jue 4/4/19	533											
535		Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	vie 5/4/19	vie 12/4/19	534											
536		<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>25 días</b>	<b>vie 5/4/19</b>	<b>lun 20/5/19</b>												
537		Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	vie 5/4/19	vie 12/4/19	534											
538		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisibile (Art N°186 RLCA)	2 días	lun 22/4/19	mar 23/4/19	537											
539		Notificación al Adjudicatario del recurso en caso de ser admisible	0 días	mar 23/4/19	mar 23/4/19	538											
540		Plazo para recibir respuesta del adjudicatario (Art N°194 RLCA)	3 días	mié 24/4/19	vie 26/4/19	539											
541		Elaboracion de la resolucio final de la revocatoria (Art N°195 RLCA)	15 días	lun 29/4/19	lun 20/5/19	540											
542		Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	lun 20/5/19	lun 20/5/19	541											
543		<b>Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones</b>	<b>6 días</b>	<b>mar 21/5/19</b>	<b>mar 28/5/19</b>	<b>542</b>											
544		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mar 21/5/19	mar 21/5/19												
545		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mar 21/5/19	mar 21/5/19	544											
546		Adjudicación en firme	5 días	mié 22/5/19	mar 28/5/19	537;545											
547		<b>Trámite de contrato</b>	<b>16 días</b>	<b>mar 21/5/19</b>	<b>mar 11/6/19</b>												
548		Elaboración del Contrato	5 días	mar 21/5/19	mar 28/5/19	544											
549		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	mar 21/5/19	mar 21/5/19	548CC											
550		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	mar 21/5/19	mar 28/5/19	549											
551		Firma de contrato oferente	1 día	mar 21/5/19	mar 21/5/19	542											

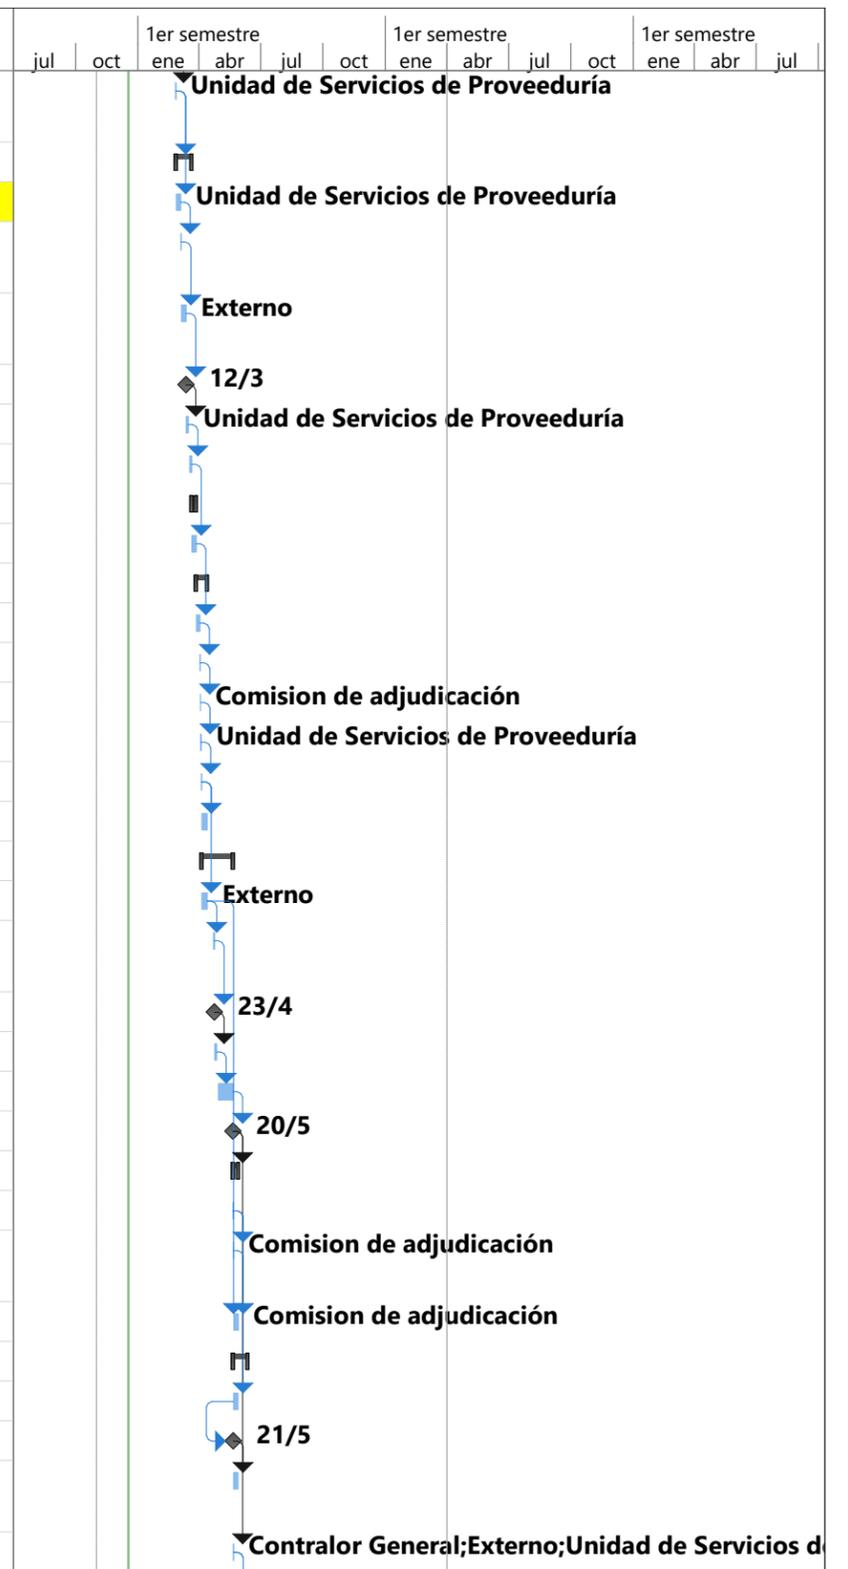


Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: mar 18/12/18

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			





Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	jul		1er semestre		jul		1er semestre		1er semestre	
							oct	ene	abr	ene	abr	ene	abr	ene	abr	
622		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	lun 6/1/20	lun 6/1/20											
623		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	lun 6/1/20	lun 6/1/20	622										
624		Adjudicación en firme	5 días	mar 7/1/20	lun 13/1/20	615;623										
625		<b>Trámite de contrato</b>	<b>16 días</b>	<b>lun 6/1/20</b>	<b>lun 27/1/20</b>											
626		Elaboración del Contrato	5 días	lun 6/1/20	lun 13/1/20	622										
627		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	lun 6/1/20	lun 6/1/20	626CC										
628		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	lun 6/1/20	lun 13/1/20	627										
629		Firma de contrato oferente	1 día	lun 6/1/20	lun 6/1/20	620										
630		Envío de contrato para firma Gerente de División de Apoyo	0 días	lun 6/1/20	lun 6/1/20	629										
631		Firma de contrato	5 días	mar 7/1/20	lun 13/1/20	630										
632		Envío de contrato a aprobación interna	0 días	lun 13/1/20	lun 13/1/20	629;631										
633		Aprobación Interna de Contrato	10 días	mar 14/1/20	lun 27/1/20	632										
634		Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	lun 27/1/20	lun 27/1/20	633										
635		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>6 días</b>	<b>mar 28/1/20</b>	<b>mar 4/2/20</b>											
636		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	mar 28/1/20	mié 29/1/20	633										
637		Envío de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	mié 29/1/20	mié 29/1/20	636										
638		Visado de pedido en la UAF	3 días	jue 30/1/20	lun 3/2/20	637										
639		Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	mar 4/2/20	mar 4/2/20	638										
640		Notificación de Pedido de Compra	0 días	mar 4/2/20	mar 4/2/20	638;639										
641		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mar 4/2/20	mar 4/2/20	640										
642		<b>Recepción de los items</b>	<b>13 días</b>	<b>mar 4/2/20</b>	<b>vie 21/2/20</b>											
643		Exoneración	0 días	mar 4/2/20	mar 4/2/20	641										
644		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mié 5/2/20	mar 18/2/20	643										
645		Recibido a satisfacción	3 días	mié 19/2/20	vie 21/2/20	644										
646		Fin recepción de items	0 días	vie 21/2/20	vie 21/2/20	645										
647		<b>Trámite de pago</b>	<b>6 días</b>	<b>lun 24/2/20</b>	<b>lun 2/3/20</b>											
648		Envío documentos a Financiero	1 día	lun 24/2/20	lun 24/2/20	646										
649		Emisión de pago en Financiero	5 días	mar 25/2/20	lun 2/3/20	648										
650		Conclusión trámite licitación	0 días	lun 2/3/20	lun 2/3/20	649										
651		<b>UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (UTI)</b>	<b>220 días</b>	<b>lun 21/1/19</b>	<b>vie 6/12/19</b>											
652		<b>2019LA-00008-0005400001; Adquisición de licencias de software; iniciar en mayo 2019; €41,223.258/año; € 164,893.032 /4 años</b>	<b>170 días</b>	<b>lun 1/4/19</b>	<b>vie 6/12/19</b>											
653		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	lun 1/4/19	lun 1/4/19											
654		<b>Confección Documento complementario al cartel</b>	<b>17 días</b>	<b>lun 1/4/19</b>	<b>jue 2/5/19</b>											
655		Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 1/4/19	vie 5/4/19	653										
656		Revisión Jurídica de cartel UJI	7 días	lun 8/4/19	mié 24/4/19	655										
657		Revisión Técnica de cartel	7 días	lun 8/4/19	mié 24/4/19	655										

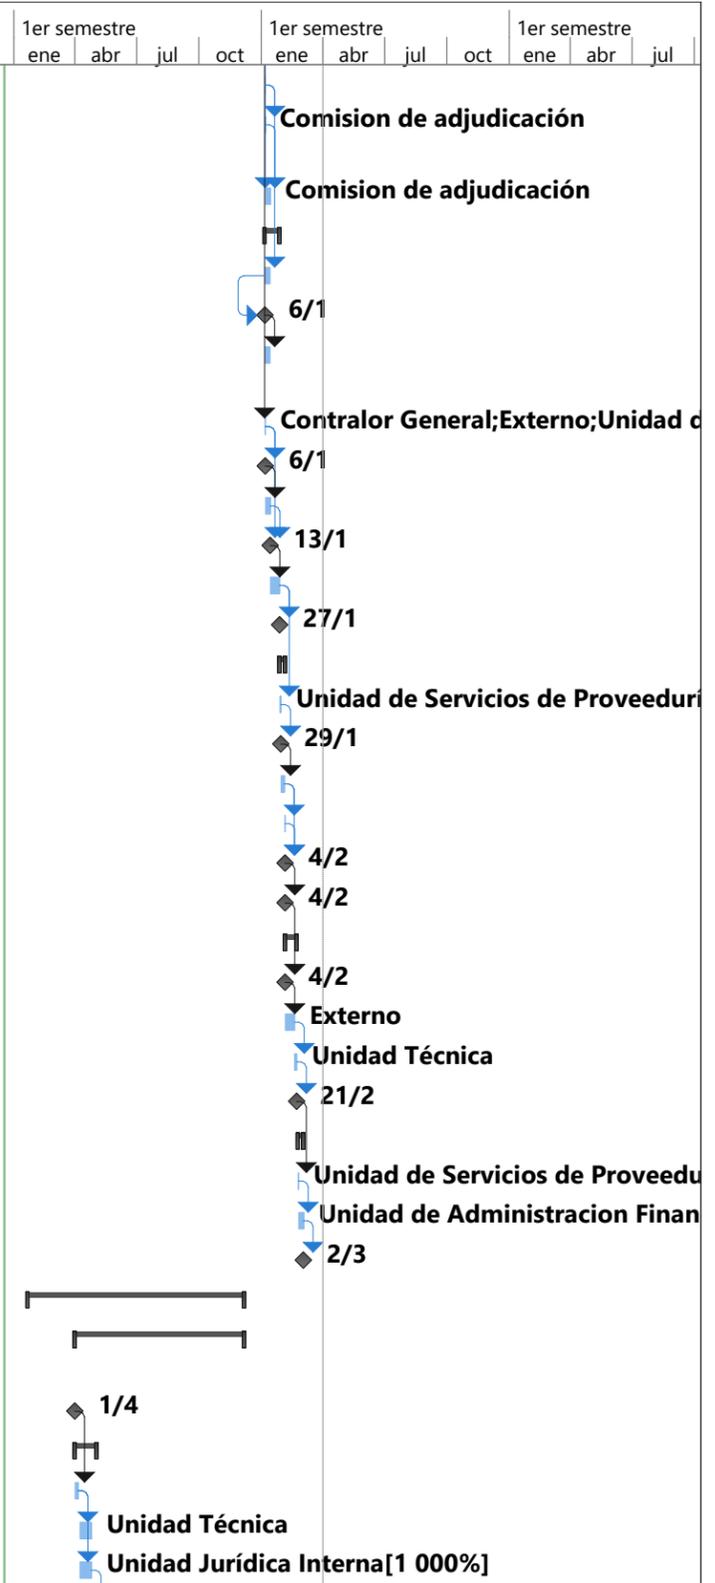


Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: mar 18/12/18

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre		1er semestre		1er semestre	
							ene	abr	ene	abr	ene	abr
692		Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	mar 23/7/19	mar 30/7/19	691						
693		<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>25 días</b>	<b>mar 23/7/19</b>	<b>jue 29/8/19</b>							
694		Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	mar 23/7/19	mar 30/7/19	691						
695		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisible (Art N°186 RLCA)	2 días	mié 31/7/19	jue 1/8/19	694						
696		Notificación al Adjudicatario del recurso en caso de ser admisible	0 días	jue 1/8/19	jue 1/8/19	695						
697		Plazo para recibir respuesta del adjudicatario (Art N°194 RLCA)	3 días	lun 5/8/19	mié 7/8/19	696						
698		Elaboracion de la resolucio final de la revocatoria (Art N°195 RLCA)	15 días	jue 8/8/19	jue 29/8/19	697						
699		Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	jue 29/8/19	jue 29/8/19	698						
700		<b>Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones</b>	<b>6 días</b>	<b>vie 30/8/19</b>	<b>vie 6/9/19</b>	<b>699</b>						
701		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	vie 30/8/19	vie 30/8/19							
702		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	vie 30/8/19	vie 30/8/19	701						
703		Adjudicación en firme	5 días	lun 2/9/19	vie 6/9/19	694;702						
704		<b>Trámite de contrato</b>	<b>16 días</b>	<b>vie 30/8/19</b>	<b>vie 20/9/19</b>							
705		Elaboración del Contrato	5 días	vie 30/8/19	vie 6/9/19	701						
706		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	vie 30/8/19	vie 30/8/19	705CC						
707		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	vie 30/8/19	vie 6/9/19	706						
708		Firma de contrato oferente	1 día	vie 30/8/19	vie 30/8/19	699						
709		Envío de contrato para firma Gerente de División de Apoyo	0 días	vie 30/8/19	vie 30/8/19	708						
710		Firma de contrato	5 días	lun 2/9/19	vie 6/9/19	709						
711		Envío de contrato a aprobación interna	0 días	vie 6/9/19	vie 6/9/19	708;710						
712		Aprobacion Interna de Contrato	10 días	lun 9/9/19	vie 20/9/19	711						
713		Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	vie 20/9/19	vie 20/9/19	712						
714		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>6 días</b>	<b>lun 23/9/19</b>	<b>lun 30/9/19</b>							
715		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	lun 23/9/19	mar 24/9/19	712						
716		Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	mar 24/9/19	mar 24/9/19	715						
717		Visado de pedido en la UAF	3 días	mié 25/9/19	vie 27/9/19	716						
718		Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	lun 30/9/19	lun 30/9/19	717						
719		Notificación de Pedido de Compra	0 días	lun 30/9/19	lun 30/9/19	718;717						
720		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	lun 30/9/19	lun 30/9/19	719						
721		<b>Recepción de los items</b>	<b>13 días</b>	<b>lun 30/9/19</b>	<b>jue 17/10/19</b>							
722		Exoneración	0 días	lun 30/9/19	lun 30/9/19	720						
723		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 1/10/19	lun 14/10/19	722						
724		Recibido a satisfacción	3 días	mar 15/10/19	jue 17/10/19	723						
725		Fin recepción de items	0 días	jue 17/10/19	jue 17/10/19	724						
726		<b>Trámite de pago</b>	<b>36 días</b>	<b>vie 18/10/19</b>	<b>vie 6/12/19</b>							
727		Envio documentos a Financiero	1 día	vie 18/10/19	vie 18/10/19	725						

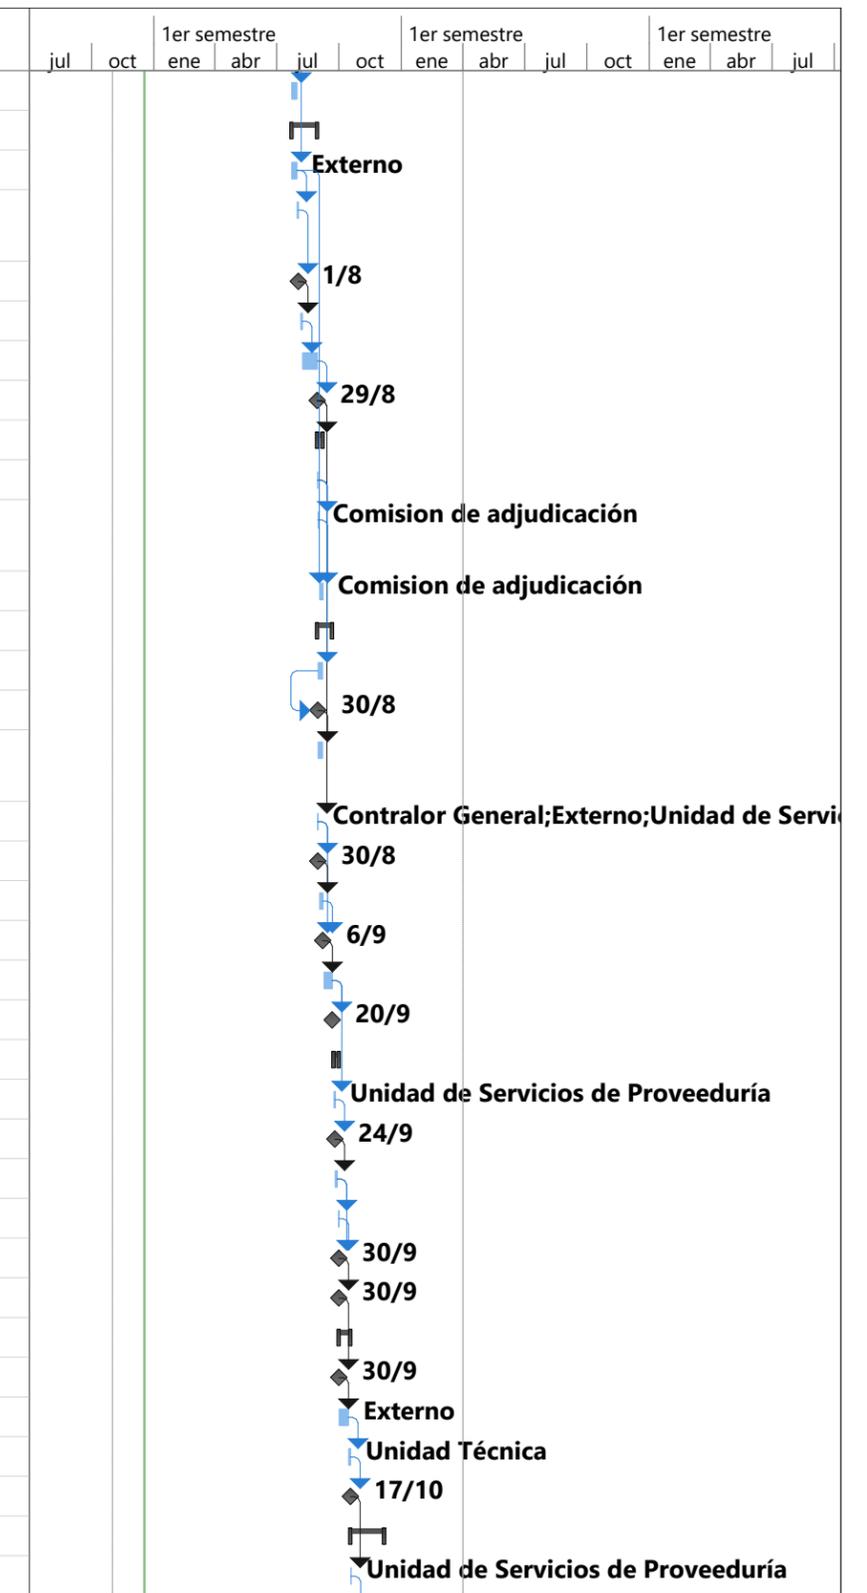

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: mar 18/12/18

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			













Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre		1er semestre		1er semestre	
							ene	abr	ene	abr	ene	abr
900		Plazo para recibir ofertas	17 días	jue 28/2/19	vie 22/3/19	899						
901		<b>Recurso de Objeción al Cartel</b>	<b>17 días</b>	<b>jue 28/2/19</b>	<b>vie 22/3/19</b>							
902		Presentacion de Objeción al cartel	5 días	jue 28/2/19	mié 6/3/19	899						
903		Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	jue 7/3/19	jue 7/3/19	902						
904		Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	vie 8/3/19	vie 8/3/19	903						
905		Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	lun 11/3/19	vie 15/3/19	904						
906		Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	lun 18/3/19	jue 21/3/19	905						
907		Comunicación de Resolución final	1 día	vie 22/3/19	vie 22/3/19	906						
908		Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	jue 7/3/19	vie 22/3/19	902						
909		<b>Plazo para adjudicación</b>	<b>34 días</b>	<b>lun 25/3/19</b>	<b>lun 20/5/19</b>							
910		Fecha máxima para adjudicar	34 días	lun 25/3/19	lun 20/5/19	908						
911		<b>Recepción de ofertas</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 22/3/19</b>	<b>lun 25/3/19</b>							
912		Apertura de ofertas	0 días	vie 22/3/19	vie 22/3/19	908						
913		Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion para entrega de prevenciones Outlook)	1 día	lun 25/3/19	lun 25/3/19	912						
914		<b>Estudio y valoración de las ofertas.</b>	<b>17 días</b>	<b>mar 26/3/19</b>	<b>jue 25/4/19</b>	<b>913</b>						
915		Admisibiliidad de ofertas (incluye reunión de admisibilidad)	5 días	mar 26/3/19	lun 1/4/19	913						
916		Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenciones	1 día	mar 2/4/19	mar 2/4/19	915						
917		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En Mer-Link)	5 días	mié 3/4/19	mar 9/4/19	916						
918		Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	mar 9/4/19	mar 9/4/19	917						
919		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mié 10/4/19	lun 22/4/19	918						
920		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	mar 23/4/19	jue 25/4/19	919						
921		<b>Informe de recomendación</b>	<b>5 días</b>	<b>vie 26/4/19</b>	<b>vie 3/5/19</b>							
922		Elaboración de Informe de recomendación	5 días	vie 26/4/19	vie 3/5/19	920						
923		<b>Recomendación, adjudicación y comunicación</b>	<b>11 días</b>	<b>lun 6/5/19</b>	<b>lun 20/5/19</b>							
924		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	lun 6/5/19	mié 8/5/19	922						
925		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	jue 9/5/19	jue 9/5/19	924						
926		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	jue 9/5/19	jue 9/5/19	925						
927		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	vie 10/5/19	vie 10/5/19	926						
928		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	lun 13/5/19	lun 13/5/19	927						
929		Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	mar 14/5/19	lun 20/5/19	928						
930		<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>25 días</b>	<b>mar 14/5/19</b>	<b>lun 17/6/19</b>							
931		Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	mar 14/5/19	lun 20/5/19	928						
932		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisibile (Art N°186 RLCA)	2 días	mar 21/5/19	mié 22/5/19	931						
933		Notificación al Adjudicatario del recurso en caso de ser admisible	0 días	mié 22/5/19	mié 22/5/19	932						
934		Plazo para recibir respuesta del adjudicatario (Art N°194 RLCA)	3 días	jue 23/5/19	lun 27/5/19	933						

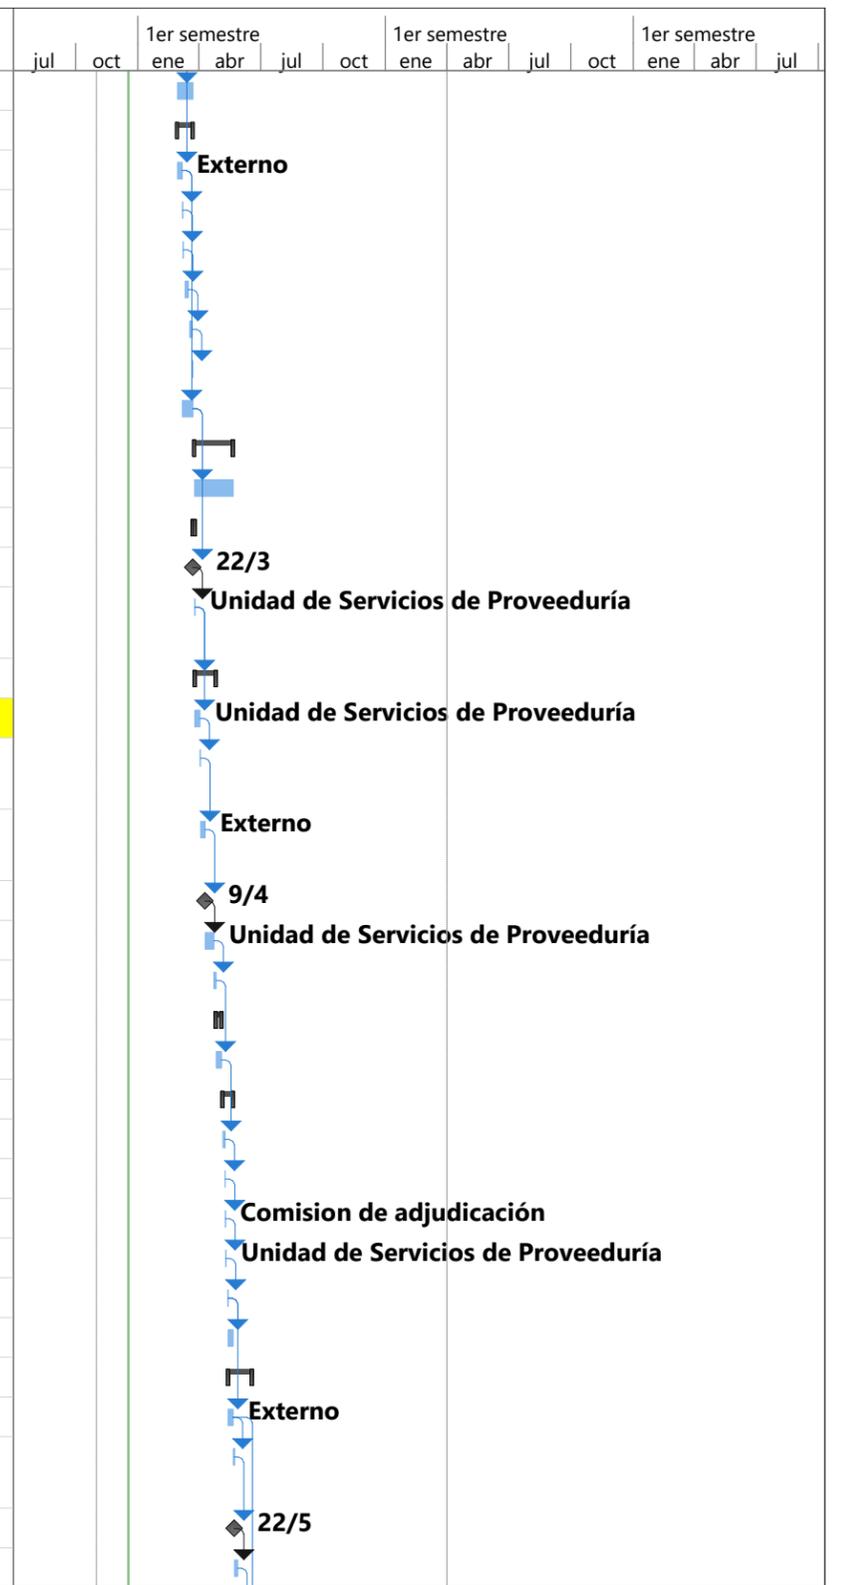

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: mar 18/12/18

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Cronograma																
							jul	oct	1er semestre		jul	oct	1er semestre		jul	oct	1er semestre						
935		Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Art N°195 RLCA)	15 días	mar 28/5/19	lun 17/6/19	934																	
936		Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	lun 17/6/19	lun 17/6/19	935																	
937		<b>Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones</b>	<b>6 días</b>	<b>mar 18/6/19</b>	<b>mar 25/6/19</b>	<b>936</b>																	
938		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mar 18/6/19	mar 18/6/19																		
939		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mar 18/6/19	mar 18/6/19	938																	
940		Adjudicación en firme	5 días	mié 19/6/19	mar 25/6/19	931;939																	
941		<b>Trámite de contrato</b>	<b>16 días</b>	<b>mar 18/6/19</b>	<b>mar 9/7/19</b>																		
942		Elaboración del Contrato	5 días	mar 18/6/19	mar 25/6/19	938																	
943		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	mar 18/6/19	mar 18/6/19	942CC																	
944		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	mar 18/6/19	mar 25/6/19	943																	
945		Firma de contrato oferente	1 día	mar 18/6/19	mar 18/6/19	936																	
946		Envío de contrato para firma Gerente de División de Apoyo	0 días	mar 18/6/19	mar 18/6/19	945																	
947		Firma de contrato	5 días	mié 19/6/19	mar 25/6/19	946																	
948		Envío de contrato a aprobación interna	0 días	mar 25/6/19	mar 25/6/19	945;947																	
949		Aprobacion Interna de Contrato	10 días	mié 26/6/19	mar 9/7/19	948																	
950		Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	mar 9/7/19	mar 9/7/19	949																	
951		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>6 días</b>	<b>mié 10/7/19</b>	<b>mié 17/7/19</b>																		
952		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	mié 10/7/19	jue 11/7/19	949																	
953		Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	jue 11/7/19	jue 11/7/19	952																	
954		Visado de pedido en la UAF	3 días	vie 12/7/19	mar 16/7/19	953																	
955		Devolución de pedido a Proveduría	1 día	mié 17/7/19	mié 17/7/19	954																	
956		Notificación de Pedido de Compra	0 días	mié 17/7/19	mié 17/7/19	954;955																	
957		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mié 17/7/19	mié 17/7/19	956																	
958		<b>Recepción de los items</b>	<b>13 días</b>	<b>mié 17/7/19</b>	<b>mié 7/8/19</b>																		
959		Exoneración	0 días	mié 17/7/19	mié 17/7/19	957																	
960		Entrega de los bienes/servicios	10 días	jue 18/7/19	jue 1/8/19	959																	
961		Recibido a satisfacción	3 días	lun 5/8/19	mié 7/8/19	960																	
962		Fin recepción de items	0 días	mié 7/8/19	mié 7/8/19	961																	
963		<b>Trámite de pago</b>	<b>36 días</b>	<b>jue 8/8/19</b>	<b>vie 27/9/19</b>																		
964		Envio documentos a Financiero	1 día	jue 8/8/19	jue 8/8/19	962																	
965		Emisión de pago en Financiero	5 días	vie 9/8/19	vie 16/8/19	964																	
966		Pago de Tesorería Nacional	30 días	lun 19/8/19	vie 27/9/19	965																	
967		Conclusión trámite licitación	0 días	vie 27/9/19	vie 27/9/19	966																	
968		<b>UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UAF)</b>	<b>140 días</b>	<b>lun 10/12/18</b>	<b>mar 16/7/19</b>																		
969		<b>2019LA-000012-000540-0001; Auditoría Externa, Contratado al 30/06/2019; c9,000.000 / año; c36,000.000 / 4 años</b>	<b>140 días</b>	<b>lun 10/12/18</b>	<b>mar 16/7/19</b>																		
970		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	lun 10/12/18	lun 10/12/18																		

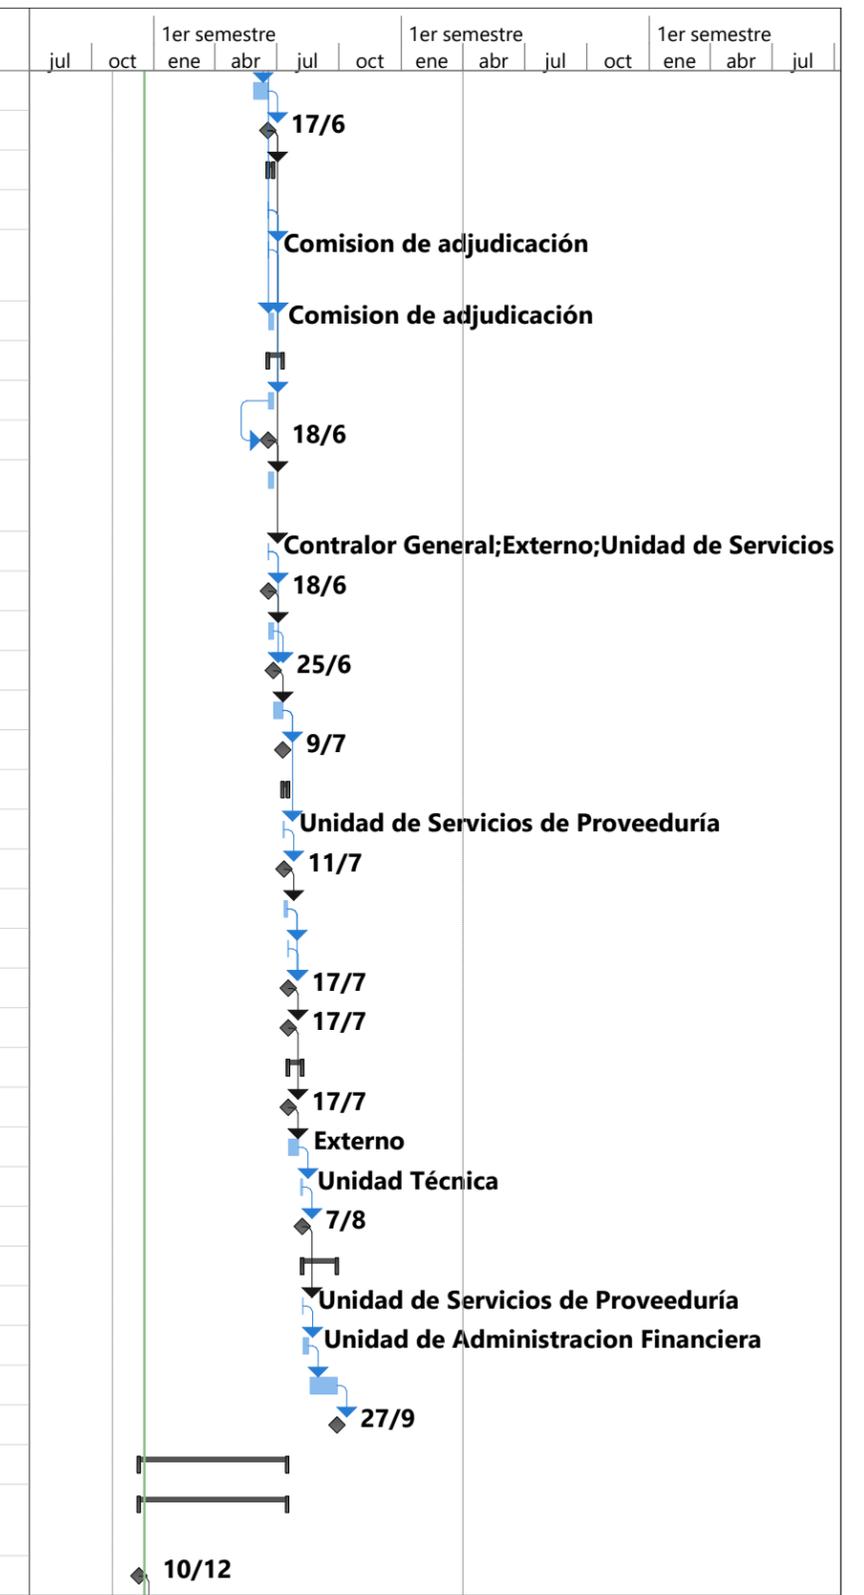


Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: mar 18/12/18

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre															
							jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr	jul			
1005		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mar 2/4/19	mar 2/4/19	1004																
1006		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mar 2/4/19	mar 2/4/19	1005																
1007		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mié 3/4/19	mié 3/4/19	1006																
1008		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	jue 4/4/19	jue 4/4/19	1007																
1009		Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	vie 5/4/19	vie 12/4/19	1008																
1010		<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>25 días</b>	<b>vie 5/4/19</b>	<b>lun 20/5/19</b>																	
1011		Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	vie 5/4/19	vie 12/4/19	1008																
1012		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisibile (Art N°186 RLCA)	2 días	lun 22/4/19	mar 23/4/19	1011																
1013		Notificación al Adjudicatario del recurso en caso de ser admisible	0 días	mar 23/4/19	mar 23/4/19	1012																
1014		Plazo para recibir respuesta del adjudicatario (Art N°194 RLCA)	3 días	mié 24/4/19	vie 26/4/19	1013																
1015		Elaboracion de la resolucio final de la revocatoria (Art N°195 RLCA)	15 días	lun 29/4/19	lun 20/5/19	1014																
1016		Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	lun 20/5/19	lun 20/5/19	1015																
1017		<b>Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones</b>	<b>6 días</b>	<b>mar 21/5/19</b>	<b>mar 28/5/19</b>	<b>1016</b>																
1018		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mar 21/5/19	mar 21/5/19																	
1019		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mar 21/5/19	mar 21/5/19	1018																
1020		Adjudicación en firme	5 días	mié 22/5/19	mar 28/5/19	1011;1019																
1021		<b>Trámite de contrato</b>	<b>16 días</b>	<b>mar 21/5/19</b>	<b>mar 11/6/19</b>																	
1022		Elaboración del Contrato	5 días	mar 21/5/19	mar 28/5/19	1018																
1023		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	mar 21/5/19	mar 21/5/19	1022CC																
1024		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	mar 21/5/19	mar 28/5/19	1023																
1025		Firma de contrato oferente	1 día	mar 21/5/19	mar 21/5/19	1016																
1026		Envío de contrato para firma Gerente de División de Apoyo	0 días	mar 21/5/19	mar 21/5/19	1025																
1027		Firma de contrato	5 días	mié 22/5/19	mar 28/5/19	1026																
1028		Envío de contrato a aprobación interna	0 días	mar 28/5/19	mar 28/5/19	1025;1027																
1029		Aprobacion Interna de Contrato	10 días	mié 29/5/19	mar 11/6/19	1028																
1030		Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	mar 11/6/19	mar 11/6/19	1029																
1031		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>6 días</b>	<b>mié 12/6/19</b>	<b>mié 19/6/19</b>																	
1032		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	mié 12/6/19	jue 13/6/19	1029																
1033		Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	jue 13/6/19	jue 13/6/19	1032																
1034		Visado de pedido en la UAF	3 días	vie 14/6/19	mar 18/6/19	1033																
1035		Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	mié 19/6/19	mié 19/6/19	1034																
1036		Notificación de Pedido de Compra	0 días	mié 19/6/19	mié 19/6/19	1034;1035																
1037		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mié 19/6/19	mié 19/6/19	1036																
1038		<b>Recepción de los items</b>	<b>13 días</b>	<b>mié 19/6/19</b>	<b>lun 8/7/19</b>																	
1039		Exoneración	0 días	mié 19/6/19	mié 19/6/19	1037																
1040		Entrega de los bienes/servicios	10 días	jue 20/6/19	mié 3/7/19	1039																

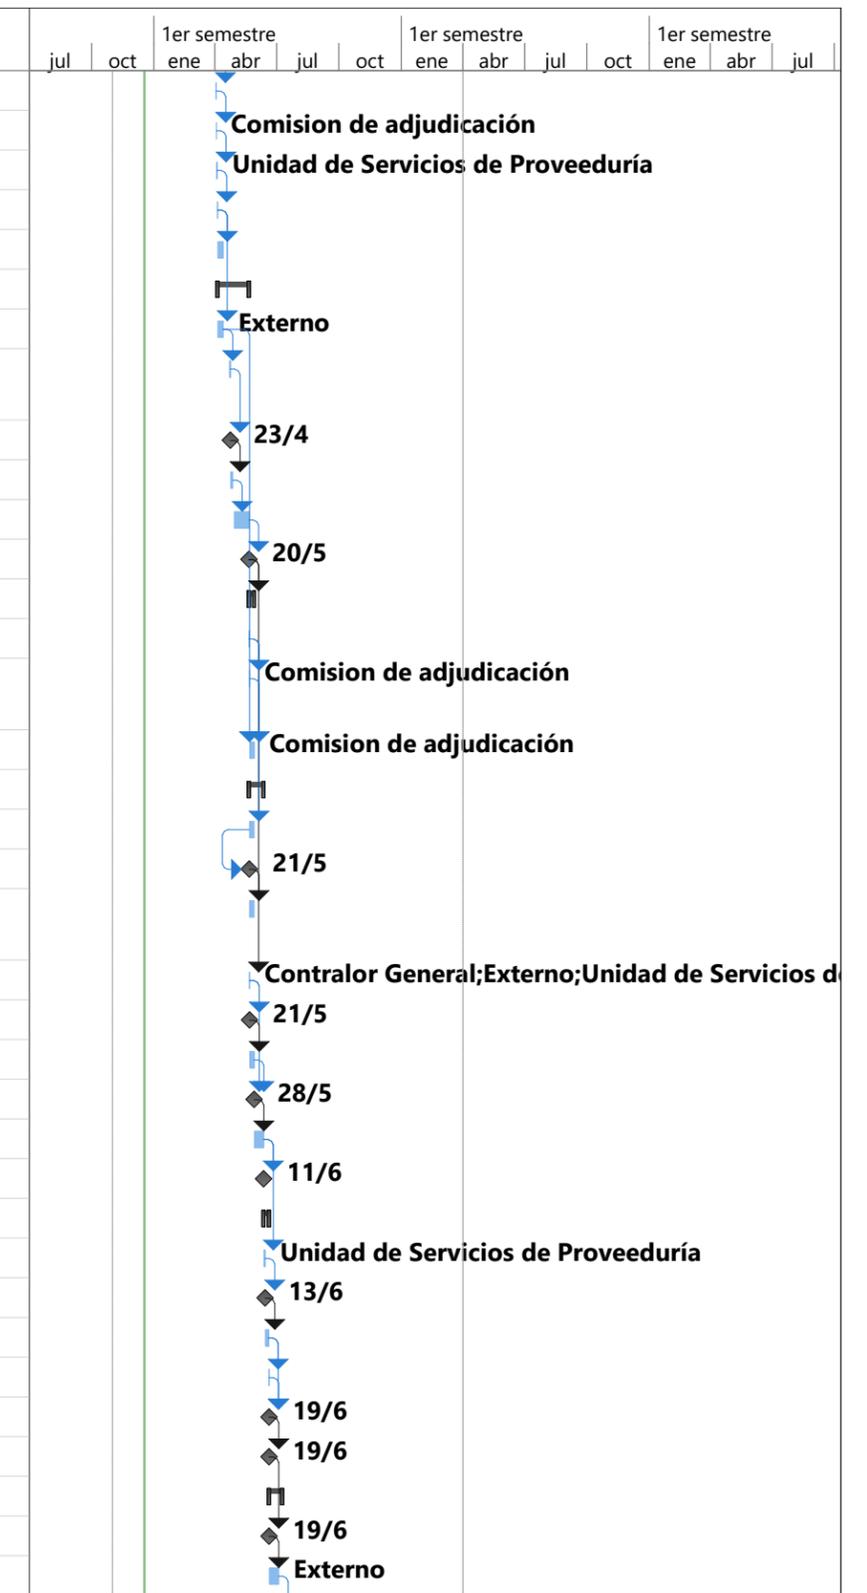


Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: mar 18/12/18

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre															
							jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr	jul			
1075		Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenciones	1 día	vie 12/4/19	vie 12/4/19	1074																
1076		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En Mer-Link)	5 días	lun 22/4/19	vie 26/4/19	1075																
1077		Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	vie 26/4/19	vie 26/4/19	1076																
1078		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	lun 29/4/19	jue 2/5/19	1077																
1079		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	vie 3/5/19	mar 7/5/19	1078																
1080		<b>Informe de recomendación</b>	<b>5 días</b>	<b>mié 8/5/19</b>	<b>mar 14/5/19</b>																	
1081		Elaboración de Informe de recomendación	5 días	mié 8/5/19	mar 14/5/19	1079																
1082		<b>Recomendación, adjudicación y comunicación</b>	<b>11 días</b>	<b>mié 15/5/19</b>	<b>mié 29/5/19</b>																	
1083		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mié 15/5/19	vie 17/5/19	1081																
1084		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	lun 20/5/19	lun 20/5/19	1083																
1085		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	lun 20/5/19	lun 20/5/19	1084																
1086		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mar 21/5/19	mar 21/5/19	1085																
1087		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	mié 22/5/19	mié 22/5/19	1086																
1088		Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	jue 23/5/19	mié 29/5/19	1087																
1089		<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>25 días</b>	<b>jue 23/5/19</b>	<b>mié 26/6/19</b>																	
1090		Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	jue 23/5/19	mié 29/5/19	1087																
1091		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisibile (Art N°186 RLCA)	2 días	jue 30/5/19	vie 31/5/19	1090																
1092		Notificación al Adjudicatario del recurso en caso de ser admisible	0 días	vie 31/5/19	vie 31/5/19	1091																
1093		Plazo para recibir respuesta del adjudicatario (Art N°194 RLCA)	3 días	lun 3/6/19	mié 5/6/19	1092																
1094		Elaboracion de la resolucio final de la revocatoria (Art N°195 RLCA)	15 días	jue 6/6/19	mié 26/6/19	1093																
1095		Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	mié 26/6/19	mié 26/6/19	1094																
1096		<b>Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones</b>	<b>6 días</b>	<b>jue 27/6/19</b>	<b>jue 4/7/19</b>	<b>1095</b>																
1097		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 27/6/19	jue 27/6/19																	
1098		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 27/6/19	jue 27/6/19	1097																
1099		Adjudicación en firme	5 días	vie 28/6/19	jue 4/7/19	1090;1098																
1100		<b>Trámite de contrato</b>	<b>16 días</b>	<b>jue 27/6/19</b>	<b>jue 18/7/19</b>																	
1101		Elaboración del Contrato	5 días	jue 27/6/19	jue 4/7/19	1097																
1102		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	jue 27/6/19	jue 27/6/19	1101CC																
1103		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	jue 27/6/19	jue 4/7/19	1102																
1104		Firma de contrato oferente	1 día	jue 27/6/19	jue 27/6/19	1095																
1105		Envío de contrato para firma Gerente de División de Apoyo	0 días	jue 27/6/19	jue 27/6/19	1104																
1106		Firma de contrato	5 días	vie 28/6/19	jue 4/7/19	1105																
1107		Envío de contrato a aprobación interna	0 días	jue 4/7/19	jue 4/7/19	1104;1106																
1108		Aprobacion Interna de Contrato	10 días	vie 5/7/19	jue 18/7/19	1107																

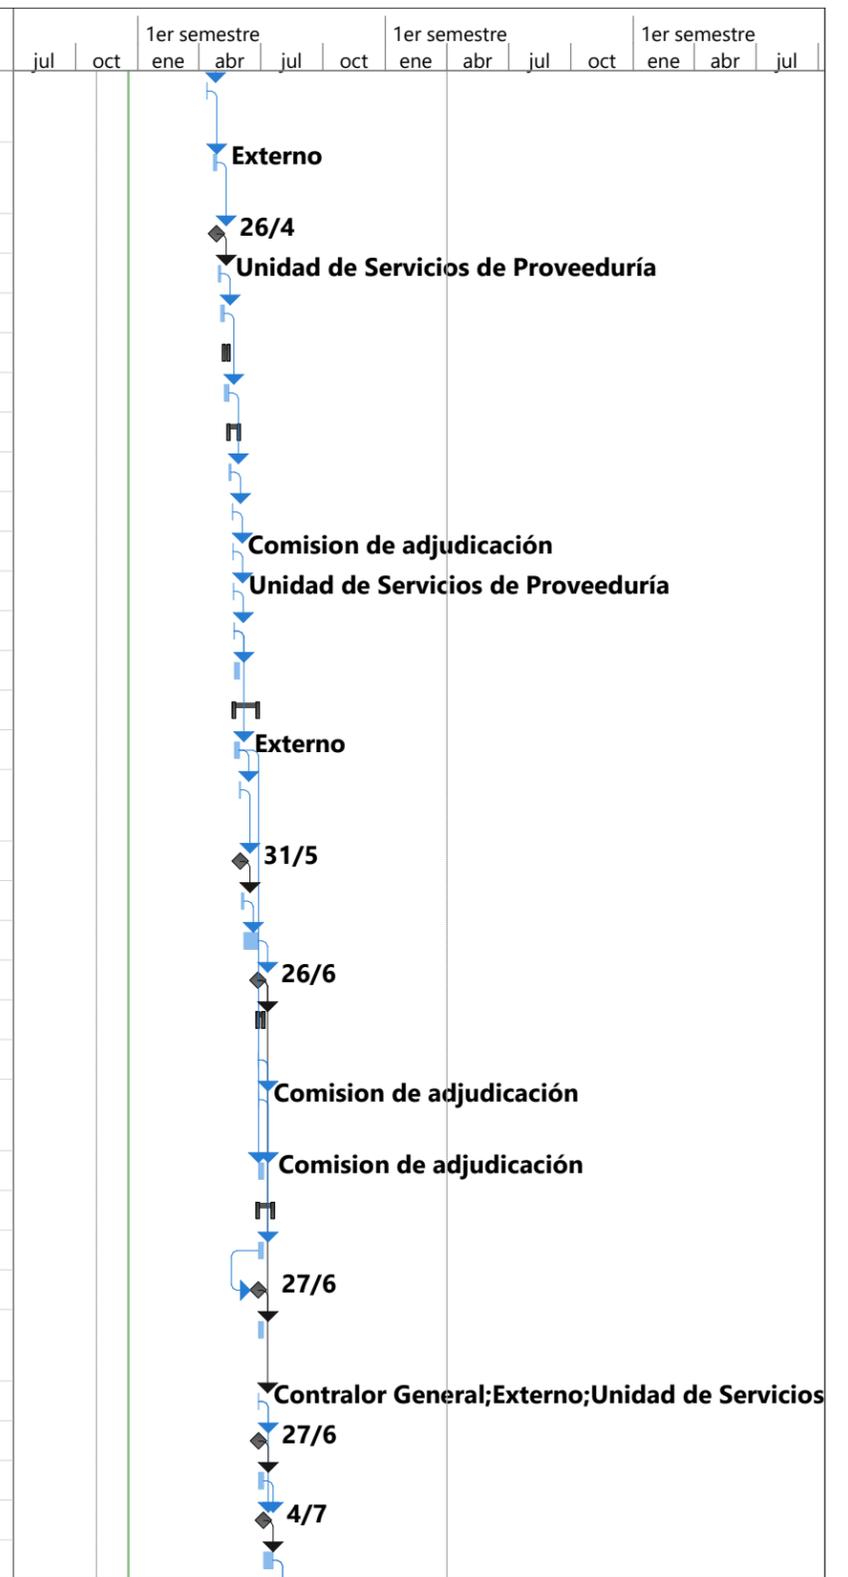


Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: mar 18/12/18

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre															
							jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr	jul			
1145		Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	vie 26/4/19	mar 14/5/19	1139																
1146		<b>Plazo para adjudicación</b>	<b>34 días</b>	<b>mié 15/5/19</b>	<b>lun 1/7/19</b>																	
1147		Fecha máxima para adjudicar	34 días	mié 15/5/19	lun 1/7/19	1145																
1148		<b>Recepción de ofertas</b>	<b>1 día</b>	<b>mar 14/5/19</b>	<b>mié 15/5/19</b>																	
1149		Apertura de ofertas	0 días	mar 14/5/19	mar 14/5/19	1145																
1150		Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion para entrega de prevenciones Outlook)	1 día	mié 15/5/19	mié 15/5/19	1149																
1151		<b>Estudio y valoración de las ofertas.</b>	<b>17 días</b>	<b>jue 16/5/19</b>	<b>vie 7/6/19</b>	<b>1150</b>																
1152		Admisibilidad de ofertas (incluye reunión de admisibilidad)	5 días	jue 16/5/19	mié 22/5/19	1150																
1153		Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenciones	1 día	jue 23/5/19	jue 23/5/19	1152																
1154		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En Mer-Link)	5 días	vie 24/5/19	jue 30/5/19	1153																
1155		Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	jue 30/5/19	jue 30/5/19	1154																
1156		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	vie 31/5/19	mar 4/6/19	1155																
1157		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	mié 5/6/19	vie 7/6/19	1156																
1158		<b>Informe de recomendación</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 10/6/19</b>	<b>vie 14/6/19</b>																	
1159		Elaboración de Informe de recomendación	5 días	lun 10/6/19	vie 14/6/19	1157																
1160		<b>Recomendación, adjudicación y comunicación</b>	<b>11 días</b>	<b>lun 17/6/19</b>	<b>lun 1/7/19</b>																	
1161		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	lun 17/6/19	mié 19/6/19	1159																
1162		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	jue 20/6/19	jue 20/6/19	1161																
1163		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	jue 20/6/19	jue 20/6/19	1162																
1164		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	vie 21/6/19	vie 21/6/19	1163																
1165		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	lun 24/6/19	lun 24/6/19	1164																
1166		Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	mar 25/6/19	lun 1/7/19	1165																
1167		<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>25 días</b>	<b>mar 25/6/19</b>	<b>mar 30/7/19</b>																	
1168		Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	mar 25/6/19	lun 1/7/19	1165																
1169		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisibile (Art N°186 RLCA)	2 días	mar 2/7/19	mié 3/7/19	1168																
1170		Notificación al Adjudicatario del recurso en caso de ser admisible	0 días	mié 3/7/19	mié 3/7/19	1169																
1171		Plazo para recibir respuesta del adjudicatario (Art N°194 RLCA)	3 días	jue 4/7/19	lun 8/7/19	1170																
1172		Elaboracion de la resolucio final de la revocatoria (Art N°195 RLCA)	15 días	mar 9/7/19	mar 30/7/19	1171																
1173		Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	mar 30/7/19	mar 30/7/19	1172																
1174		<b>Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones</b>	<b>6 días</b>	<b>mié 31/7/19</b>	<b>jue 8/8/19</b>	<b>1173</b>																
1175		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mié 31/7/19	mié 31/7/19																	
1176		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mié 31/7/19	mié 31/7/19	1175																
1177		Adjudicación en firme	5 días	jue 1/8/19	jue 8/8/19	1168;1176																
1178		<b>Trámite de contrato</b>	<b>16 días</b>	<b>mié 31/7/19</b>	<b>vie 23/8/19</b>																	

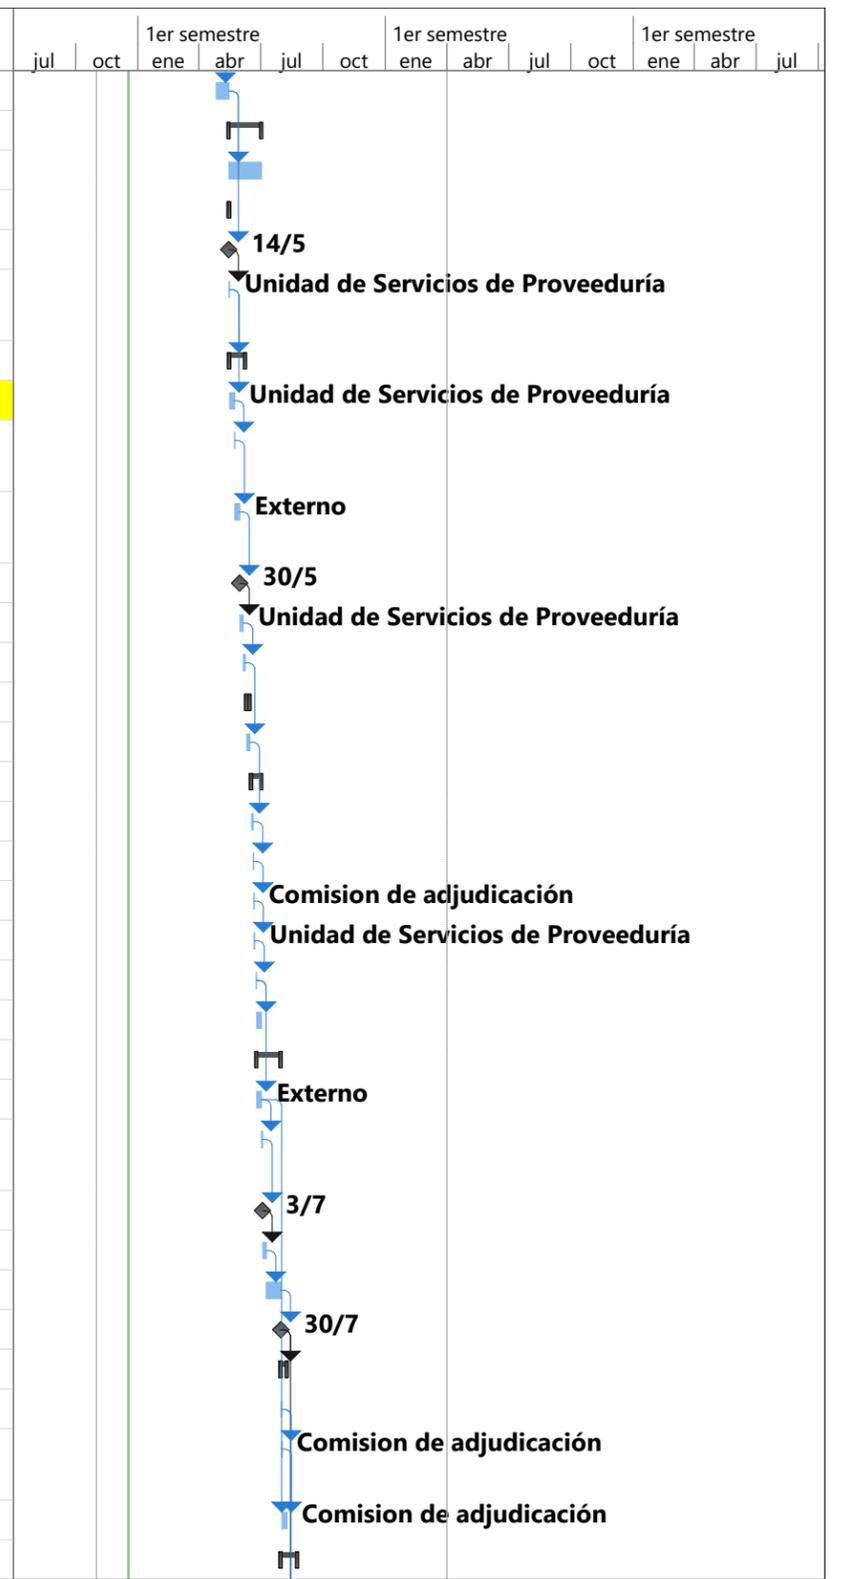


Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: mar 18/12/18

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			






Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre		1er semestre		1er semestre	
							ene	abr	ene	abr	ene	abr
1252		<b>2015CD-000183-0005400001; Mantenimiento de Aires Acondicionados de Precisión Marca Liebert, Oferente Único. contrato actual vence 19/10/2019; €6,100.000</b>	<b>74 días</b>	<b>lun 20/5/19</b>	<b>mar 3/9/19</b>							
1253		Definición de especificaciones	22 días	lun 20/5/19	mar 18/6/19							
1254		Elaboracion de especificaciones técnicas	5 días	mié 19/6/19	mar 25/6/19	1253						
1255		Recepción de solicitud y especificaciones técnicas	1 día	mié 26/6/19	mié 26/6/19	1254						
1256		Convocar a Comisión de recomendación de adjudicaciones	3 días	jue 27/6/19	lun 1/7/19	1255						
1257		Sesión de comisión de adjudicación	1 día	mar 2/7/19	mar 2/7/19	1256						
1258		Elaboracion del cartel	5 días	mié 3/7/19	mar 9/7/19	1257						
1259		Revisión Técnica de cartel	5 días	mié 10/7/19	mar 16/7/19	1258						
1260		Revisión Jurídica de cartel UJI	5 días	mié 17/7/19	mar 23/7/19	1259						
1261		Confección de invitacion con Anexo de especificaciones tecnicas	1 día	mié 24/7/19	mié 24/7/19	1260						
1262		Elaboracion y recepcion de oferta	5 días	vie 26/7/19	jue 1/8/19	1261						
1263		Revisión de oferta Unidad Técnica	7 días	lun 5/8/19	mar 13/8/19	1262						
1264		Oficio de analisis Técnico	1 día	mié 14/8/19	mié 14/8/19	1263						
1265		Convocar a Comisión de recomendación de adjudicaciones	3 días	vie 16/8/19	mar 20/8/19	1264						
1266		Sesión de comisión de adjudicación	1 día	mié 21/8/19	mié 21/8/19	1265						
1267		Elaboracion de Resolución	2 días	vie 16/8/19	lun 19/8/19	1264						
1268		Comunicación de Resolución	1 día	mar 20/8/19	mar 20/8/19	1267						
1269		Formalización y aprobacion de contrato	10 días	mié 21/8/19	mar 3/9/19	1268						
1270		<b>2019LA-00000X-0005400001; Mantenimiento correctivo y preventivo de UPS; contratado al 01-02-2020; monto anual €28,000.000; monto de contrato €112,000.000</b>	<b>74 días</b>	<b>lun 7/10/19</b>	<b>jue 30/1/20</b>							
1271		Definición de especificaciones	22 días	lun 7/10/19	mar 5/11/19							
1272		Elaboracion de especificaciones técnicas	5 días	mié 6/11/19	mar 12/11/19	1271						
1273		Recepción de solicitud y especificaciones técnicas	1 día	mié 13/11/19	mié 13/11/19	1272						
1274		Convocar a Comisión de recomendación de adjudicaciones	3 días	jue 14/11/19	lun 18/11/19	1273						
1275		Sesión de comisión de adjudicación	1 día	mar 19/11/19	mar 19/11/19	1274						
1276		Elaboracion del cartel	5 días	mié 20/11/19	mar 26/11/19	1275						
1277		Revisión Técnica de cartel	5 días	mié 27/11/19	mar 3/12/19	1276						
1278		Revisión Jurídica de cartel UJI	5 días	mié 4/12/19	mar 10/12/19	1277						
1279		Confección de invitacion con Anexo de especificaciones tecnicas	1 día	mié 11/12/19	mié 11/12/19	1278						
1280		Elaboracion y recepcion de oferta	5 días	jue 12/12/19	mié 18/12/19	1279						
1281		Revisión de oferta Unidad Técnica	7 días	jue 19/12/19	vie 10/1/20	1280						
1282		Oficio de analisis Técnico	1 día	lun 13/1/20	lun 13/1/20	1281						
1283		Convocar a Comisión de recomendación de adjudicaciones	3 días	mar 14/1/20	jue 16/1/20	1282						
1284		Sesión de comisión de adjudicación	1 día	vie 17/1/20	vie 17/1/20	1283						
1285		Elaboracion de Resolución	2 días	mar 14/1/20	mié 15/1/20	1282						
1286		Comunicación de Resolución	1 día	jue 16/1/20	jue 16/1/20	1285						

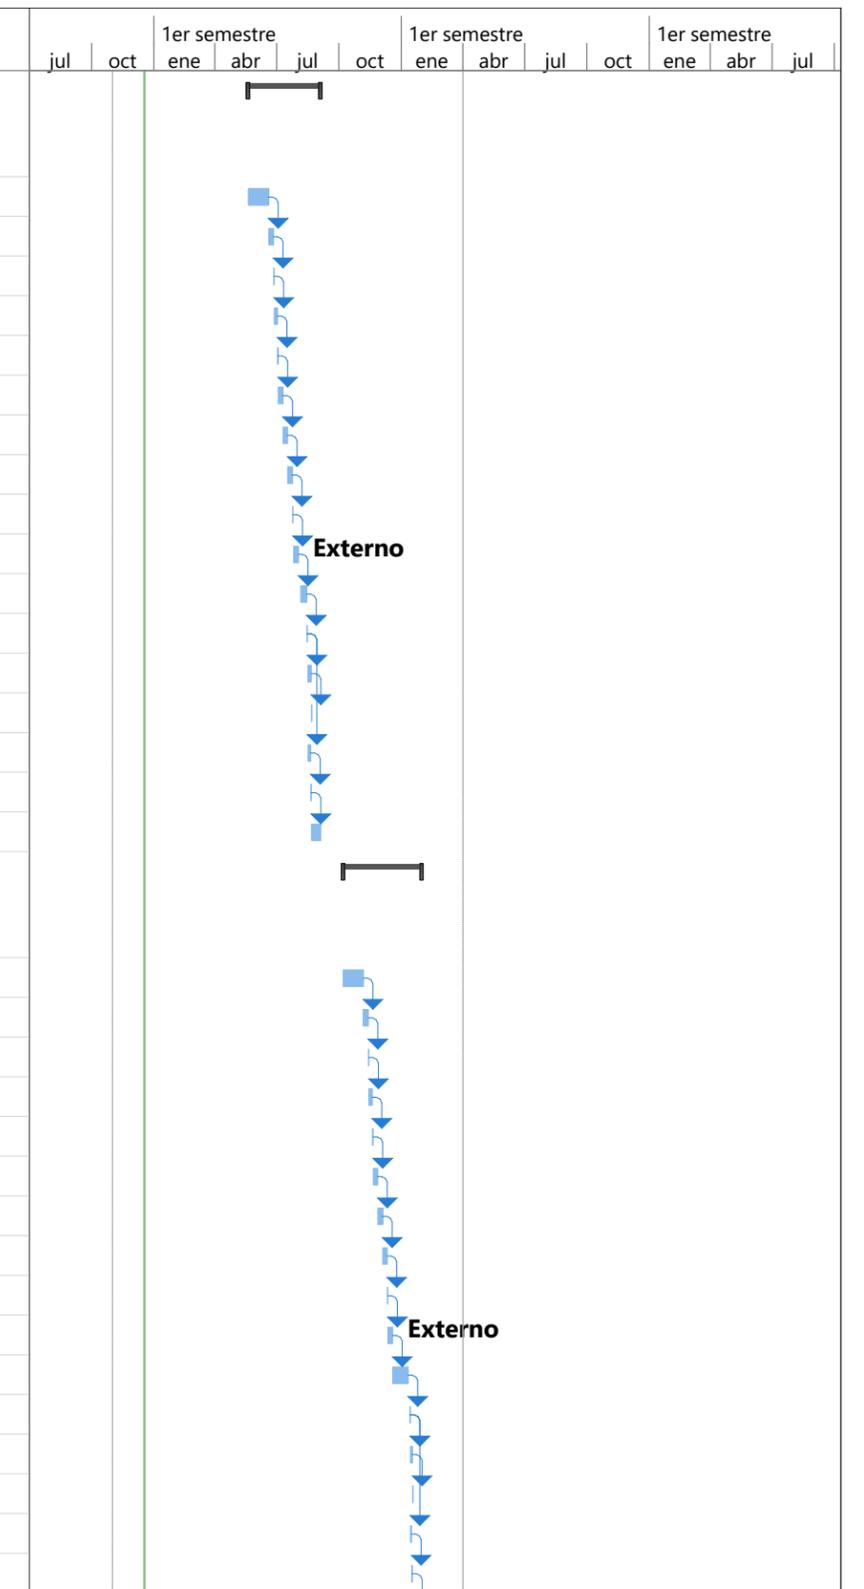

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: mar 18/12/18

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre		1er semestre		1er semestre	
							ene	abr	ene	abr	ene	abr
1287		Formalización y aprobación de contrato	10 días	vie 17/1/20	jue 30/1/20	1286						
1288		<b>Artículo 209 RLCA</b>	<b>21 días</b>	<b>lun 5/8/19</b>	<b>mar 3/9/19</b>							
1289		<b>UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (UTI)</b>	<b>21 días</b>	<b>lun 5/8/19</b>	<b>mar 3/9/19</b>							
1290		<b>2016LA-000005-0005400001; Contratar los servicios de correo electrónico y de las herramientas colaborativas en la nube Google Apps, para la Contraloría General de la República; prórroga por 1,5 años / Contratado al 07/11/2019</b>	<b>21 días</b>	<b>lun 5/8/19</b>	<b>mar 3/9/19</b>							
1291		Elaboración de solicitud de contratación	5 días	lun 5/8/19	vie 9/8/19							
1292		Envío de solicitud a la USP	1 día	lun 12/8/19	lun 12/8/19	1291						
1293		Oficio a empresa preguntando si mantiene términos y condiciones	1 día	mar 13/8/19	mar 13/8/19	1292						
1294		Plazo para que la empresa conteste	3 días	mié 14/8/19	lun 19/8/19	1293						
1295		Elaboración de Resolución Administrativa	3 días	mar 20/8/19	jue 22/8/19	1294						
1296		Revisión y firma de Resolución	3 días	vie 23/8/19	mar 27/8/19	1295						
1297		Notificación de resolución	1 día	mié 28/8/19	mié 28/8/19	1296						
1298		Elaboración de pedido de compra	1 día	jue 29/8/19	jue 29/8/19	1297						
1299		<b>Recepción de los items</b>	<b>3 días</b>	<b>jue 29/8/19</b>	<b>mar 3/9/19</b>							
1300		Entrega de los bienes/servicios	0 días	jue 29/8/19	jue 29/8/19	1298						
1301		Recibido a satisfacción	3 días	vie 30/8/19	mar 3/9/19	1300						
1302		Fin recepción de items	0 días	mar 3/9/19	mar 3/9/19	1301						
1303		<b>COMPRAS DIRECTAS</b>	<b>275,5 días</b>	<b>lun 7/1/19</b>	<b>lun 24/2/20</b>							
1304		<b>UNIDAD DE GESTIÓN DE POTENCIAL HUMANO (UGPH)</b>	<b>270,5 días</b>	<b>lun 14/1/19</b>	<b>lun 24/2/20</b>							
1305		<b>2019CD-000001-503; Capacitación abierta; de enero a diciembre 2019 €77,161.600</b>	<b>40 días</b>	<b>lun 14/1/19</b>	<b>vie 8/3/19</b>							
1306		<b>Contratación</b>	<b>0,8 días</b>	<b>lun 14/1/19</b>	<b>lun 14/1/19</b>							
1307		Contacto al Proveedor	0,5 días	lun 14/1/19	lun 14/1/19							
1308		Verificación de datos	0,1 días	lun 14/1/19	lun 14/1/19	1307						
1309		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	0,1 días	lun 14/1/19	lun 14/1/19	1308						
1310		Adjudicación en firme	0,1 días	lun 14/1/19	lun 14/1/19	1309						
1311		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>3,2 días</b>	<b>lun 14/1/19</b>	<b>jue 17/1/19</b>							
1312		Elaboración del Pedido de Compra	0,2 días	lun 14/1/19	lun 14/1/19	1310						
1313		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	2 días	mar 15/1/19	mié 16/1/19	1312						
1314		Notificación de Pedido de Compra	1 día	jue 17/1/19	jue 17/1/19	1313						
1315		<b>Ejecución</b>	<b>4 días</b>	<b>vie 18/1/19</b>	<b>mié 23/1/19</b>							
1316		Realización del Evento	1 día	vie 18/1/19	vie 18/1/19	1314						
1317		Recibido a satisfacción	3 días	lun 21/1/19	mié 23/1/19	1316						
1318		<b>Trámite de pago</b>	<b>32 días</b>	<b>jue 24/1/19</b>	<b>vie 8/3/19</b>							
1319		Envío documentos a Financiero	2 días	jue 24/1/19	vie 25/1/19	1317						
1320		Emisión de pago en Financiero	30 días	lun 28/1/19	vie 8/3/19	1319						

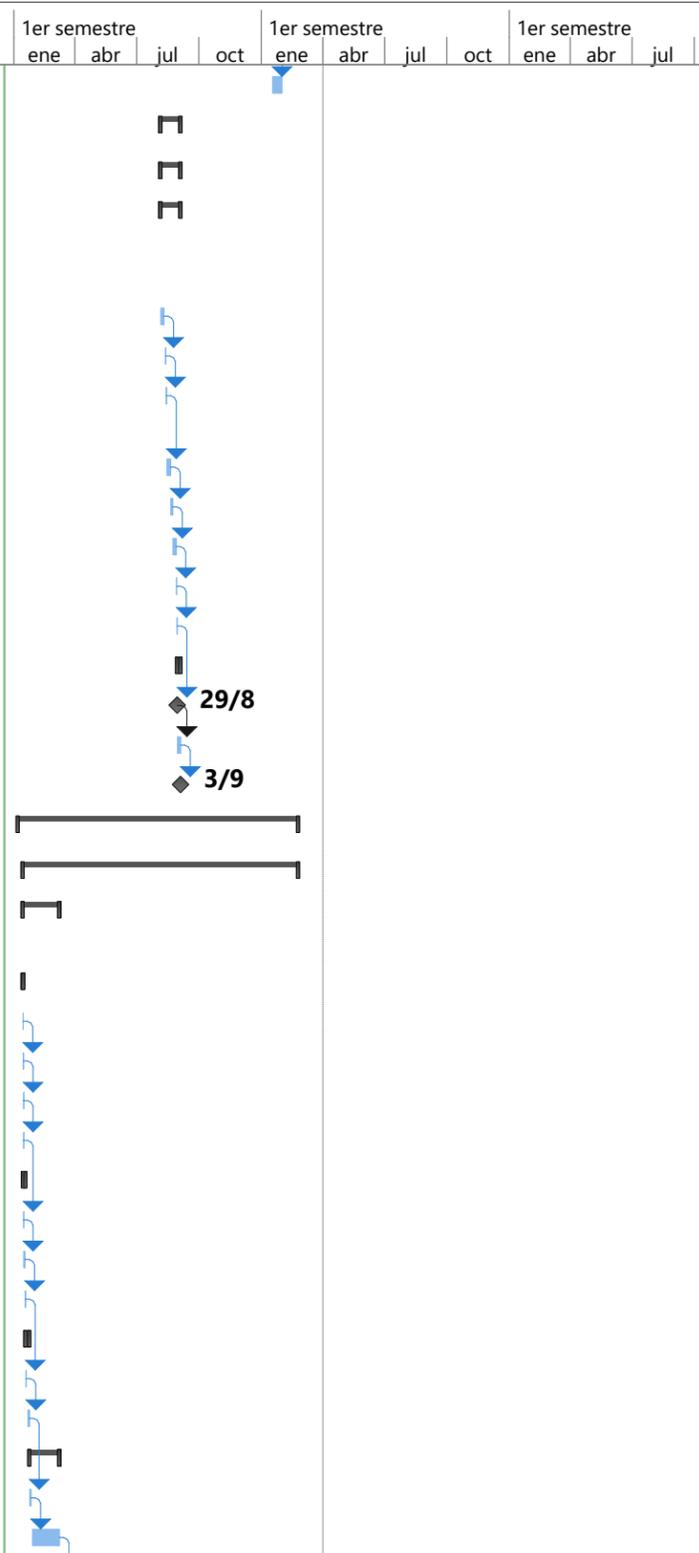

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: mar 18/12/18

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre				1er semestre				1er semestre				
							ene	abr	ene	abr	ene	abr	ene	abr	ene	abr	ene	abr	
1321		Conclusión trámite de Contratación	0 días	vie 8/3/19	vie 8/3/19	1320													
1322		<b>2019CD-00002-503_Licencias Potencial Humano; entregan especificaciones 01/04/2019; €3,500.000</b>	<b>76,5 días</b>	<b>lun 1/4/19</b>	<b>vie 26/7/19</b>														
1323		<b>Elaboración de Cartel</b>	<b>5,5 días</b>	<b>lun 1/4/19</b>	<b>lun 8/4/19</b>														
1324		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 1/4/19	lun 1/4/19														
1325		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 1/4/19	mar 2/4/19	1324													
1326		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 3/4/19	mié 3/4/19	1325													
1327		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 4/4/19	jue 4/4/19	1326													
1328		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 5/4/19	vie 5/4/19	1327													
1329		Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 8/4/19	lun 8/4/19	1328													
1330		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>lun 8/4/19</b>	<b>lun 29/4/19</b>														
1331		<b>Invitación a participar</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 8/4/19</b>	<b>mar 23/4/19</b>														
1332		Invitación	5 días	lun 8/4/19	mar 23/4/19	1329													
1333		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	0 días	lun 8/4/19	lun 8/4/19	1332CC													
1334		Resolver recurso de Objeción al cartel	0 días	lun 8/4/19	lun 8/4/19	1333													
1335		Nuevo plazo para recibir ofertas	0 días	lun 8/4/19	lun 8/4/19	1334													
1336		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>lun 8/4/19</b>	<b>lun 29/4/19</b>														
1337		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 8/4/19	lun 8/4/19	1335													
1338		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 8/4/19	lun 8/4/19	1337													
1339		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 8/4/19	lun 22/4/19	1338													
1340		Envío de prevenciones	0 días	lun 22/4/19	lun 22/4/19	1339													
1341		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	lun 22/4/19	mié 24/4/19	1340													
1342		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mié 24/4/19	vie 26/4/19	1341													
1343		Elaboración de Informe Técnico	1 día	vie 26/4/19	lun 29/4/19	1342													
1344		<b>Recomendación, adjudicación y comunicación</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 29/4/19</b>	<b>mar 30/4/19</b>														
1345		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	lun 29/4/19	mar 30/4/19	1343													
1346		<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>11 días</b>	<b>mar 30/4/19</b>	<b>jue 16/5/19</b>														
1347		Plazo para recibir recurso	2 días	mar 30/4/19	vie 3/5/19	1345													
1348		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	vie 3/5/19	mar 7/5/19	1347													
1349		Plazo para audiencia inicial	2 días	mar 7/5/19	jue 9/5/19	1348													
1350		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	jue 9/5/19	mar 14/5/19	1349													
1351		Adjudicación en firme	2 días	mar 14/5/19	jue 16/5/19	1350													
1352		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>5 días</b>	<b>jue 16/5/19</b>	<b>jue 23/5/19</b>														
1353		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	jue 16/5/19	vie 17/5/19	1351													
1354		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	vie 17/5/19	mié 22/5/19	1353													
1355		Notificación de Pedido de Compra	1 día	mié 22/5/19	jue 23/5/19	1354													
1356		<b>Recepción de los items</b>	<b>13 días</b>	<b>jue 23/5/19</b>	<b>mar 11/6/19</b>														
1357		Entrega de los bienes/servicios	10 días	jue 23/5/19	jue 6/6/19	1355													

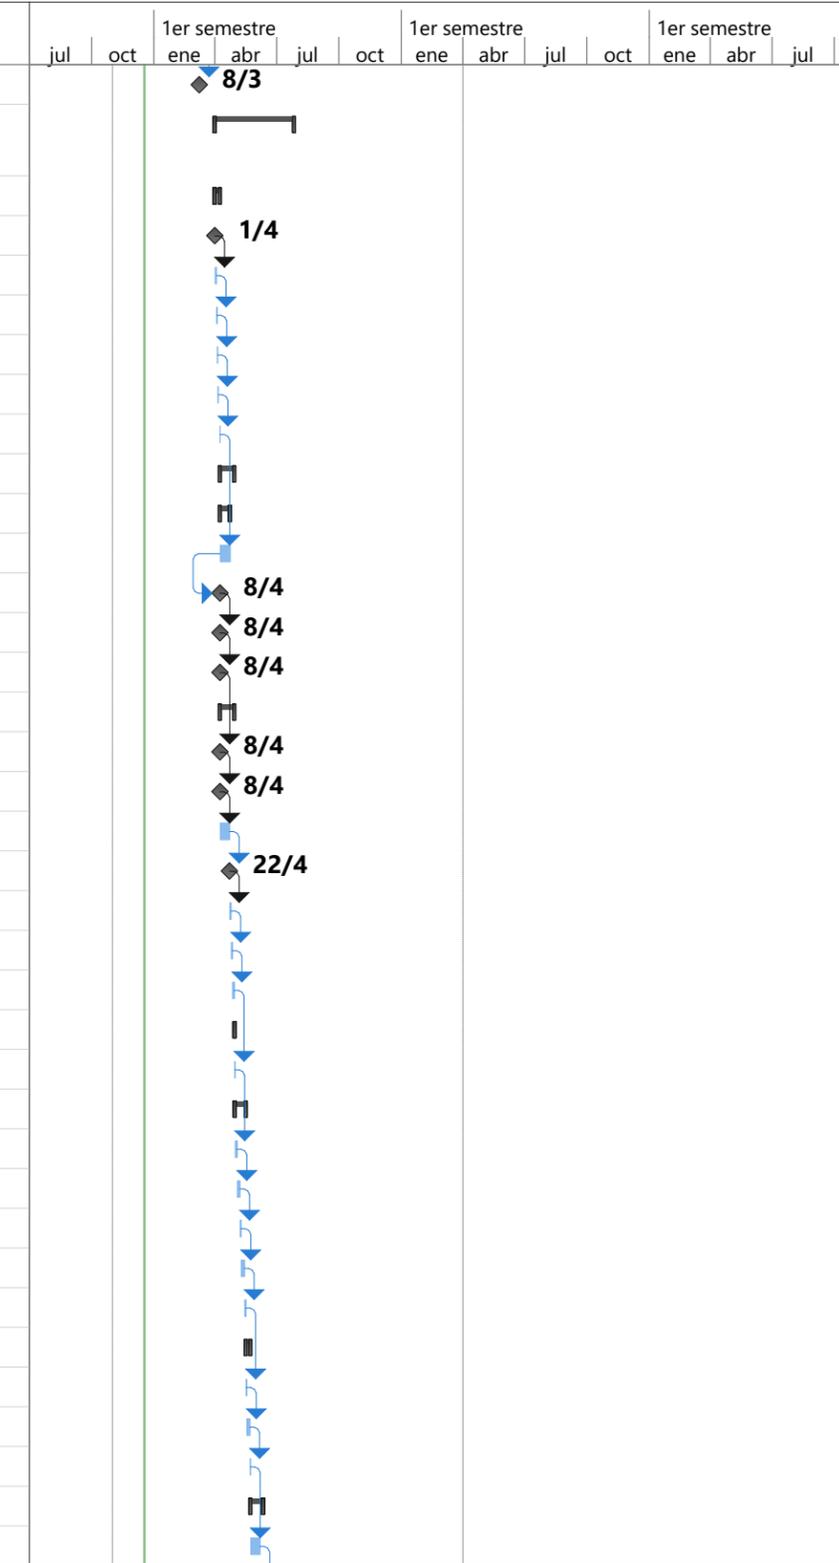

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: mar 18/12/18

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre															
							jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr	jul			
1358		Recibido a satisfacción	3 días	jue 6/6/19	mar 11/6/19	1357																
1359		<b>Trámite de pago</b>	<b>32 días</b>	<b>mar 11/6/19</b>	<b>vie 26/7/19</b>																	
1360		Envío documentos a Financiero	2 días	mar 11/6/19	jue 13/6/19	1358																
1361		Emisión de pago en Financiero	30 días	jue 13/6/19	vie 26/7/19	1360																
1362		Conclusión trámite de Contratación	0 días	vie 26/7/19	vie 26/7/19	1361																
1363		<b>2019CD-00003-503; Servicio de aplicación de web para la selección y contratación en Recursos Humanos; Vence 17/01/2020; c2,210.000</b>	<b>76,5 días</b>	<b>vie 25/10/19</b>	<b>lun 24/2/20</b>																	
1364		<b>Elaboración de Cartel</b>	<b>5,5 días</b>	<b>vie 25/10/19</b>	<b>vie 1/11/19</b>																	
1365		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	vie 25/10/19	vie 25/10/19																	
1366		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	vie 25/10/19	lun 28/10/19	1365																
1367		Revisión Técnica de cartel	1 día	mar 29/10/19	mar 29/10/19	1366																
1368		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	mié 30/10/19	mié 30/10/19	1367																
1369		Confección de cartel definitivo	1 día	jue 31/10/19	jue 31/10/19	1368																
1370		Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	vie 1/11/19	vie 1/11/19	1369																
1371		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>vie 1/11/19</b>	<b>jue 14/11/19</b>																	
1372		<b>Invitación a participar</b>	<b>5 días</b>	<b>vie 1/11/19</b>	<b>vie 8/11/19</b>																	
1373		Invitación	5 días	vie 1/11/19	vie 8/11/19	1370																
1374		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	0 días	vie 1/11/19	vie 1/11/19	1373CC																
1375		Resolver recurso de Objeción al cartel	0 días	vie 1/11/19	vie 1/11/19	1374																
1376		Nuevo plazo para recibir ofertas	0 días	vie 1/11/19	vie 1/11/19	1375																
1377		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>vie 1/11/19</b>	<b>jue 14/11/19</b>																	
1378		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	vie 1/11/19	vie 1/11/19	1376																
1379		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	vie 1/11/19	vie 1/11/19	1378																
1380		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	vie 1/11/19	jue 7/11/19	1379																
1381		Envío de prevenciones	0 días	jue 7/11/19	jue 7/11/19	1380																
1382		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	jue 7/11/19	lun 11/11/19	1381																
1383		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	lun 11/11/19	mié 13/11/19	1382																
1384		Elaboración de Informe Técnico	1 día	mié 13/11/19	jue 14/11/19	1383																
1385		<b>Recomendación, adjudicación y comunicación</b>	<b>1 día</b>	<b>jue 14/11/19</b>	<b>vie 15/11/19</b>																	
1386		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	jue 14/11/19	vie 15/11/19	1384																
1387		<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>11 días</b>	<b>vie 15/11/19</b>	<b>lun 2/12/19</b>																	
1388		Plazo para recibir recurso	2 días	vie 15/11/19	mar 19/11/19	1386																
1389		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mar 19/11/19	jue 21/11/19	1388																
1390		Plazo para audiencia inicial	2 días	jue 21/11/19	lun 25/11/19	1389																
1391		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	lun 25/11/19	jue 28/11/19	1390																
1392		Adjudicación en firme	2 días	jue 28/11/19	lun 2/12/19	1391																
1393		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 2/12/19</b>	<b>lun 9/12/19</b>																	
1394		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	lun 2/12/19	mar 3/12/19	1392																

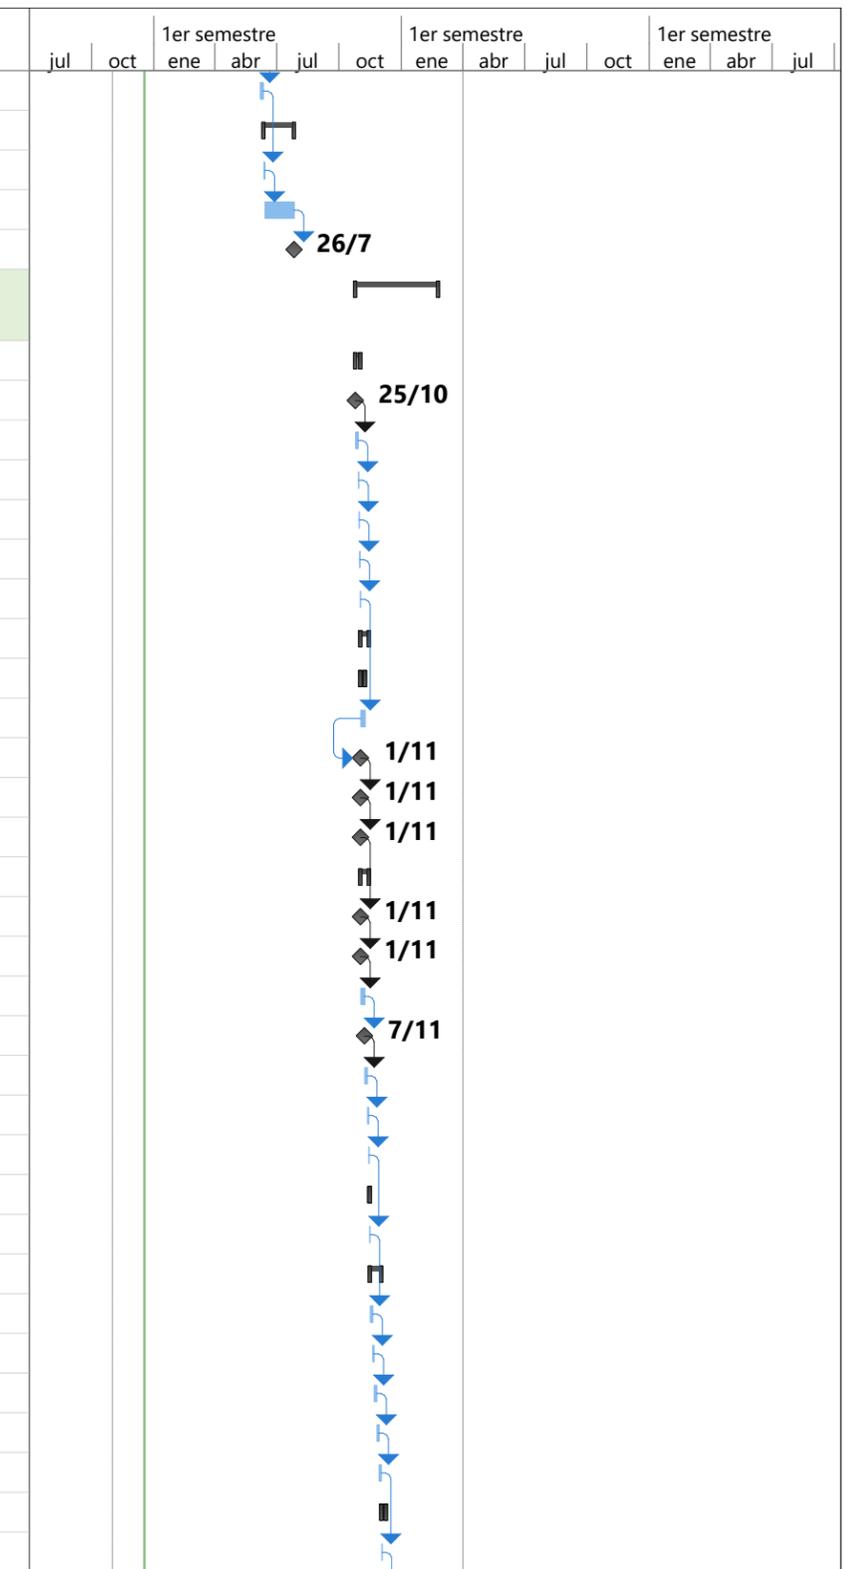

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: mar 18/12/18

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre		1er semestre		1er semestre	
							ene	abr	ene	abr	ene	abr
1395		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mar 3/12/19	vie 6/12/19	1394						
1396		Notificación de Pedido de Compra	1 día	vie 6/12/19	lun 9/12/19	1395						
1397		<b>Recepción de los items</b>	<b>13 días</b>	<b>lun 9/12/19</b>	<b>jue 9/1/20</b>							
1398		Entrega de los bienes/servicios	10 días	lun 9/12/19	lun 6/1/20	1396						
1399		Recibido a satisfacción	3 días	lun 6/1/20	jue 9/1/20	1398						
1400		<b>Trámite de pago</b>	<b>32 días</b>	<b>jue 9/1/20</b>	<b>lun 24/2/20</b>							
1401		Envío documentos a Financiero	2 días	jue 9/1/20	lun 13/1/20	1399						
1402		Emisión de pago en Financiero	30 días	lun 13/1/20	lun 24/2/20	1401						
1403		Conclusión trámite de Contratación	0 días	lun 24/2/20	lun 24/2/20	1402						
1404		<b>UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (USG)</b>	<b>76,5 días</b>	<b>lun 26/8/19</b>	<b>mar 10/12/19</b>							
1405		<b>2019CD-00004-503; Mantenimiento de extintores; Contratado al 27/10/2019; €600.000/año; €2,400.000/4 años</b>	<b>76,5 días</b>	<b>lun 26/8/19</b>	<b>mar 10/12/19</b>							
1406		<b>Elaboración de Cartel</b>	<b>5,5 días</b>	<b>lun 26/8/19</b>	<b>lun 2/9/19</b>							
1407		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 26/8/19	lun 26/8/19							
1408		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 26/8/19	mar 27/8/19	1407						
1409		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 28/8/19	mié 28/8/19	1408						
1410		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 29/8/19	jue 29/8/19	1409						
1411		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 30/8/19	vie 30/8/19	1410						
1412		Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 2/9/19	lun 2/9/19	1411						
1413		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>lun 2/9/19</b>	<b>vie 13/9/19</b>							
1414		<b>Invitación a participar</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 2/9/19</b>	<b>lun 9/9/19</b>							
1415		Invitación	5 días	lun 2/9/19	lun 9/9/19	1412						
1416		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	0 días	lun 2/9/19	lun 2/9/19	1415CC						
1417		Resolver recurso de Objeción al cartel	0 días	lun 2/9/19	lun 2/9/19	1416						
1418		Nuevo plazo para recibir ofertas	0 días	lun 2/9/19	lun 2/9/19	1417						
1419		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>lun 2/9/19</b>	<b>vie 13/9/19</b>							
1420		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 2/9/19	lun 2/9/19	1418						
1421		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 2/9/19	lun 2/9/19	1420						
1422		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 2/9/19	vie 6/9/19	1421						
1423		Envío de prevenciones	0 días	vie 6/9/19	vie 6/9/19	1422						
1424		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 6/9/19	mar 10/9/19	1423						
1425		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 10/9/19	jue 12/9/19	1424						
1426		Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 12/9/19	vie 13/9/19	1425						
1427		<b>Recomendación, adjudicación y comunicación</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 13/9/19</b>	<b>lun 16/9/19</b>							
1428		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 13/9/19	lun 16/9/19	1426						
1429		<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>11 días</b>	<b>lun 16/9/19</b>	<b>mar 1/10/19</b>							
1430		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 16/9/19	mié 18/9/19	1428						
1431		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 18/9/19	vie 20/9/19	1430						

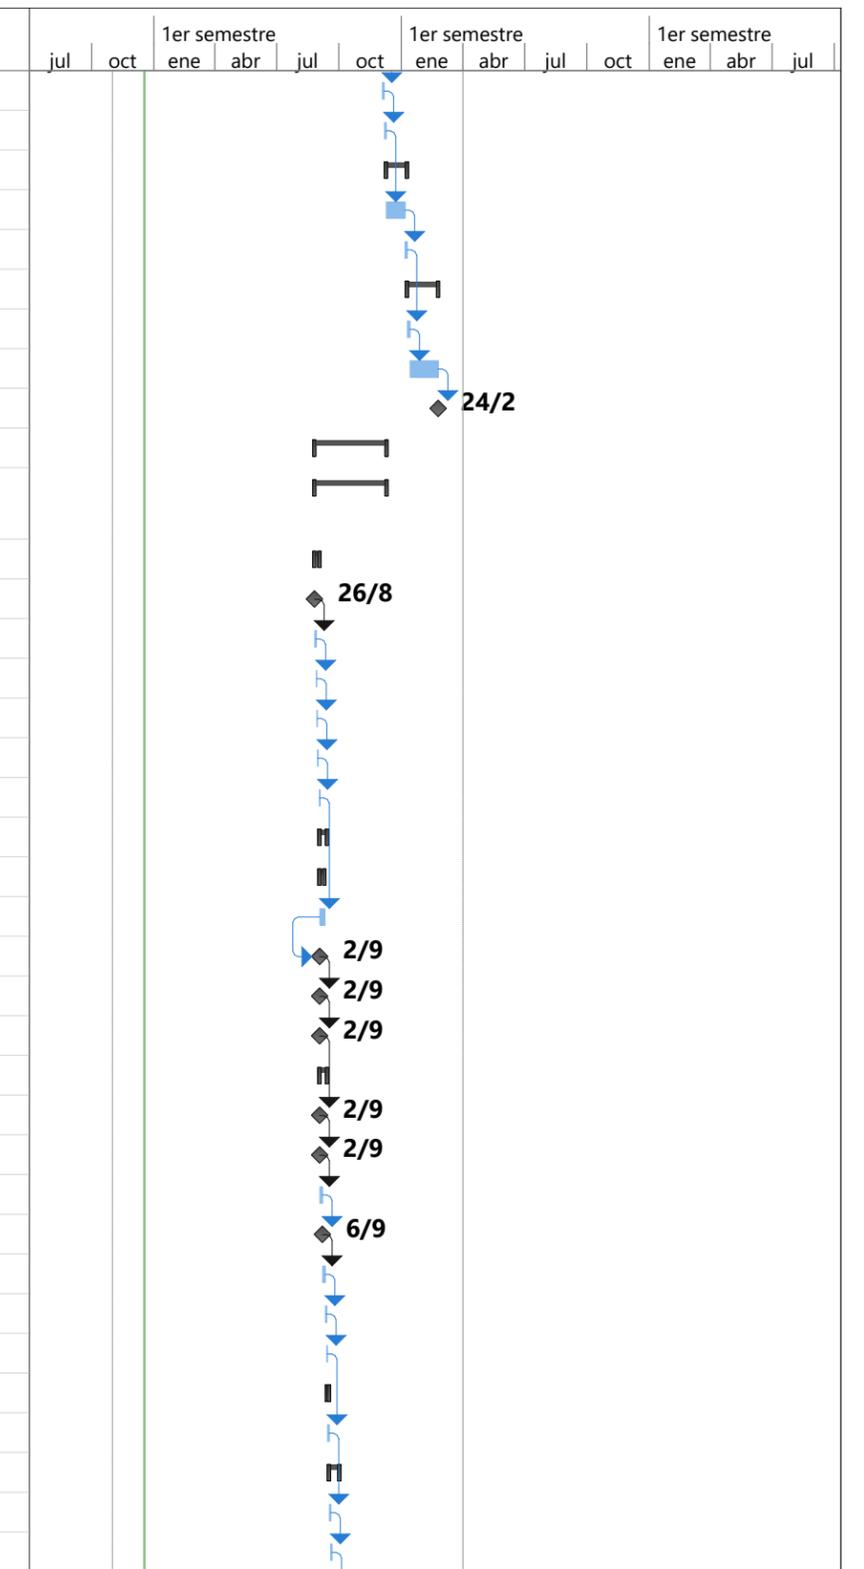

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: mar 18/12/18

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	jul		1er semestre		jul		1er semestre		jul	
							oct	ene	abr	ene	abr	ene	abr	ene	abr	
1432		Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 20/9/19	mar 24/9/19	1431										
1433		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	mar 24/9/19	vie 27/9/19	1432										
1434		Adjudicación en firme	2 días	vie 27/9/19	mar 1/10/19	1433										
1435		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>5 días</b>	<b>mar 1/10/19</b>	<b>mar 8/10/19</b>											
1436		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 1/10/19	mié 2/10/19	1434										
1437		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 2/10/19	lun 7/10/19	1436										
1438		Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 7/10/19	mar 8/10/19	1437										
1439		<b>Recepción de los items</b>	<b>13 días</b>	<b>mar 8/10/19</b>	<b>vie 25/10/19</b>											
1440		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 8/10/19	mar 22/10/19	1438										
1441		Recibido a satisfacción	3 días	mar 22/10/19	vie 25/10/19	1440										
1442		<b>Trámite de pago</b>	<b>32 días</b>	<b>vie 25/10/19</b>	<b>mar 10/12/19</b>											
1443		Envío documentos a Financiero	2 días	vie 25/10/19	mar 29/10/19	1441										
1444		Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 29/10/19	mar 10/12/19	1443										
1445		Conclusión trámite de Contratación	0 días	mar 10/12/19	mar 10/12/19	1444										
1446		<b>UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (UTI)</b>	<b>136,5 días</b>	<b>lun 7/1/19</b>	<b>vie 26/7/19</b>											
1447		<b>2019CD-000005-0005400001; Adquisición de switches para pisos, para soportar el crecimiento en la red alámbrica; invitar en Marzo, €14,925.000</b>	<b>81,5 días</b>	<b>lun 25/2/19</b>	<b>jue 27/6/19</b>											
1448		<b>Elaboración de Cartel</b>	<b>5,5 días</b>	<b>lun 25/2/19</b>	<b>lun 4/3/19</b>											
1449		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 25/2/19	lun 25/2/19											
1450		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 25/2/19	mar 26/2/19	1449										
1451		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 27/2/19	mié 27/2/19	1450										
1452		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 28/2/19	jue 28/2/19	1451										
1453		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 1/3/19	vie 1/3/19	1452										
1454		Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 4/3/19	lun 4/3/19	1453										
1455		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>lun 4/3/19</b>	<b>vie 15/3/19</b>											
1456		<b>Invitación a participar</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 4/3/19</b>	<b>lun 11/3/19</b>											
1457		Invitación	5 días	lun 4/3/19	lun 11/3/19	1454										
1458		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	0 días	lun 4/3/19	lun 4/3/19	1457CC										
1459		Resolver recurso de Objeción al cartel	0 días	lun 4/3/19	lun 4/3/19	1458										
1460		Nuevo plazo para recibir ofertas	0 días	lun 4/3/19	lun 4/3/19	1459										
1461		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>lun 4/3/19</b>	<b>vie 15/3/19</b>											
1462		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 4/3/19	lun 4/3/19	1460										
1463		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 4/3/19	lun 4/3/19	1462										
1464		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 4/3/19	vie 8/3/19	1463										
1465		Envío de prevenciones	0 días	vie 8/3/19	vie 8/3/19	1464										
1466		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 8/3/19	mar 12/3/19	1465										
1467		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 12/3/19	jue 14/3/19	1466										
1468		Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 14/3/19	vie 15/3/19	1467										

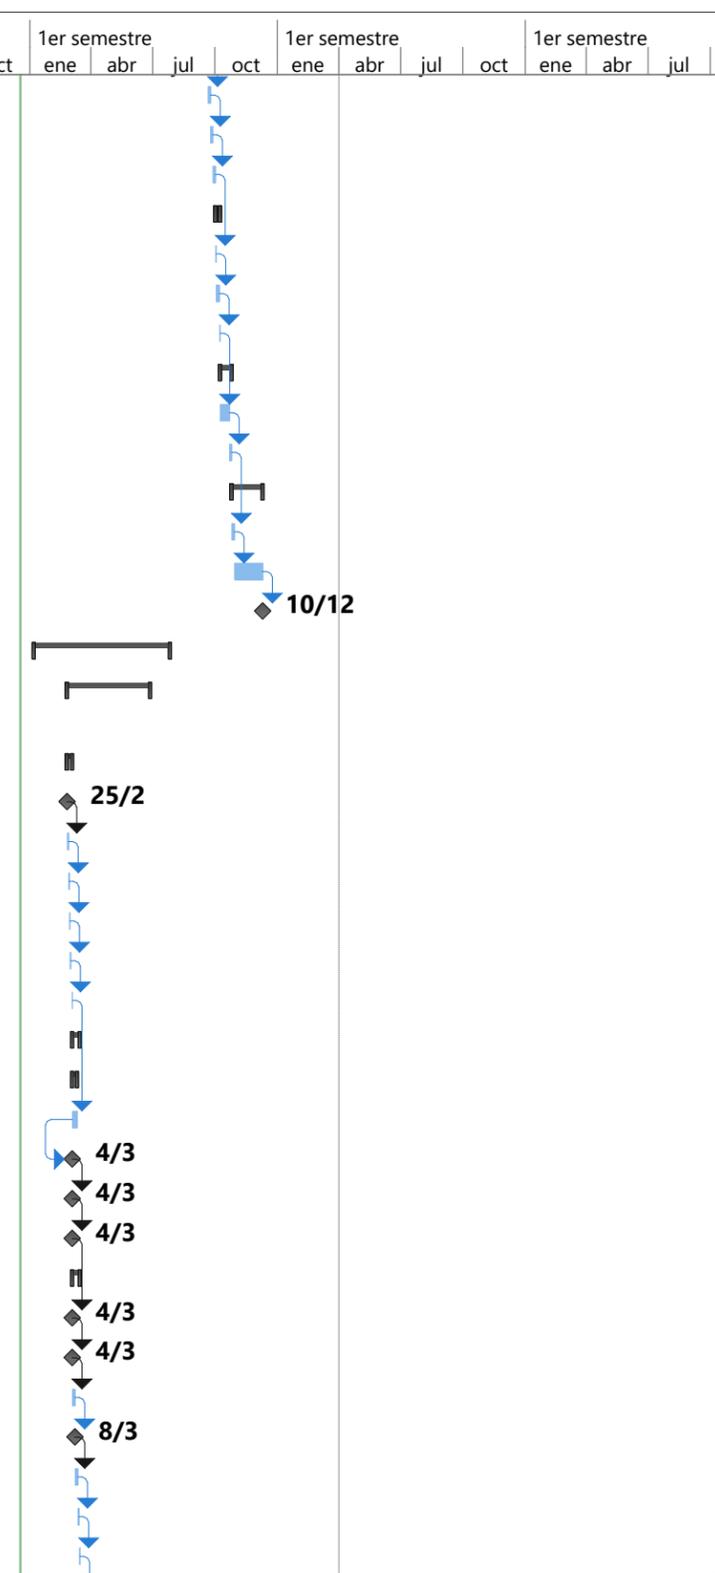

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: mar 18/12/18

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	jul		1er semestre		1er semestre		1er semestre		jul	
							oct	ene	abr	ene	abr	ene	abr	ene	abr	ene
1469		<b>Recomendación, adjudicación y comunicación</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 15/3/19</b>	<b>lun 18/3/19</b>											
1470		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 15/3/19	lun 18/3/19	1468										
1471		<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>11 días</b>	<b>lun 18/3/19</b>	<b>mar 2/4/19</b>											
1472		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 18/3/19	mié 20/3/19	1470										
1473		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 20/3/19	vie 22/3/19	1472										
1474		Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 22/3/19	mar 26/3/19	1473										
1475		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	mar 26/3/19	vie 29/3/19	1474										
1476		Adjudicación en firme	2 días	vie 29/3/19	mar 2/4/19	1475										
1477		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>5 días</b>	<b>mar 2/4/19</b>	<b>mar 9/4/19</b>											
1478		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 2/4/19	mié 3/4/19	1476										
1479		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 3/4/19	lun 8/4/19	1478										
1480		Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 8/4/19	mar 9/4/19	1479										
1481		<b>Recepción de los items</b>	<b>18 días</b>	<b>mar 9/4/19</b>	<b>mar 14/5/19</b>											
1482		Entrega de los bienes/servicios	15 días	mar 9/4/19	jue 9/5/19	1480										
1483		Recibido a satisfacción	3 días	jue 9/5/19	mar 14/5/19	1482										
1484		<b>Trámite de pago</b>	<b>32 días</b>	<b>mar 14/5/19</b>	<b>jue 27/6/19</b>											
1485		Envío documentos a Financiero	2 días	mar 14/5/19	jue 16/5/19	1483										
1486		Emisión de pago en Financiero	30 días	jue 16/5/19	jue 27/6/19	1485										
1487		Conclusión trámite de Contratación	0 días	jue 27/6/19	jue 27/6/19	1486										
1488		<b>2019CD-00006-503; Analisis de vulnerabilidades; fecha por definir con la UTI; c4,520.000</b>	<b>81,5 días</b>	<b>lun 11/3/19</b>	<b>jue 11/7/19</b>											
1489		<b>Elaboración de Cartel</b>	<b>5,5 días</b>	<b>lun 11/3/19</b>	<b>lun 18/3/19</b>											
1490		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 11/3/19	lun 11/3/19											
1491		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 11/3/19	mar 12/3/19	1490										
1492		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 13/3/19	mié 13/3/19	1491										
1493		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 14/3/19	jue 14/3/19	1492										
1494		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 15/3/19	vie 15/3/19	1493										
1495		Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 18/3/19	lun 18/3/19	1494										
1496		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>lun 18/3/19</b>	<b>vie 29/3/19</b>											
1497		<b>Invitación a participar</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 18/3/19</b>	<b>lun 25/3/19</b>											
1498		Invitación	5 días	lun 18/3/19	lun 25/3/19	1495										
1499		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	0 días	lun 18/3/19	lun 18/3/19	1498CC										
1500		Resolver recurso de Objeción al cartel	0 días	lun 18/3/19	lun 18/3/19	1499										
1501		Nuevo plazo para recibir ofertas	0 días	lun 18/3/19	lun 18/3/19	1500										
1502		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>lun 18/3/19</b>	<b>vie 29/3/19</b>											
1503		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 18/3/19	lun 18/3/19	1501										
1504		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 18/3/19	lun 18/3/19	1503										
1505		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 18/3/19	vie 22/3/19	1504										

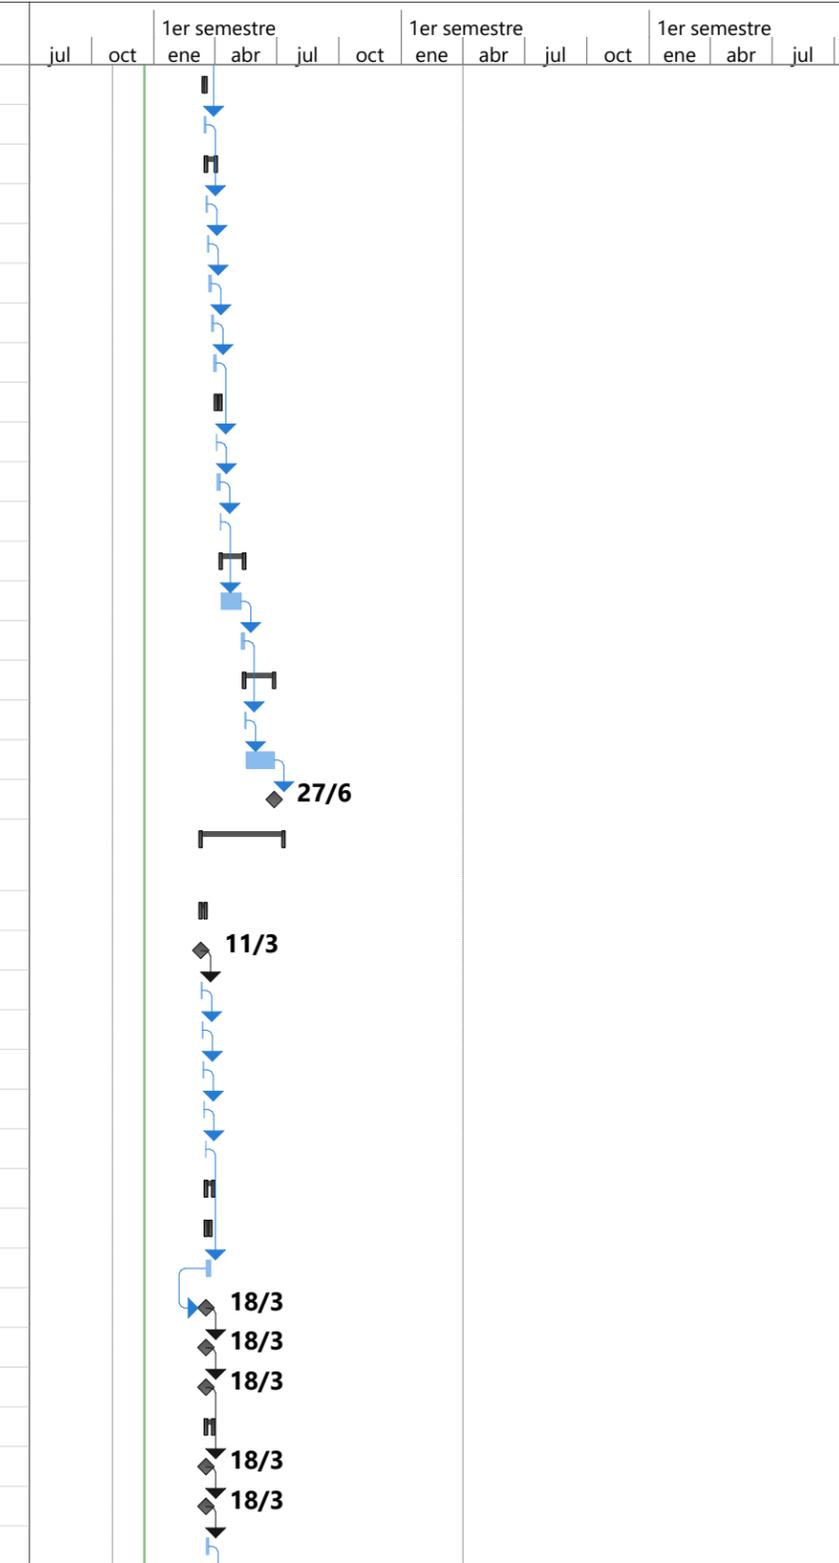

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: mar 18/12/18

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre		1er semestre		1er semestre	
							ene	abr	ene	abr	ene	abr
1506		Envío de prevenciones	0 días	vie 22/3/19	vie 22/3/19	1505						
1507		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 22/3/19	mar 26/3/19	1506						
1508		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 26/3/19	jue 28/3/19	1507						
1509		Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 28/3/19	vie 29/3/19	1508						
1510		<b>Recomendación, adjudicación y comunicación</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 29/3/19</b>	<b>lun 1/4/19</b>							
1511		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 29/3/19	lun 1/4/19	1509						
1512		<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>11 días</b>	<b>lun 1/4/19</b>	<b>mié 24/4/19</b>							
1513		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 1/4/19	mié 3/4/19	1511						
1514		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 3/4/19	vie 5/4/19	1513						
1515		Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 5/4/19	mar 9/4/19	1514						
1516		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	mar 9/4/19	lun 22/4/19	1515						
1517		Adjudicación en firme	2 días	lun 22/4/19	mié 24/4/19	1516						
1518		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>5 días</b>	<b>mié 24/4/19</b>	<b>jue 2/5/19</b>							
1519		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mié 24/4/19	jue 25/4/19	1517						
1520		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	jue 25/4/19	mar 30/4/19	1519						
1521		Notificación de Pedido de Compra	1 día	mar 30/4/19	jue 2/5/19	1520						
1522		<b>Recepción de los items</b>	<b>18 días</b>	<b>jue 2/5/19</b>	<b>mar 28/5/19</b>							
1523		Entrega de los bienes/servicios	15 días	jue 2/5/19	jue 23/5/19	1521						
1524		Recibido a satisfacción	3 días	jue 23/5/19	mar 28/5/19	1523						
1525		<b>Trámite de pago</b>	<b>32 días</b>	<b>mar 28/5/19</b>	<b>jue 11/7/19</b>							
1526		Envío documentos a Financiero	2 días	mar 28/5/19	jue 30/5/19	1524						
1527		Emisión de pago en Financiero	30 días	jue 30/5/19	jue 11/7/19	1526						
1528		Conclusión trámite de Contratación	0 días	jue 11/7/19	jue 11/7/19	1527						
1529		<b>2019CD-00007-503; Reparaciones de equipos; €5,100.000</b>	<b>81,5 días</b>	<b>lun 7/1/19</b>	<b>jue 9/5/19</b>							
1530		<b>Elaboración de Cartel</b>	<b>5,5 días</b>	<b>lun 7/1/19</b>	<b>lun 14/1/19</b>							
1531		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 7/1/19	lun 7/1/19							
1532		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 7/1/19	mar 8/1/19	1531						
1533		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 9/1/19	mié 9/1/19	1532						
1534		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 10/1/19	jue 10/1/19	1533						
1535		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 11/1/19	vie 11/1/19	1534						
1536		Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 14/1/19	lun 14/1/19	1535						
1537		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>lun 14/1/19</b>	<b>vie 25/1/19</b>							
1538		<b>Invitación a participar</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 14/1/19</b>	<b>lun 21/1/19</b>							
1539		Invitación	5 días	lun 14/1/19	lun 21/1/19	1536						
1540		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	0 días	lun 14/1/19	lun 14/1/19	1539CC						
1541		Resolver recurso de Objeción al cartel	0 días	lun 14/1/19	lun 14/1/19	1540						
1542		Nuevo plazo para recibir ofertas	0 días	lun 14/1/19	lun 14/1/19	1541						
1543		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>lun 14/1/19</b>	<b>vie 25/1/19</b>							

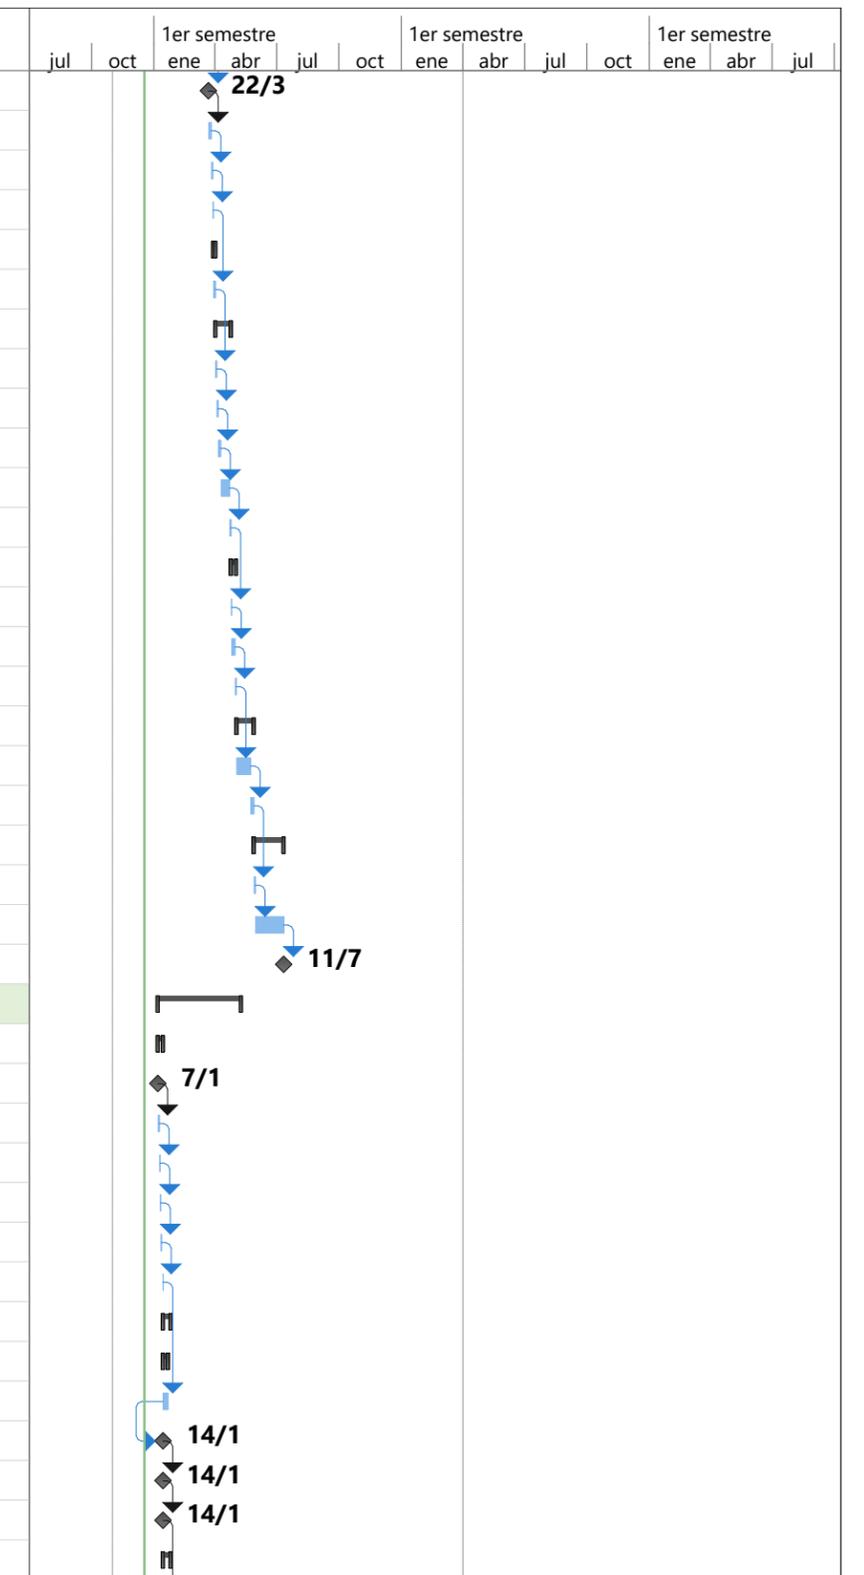

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: mar 18/12/18

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre				1er semestre				1er semestre					
							ene	abr	ene	abr	ene	abr	ene	abr	ene	abr	ene	abr		
1544		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 14/1/19	lun 14/1/19	1542														
1545		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 14/1/19	lun 14/1/19	1544														
1546		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 14/1/19	vie 18/1/19	1545														
1547		Envío de prevenciones	0 días	vie 18/1/19	vie 18/1/19	1546														
1548		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 18/1/19	mar 22/1/19	1547														
1549		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 22/1/19	jue 24/1/19	1548														
1550		Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 24/1/19	vie 25/1/19	1549														
1551		<b>Recomendación, adjudicación y comunicación</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 25/1/19</b>	<b>lun 28/1/19</b>															
1552		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 25/1/19	lun 28/1/19	1550														
1553		<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>11 días</b>	<b>lun 28/1/19</b>	<b>mar 12/2/19</b>															
1554		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 28/1/19	mié 30/1/19	1552														
1555		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 30/1/19	vie 1/2/19	1554														
1556		Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 1/2/19	mar 5/2/19	1555														
1557		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	mar 5/2/19	vie 8/2/19	1556														
1558		Adjudicación en firme	2 días	vie 8/2/19	mar 12/2/19	1557														
1559		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>5 días</b>	<b>mar 12/2/19</b>	<b>mar 19/2/19</b>															
1560		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 12/2/19	mié 13/2/19	1558														
1561		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 13/2/19	lun 18/2/19	1560														
1562		Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 18/2/19	mar 19/2/19	1561														
1563		<b>Recepción de los items</b>	<b>18 días</b>	<b>mar 19/2/19</b>	<b>vie 15/3/19</b>															
1564		Entrega de los bienes/servicios	15 días	mar 19/2/19	mar 12/3/19	1562														
1565		Recibido a satisfacción	3 días	mar 12/3/19	vie 15/3/19	1564														
1566		<b>Trámite de pago</b>	<b>32 días</b>	<b>vie 15/3/19</b>	<b>jue 9/5/19</b>															
1567		Envío documentos a Financiero	2 días	vie 15/3/19	mar 19/3/19	1565														
1568		Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 19/3/19	jue 9/5/19	1567														
1569		Conclusión trámite de Contratación	0 días	jue 9/5/19	jue 9/5/19	1568														
1570		<b>2019CD-00008-503; Repuestos y cartuchos de respaldo; modalidad entrega según demanda inicio 25/03/2019; €1,000.000</b>	<b>81,5 días</b>	<b>lun 25/3/19</b>	<b>vie 26/7/19</b>															
1571		<b>Elaboración de Cartel</b>	<b>5,5 días</b>	<b>lun 25/3/19</b>	<b>lun 1/4/19</b>															
1572		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 25/3/19	lun 25/3/19															
1573		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 25/3/19	mar 26/3/19	1572														
1574		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 27/3/19	mié 27/3/19	1573														
1575		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 28/3/19	jue 28/3/19	1574														
1576		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 29/3/19	vie 29/3/19	1575														
1577		Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 1/4/19	lun 1/4/19	1576														
1578		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>lun 1/4/19</b>	<b>lun 22/4/19</b>															
1579		<b>Invitación a participar</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 1/4/19</b>	<b>lun 8/4/19</b>															
1580		Invitación	5 días	lun 1/4/19	lun 8/4/19	1577														

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: mar 18/12/18

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre		1er semestre		1er semestre	
							ene	abr	ene	abr	ene	abr
1581		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	0 días	lun 1/4/19	lun 1/4/19	1580CC						
1582		Resolver recurso de Objeción al cartel	0 días	lun 1/4/19	lun 1/4/19	1581						
1583		Nuevo plazo para recibir ofertas	0 días	lun 1/4/19	lun 1/4/19	1582						
1584		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>lun 1/4/19</b>	<b>lun 22/4/19</b>							
1585		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 1/4/19	lun 1/4/19	1583						
1586		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 1/4/19	lun 1/4/19	1585						
1587		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 1/4/19	vie 5/4/19	1586						
1588		Envío de prevenciones	0 días	vie 5/4/19	vie 5/4/19	1587						
1589		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 5/4/19	mar 9/4/19	1588						
1590		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 9/4/19	vie 12/4/19	1589						
1591		Elaboración de Informe Técnico	1 día	vie 12/4/19	lun 22/4/19	1590						
1592		<b>Recomendación, adjudicación y comunicación</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 22/4/19</b>	<b>mar 23/4/19</b>							
1593		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	lun 22/4/19	mar 23/4/19	1591						
1594		<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>11 días</b>	<b>mar 23/4/19</b>	<b>jue 9/5/19</b>							
1595		Plazo para recibir recurso	2 días	mar 23/4/19	jue 25/4/19	1593						
1596		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	jue 25/4/19	lun 29/4/19	1595						
1597		Plazo para audiencia inicial	2 días	lun 29/4/19	jue 2/5/19	1596						
1598		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	jue 2/5/19	mar 7/5/19	1597						
1599		Adjudicación en firme	2 días	mar 7/5/19	jue 9/5/19	1598						
1600		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>5 días</b>	<b>jue 9/5/19</b>	<b>jue 16/5/19</b>							
1601		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	jue 9/5/19	vie 10/5/19	1599						
1602		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	vie 10/5/19	mié 15/5/19	1601						
1603		Notificación de Pedido de Compra	1 día	mié 15/5/19	jue 16/5/19	1602						
1604		<b>Recepción de los items</b>	<b>18 días</b>	<b>jue 16/5/19</b>	<b>mar 11/6/19</b>							
1605		Entrega de los bienes/servicios	15 días	jue 16/5/19	jue 6/6/19	1603						
1606		Recibido a satisfacción	3 días	jue 6/6/19	mar 11/6/19	1605						
1607		<b>Trámite de pago</b>	<b>32 días</b>	<b>mar 11/6/19</b>	<b>vie 26/7/19</b>							
1608		Envío documentos a Financiero	2 días	mar 11/6/19	jue 13/6/19	1606						
1609		Emisión de pago en Financiero	30 días	jue 13/6/19	vie 26/7/19	1608						
1610		Conclusión trámite de Contratación	0 días	vie 26/7/19	vie 26/7/19	1609						
1611		<b>DESPACHO CONTRALOR</b>	<b>81,5 días</b>	<b>lun 14/1/19</b>	<b>jue 16/5/19</b>							
1612		<b>2019CD-00009-503_Tiquetes aéreos Oslo Noruega; comprar apenas se cuente con contenido presupuestario €1,750.000</b>	<b>81,5 días</b>	<b>lun 14/1/19</b>	<b>jue 16/5/19</b>							
1613		<b>Elaboración de Cartel</b>	<b>5,5 días</b>	<b>lun 14/1/19</b>	<b>lun 21/1/19</b>							
1614		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 14/1/19	lun 14/1/19							
1615		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 14/1/19	mar 15/1/19	1614						
1616		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 16/1/19	mié 16/1/19	1615						
1617		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 17/1/19	jue 17/1/19	1616						

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: mar 18/12/18

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre		1er semestre		1er semestre	
							ene	abr	ene	abr	ene	abr
1655		<b>Elaboración de Cartel</b>	<b>5,5 días</b>	<b>lun 14/1/19</b>	<b>lun 21/1/19</b>							
1656		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 14/1/19	lun 14/1/19							
1657		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 14/1/19	mar 15/1/19	1656						
1658		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 16/1/19	mié 16/1/19	1657						
1659		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 17/1/19	jue 17/1/19	1658						
1660		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 18/1/19	vie 18/1/19	1659						
1661		Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 21/1/19	lun 21/1/19	1660						
1662		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>lun 21/1/19</b>	<b>vie 1/2/19</b>							
1663		<b>Invitación a participar</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 21/1/19</b>	<b>lun 28/1/19</b>							
1664		Invitación	5 días	lun 21/1/19	lun 28/1/19	1661						
1665		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	0 días	lun 21/1/19	lun 21/1/19	1664CC						
1666		Resolver recurso de Objeción al cartel	0 días	lun 21/1/19	lun 21/1/19	1665						
1667		Nuevo plazo para recibir ofertas	0 días	lun 21/1/19	lun 21/1/19	1666						
1668		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>lun 21/1/19</b>	<b>vie 1/2/19</b>							
1669		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 21/1/19	lun 21/1/19	1667						
1670		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 21/1/19	lun 21/1/19	1669						
1671		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 21/1/19	vie 25/1/19	1670						
1672		Envío de prevenciones	0 días	vie 25/1/19	vie 25/1/19	1671						
1673		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 25/1/19	mar 29/1/19	1672						
1674		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 29/1/19	jue 31/1/19	1673						
1675		Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 31/1/19	vie 1/2/19	1674						
1676		<b>Recomendación, adjudicación y comunicación</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 1/2/19</b>	<b>lun 4/2/19</b>							
1677		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 1/2/19	lun 4/2/19	1675						
1678		<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>11 días</b>	<b>lun 4/2/19</b>	<b>mar 19/2/19</b>							
1679		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 4/2/19	mié 6/2/19	1677						
1680		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 6/2/19	vie 8/2/19	1679						
1681		Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 8/2/19	mar 12/2/19	1680						
1682		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	mar 12/2/19	vie 15/2/19	1681						
1683		Adjudicación en firme	2 días	vie 15/2/19	mar 19/2/19	1682						
1684		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>5 días</b>	<b>mar 19/2/19</b>	<b>mar 26/2/19</b>							
1685		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 19/2/19	mié 20/2/19	1683						
1686		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 20/2/19	lun 25/2/19	1685						
1687		Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 25/2/19	mar 26/2/19	1686						
1688		<b>Recepción de los items</b>	<b>18 días</b>	<b>mar 26/2/19</b>	<b>vie 22/3/19</b>							
1689		Entrega de los bienes/servicios	15 días	mar 26/2/19	mar 19/3/19	1687						
1690		Recibido a satisfacción	3 días	mar 19/3/19	vie 22/3/19	1689						
1691		<b>Trámite de pago</b>	<b>32 días</b>	<b>vie 22/3/19</b>	<b>jue 16/5/19</b>							
1692		Envío documentos a Financiero	2 días	vie 22/3/19	mar 26/3/19	1690						

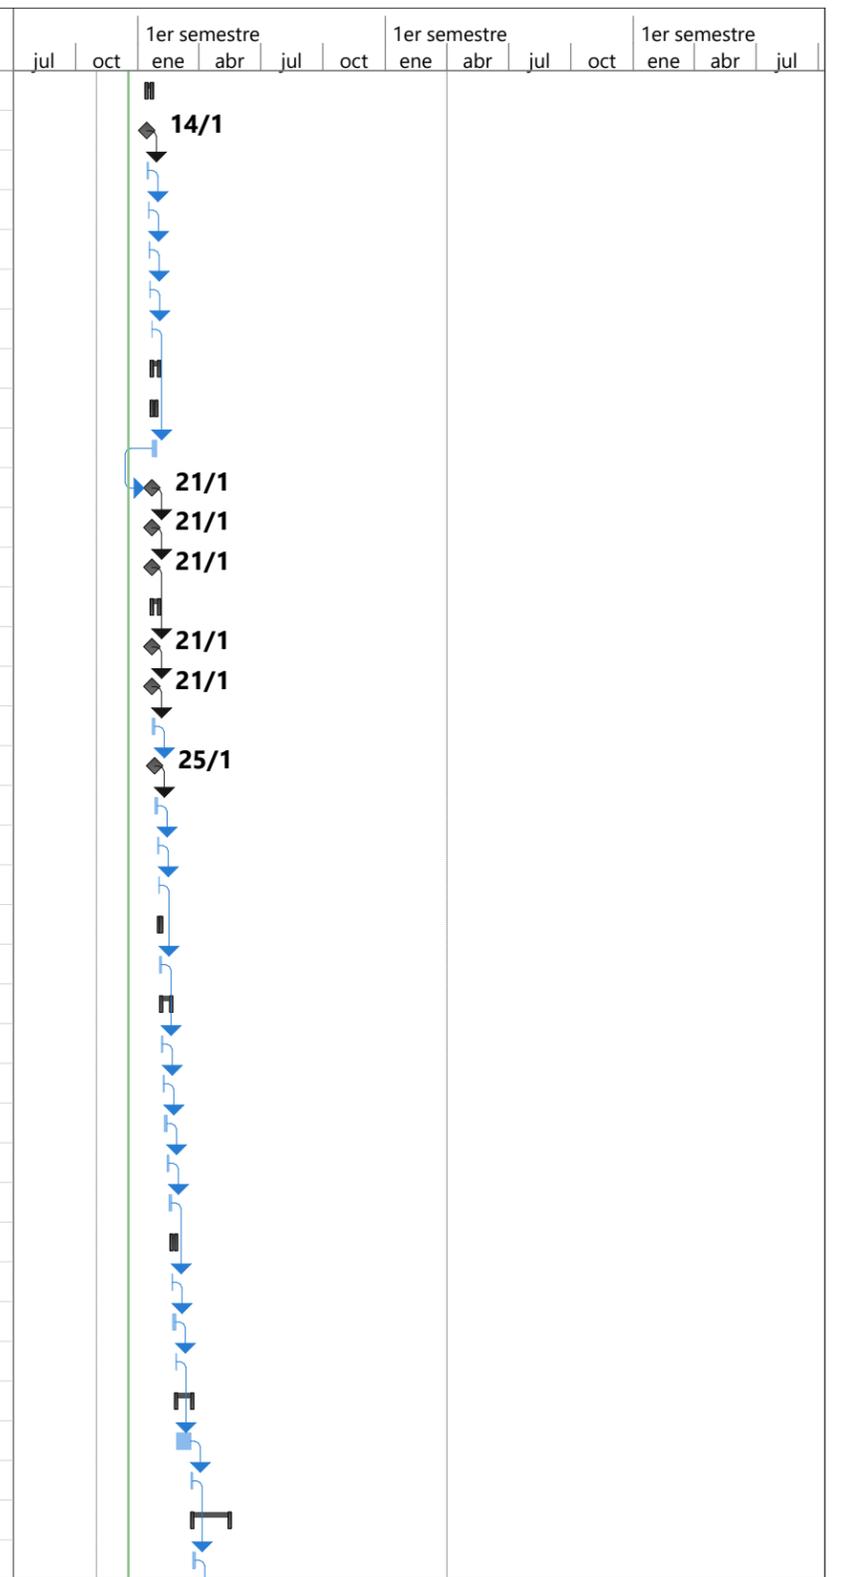

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: mar 18/12/18

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			










Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre		1er semestre		1er semestre	
							ene	abr	ene	abr	ene	abr
1841		Adjudicación en firme	3 días	mar 14/5/19	jue 16/5/19	1840						
1842		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>2 días</b>	<b>vie 17/5/19</b>	<b>lun 20/5/19</b>							
1843		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	vie 17/5/19	vie 17/5/19	1841						
1844		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	1 día	lun 20/5/19	lun 20/5/19	1843						
1845		Notificación de Pedido de Compra	0 días	lun 20/5/19	lun 20/5/19	1844						
1846		<b>Recepción de los items</b>	<b>4 días</b>	<b>mar 21/5/19</b>	<b>vie 24/5/19</b>							
1847		Entrega de los bienes/servicios	1 día	mar 21/5/19	mar 21/5/19	1845						
1848		Recibido a satisfacción	3 días	mié 22/5/19	vie 24/5/19	1847						
1849		<b>Trámite de pago</b>	<b>32 días</b>	<b>lun 27/5/19</b>	<b>mar 9/7/19</b>							
1850		Envío documentos a Financiero	2 días	lun 27/5/19	mar 28/5/19	1848						
1851		Emisión de pago en Financiero	30 días	mié 29/5/19	mar 9/7/19	1850						
1852		Conclusión trámite de Contratación	0 días	mar 9/7/19	mar 9/7/19	1851						
1853		<b>VARIAS UNIDADES</b>	<b>81,5 días</b>	<b>lun 14/1/19</b>	<b>jue 16/5/19</b>							
1854		<b>2019CD-000015-503_VARIAS UNIDADES_Tiquetes aéreos_ €8,445.000</b>	<b>81,5 días</b>	<b>lun 14/1/19</b>	<b>jue 16/5/19</b>							
1855		<b>Elaboración de Cartel</b>	<b>5,5 días</b>	<b>lun 14/1/19</b>	<b>lun 21/1/19</b>							
1856		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 14/1/19	lun 14/1/19							
1857		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 14/1/19	mar 15/1/19	1856						
1858		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 16/1/19	mié 16/1/19	1857						
1859		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 17/1/19	jue 17/1/19	1858						
1860		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 18/1/19	vie 18/1/19	1859						
1861		Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 21/1/19	lun 21/1/19	1860						
1862		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>lun 21/1/19</b>	<b>vie 1/2/19</b>							
1863		<b>Invitación a participar</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 21/1/19</b>	<b>lun 28/1/19</b>							
1864		Invitación	5 días	lun 21/1/19	lun 28/1/19	1861						
1865		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	0 días	lun 21/1/19	lun 21/1/19	1864CC						
1866		Resolver recurso de Objeción al cartel	0 días	lun 21/1/19	lun 21/1/19	1865						
1867		Nuevo plazo para recibir ofertas	0 días	lun 21/1/19	lun 21/1/19	1866						
1868		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>9 días</b>	<b>lun 21/1/19</b>	<b>vie 1/2/19</b>							
1869		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 21/1/19	lun 21/1/19	1867						
1870		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 21/1/19	lun 21/1/19	1869						
1871		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 21/1/19	vie 25/1/19	1870						
1872		Envío de prevenciones	0 días	vie 25/1/19	vie 25/1/19	1871						
1873		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 25/1/19	mar 29/1/19	1872						
1874		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 29/1/19	jue 31/1/19	1873						
1875		Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 31/1/19	vie 1/2/19	1874						
1876		<b>Recomendación, adjudicación y comunicación</b>	<b>12 días</b>	<b>vie 1/2/19</b>	<b>mar 19/2/19</b>							
1877		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 1/2/19	lun 4/2/19	1875						

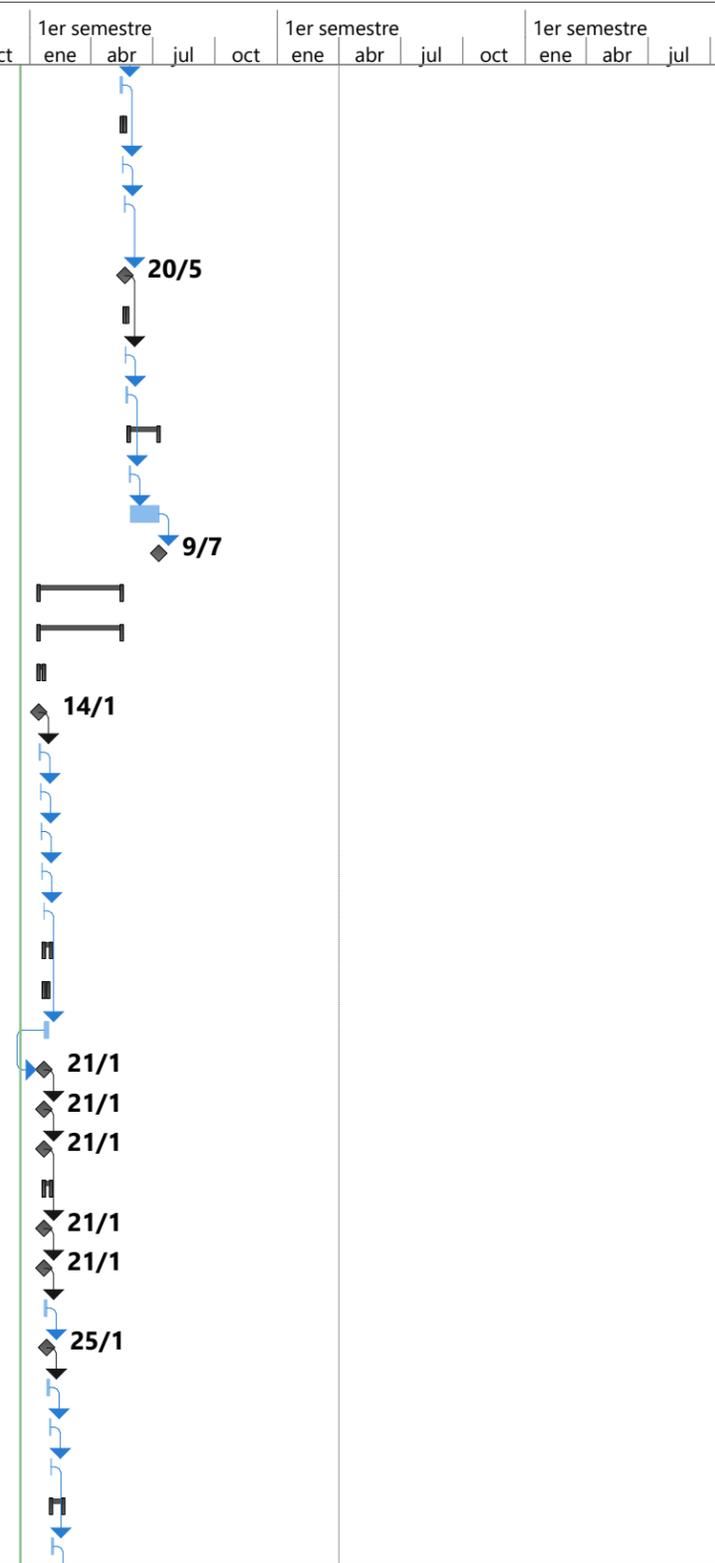

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: mar 18/12/18


Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre		1er semestre		1er semestre	
							ene	abr	ene	abr	ene	abr
1878		<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>9 días</b>	<b>lun 4/2/19</b>	<b>vie 15/2/19</b>							
1879		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 4/2/19	mié 6/2/19	1877						
1880		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 6/2/19	vie 8/2/19	1879						
1881		Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 8/2/19	mar 12/2/19	1880						
1882		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	mar 12/2/19	vie 15/2/19	1881						
1883		Adjudicación en firme	2 días	vie 15/2/19	mar 19/2/19	1882						
1884		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>5 días</b>	<b>mar 19/2/19</b>	<b>mar 26/2/19</b>							
1885		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 19/2/19	mié 20/2/19	1883						
1886		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 20/2/19	lun 25/2/19	1885						
1887		Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 25/2/19	mar 26/2/19	1886						
1888		<b>Recepción de los items</b>	<b>18 días</b>	<b>mar 26/2/19</b>	<b>vie 22/3/19</b>							
1889		Entrega de los bienes/servicios	15 días	mar 26/2/19	mar 19/3/19	1887						
1890		Recibido a satisfacción	3 días	mar 19/3/19	vie 22/3/19	1889						
1891		<b>Trámite de pago</b>	<b>32 días</b>	<b>vie 22/3/19</b>	<b>jue 16/5/19</b>							
1892		Envío documentos a Financiero	2 días	vie 22/3/19	mar 26/3/19	1890						
1893		Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 26/3/19	jue 16/5/19	1892						
1894		Conclusión trámite de Contratación	0 días	jue 16/5/19	jue 16/5/19	1893						
1895		<b>2019CD-000016-503_VARIOS_Publicación en la Gaceta y otros medios de comunicación €8,047.000</b>	<b>60 días</b>	<b>lun 14/1/19</b>	<b>vie 5/4/19</b>							
1896		<b>Elaboración de Cartel</b>	<b>6 días</b>	<b>lun 14/1/19</b>	<b>lun 21/1/19</b>							
1897		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 14/1/19	lun 14/1/19							
1898		Creación de Código en Mer Link	5 días	lun 14/1/19	vie 18/1/19	1897						
1899		Confección de cartel definitivo	1 día	lun 21/1/19	lun 21/1/19	1898						
1900		Invitación a participar en Mer- Link	0 días	lun 21/1/19	lun 21/1/19	1899						
1901		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 21/1/19</b>	<b>lun 21/1/19</b>							
1902		<b>Invitación a participar</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 21/1/19</b>	<b>lun 21/1/19</b>							
1903		Envío de invitación	0 días	lun 21/1/19	lun 21/1/19	1900						
1904		Objeción al cartel	0 días	lun 21/1/19	lun 21/1/19	1903						
1905		Nuevo plazo para recibir ofertas	0 días	lun 21/1/19	lun 21/1/19	1904						
1906		<b>Nuevo plazo para recibir ofertas</b>	<b>0,8 días</b>	<b>lun 21/1/19</b>	<b>mar 22/1/19</b>	<b>1904</b>						
1907		<b>Recepción y estudio de ofertas</b>	<b>0,8 días</b>	<b>lun 21/1/19</b>	<b>mar 22/1/19</b>							
1908		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 21/1/19	lun 21/1/19							
1909		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 21/1/19	lun 21/1/19	1908						
1910		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	0,8 días	mar 22/1/19	mar 22/1/19	1909						
1911		Envío de prevenciones	0 días	mar 22/1/19	mar 22/1/19	1910						
1912		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	0 días	mar 22/1/19	mar 22/1/19	1911						
1913		Análisis de respuesta a prevenciones	0 días	mar 22/1/19	mar 22/1/19	1912						
1914		Elaboración de Informe Técnico	0 días	mar 22/1/19	mar 22/1/19	1913						

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: mar 18/12/18

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre		1er semestre		1er semestre	
							ene	abr	ene	abr	ene	abr
1915		<b>Recomendación, adjudicación y comunicación</b>	<b>0,2 días</b>	<b>mar 22/1/19</b>	<b>mar 22/1/19</b>							
1916		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	0,2 días	mar 22/1/19	mar 22/1/19	1914						
1917		<b>Recurso de revocatoria</b>	<b>15 días</b>	<b>mié 23/1/19</b>	<b>mar 12/2/19</b>							
1918		Plazo para recibir recurso	2 días	mié 23/1/19	jue 24/1/19	1916						
1919		Resolución de Recurso de revocatoria	10 días	vie 25/1/19	jue 7/2/19	1918						
1920		Adjudicación en firme	3 días	vie 8/2/19	mar 12/2/19	1919						
1921		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>2 días</b>	<b>mié 13/2/19</b>	<b>jue 14/2/19</b>							
1922		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mié 13/2/19	mié 13/2/19	1920						
1923		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	1 día	jue 14/2/19	jue 14/2/19	1922						
1924		Notificación de Pedido de Compra	0 días	jue 14/2/19	jue 14/2/19	1923						
1925		<b>Recepción de los items</b>	<b>4 días</b>	<b>vie 15/2/19</b>	<b>mié 20/2/19</b>							
1926		Entrega de los bienes/servicios	1 día	vie 15/2/19	vie 15/2/19	1924						
1927		Recibido a satisfacción	3 días	lun 18/2/19	mié 20/2/19	1926						
1928		<b>Trámite de pago</b>	<b>32 días</b>	<b>jue 21/2/19</b>	<b>vie 5/4/19</b>							
1929		Envío documentos a Financiero	2 días	jue 21/2/19	vie 22/2/19	1927						
1930		Emisión de pago en Financiero	30 días	lun 25/2/19	vie 5/4/19	1929						
1931		Conclusión trámite de Contratación	0 días	vie 5/4/19	vie 5/4/19	1930						
1932		<b>REGLAMENTO DE ESPECIALISTAS AUTORIZADO POR LA DCA</b>	<b>125 días</b>	<b>lun 10/12/18</b>	<b>mar 25/6/19</b>							
1933		<b>UNIDAD JURÍDICA INTERNA</b>	<b>17 días</b>	<b>lun 14/1/19</b>	<b>mar 5/2/19</b>							
1934		<b>2019CD-000017-503_Ortopedista o traumatólogo; invitar a registrarse en registro de especialistas; €2,000.000</b>	<b>17 días</b>	<b>lun 14/1/19</b>	<b>mar 5/2/19</b>							
1935		Art 10. Mecanismo de nombramiento Rol	0 días	lun 14/1/19	lun 14/1/19							
1936		Art 11. Etapa inicial (formulario de la Unidad solicitante)	0 días	lun 14/1/19	lun 14/1/19	1935						
1937		Art 12. Invitación	0 días	lun 14/1/19	lun 14/1/19	1936						
1938		Recepción de ofertas	3 días	lun 14/1/19	mié 16/1/19	1937						
1939		Apertura	1 día	jue 17/1/19	jue 17/1/19	1938						
1940		Respuesta ala solicitud de criterio técnico	2 días	vie 18/1/19	lun 21/1/19	1939						
1941		Art 13. Emisión de criterio técnico	3 días	mar 22/1/19	jue 24/1/19	1940						
1942		Adjudicación	1 día	vie 25/1/19	vie 25/1/19	1941						
1943		Art 14. Notificación y solicitud de aceptación del servicio	3 días	lun 28/1/19	mié 30/1/19	1942						
1944		Respuesta a solicitud de aceptación adjudicación	1 día	jue 31/1/19	jue 31/1/19	1943						
1945		Art 15. Aclaraciones y recursos	0 días	jue 31/1/19	jue 31/1/19	1944						
1946		Elaboración de pedido	1 día	vie 1/2/19	vie 1/2/19	1945						
1947		Art 16. Notificación de pedido	2 días	lun 4/2/19	mar 5/2/19	1946						
1948		<b>DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA</b>	<b>125 días</b>	<b>lun 10/12/18</b>	<b>mar 25/6/19</b>							
1949		<b>CONSULTORIAS DFOE €27,525.000,00</b>	<b>125 días</b>	<b>lun 10/12/18</b>	<b>mar 25/6/19</b>							
1950		<b>2018CD-000018-503_Consultoría_Asesoría en Auditoría Financiera (Envían especificaciones el 10/12/2018); €7,500.000</b>	<b>17 días</b>	<b>lun 10/12/18</b>	<b>mar 15/1/19</b>							

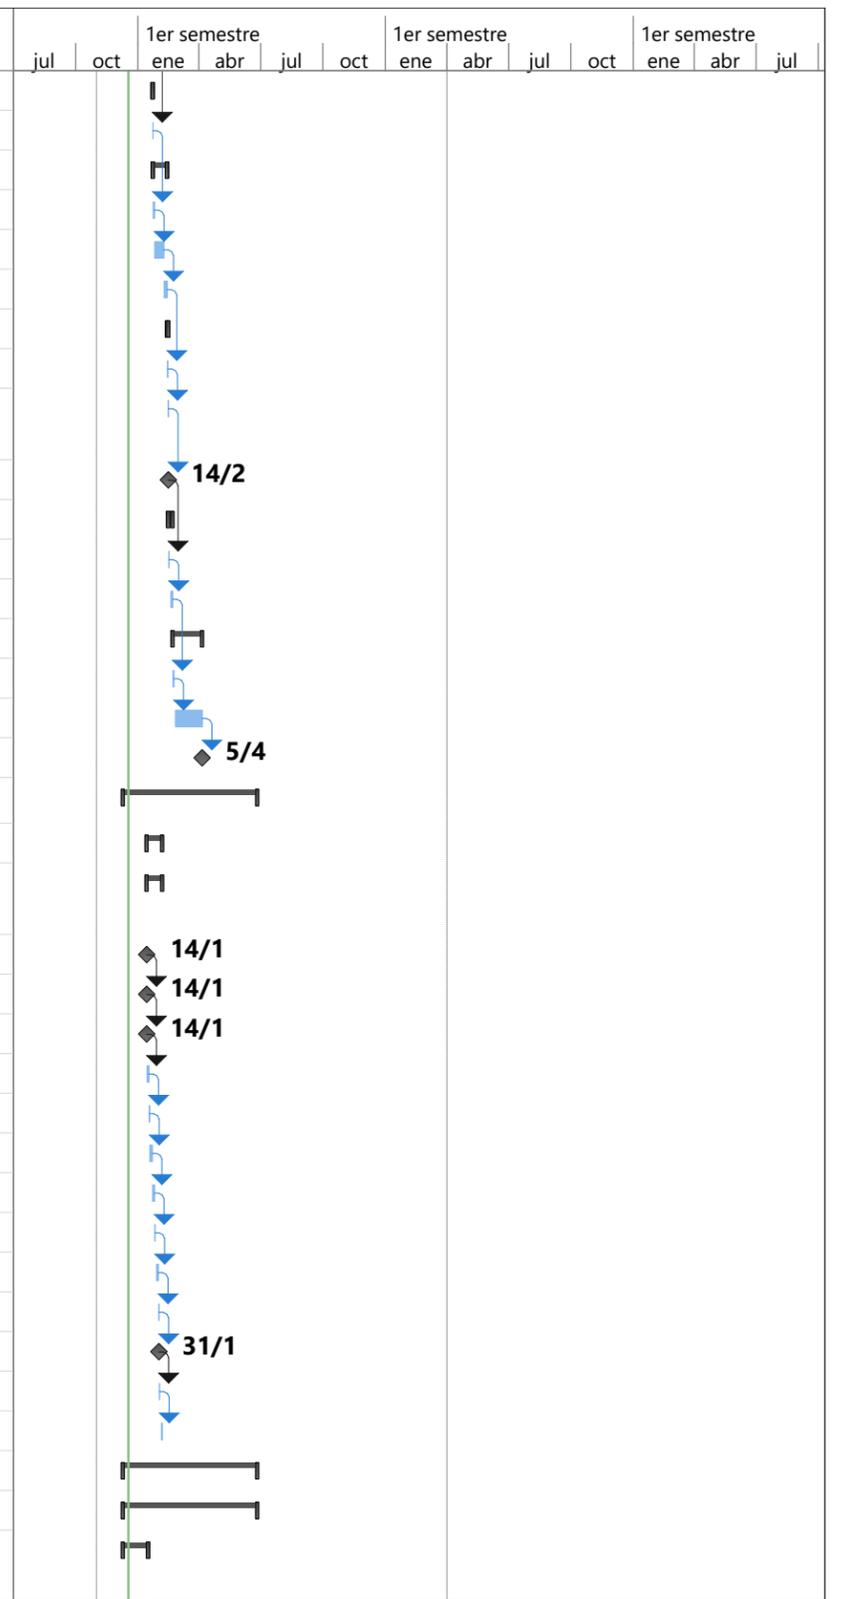

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: mar 18/12/18

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1er semestre		1er semestre		1er semestre	
							ene	abr	ene	abr	ene	abr
1987		Art 14. Notificación y solicitud de aceptación del servicio	3 días	mar 29/1/19	jue 31/1/19	1986						
1988		Respuesta a solicitud de aceptación adjudicación	1 día	vie 1/2/19	vie 1/2/19	1987						
1989		Art 15. Aclaraciones y recursos	0 días	vie 1/2/19	vie 1/2/19	1988						
1990		Elaboración de pedido	1 día	lun 4/2/19	lun 4/2/19	1989						
1991		Art 16. Notificación de pedido	2 días	mar 5/2/19	mié 6/2/19	1990						
1992		<b>2018CD-000021-503_Consultoría_Asesoría en presupuesto por resultados (Envían especificaciones el 01/02/2019); €8,000.000</b>	<b>17 días</b>	<b>lun 4/2/19</b>	<b>mar 26/2/19</b>							
1993		Art 10. Mecanismo de nombramiento Rol	0 días	lun 4/2/19	lun 4/2/19							
1994		Art 11. Etapa inicial (formulario de la Unidad solicitante)	0 días	lun 4/2/19	lun 4/2/19	1993						
1995		Art 12. Invitación	0 días	lun 4/2/19	lun 4/2/19	1994						
1996		Recepción de ofertas	3 días	lun 4/2/19	mié 6/2/19	1995						
1997		Apertura	1 día	jue 7/2/19	jue 7/2/19	1996						
1998		Respuesta ala solicitud de criterio técnico	2 días	vie 8/2/19	lun 11/2/19	1997						
1999		Art 13. Emisión de criterio técnico	3 días	mar 12/2/19	jue 14/2/19	1998						
2000		Adjudicación	1 día	vie 15/2/19	vie 15/2/19	1999						
2001		Art 14. Notificación y solicitud de aceptación del servicio	3 días	lun 18/2/19	mié 20/2/19	2000						
2002		Respuesta a solicitud de aceptación adjudicación	1 día	jue 21/2/19	jue 21/2/19	2001						
2003		Art 15. Aclaraciones y recursos	0 días	jue 21/2/19	jue 21/2/19	2002						
2004		Elaboración de pedido	1 día	vie 22/2/19	vie 22/2/19	2003						
2005		Art 16. Notificación de pedido	2 días	lun 25/2/19	mar 26/2/19	2004						
2006		<b>2018CD-000022-503_Consultoría_Asesoría en proceso de aprobación presupuestaria (Envían especificaciones el 01/06/2019); €3,000.000</b>	<b>17 días</b>	<b>lun 3/6/19</b>	<b>mar 25/6/19</b>							
2007		Art 10. Mecanismo de nombramiento Rol	0 días	lun 3/6/19	lun 3/6/19							
2008		Art 11. Etapa inicial (formulario de la Unidad solicitante)	0 días	lun 3/6/19	lun 3/6/19	2007						
2009		Art 12. Invitación	0 días	lun 3/6/19	lun 3/6/19	2008						
2010		Recepción de ofertas	3 días	lun 3/6/19	mié 5/6/19	2009						
2011		Apertura	1 día	jue 6/6/19	jue 6/6/19	2010						
2012		Respuesta ala solicitud de criterio técnico	2 días	vie 7/6/19	lun 10/6/19	2011						
2013		Art 13. Emisión de criterio técnico	3 días	mar 11/6/19	jue 13/6/19	2012						
2014		Adjudicación	1 día	vie 14/6/19	vie 14/6/19	2013						
2015		Art 14. Notificación y solicitud de aceptación del servicio	3 días	lun 17/6/19	mié 19/6/19	2014						
2016		Respuesta a solicitud de aceptación adjudicación	1 día	jue 20/6/19	jue 20/6/19	2015						
2017		Art 15. Aclaraciones y recursos	0 días	jue 20/6/19	jue 20/6/19	2016						
2018		Elaboración de pedido	1 día	vie 21/6/19	vie 21/6/19	2017						
2019		Art 16. Notificación de pedido	2 días	lun 24/6/19	mar 25/6/19	2018						
2020		<b>2018CD-000023-503_Consultorías_Asesoría en minería (Envían especificaciones el 01/04/2019); €3,125.000</b>	<b>17 días</b>	<b>lun 1/4/19</b>	<b>jue 2/5/19</b>							
2021		Art 10. Mecanismo de nombramiento Rol	0 días	lun 1/4/19	lun 1/4/19							
2022		Art 11. Etapa inicial (formulario de la Unidad solicitante)	0 días	lun 1/4/19	lun 1/4/19	2021						

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: mar 18/12/18

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

