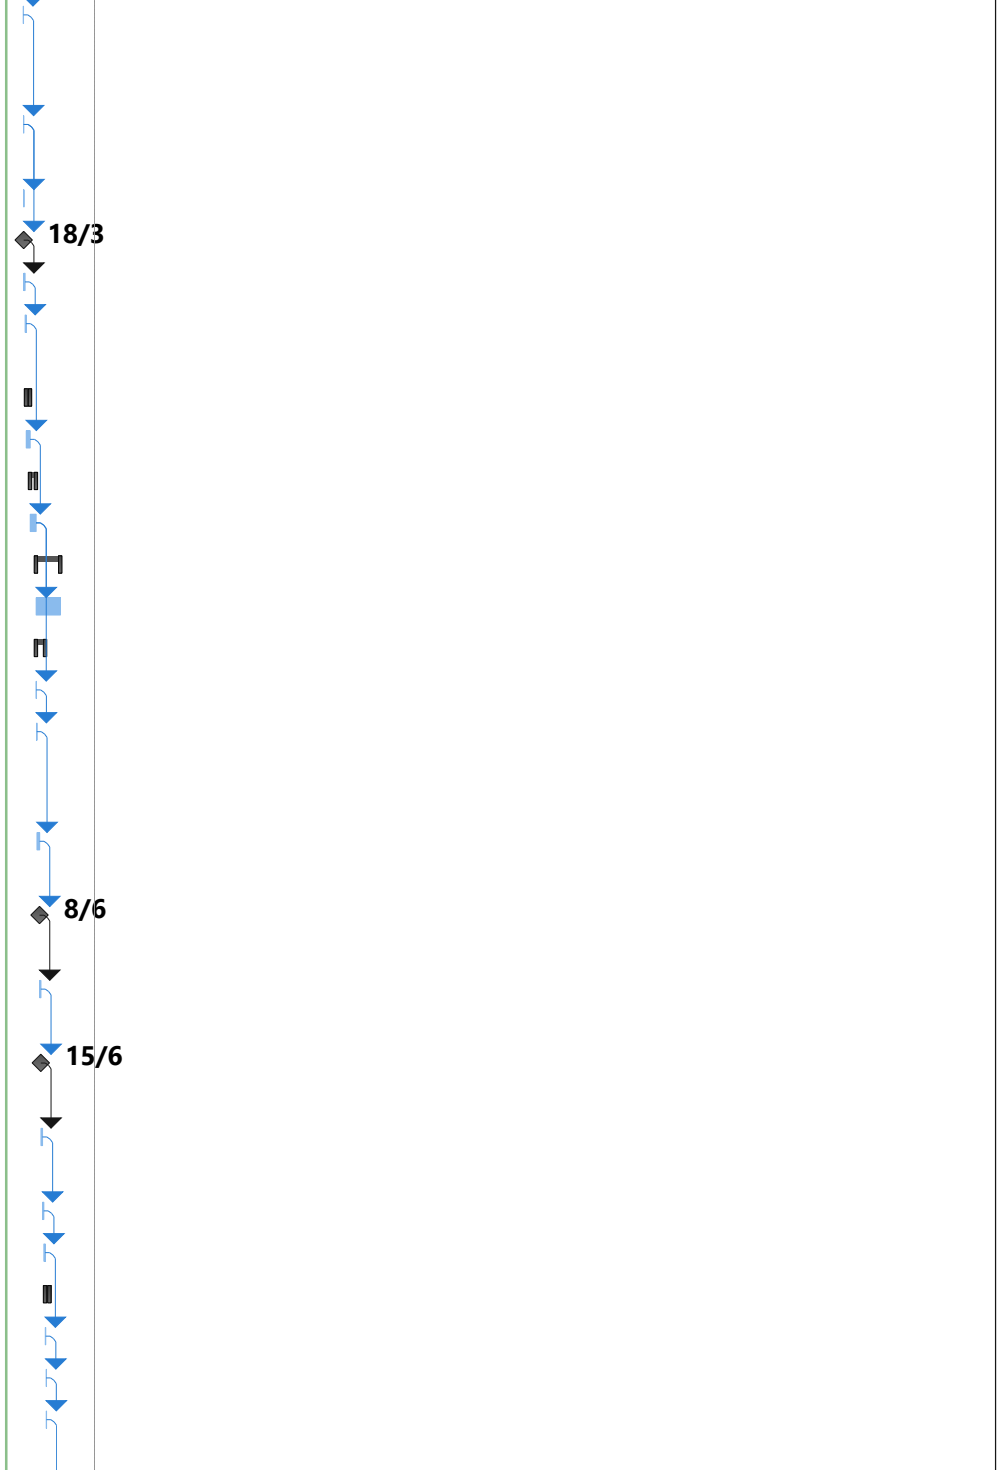


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin												
							2014			2019			2024			2029		
108			La DCA solicita expediente administrativo a la USP y solicita criterio técnico acerca del recursos en mención.	1 día	lun 16/3/20	lun 16/3/20												
109			Respuesta con el criterio de la UT a la USP para ser enviado a la DCA	2 días	mar 17/3/20	mié 18/3/20												
110			Respuesta de la USP para ser enviado a la DCA	1 día	jue 19/3/20	jue 19/3/20												
111			Remisión del criterio técnico a la DCA	0 días	mié 18/3/20	mié 18/3/20												
112			Confeccion de Resolucion a la Objecion	5 días	jue 19/3/20	mié 25/3/20												
113			Comunicación de Resolucion final por medio de Mer Link	3 días	jue 26/3/20	lun 30/3/20												
114			Enmiendas al Cartel	10 días	mar 31/3/20	lun 20/4/20												
115			Enmiendas al Cartel	10 días	mar 31/3/20	lun 20/4/20												
116			Nuevo plazo para recibir ofertas	22 días	mar 21/4/20	jue 21/5/20												
117			Nuevo plazo para recibir ofertas	22 días	mar 21/4/20	jue 21/5/20												
118			Fecha máxima para adjudicar	88 días	vie 22/5/20	jue 24/9/20												
119			Fecha máxima para adjudicar	88 días	vie 22/5/20	jue 24/9/20												
120			Recepción y estudio de ofertas	32 días	vie 22/5/20	mar 7/7/20												
121			Apertura de ofertas	1 día	vie 22/5/20	vie 22/5/20												
122			Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion de admisibilidad	1 día	lun 25/5/20	lun 25/5/20												
123			Estudio y valoración de las ofertas (incluye reunión de admisibilidad)	10 días	mar 26/5/20	lun 8/6/20												
124			Solicitud de información en SICOP a los oferentes para atender prevenciones	0 días	lun 8/6/20	lun 8/6/20												
125			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En SICOP)	5 días	mar 9/6/20	lun 15/6/20												
126			Envío de las respuestas de proveedores a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	lun 15/6/20	lun 15/6/20												
127			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	5 días	mar 16/6/20	mar 23/6/20												
128			Informe de admisibilidad (UJI y UT)	5 días	mié 24/6/20	mar 30/6/20												
129			Elaboración de Informe de recomendación (UT)	5 días	mié 1/7/20	mar 7/7/20												
130			Recomendación, adjudicación y comunicación	16,5 días	mié 8/7/20	jue 30/7/20												
131			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mié 8/7/20	vie 10/7/20												
132			Sesión de la Comision de Adjuducaciones	0,5 días	lun 13/7/20	lun 13/7/20												
133			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	1 día	lun 13/7/20	mar 14/7/20												
Proyecto: Cronograma de com Fecha: jue 19/12/19			Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual solo duración Informe de resumen manual Resumen manual solo el comienzo solo fin Tareas externas Hito externo Fecha límite Progreso Progreso manual															
Página 5																		

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin				
							2014	2019	2024	2029
260			Fin recepción de items	0 días	lun 16/11/20	lun 16/11/20				
261			Trámite de pago	36 días	mar 17/11/20	mar 19/1/21				
262			Envio documentos a Financiero	1 día	mar 17/11/20	mar 17/11/20				
263			Emisión de pago en Financiero	5 días	mié 18/11/20	mar 24/11/20				
264			Pago de Tesorería Nacional	30 días	mié 25/11/20	mar 19/1/21				
265			Conclusión trámite licitación	0 días	mar 19/1/21	mar 19/1/21				
266			LICITACIONES ABREVIADAS	237 días	mar 10/12/19	mié 2/12/20				
267			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (USG)	201 días	jue 13/2/20	mié 2/12/20				
268			2020LA-000002-503_USG_Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema contra incendios; \$22,600.000_Contratado al 01/2021_Monto del contrato \$90,400.000	164 días	lun 13/4/20	mié 2/12/20				
269			Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	lun 13/4/20	lun 13/4/20				
270			Confección Documento complementario al cartel	17 días	lun 13/4/20	mié 6/5/20				
271			Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 13/4/20	vie 17/4/20				
272			Revisión Jurídica de cartel UJI	7 días	lun 20/4/20	mar 28/4/20				
273			Revisión Técnica de cartel	7 días	lun 20/4/20	mar 28/4/20				
274			Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al cartel	5 días	mié 29/4/20	mié 6/5/20				
275			Invitación a participar	28 días	jue 7/5/20	lun 15/6/20				
276			Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	jue 7/5/20	mié 13/5/20				
277			Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en SICOP	5 días	jue 14/5/20	mié 20/5/20				
278			Invitación a participar en SICOP	1 día	jue 21/5/20	jue 21/5/20				
279			Plazo para recibir ofertas	17 días	vie 22/5/20	lun 15/6/20				
280			Recurso de Objeción al Cartel	17 días	vie 22/5/20	lun 15/6/20				
281			Presentacion de Objeción al cartel	5 días	vie 22/5/20	jue 28/5/20				
282			Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en SICOP	1 día	vie 29/5/20	vie 29/5/20				
283			Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	lun 1/6/20	lun 1/6/20				
284			Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	mar 2/6/20	lun 8/6/20				
285			Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	mar 9/6/20	vie 12/6/20				
286			Comunicación de Resolución final	1 día	lun 15/6/20	lun 15/6/20				
287			Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	vie 29/5/20	lun 15/6/20				
Proyecto: Cronograma de com Fecha: jue 19/12/19										
Tarea			Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División			Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito			Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen			Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin					
							2014	2019	2024	2029	
288			Plazo para adjudicación	34 días	mar 16/6/20	lun 3/8/20					
289			Fecha máxima para adjudicar	34 días	mar 16/6/20	lun 3/8/20					
290			Recepción de ofertas	1 día	lun 15/6/20	mar 16/6/20					
291			Apertura de ofertas	0 días	lun 15/6/20	lun 15/6/20					
292			Remisión en SICOP de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion para entrega de prevenciones Outlook)	1 día	mar 16/6/20	mar 16/6/20					
293			Estudio y valoración de las ofertas.	17 días	jue 18/6/20	vie 10/7/20					
294			Admisibilidad de ofertas (incluye reunión de admisibilidad)	5 días	jue 18/6/20	mié 24/6/20					
295			Solicitud de información en SICOP a los oferentes para atender prevenciones	1 día	jue 25/6/20	jue 25/6/20					
296			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En SICOP)	5 días	vie 26/6/20	jue 2/7/20					
297			Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (SICOP)	0 días	jue 2/7/20	jue 2/7/20					
298			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	vie 3/7/20	mar 7/7/20					
299			Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	mié 8/7/20	vie 10/7/20					
300			Informe de recomendación	5 días	lun 13/7/20	vie 17/7/20					
301			Elaboración de Informe de recomendación	5 días	lun 13/7/20	vie 17/7/20					
302			Recomendación, adjudicación y comunicación	11 días	lun 20/7/20	lun 3/8/20					
303			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	lun 20/7/20	mié 22/7/20					
304			Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	jue 23/7/20	jue 23/7/20					
305			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	jue 23/7/20	jue 23/7/20					
306			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	vie 24/7/20	vie 24/7/20					
307			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	lun 27/7/20	lun 27/7/20					
308			Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	mar 28/7/20	lun 3/8/20					
309			Recurso de revocatoria	25 días	mar 28/7/20	lun 31/8/20					
310			Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	mar 28/7/20	lun 3/8/20					
311			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisibile (Art N°186 RLCA)	2 días	mar 4/8/20	mié 5/8/20					
312			Notificación al Adjudicatario del recurso en caso de ser admisible	0 días	mié 5/8/20	mié 5/8/20					
Proyecto: Cronograma de com Fecha: jue 19/12/19		Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
		División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
		Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
		Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			
Página 11											

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin				
							2014	2019	2024	2029
313			Plazo para recibir respuesta del adjudicatario (Art N°194 RLCA)	3 días	jue 6/8/20	lun 10/8/20				
314			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Art N°195 RLCA)	15 días	mar 11/8/20	lun 31/8/20				
315			Notificacion de la resolución (SICOP)	0 días	lun 31/8/20	lun 31/8/20				
316			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	6 días	mar 1/9/20	mar 8/9/20				
317			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mar 1/9/20	mar 1/9/20				
318			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mar 1/9/20	mar 1/9/20				
319			Adjudicación en firme	5 días	mié 2/9/20	mar 8/9/20				
320			Trámite de contrato	16 días	mar 1/9/20	mié 23/9/20				
321			Elaboración del Contrato	5 días	mar 1/9/20	mar 8/9/20				
322			Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	mar 1/9/20	mar 1/9/20				
323			Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	mar 1/9/20	mar 8/9/20				
324			Firma de contrato oferente	1 día	mar 1/9/20	mar 1/9/20				
325			Envío de contrato para firma Gerente de División de Apoyo	0 días	mar 1/9/20	mar 1/9/20				
326			Firma de contrato	5 días	mié 2/9/20	mar 8/9/20				
327			Envío de contrato a aprobación interna	0 días	mar 8/9/20	mar 8/9/20				
328			Aprobacion Interna de Contrato	10 días	mié 9/9/20	mié 23/9/20				
329			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	mié 23/9/20	mié 23/9/20				
330			Trámite del Pedido	6 días	jue 24/9/20	jue 1/10/20				
331			Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	jue 24/9/20	vie 25/9/20				
332			Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	vie 25/9/20	vie 25/9/20				
333			Visado de pedido en la UAF	3 días	lun 28/9/20	mié 30/9/20				
334			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	jue 1/10/20	jue 1/10/20				
335			Notificación de Pedido de Compra	0 días	jue 1/10/20	jue 1/10/20				
336			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	jue 1/10/20	jue 1/10/20				
337			Recepción de los items	13 días	jue 24/9/20	mar 13/10/20				
338			Entrega de los bienes/servicios	10 días	jue 24/9/20	mié 7/10/20				
339			Recibido a satisfacción	3 días	jue 8/10/20	mar 13/10/20				
340			Fin recepción de items	0 días	mar 13/10/20	mar 13/10/20				
341			Trámite de pago	36 días	mié 14/10/20	mié 2/12/20				
342			Envio documentos a Financiero	1 día	mié 14/10/20	mié 14/10/20				

Proyecto: Cronograma de com

Fecha: jue 19/12/19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 12

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin																																																				
							2014		2019		2024		2024		2029																																											
343			Emisión de pago en Financiero	5 días	jue 15/10/20	mié 21/10/20																																																				
344			Pago de Tesorería Nacional	30 días	jue 22/10/20	mié 2/12/20																																																				
345			Conclusión trámite licitación	0 días	mié 2/12/20	mié 2/12/20																																																				
346			2020LA-00003-503_USG_Proyecto de redundancia eléctrica para el centro de datos; Contratado al 30 de junio; ¢22,600.000	134 días	lun 13/4/20	mié 21/10/20																																																				
347			Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	lun 13/4/20	lun 13/4/20																																																				
348			Confección Documento complementario al cartel	17 días	lun 13/4/20	mié 6/5/20																																																				
349			Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 13/4/20	vie 17/4/20																																																				
350			Revisión Jurídica de cartel UJI	7 días	lun 20/4/20	mar 28/4/20																																																				
351			Revisión Técnica de cartel	7 días	lun 20/4/20	mar 28/4/20																																																				
352			Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al cartel	5 días	mié 29/4/20	mié 6/5/20																																																				
353			Invitación a participar	28 días	jue 7/5/20	lun 15/6/20																																																				
354			Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	jue 7/5/20	mié 13/5/20																																																				
355			Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en SICOP	5 días	jue 14/5/20	mié 20/5/20																																																				
356			Invitación a participar en SICOP	1 día	jue 21/5/20	jue 21/5/20																																																				
357			Plazo para recibir ofertas	17 días	vie 22/5/20	lun 15/6/20																																																				
358			Recurso de Objeción al Cartel	17 días	vie 22/5/20	lun 15/6/20																																																				
359			Presentacion de Objeción al cartel	5 días	vie 22/5/20	jue 28/5/20																																																				
360			Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en SICOP	1 día	vie 29/5/20	vie 29/5/20																																																				
361			Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	lun 1/6/20	lun 1/6/20																																																				
362			Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	mar 2/6/20	lun 8/6/20																																																				
363			Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	mar 9/6/20	vie 12/6/20																																																				
364			Comunicación de Resolución final	1 día	lun 15/6/20	lun 15/6/20																																																				
365			Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	vie 29/5/20	lun 15/6/20																																																				
366			Plazo para adjudicación	34 días	mar 16/6/20	lun 3/8/20																																																				
367			Fecha máxima para adjudicar	34 días	mar 16/6/20	lun 3/8/20																																																				
368			Recepción de ofertas	1 día	lun 15/6/20	mar 16/6/20																																																				
369			Apertura de ofertas	0 días	lun 15/6/20	lun 15/6/20																																																				
Proyecto: Cronograma de com Fecha: jue 19/12/19			<table><tr><td>Tarea</td><td></td><td>Resumen del proyecto</td><td></td><td>Tarea manual</td><td></td><td>solo el comienzo</td><td></td><td>Fecha límite</td><td></td></tr><tr><td>División</td><td></td><td>Tarea inactiva</td><td></td><td>solo duración</td><td></td><td>solo fin</td><td></td><td>Progreso</td><td></td></tr><tr><td>Hito</td><td></td><td>Hito inactivo</td><td></td><td>Informe de resumen manual</td><td></td><td>Tareas externas</td><td></td><td>Progreso manual</td><td></td></tr><tr><td>Resumen</td><td></td><td>Resumen inactivo</td><td></td><td>Resumen manual</td><td></td><td>Hito externo</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite		División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso		Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual		Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			
Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite																																																		
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso																																																		
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual																																																		
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo																																																				
Página 13																																																										

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin												
							2014		2019		2024		2029					
448			Estudio y valoración de las ofertas.	17 días	mié 13/5/20	jue 4/6/20												
449			Admisibilidad de ofertas (incluye reunión de admisibilidad)	5 días	mié 13/5/20	mar 19/5/20												
450			Solicitud de información en SICOP a los oferentes para atender prevenciones	1 día	mié 20/5/20	mié 20/5/20												
451			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En SICOP)	5 días	jue 21/5/20	mié 27/5/20												
452			Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (SICOP)	0 días	mié 27/5/20	mié 27/5/20												
453			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	jue 28/5/20	lun 1/6/20												
454			Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	mar 2/6/20	jue 4/6/20												
455			Informe de recomendación	5 días	vie 5/6/20	jue 11/6/20												
456			Elaboración de Informe de recomendación	5 días	vie 5/6/20	jue 11/6/20												
457			Recomendación, adjudicación y comunicación	11 días	vie 12/6/20	lun 29/6/20												
458			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	vie 12/6/20	mar 16/6/20												
459			Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	jue 18/6/20	jue 18/6/20												
460			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	jue 18/6/20	jue 18/6/20												
461			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	vie 19/6/20	vie 19/6/20												
462			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	lun 22/6/20	lun 22/6/20												
463			Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	mar 23/6/20	lun 29/6/20												
464			Recurso de revocatoria	25 días	mar 23/6/20	lun 27/7/20												
465			Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	mar 23/6/20	lun 29/6/20												
466			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmissible (Art N°186 RLCA)	2 días	mar 30/6/20	mié 1/7/20												
467			Notificación al Adjudicatario del recurso en caso de ser admisible	0 días	mié 1/7/20	mié 1/7/20												
468			Plazo para recibir respuesta del adjudicatario (Art N°194 RLCA)	3 días	jue 2/7/20	lun 6/7/20												
469			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Art N°195 RLCA)	15 días	mar 7/7/20	lun 27/7/20												
470			Notificacion de la resolución (SICOP)	0 días	lun 27/7/20	lun 27/7/20												
471			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	6 días	mar 28/7/20	mar 4/8/20												
472			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mar 28/7/20	mar 28/7/20												
473			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mar 28/7/20	mar 28/7/20												
Proyecto: Cronograma de com Fecha: jue 19/12/19			Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo	[	Fecha límite							
			División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin	)	Progreso							
			Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual							
			Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo									

Página 17

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
----	--	---------------	-----------------	----------	----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
----	--	---------------	-----------------	----------	----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	
593			Envío de recurso de objeccion a Unidad Jurídica y a Uni	1 día	vie 13/3/20	vie 13/3/20	
594			Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	lun 16/3/20	vie 20/3/20	
595			Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	lun 23/3/20	jue 26/3/20	
596			Comunicación de Resolución final	1 día	vie 27/3/20	vie 27/3/20	
597			Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	jue 12/3/20	vie 27/3/20	
598			Plazo para adjudicación	34 días	lun 30/3/20	vie 22/5/20	
599			Fecha máxima para adjudicar	34 días	lun 30/3/20	vie 22/5/20	
600			Recepción de ofertas	1 día	vie 27/3/20	lun 30/3/20	
601			Apertura de ofertas	0 días	vie 27/3/20	vie 27/3/20	
602			Remisión en SICOP de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion	1 día	lun 30/3/20	lun 30/3/20	
603			Estudio y valoración de las ofertas.	17 días	mar 31/3/20	mié 29/4/20	
604			Admisibiliidad de ofertas (incluye reunión de admisibi	5 días	mar 31/3/20	lun 13/4/20	
605			Solicitud de información en SICOP a los oferentes par	1 día	mar 14/4/20	mar 14/4/20	
606			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a	5 días	mié 15/4/20	mar 21/4/20	
607			Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la	0 días	mar 21/4/20	mar 21/4/20	
608			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la	3 días	mié 22/4/20	vie 24/4/20	
609			Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	lun 27/4/20	mié 29/4/20	
610			Informe de recomendación	5 días	jue 30/4/20	jue 7/5/20	
611			Elaboración de Informe de recomendación	5 días	jue 30/4/20	jue 7/5/20	
612			Recomendación, adjudicación y comunicación	11 días	vie 8/5/20	vie 22/5/20	
613			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	vie 8/5/20	mar 12/5/20	
614			Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 13/5/20	mié 13/5/20	
615			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 13/5/20	mié 13/5/20	
616			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	jue 14/5/20	jue 14/5/20	
617			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion	1 día	vie 15/5/20	vie 15/5/20	
618			Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	lun 18/5/20	vie 22/5/20	
619			Recurso de revocatoria	25 días	lun 18/5/20	lun 22/6/20	
620			Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	lun 18/5/20	vie 22/5/20	
621			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisible (Art N°186 RLCA)	2 días	lun 25/5/20	mar 26/5/20	
622			Notificación al Adjudicatario del recurso en caso de se	0 días	mar 26/5/20	mar 26/5/20	
623			Plazo para recibir respuesta del adjudicatario (Art N°1	3 días	mié 27/5/20	vie 29/5/20	
624			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Ar	15 días	lun 1/6/20	lun 22/6/20	
625			Notificacion de la resolución (SICOP)	0 días	lun 22/6/20	lun 22/6/20	
626			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	6 días	mar 23/6/20	mar 30/6/20	
Proyecto: Cronograma de com		Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	
Fecha: jue 19/12/19		División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso	
		Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual	
		Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo		
Página 22							

Cronograma de actividades						
ID	Icono	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
660			Revisión Jurídica de cartel UJI	7 días	mar 18/2/20	mié 26/2/20
661			Revisión Técnica de cartel	7 días	mar 18/2/20	mié 26/2/20
662			Incorporación de ajustes y confección de documento c	5 días	jue 27/2/20	mié 4/3/20
663			Invitación a participar	28 días	jue 5/3/20	lun 20/4/20
664			Buscar código de producto / solicitar la creación de có	5 días	jue 5/3/20	mié 11/3/20
665			Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en SICC	5 días	jue 12/3/20	mié 18/3/20
666			Invitación a participar en SICOP	1 día	jue 19/3/20	jue 19/3/20
667			Plazo para recibir ofertas	17 días	vie 20/3/20	lun 20/4/20
668			Recurso de Objeción al Cartel	17 días	vie 20/3/20	lun 20/4/20
669			Presentacion de Objeción al cartel	5 días	vie 20/3/20	jue 26/3/20
670			Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación	1 día	vie 27/3/20	vie 27/3/20
671			Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Uni	1 día	lun 30/3/20	lun 30/3/20
672			Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	mar 31/3/20	lun 13/4/20
673			Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	mar 14/4/20	vie 17/4/20
674			Comunicación de Resolución final	1 día	lun 20/4/20	lun 20/4/20
675			Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	vie 27/3/20	lun 20/4/20
676			Plazo para adjudicación	34 días	mar 21/4/20	lun 8/6/20
677			Fecha máxima para adjudicar	34 días	mar 21/4/20	lun 8/6/20
678			Recepción de ofertas	1 día	lun 20/4/20	mar 21/4/20
679			Apertura de ofertas	0 días	lun 20/4/20	lun 20/4/20
680			Remisión en SICOP de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion	1 día	mar 21/4/20	mar 21/4/20
681			Estudio y valoración de las ofertas.	17 días	mié 22/4/20	vie 15/5/20
682			Admisibilidad de ofertas (incluye reunión de admisibi	5 días	mié 22/4/20	mar 28/4/20
683			Solicitud de información en SICOP a los oferentes par	1 día	mié 29/4/20	mié 29/4/20
684			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a	5 días	jue 30/4/20	jue 7/5/20
685			Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la U	0 días	jue 7/5/20	jue 7/5/20
686			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la U	3 días	vie 8/5/20	mar 12/5/20
687			Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	mié 13/5/20	vie 15/5/20
688			Informe de recomendación	5 días	lun 18/5/20	vie 22/5/20
689			Elaboración de Informe de recomendación	5 días	lun 18/5/20	vie 22/5/20
690			Recomendación, adjudicación y comunicación	11 días	lun 25/5/20	lun 8/6/20
691			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	lun 25/5/20	mié 27/5/20
692			Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	jue 28/5/20	jue 28/5/20
693			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	jue 28/5/20	jue 28/5/20
694			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	vie 29/5/20	vie 29/5/20

Proyecto: Cronograma de com
Fecha: jue 19/12/19

TareaResumen del proyecto

DivisiónTarea inactiva

HitoHito inactivo

ResumenResumen inactivo

Tarea manualsolo el comienzo

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 24

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin				
							2014	2019	2024	2029
695			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion	1 día	lun 1/6/20	lun 1/6/20				
696			Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	mar 2/6/20	lun 8/6/20				
697			Recurso de revocatoria	25 días	mar 2/6/20	mar 7/7/20				
698			Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	mar 2/6/20	lun 8/6/20				
699			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisible (Art N°186 RLCA)	2 días	mar 9/6/20	mié 10/6/20				
700			Notificación al Adjudicatario del recurso en caso de se	0 días	mié 10/6/20	mié 10/6/20				
701			Plazo para recibir respuesta del adjudicatario (Art N°1	3 días	jue 11/6/20	lun 15/6/20				
702			Elaboracion de la resolucio final de la revocatoria (Ar	15 días	mar 16/6/20	mar 7/7/20				
703			Notificacion de la resolución (SICOP)	0 días	mar 7/7/20	mar 7/7/20				
704			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	6 días	mié 8/7/20	mié 15/7/20				
705			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mié 8/7/20	mié 8/7/20				
706			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la	0,5 días	mié 8/7/20	mié 8/7/20				
707			Adjudicación en firme	5 días	jue 9/7/20	mié 15/7/20				
708			Trámite de contrato	16 días	mié 8/7/20	mié 29/7/20				
709			Elaboración del Contrato	5 días	mié 8/7/20	mié 15/7/20				
710			Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	mié 8/7/20	mié 8/7/20				
711			Presentación de documentos por parte de adjudicar	5 días	mié 8/7/20	mié 15/7/20				
712			Firma de contrato oferente	1 día	mié 8/7/20	mié 8/7/20				
713			Envío de contrato para firma Gerente de División de A	0 días	mié 8/7/20	mié 8/7/20				
714			Firma de contrato	5 días	jue 9/7/20	mié 15/7/20				
715			Envío de contrato a aprobación interna	0 días	mié 15/7/20	mié 15/7/20				
716			Aprobacion Interna de Contrato	10 días	jue 16/7/20	mié 29/7/20				
717			Comunicación a empresa de aprobación del contrato	0 días	mié 29/7/20	mié 29/7/20				
718			Trámite del Pedido	6 días	jue 30/7/20	jue 6/8/20				
719			Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	jue 30/7/20	vie 31/7/20				
720			Envio de borrador de pedido a Financiero para aproba	0 días	vie 31/7/20	vie 31/7/20				
721			Visado de pedido en la UAF	3 días	lun 3/8/20	mié 5/8/20				
722			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	jue 6/8/20	jue 6/8/20				
723			Notificación de Pedido de Compra	0 días	jue 6/8/20	jue 6/8/20				
724			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	jue 6/8/20	jue 6/8/20				
725			Recepción de los items	13 días	jue 30/7/20	lun 17/8/20				
726			Entrega de los bienes/servicios	10 días	jue 30/7/20	mié 12/8/20				
727			Recibido a satisfacción	3 días	jue 13/8/20	lun 17/8/20				
728			Fin recepción de items	0 días	lun 17/8/20	lun 17/8/20				
729			Trámite de pago	36 días	mar 18/8/20	mié 7/10/20				

Proyecto: Cronograma de com
Fecha: jue 19/12/19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 25

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin				
							2014	2019	2024	2029
730			Envío documentos a Financiero	1 día	mar 18/8/20	mar 18/8/20	Unidad de Servicios de Proveduría Unidad de Administracion Financiera 7/10 2/3 Unidad Técnica Unidad Jurídica Interna[1.000%] Unidad de Servicios de Proveduría Unidad de Servicios de Proveduría Externo 11/5 Unidad de Servicios de Proveduría Unidad de Servicios de Proveduría Externo			
731			Emisión de pago en Financiero	5 días	mié 19/8/20	mar 25/8/20				
732			Pago de Tesorería Nacional	30 días	mié 26/8/20	mié 7/10/20				
733			Conclusión trámite licitación	0 días	mié 7/10/20	mié 7/10/20				
734			2020LA-000008-503_UTI_Fortalecimiento de los servicios de infraestructura; Envían especificaciones 02/03/2020; \$67,024,000	164 días	lun 2/3/20	mié 28/10/20				
735			Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	lun 2/3/20	lun 2/3/20				
736			Confección Documento complementario al cartel	17 días	lun 2/3/20	mar 24/3/20				
737			Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 2/3/20	vie 6/3/20				
738			Revisión Jurídica de cartel UJI	7 días	lun 9/3/20	mar 17/3/20				
739			Revisión Técnica de cartel	7 días	lun 9/3/20	mar 17/3/20				
740			Incorporación de ajustes y confección de documento	5 días	mié 18/3/20	mar 24/3/20				
741			Invitación a participar	28 días	mié 25/3/20	lun 11/5/20				
742			Buscar código de producto / solicitar la creación de código	5 días	mié 25/3/20	mar 31/3/20				
743			Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en SICOP	5 días	mié 1/4/20	mar 14/4/20				
744			Invitación a participar en SICOP	1 día	mié 15/4/20	mié 15/4/20				
745			Plazo para recibir ofertas	17 días	jue 16/4/20	lun 11/5/20				
746			Recurso de Objeción al Cartel	17 días	jue 16/4/20	lun 11/5/20				
747			Presentacion de Objeción al cartel	5 días	jue 16/4/20	mié 22/4/20				
748			Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación	1 día	jue 23/4/20	jue 23/4/20				
749			Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	vie 24/4/20	vie 24/4/20				
750			Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	lun 27/4/20	lun 4/5/20				
751			Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	mar 5/5/20	vie 8/5/20				
752			Comunicación de Resolución final	1 día	lun 11/5/20	lun 11/5/20				
753			Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	jue 23/4/20	lun 11/5/20				
754			Plazo para adjudicación	34 días	mar 12/5/20	lun 29/6/20				
755			Fecha máxima para adjudicar	34 días	mar 12/5/20	lun 29/6/20				
756			Recepción de ofertas	1 día	lun 11/5/20	mar 12/5/20				
757			Apertura de ofertas	0 días	lun 11/5/20	lun 11/5/20				
758			Remisión en SICOP de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion	1 día	mar 12/5/20	mar 12/5/20				
759			Estudio y valoración de las ofertas.	17 días	mié 13/5/20	jue 4/6/20				
760			Admisibiliidad de ofertas (incluye reunión de admisibilidad)	5 días	mié 13/5/20	mar 19/5/20				
761			Solicitud de información en SICOP a los oferentes para	1 día	mié 20/5/20	mié 20/5/20				
762			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a	5 días	jue 21/5/20	mié 27/5/20				
Proyecto: Cronograma de com Fecha: jue 19/12/19										
Tarea			Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División			Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito			Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen			Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Página 26

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin					
							2014	2019	2024	2029	
763			Envío de las respuestas a prevenciones a la UIJ y a la U	0 días	mié 27/5/20	mié 27/5/20					
764			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la U	3 días	jue 28/5/20	lun 1/6/20					
765			Informe de admisibilidad (UIJ y UT)	3 días	mar 2/6/20	jue 4/6/20					
766			Informe de recomendación	5 días	vie 5/6/20	jue 11/6/20					
767			Elaboración de Informe de recomendación	5 días	vie 5/6/20	jue 11/6/20					
768			Recomendación, adjudicación y comunicación	11 días	vie 12/6/20	lun 29/6/20					
769			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	vie 12/6/20	mar 16/6/20					
770			Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	jue 18/6/20	jue 18/6/20					
771			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	jue 18/6/20	jue 18/6/20					
772			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	vie 19/6/20	vie 19/6/20					
773			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicator	1 día	lun 22/6/20	lun 22/6/20					
774			Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	mar 23/6/20	lun 29/6/20					
775			Recurso de revocatoria	25 días	mar 23/6/20	lun 27/7/20					
776			Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	mar 23/6/20	lun 29/6/20					
777			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisible (Art N°186 RLCA)	2 días	mar 30/6/20	mié 1/7/20					
778			Notificación al Adjudicatario del recurso en caso de se	0 días	mié 1/7/20	mié 1/7/20					
779			Plazo para recibir respuesta del adjudicatario (Art N°183	13 días	jue 2/7/20	lun 6/7/20					
780			Elaboracion de la resolucio final de la revocatoria (Ar	15 días	mar 7/7/20	lun 27/7/20					
781			Notificacion de la resolución (SICOP)	0 días	lun 27/7/20	lun 27/7/20					
782			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	6 días	mar 28/7/20	mar 4/8/20					
783			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mar 28/7/20	mar 28/7/20					
784			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la	0,5 días	mar 28/7/20	mar 28/7/20					
785			Adjudicación en firme	5 días	mié 29/7/20	mar 4/8/20					
786			Trámite de contrato	16 días	mar 28/7/20	mar 18/8/20					
787			Elaboración del Contrato	5 días	mar 28/7/20	mar 4/8/20					
788			Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	mar 28/7/20	mar 28/7/20					
789			Presentación de documentos por parte de adjudicar	5 días	mar 28/7/20	mar 4/8/20					
790			Firma de contrato oferente	1 día	mar 28/7/20	mar 28/7/20					
791			Envío de contrato para firma Gerente de División de A	0 días	mar 28/7/20	mar 28/7/20					
792			Firma de contrato	5 días	mié 29/7/20	mar 4/8/20					
793			Envío de contrato a aprobación interna	0 días	mar 4/8/20	mar 4/8/20					
794			Aprobacion Interna de Contrato	10 días	mié 5/8/20	mar 18/8/20					
795			Comunicación a empresa de aprobación del contrato	0 días	mar 18/8/20	mar 18/8/20					
796			Trámite del Pedido	6 días	mié 19/8/20	mié 26/8/20					
797			Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	mié 19/8/20	jue 20/8/20					

Proyecto: Cronograma de com Fecha: jue 19/12/19	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Página 27

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin					
							2014	2019	2024	2029	
832			Plazo para adjudicación	34 días	lun 13/4/20	vie 29/5/20	The Gantt chart displays the project schedule from 2014 to 2029. Key features include: Task Bars: Represented by blue bars with icons indicating task status or type. Milestones: Indicated by diamond shapes with dates like 3/4, 28/4, 2/6, and 29/6. Labels: Units such as 'Unidad de Servicios de Proveduría' and 'Externo' are labeled along the timeline. Legend: A detailed legend at the bottom explains symbols for tasks, divisions, milestones, and summaries.				
833			Fecha máxima para adjudicar	34 días	lun 13/4/20	vie 29/5/20					
834			Recepción de ofertas	1 día	vie 3/4/20	lun 13/4/20					
835			Apertura de ofertas	0 días	vie 3/4/20	vie 3/4/20					
836			Remisión en SICOP de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion	1 día	lun 13/4/20	lun 13/4/20					
837			Estudio y valoración de las ofertas.	17 días	mar 14/4/20	jue 7/5/20					
838			Admisibiliidad de ofertas (incluye reunión de admisibi	5 días	mar 14/4/20	lun 20/4/20					
839			Solicitud de información en SICOP a los oferentes par	1 día	mar 21/4/20	mar 21/4/20					
840			Recepción de respuestas por parte de los oferentes a	5 días	mié 22/4/20	mar 28/4/20					
841			Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la U	0 días	mar 28/4/20	mar 28/4/20					
842			Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la U	3 días	mié 29/4/20	lun 4/5/20					
843			Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	mar 5/5/20	jue 7/5/20					
844			Informe de recomendación	5 días	vie 8/5/20	jue 14/5/20					
845			Elaboración de Informe de recomendación	5 días	vie 8/5/20	jue 14/5/20					
846			Recomendación, adjudicación y comunicación	11 días	vie 15/5/20	vie 29/5/20					
847			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	vie 15/5/20	mar 19/5/20					
848			Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 20/5/20	mié 20/5/20					
849			Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 20/5/20	mié 20/5/20					
850			Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	jue 21/5/20	jue 21/5/20					
851			Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion	1 día	vie 22/5/20	vie 22/5/20					
852			Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	lun 25/5/20	vie 29/5/20					
853			Recurso de revocatoria	25 días	lun 25/5/20	lun 29/6/20					
854			Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	lun 25/5/20	vie 29/5/20					
855			Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisible (Art N°186 RLCA)	2 días	lun 1/6/20	mar 2/6/20					
856			Notificación al Adjudicatario del recurso en caso de se	0 días	mar 2/6/20	mar 2/6/20					
857			Plazo para recibir respuesta del adjudicatario (Art N°1	3 días	mié 3/6/20	vie 5/6/20					
858			Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Ar	15 días	lun 8/6/20	lun 29/6/20					
859			Notificacion de la resolución (SICOP)	0 días	lun 29/6/20	lun 29/6/20					
860			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	6 días	mar 30/6/20	mar 7/7/20					
861			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mar 30/6/20	mar 30/6/20					
862			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la	0,5 días	mar 30/6/20	mar 30/6/20					
863			Adjudicación en firme	5 días	mié 1/7/20	mar 7/7/20					
864			Trámite de contrato	16 días	mar 30/6/20	mar 21/7/20					
865			Elaboración del Contrato	5 días	mar 30/6/20	mar 7/7/20					

Proyecto: Cronograma de com
Fecha: jue 19/12/19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 29

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin												
							2014201920242029											
866			Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	mar 30/6/20	mar 30/6/20												
867			Presentación de documentos por parte de adjudicatar	5 días	mar 30/6/20	mar 7/7/20												
868			Firma de contrato oferente	1 día	mar 30/6/20	mar 30/6/20												
869			Envío de contrato para firma Gerente de División de A	0 días	mar 30/6/20	mar 30/6/20												
870			Firma de contrato	5 días	mié 1/7/20	mar 7/7/20												
871			Envío de contrato a aprobación interna	0 días	mar 7/7/20	mar 7/7/20												
872			Aprobacion Interna de Contrato	10 días	mié 8/7/20	mar 21/7/20												
873			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y	0 días	mar 21/7/20	mar 21/7/20												
874			Trámite del Pedido	6 días	mié 22/7/20	mié 29/7/20												
875			Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	mié 22/7/20	jue 23/7/20												
876			Envio de borrador de pedido a Financiero para aproba	0 días	jue 23/7/20	jue 23/7/20												
877			Visado de pedido en la UAF	3 días	vie 24/7/20	mar 28/7/20												
878			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	mié 29/7/20	mié 29/7/20												
879			Notificación de Pedido de Compra	0 días	mié 29/7/20	mié 29/7/20												
880			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mié 29/7/20	mié 29/7/20												
881			Recepción de los items	13 días	mié 22/7/20	vie 7/8/20												
882			Entrega de los bienes/servicios	10 días	mié 22/7/20	mar 4/8/20												
883			Recibido a satisfacción	3 días	mié 5/8/20	vie 7/8/20												
884			Fin recepción de items	0 días	vie 7/8/20	vie 7/8/20												
885			Trámite de pago	36 días	lun 10/8/20	mar 29/9/20												
886			Envio documentos a Financiero	1 día	lun 10/8/20	lun 10/8/20												
887			Emisión de pago en Financiero	5 días	mar 11/8/20	lun 17/8/20												
888			pago de Tesorería Nacional	30 días	mar 18/8/20	mar 29/9/20												
889			Conclusión trámite licitación	0 días	mar 29/9/20	mar 29/9/20												
890			2020LA-000010-503_UTI_Conexión a internet movil; modalidad según demanda; contratado al 26 de mayo)	164 días	lun 13/1/20	lun 7/9/20												
891			Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercade	0 días	lun 13/1/20	lun 13/1/20												
892			Confección Documento complementario al cartel	17 días	lun 13/1/20	mar 4/2/20												
893			Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 13/1/20	vie 17/1/20												
894			Revisión Jurídica de cartel UJI	7 días	lun 20/1/20	mar 28/1/20												
895			Revisión Técnica de cartel	7 días	lun 20/1/20	mar 28/1/20												
896			Incorporación de ajustes y confección de documento c	5 días	mié 29/1/20	mar 4/2/20												
897			Invitación a participar	28 días	mié 5/2/20	vie 13/3/20												
898			Buscar código de producto / solicitar la creación de có	5 días	mié 5/2/20	mar 11/2/20												
899			Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en SICC	5 días	mié 12/2/20	mar 18/2/20												
Proyecto: Cronograma de com Fecha: jue 19/12/19			Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite											
			División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso											
			Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual											
			Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo												
Página 30																		

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin					
							2014	2019	2024	2029	
934			Notificación al Adjudicatario del recurso en caso de se	0 días	mar 12/5/20	mar 12/5/20					
935			Plazo para recibir respuesta del adjudicatario (Art N°13	3 días	mié 13/5/20	vie 15/5/20					
936			Elaboracion de la resolucio final de la revocatoria (Ar	15 días	lun 18/5/20	vie 5/6/20					
937			Notificacion de la resolución (SICOP)	0 días	vie 5/6/20	vie 5/6/20					
938			Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	6 días	lun 8/6/20	lun 15/6/20					
939			Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	lun 8/6/20	lun 8/6/20					
940			Nueva recomendación de adjudicación por parte de la	0,5 días	lun 8/6/20	lun 8/6/20					
941			Adjudicación en firme	5 días	mar 9/6/20	lun 15/6/20					
942			Trámite de contrato	16 días	lun 8/6/20	mar 30/6/20					
943			Elaboración del Contrato	5 días	lun 8/6/20	lun 15/6/20					
944			Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	lun 8/6/20	lun 8/6/20					
945			Presentación de documentos por parte de adjudicar	5 días	lun 8/6/20	lun 15/6/20					
946			Firma de contrato oferente	1 día	lun 8/6/20	lun 8/6/20					
947			Envío de contrato para firma Gerente de División de A	0 días	lun 8/6/20	lun 8/6/20					
948			Firma de contrato	5 días	mar 9/6/20	lun 15/6/20					
949			Envío de contrato a aprobación interna	0 días	lun 15/6/20	lun 15/6/20					
950			Aprobacion Interna de Contrato	10 días	mar 16/6/20	mar 30/6/20					
951			Comunicación a empresa de aprobación del contrato y	0 días	mar 30/6/20	mar 30/6/20					
952			Trámite del Pedido	6 días	mié 1/7/20	mié 8/7/20					
953			Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	mié 1/7/20	jue 2/7/20					
954			Envio de borrador de pedido a Financiero para aproba	0 días	jue 2/7/20	jue 2/7/20					
955			Visado de pedido en la UAF	3 días	vie 3/7/20	mar 7/7/20					
956			Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	mié 8/7/20	mié 8/7/20					
957			Notificación de Pedido de Compra	0 días	mié 8/7/20	mié 8/7/20					
958			Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mié 8/7/20	mié 8/7/20					
959			Recepción de los items	13 días	mié 1/7/20	vie 17/7/20					
960			Entrega de los bienes/servicios	10 días	mié 1/7/20	mar 14/7/20					
961			Recibido a satisfacción	3 días	mié 15/7/20	vie 17/7/20					
962			Fin recepción de items	0 días	vie 17/7/20	vie 17/7/20					
963			Trámite de pago	36 días	lun 20/7/20	lun 7/9/20					
964			Envio documentos a Financiero	1 día	lun 20/7/20	lun 20/7/20					
965			Emisión de pago en Financiero	5 días	mar 21/7/20	lun 27/7/20					
966			pago de Tesorería Nacional	30 días	mar 28/7/20	lun 7/9/20					
967			Conclusión trámite licitación	0 días	lun 7/9/20	lun 7/9/20					
968			UNIDAD CENTRO DE CAPACITACIÓN	134 días	mar 10/12/19	mié 8/7/20					

Proyecto: Cronograma de com
Fecha: jue 19/12/19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 32

Cronograma de actividades						
ID	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	
969		2020LA-000010-503_Contratación de hotel y servicio de alimentación e instructores_Envían especificaciones el 09/12/2019; ¢27.500.000/año; ¢110,000.000/4años	134 días	mar 10/12/19	mié 8/7/20	
970		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	mar 10/12/19	mar 10/12/19	
971		Confección Documento complementario al cartel	17 días	mar 10/12/19	jue 16/1/20	
972		Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	mar 10/12/19	lun 16/12/19	
973		Revisión Jurídica de cartel UJI	7 días	mar 17/12/19	jue 9/1/20	
974		Revisión Técnica de cartel	7 días	mar 17/12/19	jue 9/1/20	
975		Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al cartel	5 días	vie 10/1/20	jue 16/1/20	
976		Invitación a participar	28 días	vie 17/1/20	mar 25/2/20	
977		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	vie 17/1/20	jue 23/1/20	
978		Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en SICC	5 días	vie 24/1/20	jue 30/1/20	
979		Invitación a participar en SICOP	1 día	vie 31/1/20	vie 31/1/20	
980		Plazo para recibir ofertas	17 días	lun 3/2/20	mar 25/2/20	
981		Recurso de Objeción al Cartel	17 días	lun 3/2/20	mar 25/2/20	
982		Presentacion de Objeción al cartel	5 días	lun 3/2/20	vie 7/2/20	
983		Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación	1 día	lun 10/2/20	lun 10/2/20	
984		Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Uni	1 día	mar 11/2/20	mar 11/2/20	
985		Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	mié 12/2/20	mar 18/2/20	
986		Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	mié 19/2/20	lun 24/2/20	
987		Comunicación de Resolución final	1 día	mar 25/2/20	mar 25/2/20	
988		Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	lun 10/2/20	mar 25/2/20	
989		Plazo para adjudicación	34 días	mié 26/2/20	lun 20/4/20	
990		Fecha máxima para adjudicar	34 días	mié 26/2/20	lun 20/4/20	
991		Recepción de ofertas	1 día	mar 25/2/20	mié 26/2/20	
992		Apertura de ofertas	0 días	mar 25/2/20	mar 25/2/20	
993		Remisión en SICOP de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion	1 día	mié 26/2/20	mié 26/2/20	
994		Estudio y valoración de las ofertas.	17 días	jue 27/2/20	vie 20/3/20	
995		Admisibiliidad de ofertas (incluye reunión de admisibi	5 días	jue 27/2/20	mié 4/3/20	
996		Solicitud de información en SICOP a los oferentes para atender prevenciones	1 día	jue 5/3/20	jue 5/3/20	
997		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En SICOP)	5 días	vie 6/3/20	jue 12/3/20	

Proyecto: Cronograma de com
Fecha: jue 19/12/19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 33

Proyecto: Cronograma de com						
Fecha: jue 19/12/19						
Tarea Resumen del proyecto Tarea manual solo el comienzo Fecha límite División Tarea inactiva solo duración solo fin Progreso Hito Hito inactivo Informe de resumen manual Tareas externas Progreso manual Resumen Resumen inactivo Resumen manual Hito externo						

