


Proyecto: Cronograma de comp
Fecha: jue 16/12/21

Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		Progreso manual	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha limite			
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023	T1	T2
46		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	1 día	mar 7/6/22	mié 8/6/22	45										
47		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mié 8/6/22	jue 9/6/22	46										
48		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicación (SICOP)	1 día	jue 9/6/22	vie 10/6/22	47										
49		Firmeza del acto de adjudicación	10 días	vie 10/6/22	vie 24/6/22	48										
50		Plazo para recibir recurso (Art 182 RLCA)	10 días	vie 10/6/22	vie 24/6/22											
51		Plazo para recibir recurso (Art 182 RLCA)	10 días	vie 10/6/22	vie 24/6/22	48										
52		Recurso de revocatoria ante la Administración	33 días	vie 24/6/22	vie 12/8/22											
53		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisibile (Art 193 RLCA)	10 días	vie 24/6/22	vie 8/7/22	51										
54		Notificacion al Adjudicatario y a la administración del recurso	2 días	vie 8/7/22	mar 12/7/22	53										
55		Plazo para recibir respuesta del adjudicatario y de la administración (Art190 RLCA)	3 días	mar 12/7/22	vie 15/7/22	54										
56		Elaboracion de la resolucio final de la apelación	15 días	vie 15/7/22	mar 9/8/22	55										
57		Notificacion de la resolución (SICOP)	3 días	mar 9/8/22	vie 12/8/22	56										
58		Comisión de adjudicaciones	16,5 días?	vie 12/8/22	mar 6/9/22											
59		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	vie 12/8/22	jue 18/8/22	57										
60		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	jue 18/8/22	jue 18/8/22	59										
61		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	1 día	vie 19/8/22	vie 19/8/22	60										
62		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día?	lun 22/8/22	lun 22/8/22	61										
63		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicación (SICOP)	1 día	mar 23/8/22	mar 23/8/22	62										
64		Adjudicación en firme	10 días	mié 24/8/22	mar 6/9/22	63										
65		Trámite de contrato	26 días	mié 7/9/22	jue 13/10/22											
66		Elaboración del Contrato	5 días	mié 7/9/22	mar 13/9/22	64										
67		Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	mié 7/9/22	mié 7/9/22	66CC										
68		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	jue 8/9/22	mié 14/9/22	67										
69		Firma de contrato oferente	3 días	jue 15/9/22	mar 20/9/22	64;68										
70		Envío de contrato para firma a Gerencia de Gestión de Apoyo	1 día	mié 21/9/22	mié 21/9/22	69										
71		Firma de contrato	5 días	jue 22/9/22	mié 28/9/22	70										
72		Envío de contrato a Refrendo Interno a la UJI	1 día	jue 29/9/22	jue 29/9/22	71										
73		Refrendo del Contrato	10 días	vie 30/9/22	jue 13/10/22	72										
74		Comunicación a la (las) empresa del refendo del contrato y orden de inicio	0 días	jue 13/10/22	jue 13/10/22	73										
75		Trámite del Pedido	5 días	vie 14/10/22	jue 20/10/22											
76		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	vie 14/10/22	lun 17/10/22	74										
77		Envío de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	lun 17/10/22	lun 17/10/22	76										
78		Devolución de pedido a Proveeduría	3 días	mar 18/10/22	jue 20/10/22	77										
79		Notificación de Pedido de Compra	0 días	jue 20/10/22	jue 20/10/22	78										
80		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	jue 20/10/22	jue 20/10/22	79										
81		Recepción de los items	4 días	jue 20/10/22	mié 26/10/22											
82		Trámite de exoneración de bienes	0 días	jue 20/10/22	jue 20/10/22	80										
83		Entrega de los bienes/servicios	1 día	vie 21/10/22	vie 21/10/22	82										
84		Recibido a satisfacción	3 días	lun 24/10/22	mié 26/10/22	83										
85		Fin recepción de items	0 días	mié 26/10/22	mié 26/10/22	84										
86		Trámite de pago	36 días	jue 27/10/22	vie 16/12/22											
87		Envío documentos a Financiero	1 día	jue 27/10/22	jue 27/10/22	85										
88		Emisión de pago en Financiero	5 días	vie 28/10/22	jue 3/11/22	87										
89		Pago de Tesorería Nacional	30 días	vie 4/11/22	vie 16/12/22	88										
90		Conclusión trámite licitación	0 días	vie 16/12/22	vie 16/12/22	89										
91		UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (UTI)	250 días?	vie 28/1/22	jue 9/2/23											
92		2022LN-00002-503; UTI; Subasta a la baja de computadoras portátiles entrega según demanda; iniciar en enero 2022; \$102,514.000/2022; Walter Araya - Carlos Leal	249 días?	lun 31/1/22	jue 9/2/23											

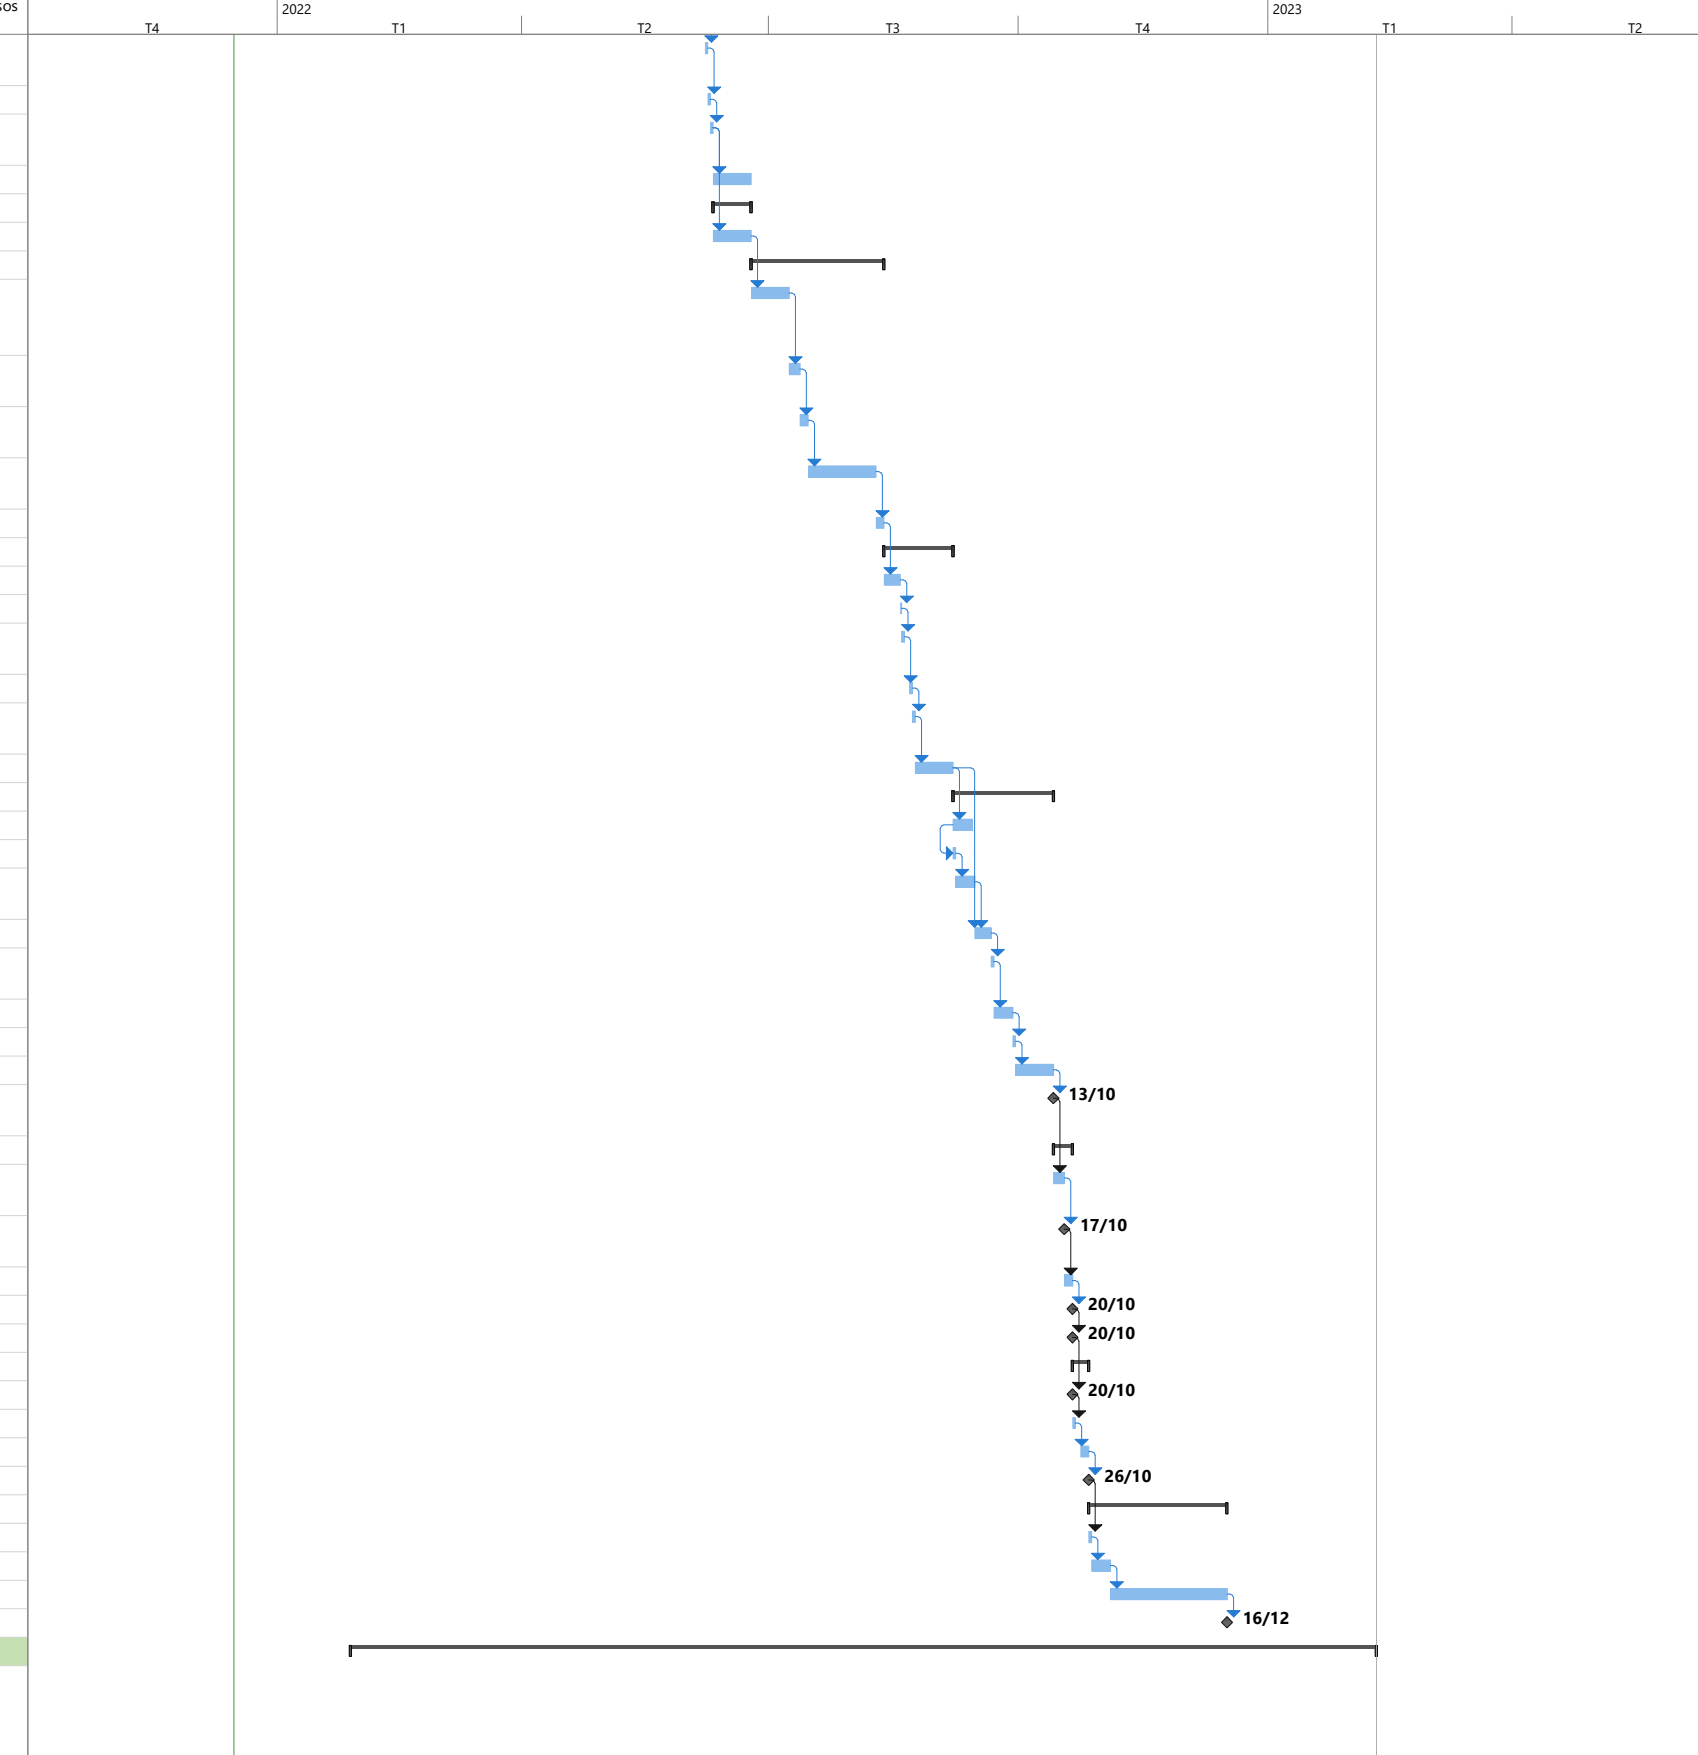

Proyecto: Cronograma de comp
Fecha: jue 16/12/21

Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		Progreso manual	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha limite			
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023	T1	T2
93		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	lun 31/1/22	lun 31/1/22					31/1						
94		Confección Documento complementario al cartel	24 días	lun 31/1/22	jue 3/3/22											
95		Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 31/1/22	vie 4/2/22	93										
96		Revisión Jurídica de cartel UJI	7 días	lun 7/2/22	mar 15/2/22	95										
97		Revisión Técnica de cartel	7 días	mié 16/2/22	jue 24/2/22	96										
98		Incorporación de ajustes y confección de Documento complementario al cartel	5 días	vie 25/2/22	jue 3/3/22	97										
99		Invitación a participar	11 días	vie 4/3/22	vie 18/3/22											
100		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	vie 4/3/22	jue 10/3/22	98										
101		Elaboración de solicitud y confección de Cartel en SICOP	5 días	vie 11/3/22	jue 17/3/22	100										
102		Invitación a participar en SICOP	1 día	vie 18/3/22	vie 18/3/22	101										
103		Plazo para recibir ofertas	22 días	lun 21/3/22	mar 26/4/22											
104		Plazo para recibir ofertas	22 días	lun 21/3/22	mar 26/4/22	102										
105		Presentación de Objeción al cartel	3 días	vie 18/3/22	mar 22/3/22											
106		Presentación de Objeción al cartel	3 días	vie 18/3/22	mar 22/3/22	102CC										
107		Recurso de Objeción al Cartel	12 días	mié 23/3/22	jue 7/4/22											
108		Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en SICOP	1 día	mié 23/3/22	mié 23/3/22	106										
109		La DCA solicita expediente administrativo a la USP y solicita criterio técnico acerca del recursos en mención.	1 día	jue 24/3/22	jue 24/3/22	108										
110		Respuesta con el criterio de la UT a la USP para ser enviado a la DCA	2 días	vie 25/3/22	lun 28/3/22	109										
111		Respuesta de la USP para ser enviado a la DCA	1 día	mar 29/3/22	mar 29/3/22	110										
112		Remisión del criterio técnico a la DCA	0 días	lun 28/3/22	lun 28/3/22	110				28/3						
113		Confección de Resolución a la Objeción	5 días	mar 29/3/22	lun 4/4/22	112										
114		Comunicación de Resolución final por medio de SICOP	3 días	mar 5/4/22	jue 7/4/22	113										
115		Enmiendas al Cartel	10 días	vie 8/4/22	jue 28/4/22											
116		Enmiendas al Cartel	10 días	vie 8/4/22	jue 28/4/22	114										
117		Nuevo plazo para recibir ofertas	22 días	vie 29/4/22	lun 30/5/22											
118		Nuevo plazo para recibir ofertas	22 días	vie 29/4/22	lun 30/5/22	116										
119		Fecha máxima para adjudicar	88 días	mar 31/5/22	mié 5/10/22											
120		Fecha máxima para adjudicar	88 días	mar 31/5/22	mié 5/10/22	118										
121		Recepción y estudio de ofertas	31 días	lun 30/5/22	mar 12/7/22											
122		Apertura de ofertas	0 días	lun 30/5/22	lun 30/5/22	118										
123		Remisión en SICOP de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunión de admisibilidad	1 día	mar 31/5/22	mar 31/5/22	122										
124		Estudio y valoración de las ofertas (incluye reunión de admisibilidad)	10 días	mié 1/6/22	mar 14/6/22	123										
125		Solicitud de información en SICOP a los oferentes para atender prevenciones	0 días	mar 14/6/22	mar 14/6/22	124										
126		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En SICOP)	5 días	mié 15/6/22	mar 21/6/22	125										
127		Envío de las respuestas de proveedores a prevenciones a la UJI y a la UT (SICOP)	0 días	mar 21/6/22	mar 21/6/22	126										
128		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	5 días	mié 22/6/22	mar 28/6/22	127										
129		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	5 días	mié 29/6/22	mar 5/7/22	128										
130		Elaboración de Informe de recomendación (UT)	5 días	mié 6/7/22	mar 12/7/22	129										
131		Recomendación, adjudicación y comunicación	16,5 días	mié 13/7/22	lun 8/8/22											
132		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mié 13/7/22	vie 15/7/22	130										
133		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	lun 18/7/22	lun 18/7/22	132										
134		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	1 día	lun 18/7/22	mar 19/7/22	133										
135		Elaboración de acuerdo de adjudicación	1 día	mar 19/7/22	mié 20/7/22	134										
136		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicación (SICOP)	1 día	mié 20/7/22	jue 21/7/22	135										
137		Firmeza del acto de adjudicación	10 días	jue 21/7/22	lun 8/8/22	136										

Proyecto: Cronograma de comp
Fecha: jue 16/12/21


Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		Progreso manual	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha limite			
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023	T1	T2
138		Plazo para recibir recurso (Art 182 RLCA)	10 días	jue 21/7/22	lun 8/8/22											
139		Plazo para recibir recurso (Art 182 RLCA)	10 días	jue 21/7/22	lun 8/8/22	136										
140		Recurso de revocatoria ante la Administración	33 días	lun 8/8/22	lun 26/9/22											
141		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisibile (Art 193 RLCA)	10 días	lun 8/8/22	mar 23/8/22	139										
142		Notificación al Adjudicatario y a la administración del recurso	2 días	mar 23/8/22	jue 25/8/22	141										
143		Plazo para recibir respuesta del adjudicatario y de la administración (Art190 RLCA)	3 días	jue 25/8/22	mar 30/8/22	142										
144		Elaboracion de la resolucio final de la apelación	15 días	mar 30/8/22	mié 21/9/22	143										
145		Notificación de la resolución (SICOP)	3 días	mié 21/9/22	lun 26/9/22	144										
146		Comisión de adjudicaciones	16,5 días?	lun 26/9/22	mar 18/10/22											
147		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	lun 26/9/22	jue 29/9/22	145										
148		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 29/9/22	jue 29/9/22	147										
149		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	1 día	vie 30/9/22	vie 30/9/22	148										
150		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día?	lun 3/10/22	lun 3/10/22	149										
151		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicación (SICOP)	1 día	mar 4/10/22	mar 4/10/22	150										
152		Adjudicación en firme	10 días	mié 5/10/22	mar 18/10/22	151										
153		Trámite de contrato	26 días	mié 19/10/22	mié 23/11/22											
154		Elaboración del Contrato	5 días	mié 19/10/22	mar 25/10/22	152										
155		Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	mié 19/10/22	mié 19/10/22	154CC										
156		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	jue 20/10/22	mié 26/10/22	155										
157		Firma de contrato oferente	3 días	jue 27/10/22	lun 31/10/22	152;156										
158		Envío de contrato para firma a Gerencia de Gestión de Apoyo	1 día	mar 1/11/22	mar 1/11/22	157										
159		Firma de contrato	5 días	mié 2/11/22	mar 8/11/22	158										
160		Envío de contrato a Refrendo Interno a la UJI	1 día	mié 9/11/22	mié 9/11/22	159										
161		Refrendo del Contrato	10 días	jue 10/11/22	mié 23/11/22	160										
162		Comunicación a la (las) empresa del refendo del contrato y orden de inicio	0 días	mié 23/11/22	mié 23/11/22	161										
163		Trámite del Pedido	5 días	jue 24/11/22	mié 30/11/22											
164		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	jue 24/11/22	vie 25/11/22	162										
165		Envío de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	vie 25/11/22	vie 25/11/22	164										
166		Devolución de pedido a Proveeduría	3 días	lun 28/11/22	mié 30/11/22	165										
167		Notificación de Pedido de Compra	0 días	mié 30/11/22	mié 30/11/22	166										
168		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mié 30/11/22	mié 30/11/22	167										
169		Recepción de los items	4 días	mié 30/11/22	mié 7/12/22											
170		Trámite de exoneración de bienes	0 días	mié 30/11/22	mié 30/11/22	168										
171		Entrega de los bienes/servicios	1 día	vie 2/12/22	vie 2/12/22	170										
172		Recibido a satisfacción	3 días	lun 5/12/22	mié 7/12/22	171										
173		Fin recepción de items	0 días	mié 7/12/22	mié 7/12/22	172										
174		Trámite de pago	36 días	jue 8/12/22	jue 9/2/23											
175		Envío documentos a Financiero	1 día	jue 8/12/22	jue 8/12/22	173										
176		Emisión de pago en Financiero	5 días	vie 9/12/22	jue 15/12/22	175										
177		Pago de Tesorería Nacional	30 días	vie 16/12/22	jue 9/2/23	176										
178		Conclusión trámite licitación	0 días	jue 9/2/23	jue 9/2/23	177										
179		2022LN-00003-503; UTI; Software; Envían especificaciones 2/01/20222; €50,086.000,00/2022; Carolina Guevara - Eneyda Flores	249 días?	vie 28/1/22	mié 8/2/23											
180		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	vie 28/1/22	vie 28/1/22											
181		Confección Documento complementario al cartel	24 días	vie 28/1/22	mié 2/3/22											
182		Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	vie 28/1/22	jue 3/2/22	180										
183		Revisión Jurídica de cartel UJI	7 días	vie 4/2/22	lun 14/2/22	182										
184		Revisión Técnica de cartel	7 días	mar 15/2/22	mié 23/2/22	183										


Proyecto: Cronograma de comp
Fecha: jue 16/12/21

Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		Progreso manual	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha limite			
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023	T1	T2
185		Incorporación de ajustes y confección de Documento complementario al cartel	5 días	jue 24/2/22	mié 2/3/22	184										
186		Invitación a participar	11 días	jue 3/3/22	jue 17/3/22											
187		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	jue 3/3/22	mié 9/3/22	185										
188		Elaboración de solicitud y confección de Cartel en SICOP	5 días	jue 10/3/22	mié 16/3/22	187										
189		Invitación a participar en SICOP	1 día	jue 17/3/22	jue 17/3/22	188										
190		Plazo para recibir ofertas	22 días	vie 18/3/22	lun 25/4/22											
191		Plazo para recibir ofertas	22 días	vie 18/3/22	lun 25/4/22	189										
192		Presentación de Objeción al cartel	3 días	jue 17/3/22	lun 21/3/22											
193		Presentación de Objeción al cartel	3 días	jue 17/3/22	lun 21/3/22	189CC										
194		Recurso de Objeción al Cartel	12 días	mar 22/3/22	mié 6/4/22											
195		Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en SICOP	1 día	mar 22/3/22	mar 22/3/22	193										
196		La DCA solicita expediente administrativo a la USP y solicita criterio técnico acerca del recursos en mención.	1 día	mié 23/3/22	mié 23/3/22	195										
197		Respuesta con el criterio de la UT a la USP para ser enviado a la DCA	2 días	jue 24/3/22	vie 25/3/22	196										
198		Respuesta de la USP para ser enviado a la DCA	1 día	lun 28/3/22	lun 28/3/22	197										
199		Remisión del criterio técnico a la DCA	0 días	vie 25/3/22	vie 25/3/22	197										
200		Confeccion de Resolucion a la Objecion	5 días	lun 28/3/22	vie 1/4/22	199										
201		Comunicación de Resolucion final por medio de SICOP	3 días	lun 4/4/22	mié 6/4/22	200										
202		Enmiendas al Cartel	10 días	jue 7/4/22	mié 27/4/22											
203		Enmiendas al Cartel	10 días	jue 7/4/22	mié 27/4/22	201										
204		Nuevo plazo para recibir ofertas	22 días	jue 28/4/22	vie 27/5/22											
205		Nuevo plazo para recibir ofertas	22 días	jue 28/4/22	vie 27/5/22	203										
206		Fecha máxima para adjudicar	88 días	lun 30/5/22	mar 4/10/22											
207		Fecha máxima para adjudicar	88 días	lun 30/5/22	mar 4/10/22	205										
208		Recepción y estudio de ofertas	31 días	vie 27/5/22	lun 11/7/22											
209		Apertura de ofertas	0 días	vie 27/5/22	vie 27/5/22	205										
210		Remisión en SICOP de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion de admisibilidad	1 día	lun 30/5/22	lun 30/5/22	209										
211		Estudio y valoración de las ofertas (incluye reunión de admisibilidad)	10 días	mar 31/5/22	lun 13/6/22	210										
212		Solicitud de información en SICOP a los oferentes para atender prevenciones	0 días	lun 13/6/22	lun 13/6/22	211										
213		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En SICOP)	5 días	mar 14/6/22	lun 20/6/22	212										
214		Envío de las respuestas de proveedores a prevenciones a la UJI y a la UT (SICOP)	0 días	lun 20/6/22	lun 20/6/22	213										
215		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	5 días	mar 21/6/22	lun 27/6/22	214										
216		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	5 días	mar 28/6/22	lun 4/7/22	215										
217		Elaboración de Informe de recomendación (UT)	5 días	mar 5/7/22	lun 11/7/22	216										
218		Recomendación, adjudicación y comunicación	16,5 días	mar 12/7/22	vie 5/8/22											
219		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mar 12/7/22	jue 14/7/22	217										
220		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	vie 15/7/22	vie 15/7/22	219										
221		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	1 día	vie 15/7/22	lun 18/7/22	220										
222		Elaboración de acuerdo de adjudicación	1 día	lun 18/7/22	mar 19/7/22	221										
223		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicación (SICOP)	1 día	mar 19/7/22	mié 20/7/22	222										
224		Firmeza del acto de adjudicación	10 días	mié 20/7/22	vie 5/8/22	223										
225		Plazo para recibir recurso (Art 182 RLCA)	10 días	mié 20/7/22	vie 5/8/22											
226		Plazo para recibir recurso (Art 182 RLCA)	10 días	mié 20/7/22	vie 5/8/22	223										
227		Recurso de revocatoria ante la Administración	33 días	vie 5/8/22	vie 23/9/22											
228		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisibles (Art 193 RLCA)	10 días	vie 5/8/22	lun 22/8/22	226										
229		Notificación al Adjudicatario y a la administración del recurso	2 días	lun 22/8/22	mié 24/8/22	228										

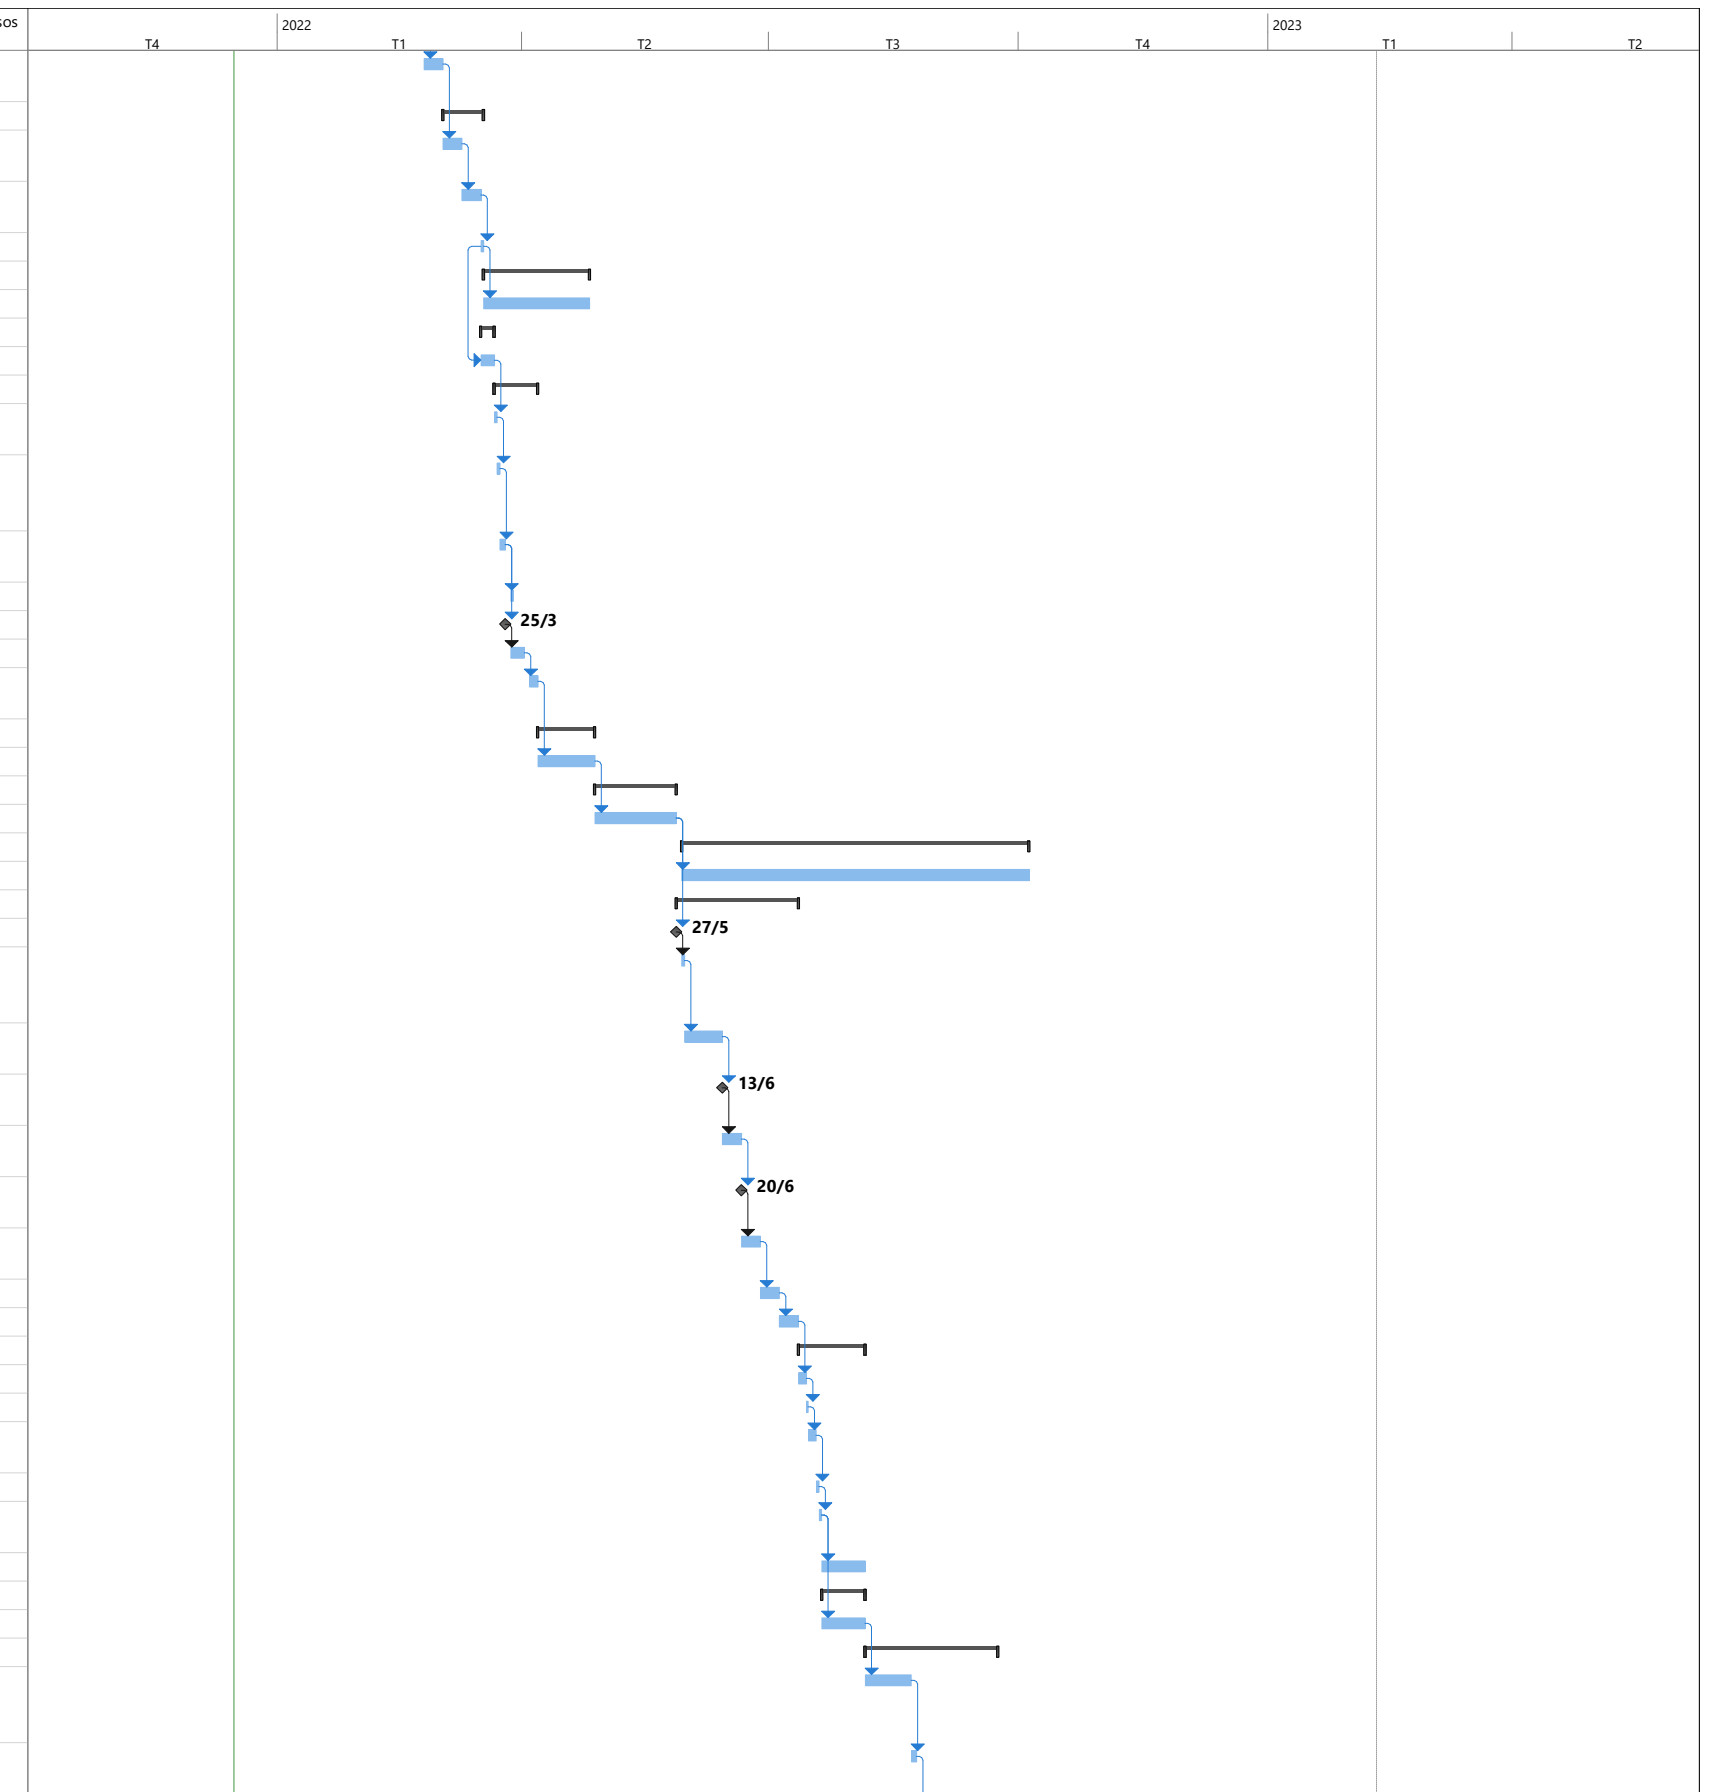



Proyecto: Cronograma de comp	Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Progreso manual
Fecha: jue 16/12/21	División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	
	Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Progreso	

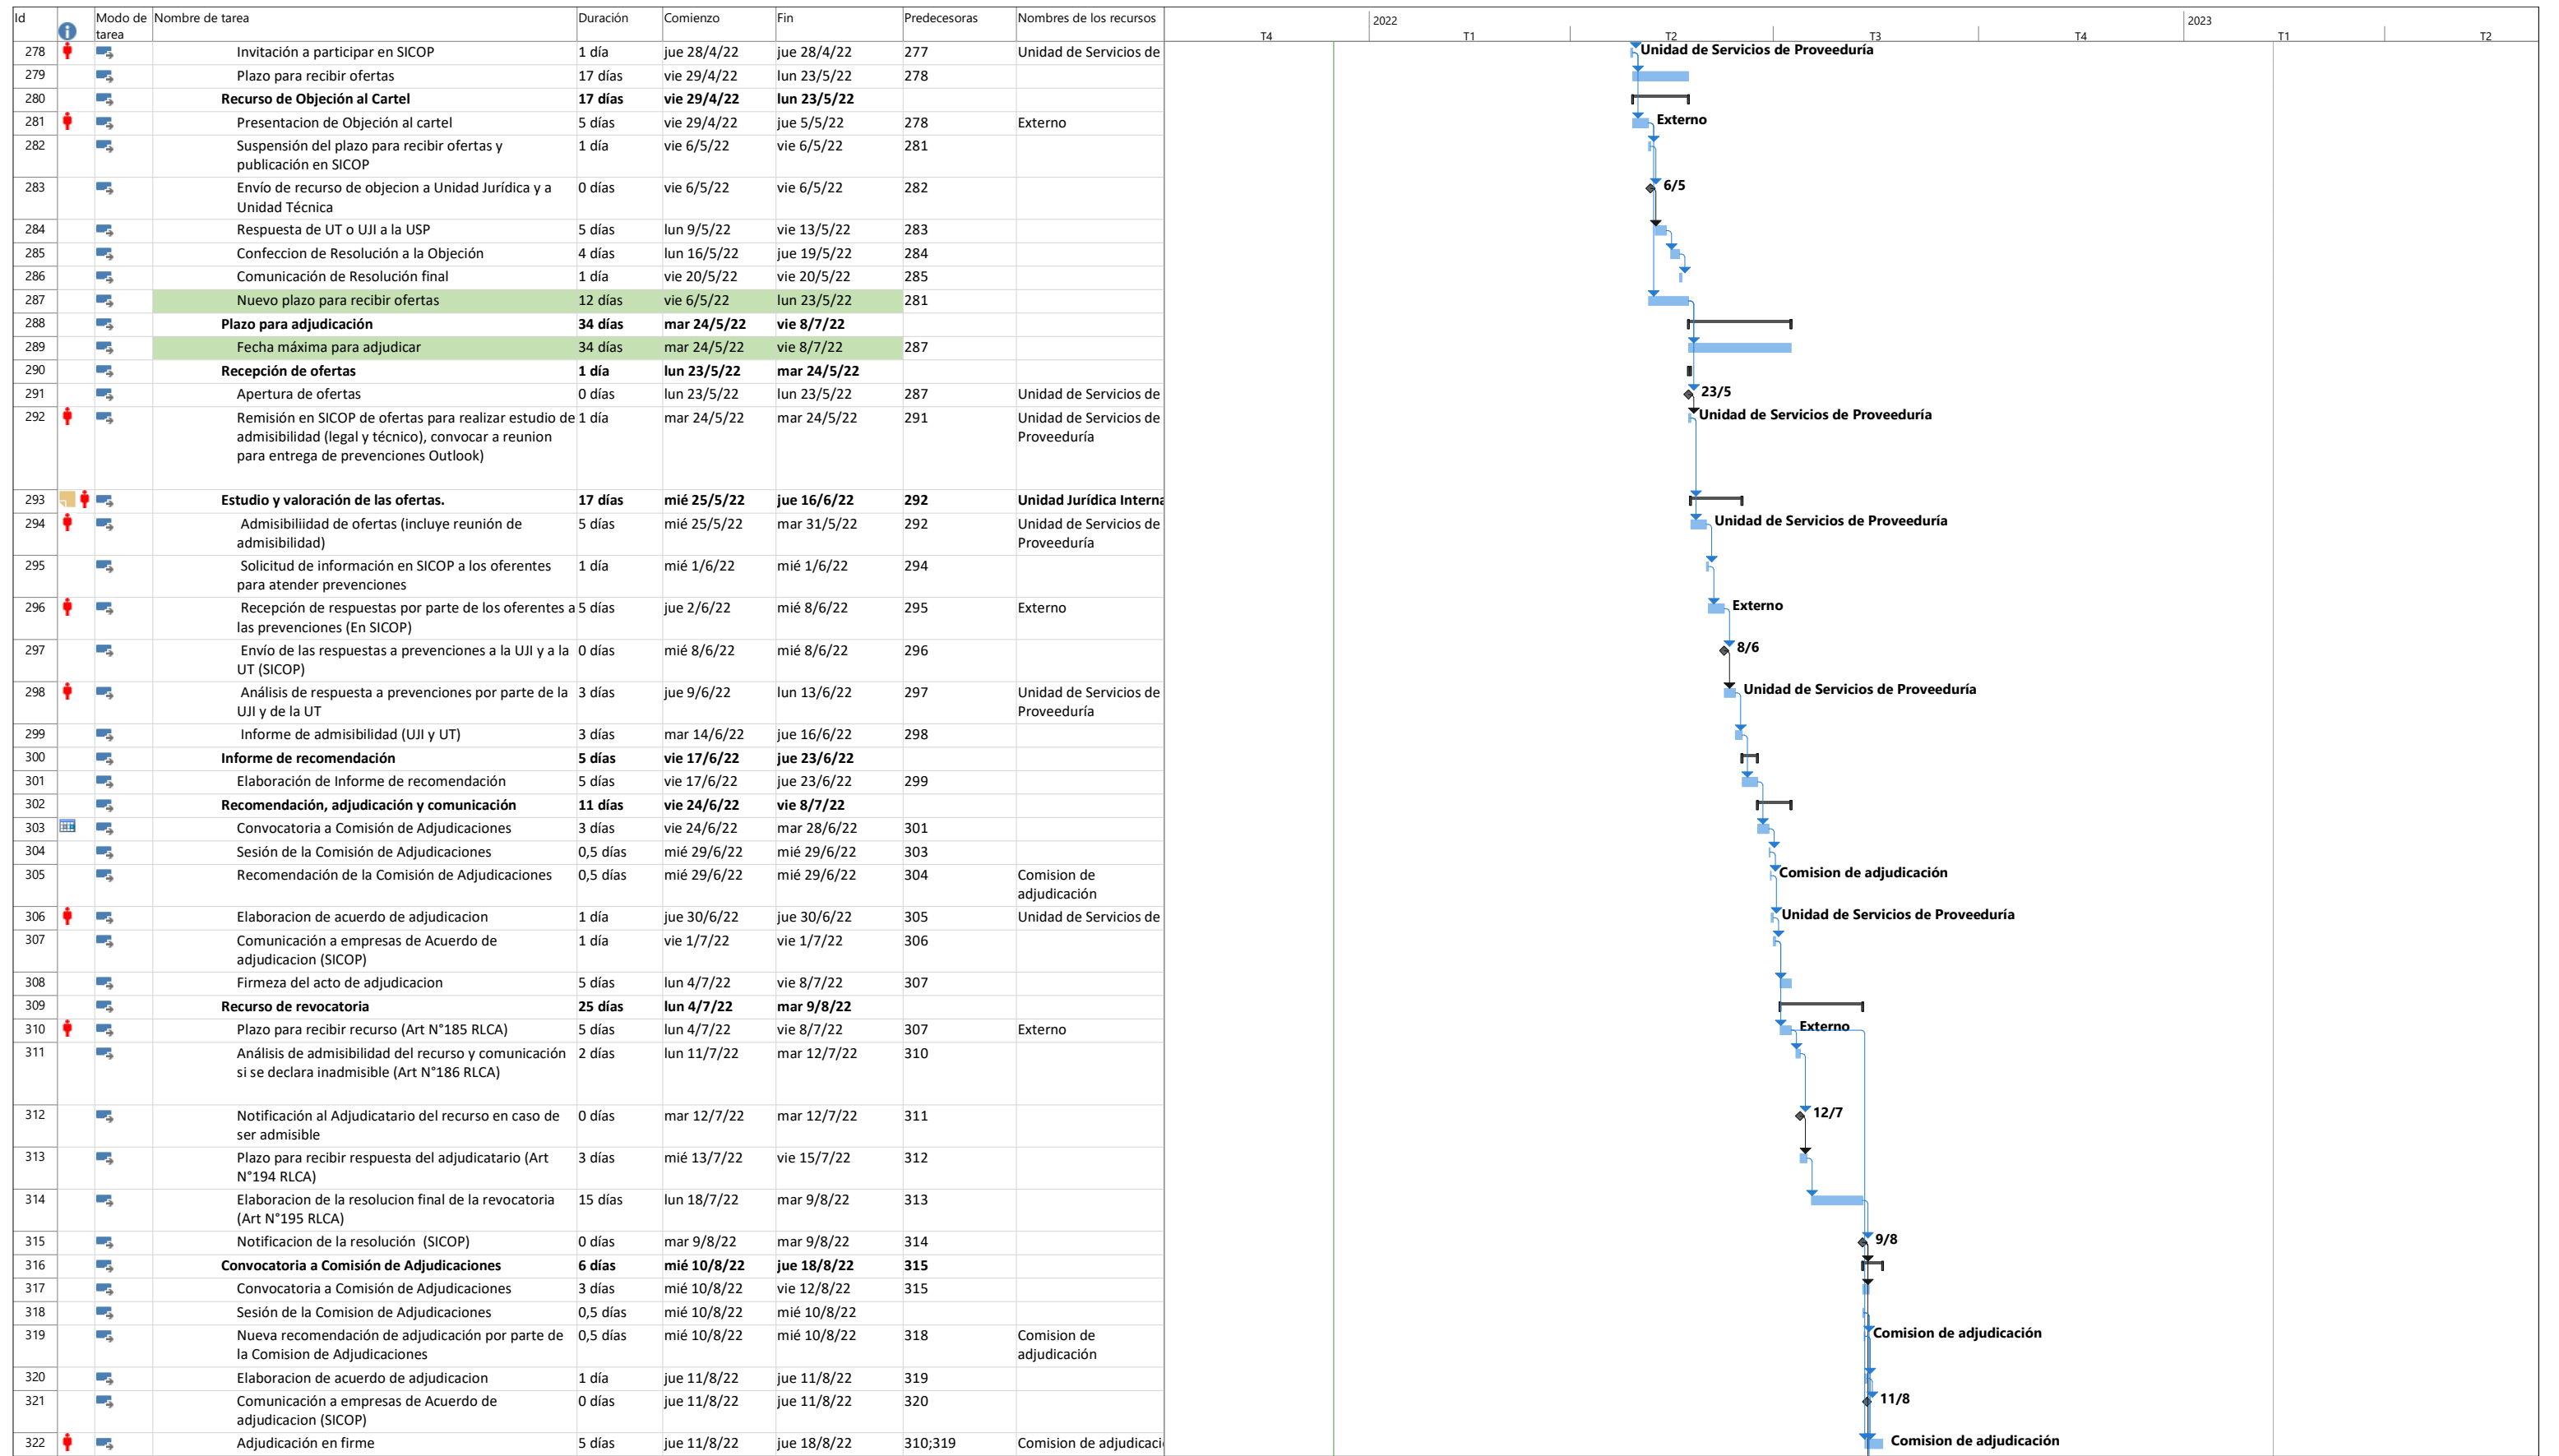

Proyecto: Cronograma de comp
Fecha: jue 16/12/21




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023	T1	T2
323		Trámite de contrato	16 días	mié 10/8/22	jue 1/9/22											
324		Elaboración del Contrato	5 días	mié 10/8/22	jue 18/8/22	318										
325		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	mié 10/8/22	mié 10/8/22	324CC										
326		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	mié 10/8/22	jue 18/8/22	325										
327		Firma de contrato oferente	1 día	mié 10/8/22	mié 10/8/22	315	Contralor General;Exte									
328		Envío de contrato para firma Gerente de División de Apoyo	0 días	mié 10/8/22	mié 10/8/22	327										
329		Firma de contrato	5 días	jue 11/8/22	jue 18/8/22	328										
330		Envío de contrato a aprobación interna	0 días	jue 18/8/22	jue 18/8/22	327;329	Unidad Jurídica Interna									
331		Aprobación Interna de Contrato	10 días	vie 19/8/22	jue 1/9/22	330										
332		Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	jue 1/9/22	jue 1/9/22	331	Unidad de Servicios de Proveeduría									
333		Trámite del Pedido	6 días	vie 2/9/22	vie 9/9/22											
334		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	vie 2/9/22	lun 5/9/22	331	Unidad de Servicios de									
335		Envío de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	lun 5/9/22	lun 5/9/22	334	Unidad de Servicios de Proveeduría									
336		Visado de pedido en la UAF	3 días	mar 6/9/22	jue 8/9/22	335										
337		Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	vie 9/9/22	vie 9/9/22	336										
338		Notificación de Pedido de Compra	0 días	vie 9/9/22	vie 9/9/22	336;337	Unidad de Servicios de									
339		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	vie 9/9/22	vie 9/9/22	338										
340		Recepción de los items	13 días	vie 2/9/22	mié 21/9/22											
341		Entrega de los bienes/servicios	10 días	vie 2/9/22	jue 15/9/22	331	Externo									
342		Recibido a satisfacción	3 días	vie 16/9/22	mié 21/9/22	341	Unidad Técnica									
343		Fin recepción de items	0 días	mié 21/9/22	mié 21/9/22	342										
344		Trámite de pago	36 días	jue 22/9/22	jue 10/11/22											
345		Envío documentos a Financiero	1 día	jue 22/9/22	jue 22/9/22	343	Unidad de Servicios de									
346		Emisión de pago en Financiero	5 días	vie 23/9/22	jue 29/9/22	345	Unidad de Administraci									
347		Pago de Tesorería Nacional	30 días	vie 30/9/22	jue 10/11/22	346										
348		Conclusión trámite licitación	0 días	jue 10/11/22	jue 10/11/22	347										
349		2022LA-00002-503; USG;Paneles solares; USG; envío de especificaciones 18/02; Contratada al 31/7/2022; €19.180.000 /2022; € 127.180.000 /4 años; años 2 y 4 €36,000.000/año; Nazira Montero - Carlos Leal	164 días	vie 18/2/22	mar 18/10/22											
350		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	vie 18/2/22	vie 18/2/22											
351		Confección Documento complementario al cartel	17 días	vie 18/2/22	lun 14/3/22		Unidad de Servicios de									
352		Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	vie 18/2/22	jue 24/2/22	350										
353		Revisión Jurídica de cartel UJI	7 días	vie 25/2/22	lun 7/3/22	352	Unidad Técnica									
354		Revisión Técnica de cartel	7 días	vie 25/2/22	lun 7/3/22	352	Unidad Jurídica Interna									
355		Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al cartel	5 días	mar 8/3/22	lun 14/3/22	354	Unidad de Servicios de Proveeduría									
356		Invitación a participar	28 días	mar 15/3/22	jue 28/4/22											
357		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	mar 15/3/22	lun 21/3/22	355										
358		Elaboración de solicitud y confección de Cartel en SICOP	5 días	mar 22/3/22	lun 28/3/22	357										
359		Invitación a participar en SICOP	1 día	mar 29/3/22	mar 29/3/22	358	Unidad de Servicios de									
360		Plazo para recibir ofertas	17 días	mié 30/3/22	jue 28/4/22	359										
361		Recurso de Objeción al Cartel	17 días	mié 30/3/22	jue 28/4/22											
362		Presentación de Objeción al cartel	5 días	mié 30/3/22	mar 5/4/22	359	Externo									
363		Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en SICOP	1 día	mié 6/4/22	mié 6/4/22	362										
364		Envío de recurso de objeción a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	0 días	mié 6/4/22	mié 6/4/22	363										
365		Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	jue 7/4/22	mié 20/4/22	364										
366		Confección de Resolución a la Objeción	4 días	jue 21/4/22	mar 26/4/22	365										
367		Comunicación de Resolución final	1 día	mié 27/4/22	mié 27/4/22	366										
368		Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	mié 6/4/22	jue 28/4/22	362										
369		Plazo para adjudicación	34 días	vie 29/4/22	mié 15/6/22											
370		Fecha máxima para adjudicar	34 días	vie 29/4/22	mié 15/6/22	368										
371		Recepción de ofertas	1 día	jue 28/4/22	vie 29/4/22											

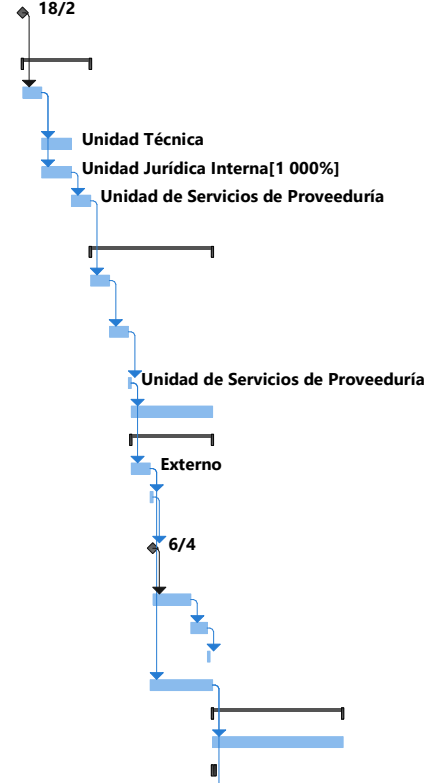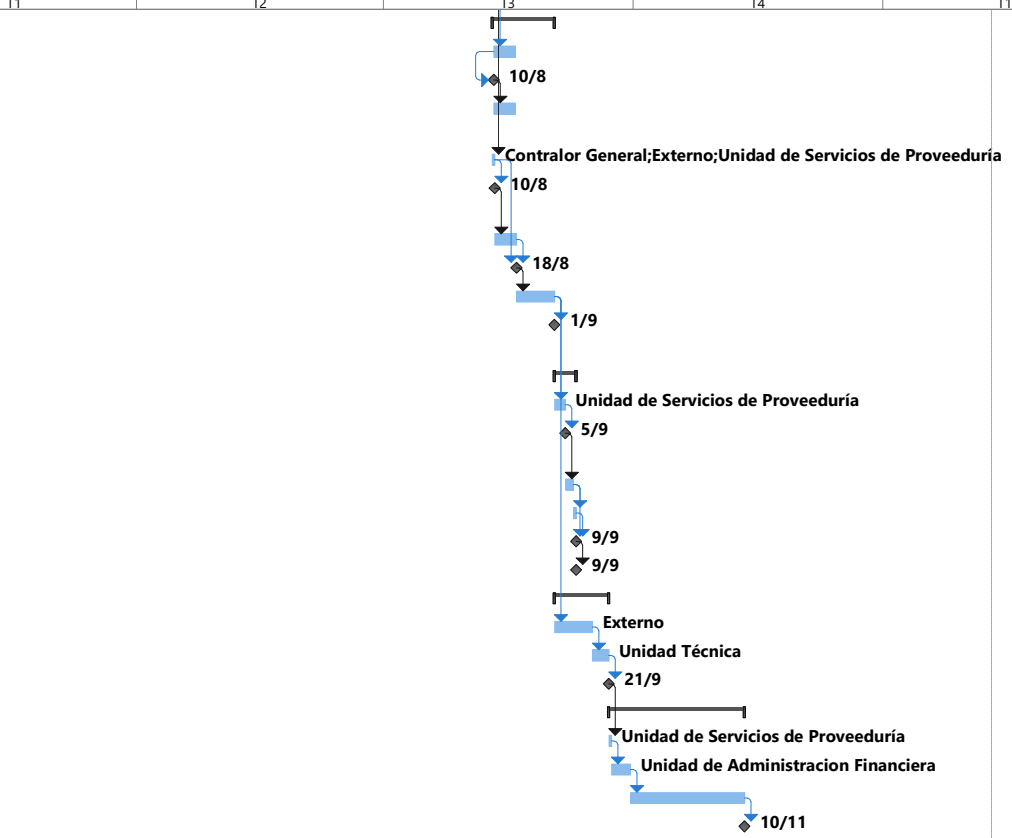

Proyecto: Cronograma de comp	Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Progreso manual
Fecha: jue 16/12/21	División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	
	Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Progreso	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023	T1	T2
372		Apertura de ofertas	0 días	jue 28/4/22	jue 28/4/22	368	Unidad de Servicios de				28/4					
373		Remisión en SICOP de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion para entrega de prevenciones Outlook)	1 día	vie 29/4/22	vie 29/4/22	372	Unidad de Servicios de Proveeduría				Unidad de Servicios de Proveeduría					
374		Estudio y valoración de las ofertas.	17 días	lun 2/5/22	mar 24/5/22	373	Unidad Jurídica Interna				Unidad de Servicios de Proveeduría					
375		Admisibilidad de ofertas (incluye reunión de admisibilidad)	5 días	lun 2/5/22	vie 6/5/22	373	Unidad de Servicios de Proveeduría				Unidad de Servicios de Proveeduría					
376		Solicitud de información en SICOP a los oferentes para atender prevenciones	1 día	lun 9/5/22	lun 9/5/22	375					Externo					
377		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En SICOP)	5 días	mar 10/5/22	lun 16/5/22	376	Externo				Externo					
378		Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (SICOP)	0 días	lun 16/5/22	lun 16/5/22	377					16/5					
379		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mar 17/5/22	jue 19/5/22	378	Unidad de Servicios de Proveeduría				Unidad de Servicios de Proveeduría					
380		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	vie 20/5/22	mar 24/5/22	379										
381		Informe de recomendación	5 días	mié 25/5/22	mar 31/5/22											
382		Elaboración de Informe de recomendación	5 días	mié 25/5/22	mar 31/5/22	380										
383		Recomendación, adjudicación y comunicación	11 días	mié 1/6/22	mié 15/6/22											
384		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mié 1/6/22	vie 3/6/22	382										
385		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	lun 6/6/22	lun 6/6/22	384										
386		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	lun 6/6/22	lun 6/6/22	385	Comision de adjudicación									
387		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mar 7/6/22	mar 7/6/22	386	Unidad de Servicios de									
388		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (SICOP)	1 día	mié 8/6/22	mié 8/6/22	387										
389		Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	jue 9/6/22	mié 15/6/22	388										
390		Recurso de revocatoria	25 días	jue 9/6/22	mié 13/7/22											
391		Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	jue 9/6/22	mié 15/6/22	388	Externo									
392		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisibile (Art N°186 RLCA)	2 días	jue 16/6/22	vie 17/6/22	391										
393		Notificación al Adjudicatario del recurso en caso de ser admisible	0 días	vie 17/6/22	vie 17/6/22	392										
394		Plazo para recibir respuesta del adjudicatario (Art N°194 RLCA)	3 días	lun 20/6/22	mié 22/6/22	393										
395		Elaboracion de la resolucio final de la revocatoria (Art N°195 RLCA)	15 días	jue 23/6/22	mié 13/7/22	394										
396		Notificacion de la resolución (SICOP)	0 días	mié 13/7/22	mié 13/7/22	395										
397		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	6 días	jue 14/7/22	jue 21/7/22	396										
398		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	jue 14/7/22	lun 18/7/22	396										
399		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	jue 14/7/22	jue 14/7/22	398										
400		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 14/7/22	jue 14/7/22	399	Comision de adjudicación									
401		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	vie 15/7/22	vie 15/7/22	400										
402		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (SICOP)	0 días	vie 15/7/22	vie 15/7/22	401										
403		Adjudicación en firme	5 días	vie 15/7/22	jue 21/7/22	391;400	Comision de adjudicaci									
404		Trámite de contrato	16 días	jue 14/7/22	lun 8/8/22											
405		Elaboración del Contrato	5 días	jue 14/7/22	jue 21/7/22	399										
406		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	jue 14/7/22	jue 14/7/22	405CC										
407		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	jue 14/7/22	jue 21/7/22	406										
408		Firma de contrato oferente	1 día	jue 14/7/22	jue 14/7/22	396	Contralor General;Exte									
409		Envío de contrato para firma Gerente de División de Apoyo	0 días	jue 14/7/22	jue 14/7/22	408										
410		Firma de contrato	5 días	vie 15/7/22	jue 21/7/22	409										
411		Envío de contrato a aprobación interna	0 días	jue 21/7/22	jue 21/7/22	408;410	Unidad Jurídica Interna									
412		Aprobacion Interna de Contrato	10 días	vie 22/7/22	lun 8/8/22	411										
413		Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	lun 8/8/22	lun 8/8/22	412	Unidad de Servicios de Proveeduría									
414		Trámite del Pedido	6 días	mar 9/8/22	mié 17/8/22											
415		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	mar 9/8/22	mié 10/8/22	412	Unidad de Servicios de									

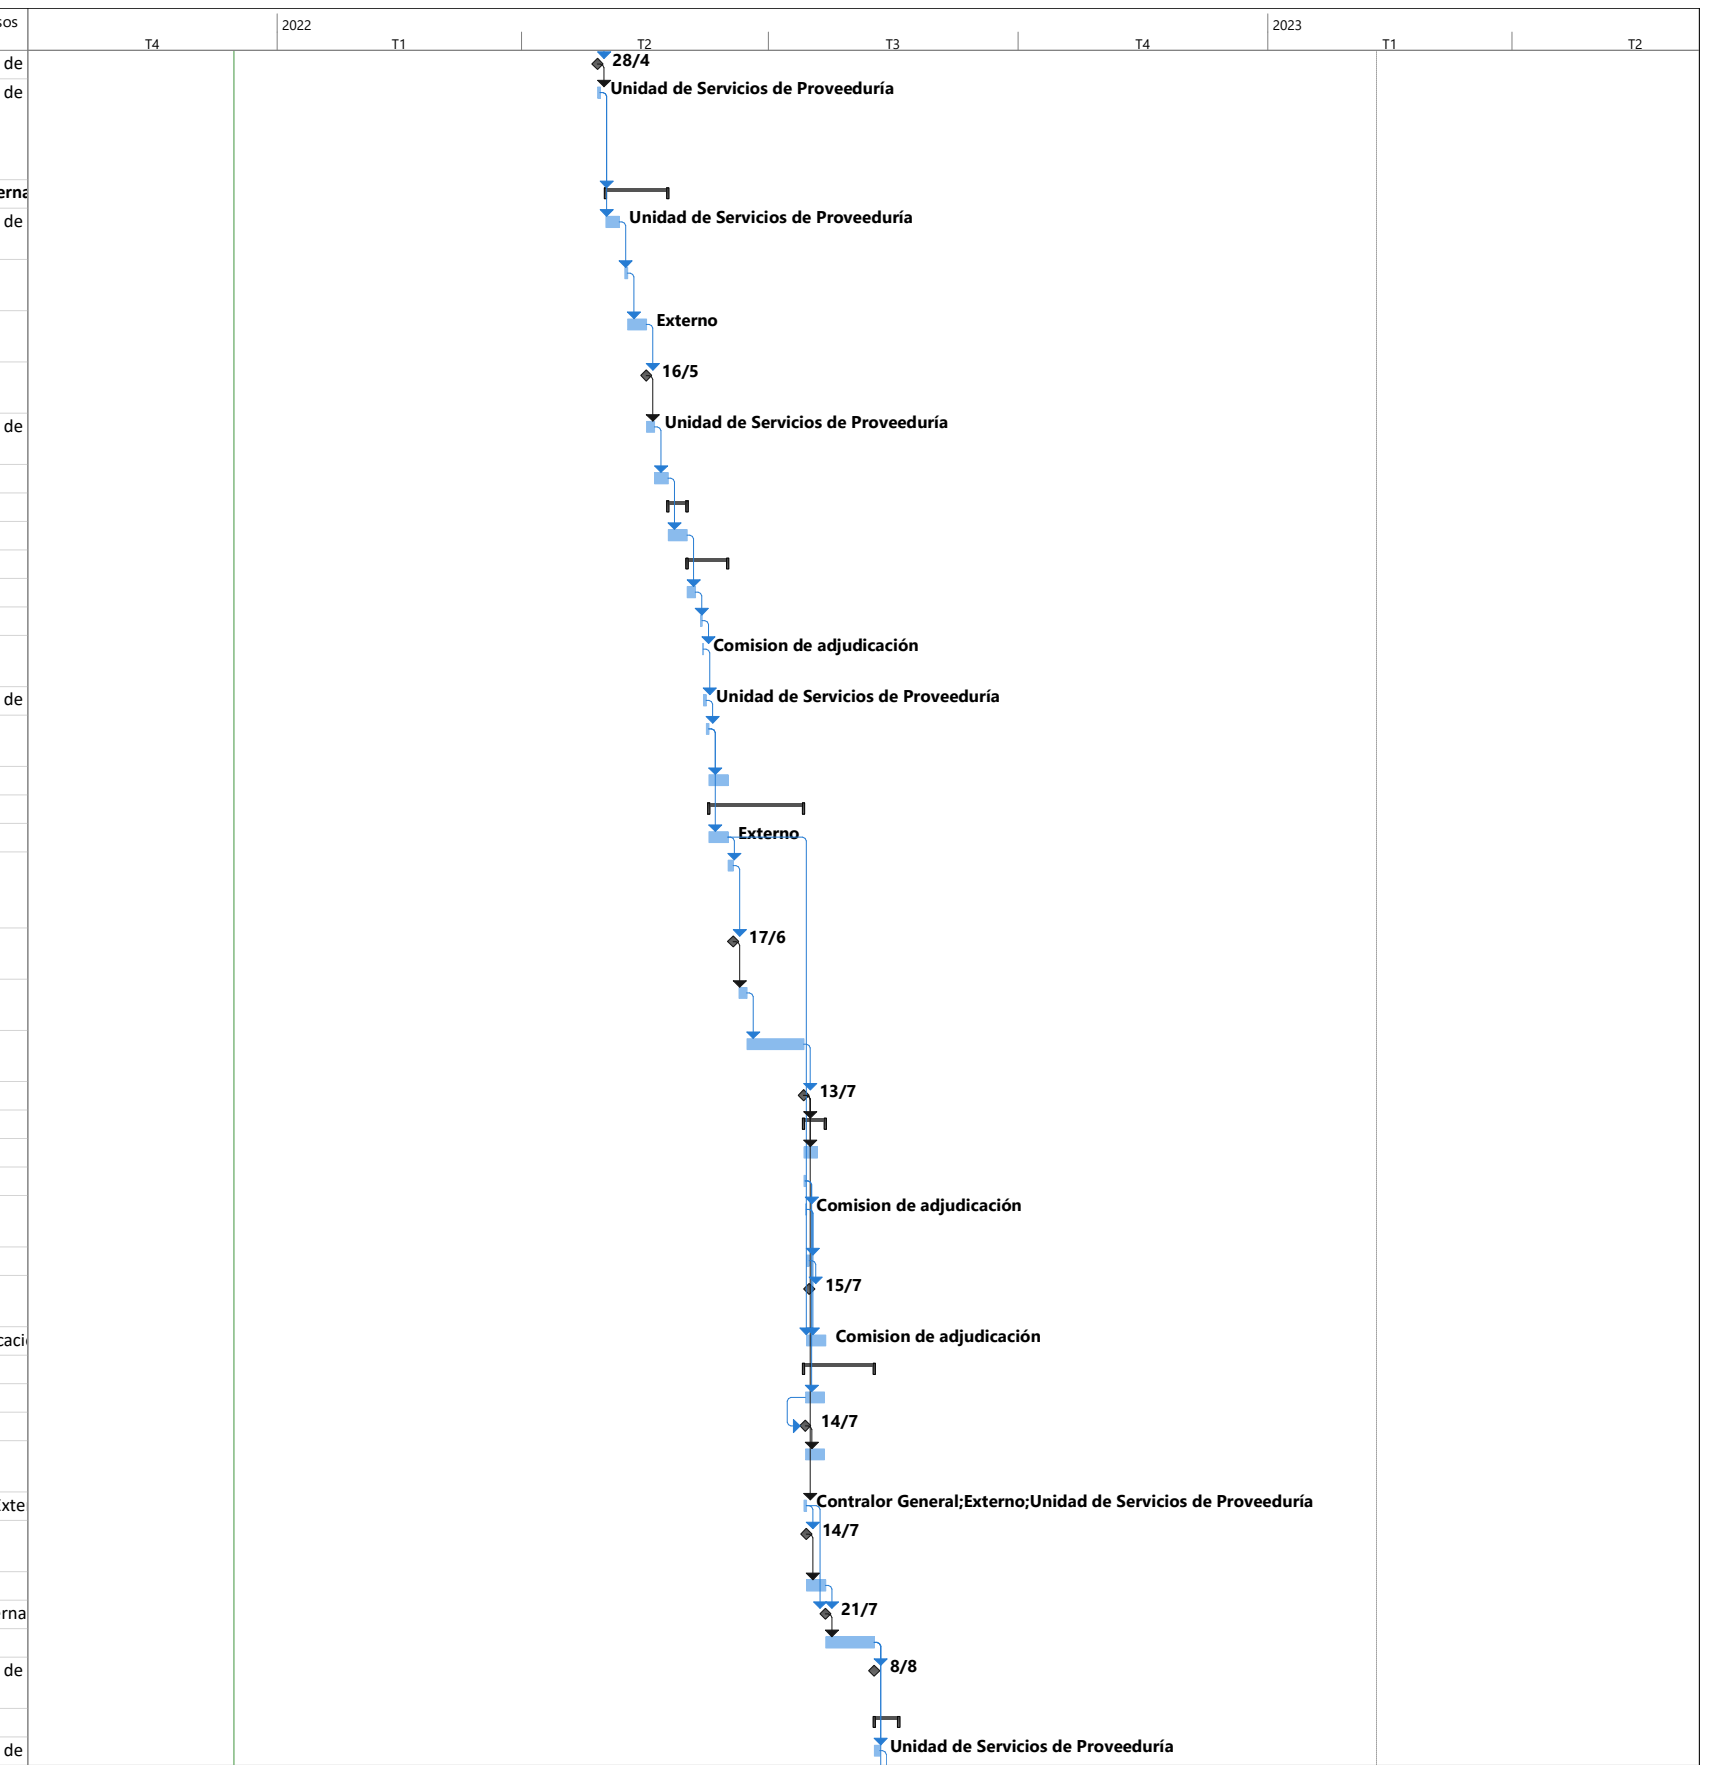

Proyecto: Cronograma de comp
Fecha: jue 16/12/21

Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		Progreso manual	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha limite			
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023	T1	T2
416		Envío de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	mié 10/8/22	mié 10/8/22	415	Unidad de Servicios de Proveeduría					10/8				
417		Visado de pedido en la UAF	3 días	jue 11/8/22	mar 16/8/22	416										
418		Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	mié 17/8/22	mié 17/8/22	417										
419		Notificación de Pedido de Compra	0 días	mié 17/8/22	mié 17/8/22	417,418	Unidad de Servicios de									
420		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mié 17/8/22	mié 17/8/22	419										
421		Recepción de los items	13 días	mar 9/8/22	vie 26/8/22											
422		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 9/8/22	mar 23/8/22	412	Externo									
423		Recibido a satisfacción	3 días	mié 24/8/22	vie 26/8/22	422	Unidad Técnica									
424		Fin recepción de items	0 días	vie 26/8/22	vie 26/8/22	423										
425		Trámite de pago	36 días	lun 29/8/22	mar 18/10/22											
426		Envío documentos a Financiero	1 día	lun 29/8/22	lun 29/8/22	424	Unidad de Servicios de									
427		Emisión de pago en Financiero	5 días	mar 30/8/22	lun 5/9/22	426	Unidad de Administrac									
428		Pago de Tesorería Nacional	30 días	mar 6/9/22	mar 18/10/22	427										
429		Conclusión trámite licitación	0 días	mar 18/10/22	mar 18/10/22	428										
430		2022LA-00003-503; USG; Mejoras en el sistema eléctrico de la CGR; Envían especificaciones 25/3/2022; \$15.000.000 /2022; Silvia Castro - Yeimy Mora	164 días	vie 25/3/22	mar 22/11/22											
431		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	vie 25/3/22	vie 25/3/22											
432		Confección Documento complementario al cartel	17 días	vie 25/3/22	lun 25/4/22		Unidad de Servicios de									
433		Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	vie 25/3/22	jue 31/3/22	431										
434		Revisión Jurídica de cartel UJI	7 días	vie 1/4/22	lun 18/4/22	433	Unidad Técnica									
435		Revisión Técnica de cartel	7 días	vie 1/4/22	lun 18/4/22	433	Unidad Jurídica Interna									
436		Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al cartel	5 días	mar 19/4/22	lun 25/4/22	435	Unidad de Servicios de Proveeduría									
437		Invitación a participar	28 días	mar 26/4/22	jue 2/6/22											
438		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	mar 26/4/22	lun 2/5/22	436										
439		Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en SICOP	5 días	mar 3/5/22	lun 9/5/22	438										
440		Invitación a participar en SICOP	1 día	mar 10/5/22	mar 10/5/22	439	Unidad de Servicios de									
441		Plazo para recibir ofertas	17 días	mié 11/5/22	jue 2/6/22	440										
442		Recurso de Objeción al Cartel	17 días	mié 11/5/22	jue 2/6/22											
443		Presentación de Objeción al cartel	5 días	mié 11/5/22	mar 17/5/22	440	Externo									
444		Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en SICOP	1 día	mié 18/5/22	mié 18/5/22	443										
445		Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	0 días	mié 18/5/22	mié 18/5/22	444										
446		Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	jue 19/5/22	mié 25/5/22	445										
447		Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	jue 26/5/22	mar 31/5/22	446										
448		Comunicación de Resolución final	1 día	mié 1/6/22	mié 1/6/22	447										
449		Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	mié 18/5/22	jue 2/6/22	443										
450		Plazo para adjudicación	34 días	vie 3/6/22	mié 20/7/22											
451		Fecha máxima para adjudicar	34 días	vie 3/6/22	mié 20/7/22	449										
452		Recepción de ofertas	1 día	jue 2/6/22	vie 3/6/22											
453		Apertura de ofertas	0 días	jue 2/6/22	jue 2/6/22	449	Unidad de Servicios de									
454		Remisión en SICOP de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion para entrega de prevenciones Outlook)	1 día	vie 3/6/22	vie 3/6/22	453	Unidad de Servicios de Proveeduría									
455		Estudio y valoración de las ofertas.	17 días	lun 6/6/22	mar 28/6/22	454	Unidad Jurídica Interna									
456		Admisibilidad de ofertas (incluye reunión de admisibilidad)	5 días	lun 6/6/22	vie 10/6/22	454	Unidad de Servicios de Proveeduría									
457		Solicitud de información en SICOP a los oferentes para atender prevenciones	1 día	lun 13/6/22	lun 13/6/22	456										
458		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En SICOP)	5 días	mar 14/6/22	lun 20/6/22	457	Externo									
459		Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (SICOP)	0 días	lun 20/6/22	lun 20/6/22	458										
460		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mar 21/6/22	jue 23/6/22	459	Unidad de Servicios de Proveeduría									

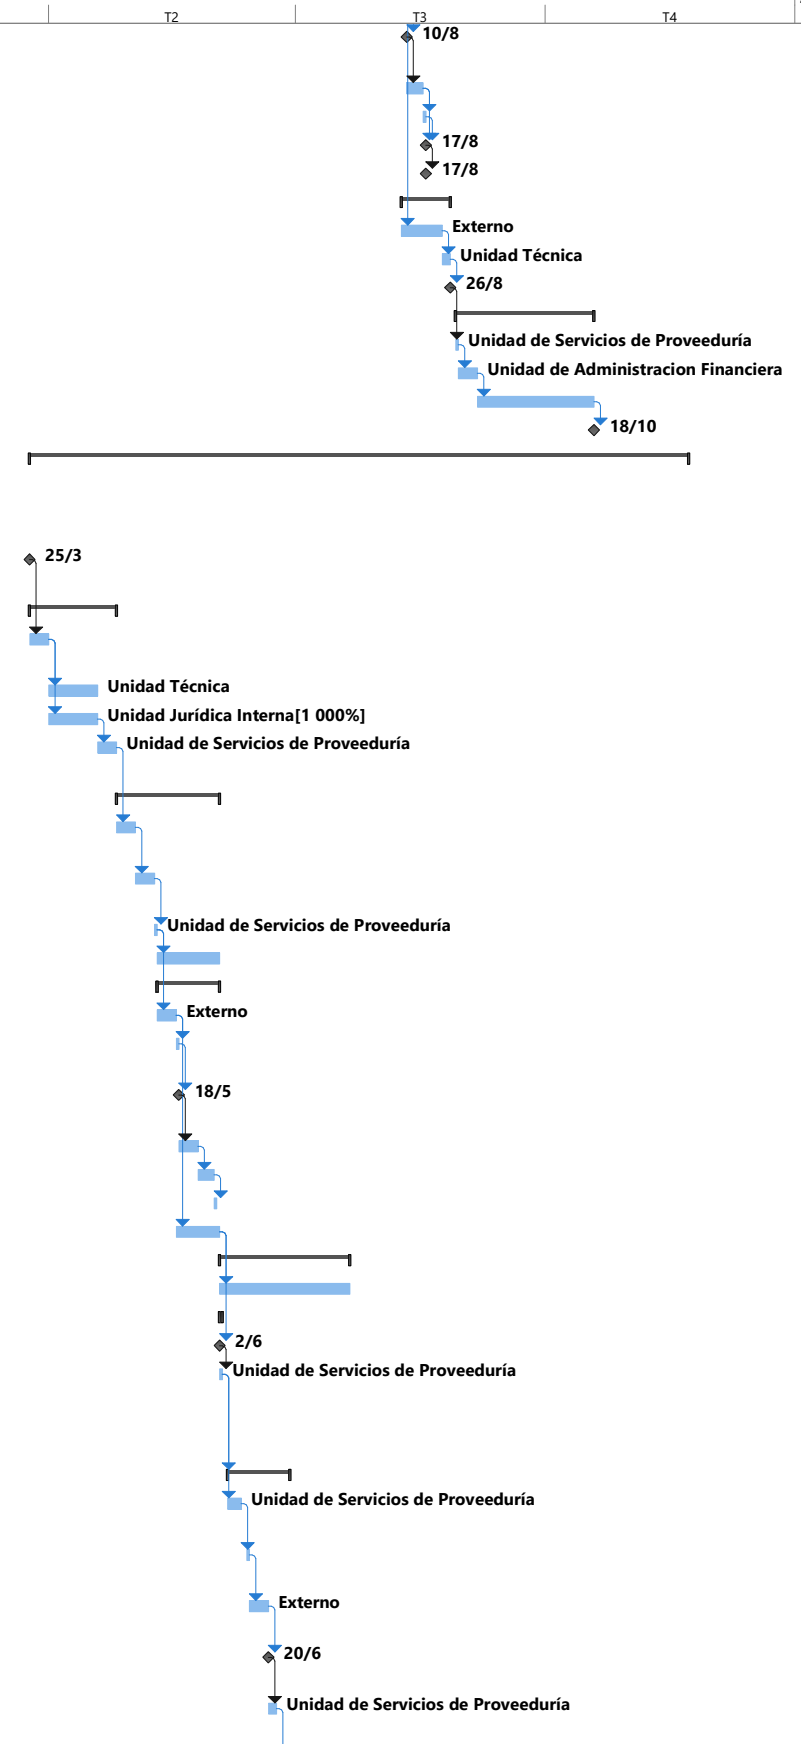

Proyecto: Cronograma de comp
Fecha: jue 16/12/21

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Progreso manual
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Progreso	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023	T1	T2
461		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	vie 24/6/22	mar 28/6/22	460										
462		Informe de recomendación	5 días	mié 29/6/22	mar 5/7/22											
463		Elaboración de Informe de recomendación	5 días	mié 29/6/22	mar 5/7/22	461										
464		Recomendación, adjudicación y comunicación	11 días	mié 6/7/22	mié 20/7/22											
465		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mié 6/7/22	vie 8/7/22	463										
466		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	lun 11/7/22	lun 11/7/22	465										
467		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	lun 11/7/22	lun 11/7/22	466	Comision de adjudicación									
468		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mar 12/7/22	mar 12/7/22	467	Unidad de Servicios de									
469		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (SICOP)	1 día	mié 13/7/22	mié 13/7/22	468										
470		Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	jue 14/7/22	mié 20/7/22	469										
471		Recurso de revocatoria	25 días	jue 14/7/22	lun 22/8/22											
472		Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	jue 14/7/22	mié 20/7/22	469	Externo									
473		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisibile (Art N°186 RLCA)	2 días	jue 21/7/22	vie 22/7/22	472										
474		Notificación al Adjudicatario del recurso en caso de ser admisible	0 días	vie 22/7/22	vie 22/7/22	473										
475		Plazo para recibir respuesta del adjudicatario (Art N°194 RLCA)	3 días	mar 26/7/22	jue 28/7/22	474										
476		Elaboracion de la resolucio final de la revocatoria (Art N°195 RLCA)	15 días	vie 29/7/22	lun 22/8/22	475										
477		Notificacion de la resolucio (SICOP)	0 días	lun 22/8/22	lun 22/8/22	476										
478		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	6 días	mar 23/8/22	mar 30/8/22	477										
479		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mar 23/8/22	jue 25/8/22	477										
480		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mar 23/8/22	mar 23/8/22	480										
481		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mar 23/8/22	mar 23/8/22	480	Comision de adjudicación									
482		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mié 24/8/22	mié 24/8/22	481										
483		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (SICOP)	0 días	mié 24/8/22	mié 24/8/22	482										
484		Adjudicación en firme	5 días	mié 24/8/22	mar 30/8/22	472;481	Comision de adjudicaci									
485		Trámite de contrato	16 días	mar 23/8/22	mar 13/9/22											
486		Elaboración del Contrato	5 días	mar 23/8/22	mar 30/8/22	480										
487		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	mar 23/8/22	mar 23/8/22	486CC										
488		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	mar 23/8/22	mar 30/8/22	487										
489		Firma de contrato oferente	1 día	mar 23/8/22	mar 23/8/22	477	Contralor General;Exte									
490		Envío de contrato para firma Gerente de División de Apoyo	0 días	mar 23/8/22	mar 23/8/22	489										
491		Firma de contrato	5 días	mié 24/8/22	mar 30/8/22	490										
492		Envío de contrato a aprobación interna	0 días	mar 30/8/22	mar 30/8/22	489;491	Unidad Jurídica Interna									
493		Aprobacion Interna de Contrato	10 días	mié 31/8/22	mar 13/9/22	492										
494		Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	mar 13/9/22	mar 13/9/22	493	Unidad de Servicios de Proveeduría									
495		Trámite del Pedido	6 días	mié 14/9/22	jue 22/9/22											
496		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	mié 14/9/22	jue 15/9/22	493	Unidad de Servicios de									
497		Envío de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	jue 15/9/22	jue 15/9/22	496	Unidad de Servicios de Proveeduría									
498		Visado de pedido en la UAF	3 días	vie 16/9/22	mié 21/9/22	497										
499		Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	jue 22/9/22	jue 22/9/22	498										
500		Notificación de Pedido de Compra	0 días	jue 22/9/22	jue 22/9/22	498;499	Unidad de Servicios de									
501		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	jue 22/9/22	jue 22/9/22	500										
502		Recepción de los items	13 días	mié 14/9/22	lun 3/10/22											
503		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mié 14/9/22	mié 28/9/22	493	Externo									
504		Recibido a satisfacción	3 días	jue 29/9/22	lun 3/10/22	503	Unidad Técnica									
505		Fin recepción de items	0 días	lun 3/10/22	lun 3/10/22	504										
506		Trámite de pago	36 días	mar 4/10/22	mar 22/11/22											
507		Envío documentos a Financiero	1 día	mar 4/10/22	mar 4/10/22	505	Unidad de Servicios de									
508		Emisión de pago en Financiero	5 días	mié 5/10/22	mar 11/10/22	507	Unidad de Administraci									
509		Pago de Tesorería Nacional	30 días	mié 12/10/22	mar 22/11/22	508										
510		Conclusión trámite licitación	0 días	mar 22/11/22	mar 22/11/22	509										

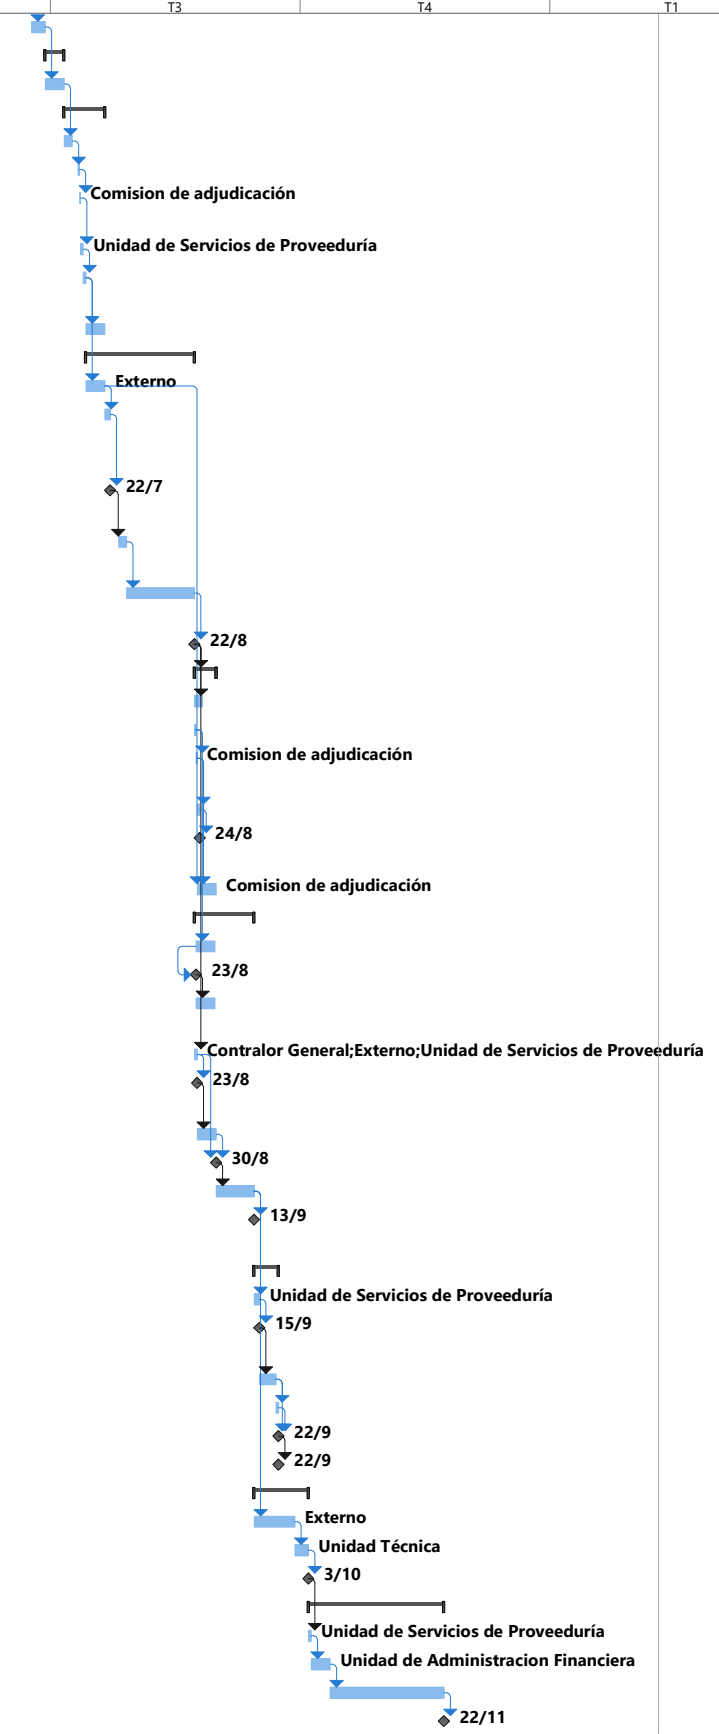

Proyecto: Cronograma de comp
Fecha: jue 16/12/21

Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		Progreso manual	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha limite			
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023	T1	T2
511		2022LA-00004-503; USG; Mejoras al sistema contra incendios; Envío de especificaciones 28/02; Contratado al 30/08/2022; €10.000.000 / 2022; €10.000.000 2023 y €10.000.000/2024; Eneyda Flores - Gabriela Solano	164 días	lun 28/2/22	mié 26/10/22											
512		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	lun 28/2/22	lun 28/2/22											
513		Confección Documento complementario al cartel	17 días	lun 28/2/22	mar 22/3/22		Unidad de Servicios de									
514		Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 28/2/22	vie 4/3/22	512										
515		Revisión Jurídica de cartel UJI	7 días	lun 7/3/22	mar 15/3/22	514	Unidad Técnica									
516		Revisión Técnica de cartel	7 días	lun 7/3/22	mar 15/3/22	514	Unidad Jurídica Interna									
517		Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al cartel	5 días	mié 16/3/22	mar 22/3/22	516	Unidad de Servicios de Proveeduría									
518		Invitación a participar	28 días	mié 23/3/22	vie 6/5/22											
519		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	mié 23/3/22	mar 29/3/22	517										
520		Elaboración de solicitud y confección de Cartel en SICOP	5 días	mié 30/3/22	mar 5/4/22	519										
521		Invitación a participar en SICOP	1 día	mié 6/4/22	mié 6/4/22	520	Unidad de Servicios de									
522		Plazo para recibir ofertas	17 días	jue 7/4/22	vie 6/5/22	521										
523		Recurso de Objeción al Cartel	17 días	jue 7/4/22	vie 6/5/22											
524		Presentación de Objeción al cartel	5 días	jue 7/4/22	mié 20/4/22	521	Externo									
525		Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en SICOP	1 día	jue 21/4/22	jue 21/4/22	524										
526		Envío de recurso de objeción a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	0 días	jue 21/4/22	jue 21/4/22	525										
527		Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	vie 22/4/22	jue 28/4/22	526										
528		Confección de Resolución a la Objeción	4 días	vie 29/4/22	mié 4/5/22	527										
529		Comunicación de Resolución final	1 día	jue 5/5/22	jue 5/5/22	528										
530		Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	jue 21/4/22	vie 6/5/22	524										
531		Plazo para adjudicación	34 días	lun 9/5/22	jue 23/6/22											
532		Fecha máxima para adjudicar	34 días	lun 9/5/22	jue 23/6/22	530										
533		Recepción de ofertas	1 día	vie 6/5/22	lun 9/5/22											
534		Apertura de ofertas	0 días	vie 6/5/22	vie 6/5/22	530	Unidad de Servicios de									
535		Remisión en SICOP de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion para entrega de prevenciones Outlook)	1 día	lun 9/5/22	lun 9/5/22	534	Unidad de Servicios de Proveeduría									
536		Estudio y valoración de las ofertas.	17 días	mar 10/5/22	mié 1/6/22	535	Unidad Jurídica Interna									
537		Admisibilidad de ofertas (incluye reunión de admisibilidad)	5 días	mar 10/5/22	lun 16/5/22	535	Unidad de Servicios de Proveeduría									
538		Solicitud de información en SICOP a los oferentes para atender prevenciones	1 día	mar 17/5/22	mar 17/5/22	537										
539		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En SICOP)	5 días	mié 18/5/22	mar 24/5/22	538	Externo									
540		Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (SICOP)	0 días	mar 24/5/22	mar 24/5/22	539										
541		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mié 25/5/22	vie 27/5/22	540	Unidad de Servicios de Proveeduría									
542		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	lun 30/5/22	mié 1/6/22	541										
543		Informe de recomendación	5 días	jue 2/6/22	mié 8/6/22											
544		Elaboración de Informe de recomendación	5 días	jue 2/6/22	mié 8/6/22	542										
545		Recomendación, adjudicación y comunicación	11 días	jue 9/6/22	jue 23/6/22											
546		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	jue 9/6/22	lun 13/6/22	544										
547		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mar 14/6/22	mar 14/6/22	546										
548		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mar 14/6/22	mar 14/6/22	547	Comision de adjudicación									
549		Elaboración de acuerdo de adjudicación	1 día	mié 15/6/22	mié 15/6/22	548	Unidad de Servicios de									
550		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicación (SICOP)	1 día	jue 16/6/22	jue 16/6/22	549										
551		Firma del acto de adjudicación	5 días	vie 17/6/22	jue 23/6/22	550										
552		Recurso de revocatoria	25 días	vie 17/6/22	jue 21/7/22											
553		Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	vie 17/6/22	jue 23/6/22	550	Externo									

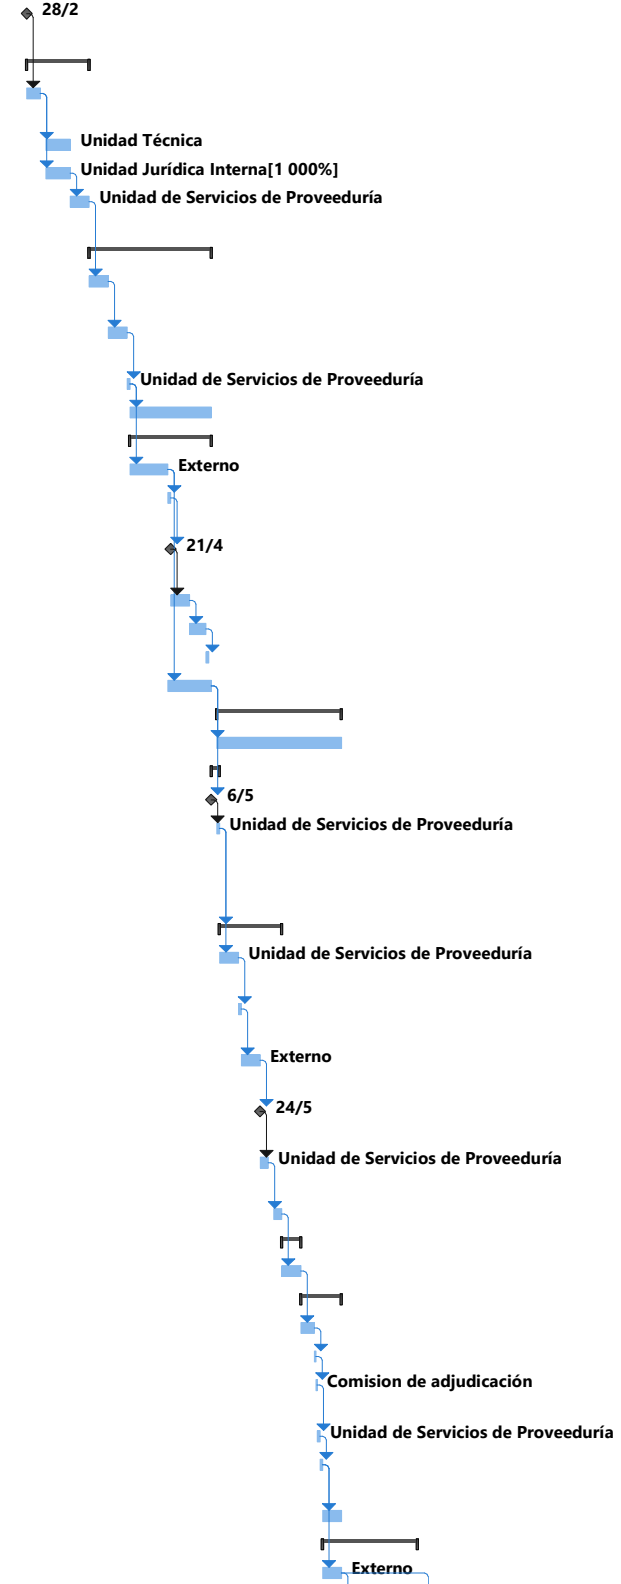


Proyecto: Cronograma de comp
Fecha: jue 16/12/21


Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		Progreso manual	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha límite		Progreso	
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023	T1	T2
554		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisibile (Art N°186 RLCA)	2 días	vie 24/6/22	lun 27/6/22	553										
555		Notificación al Adjudicatario del recurso en caso de ser admisible	0 días	lun 27/6/22	lun 27/6/22	554										
556		Plazo para recibir respuesta del adjudicatario (Art N°194 RLCA)	3 días	mar 28/6/22	jue 30/6/22	555										
557		Elaboracion de la resolucio final de la revocatoria (Art N°195 RLCA)	15 días	vie 1/7/22	jue 21/7/22	556										
558		Notificacio de la resolucio (SICOP)	0 días	jue 21/7/22	jue 21/7/22	557										
559		Convocatoria a Comisi3n de Adjudicaciones	6 días	vie 22/7/22	lun 1/8/22	558										
560		Convocatoria a Comisi3n de Adjudicaciones	3 días	vie 22/7/22	mi3 27/7/22	558										
561		Sesi3n de la Comisi3n de Adjudicaciones	0,5 días	vie 22/7/22	vie 22/7/22											
562		Nueva recomendaci3n de adjudicaci3n por parte de la Comisi3n de Adjudicaciones	0,5 días	vie 22/7/22	vie 22/7/22	561	Comisi3n de adjudicaci3n									
563		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mar 26/7/22	mar 26/7/22	562										
564		Comunicaci3n a empresas de Acuerdo de adjudicaci3n (SICOP)	0 días	mar 26/7/22	mar 26/7/22	563										
565		Adjudicaci3n en firme	5 días	mar 26/7/22	lun 1/8/22	553;562	Comisi3n de adjudicaci3n									
566		Trámite de contrato	16 días	vie 22/7/22	mi3 17/8/22											
567		Elaboraci3n del Contrato	5 días	vie 22/7/22	lun 1/8/22	561										
568		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	vie 22/7/22	vie 22/7/22	567CC										
569		Presentaci3n de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	vie 22/7/22	lun 1/8/22	568										
570		Firma de contrato oferente	1 día	vie 22/7/22	vie 22/7/22	558	Contralor General;Exte									
571		Envío de contrato para firma Gerente de Divisi3n de Apoyo	0 días	vie 22/7/22	vie 22/7/22	570										
572		Firma de contrato	5 días	mar 26/7/22	lun 1/8/22	571										
573		Envío de contrato a aprobaci3n interna	0 días	lun 1/8/22	lun 1/8/22	570;572	Unidad Jurídic									
574		Aprobacion Interna de Contrato	10 días	mi3 3/8/22	mi3 17/8/22	573										
575		Comunicaci3n a empresa de aprobaci3n del contrato y orden de inicio	0 días	mi3 17/8/22	mi3 17/8/22	574	Unidad de Servicios de Proveeduría									
576		Trámite del Pedido	6 días	jue 18/8/22	jue 25/8/22											
577		Elaboraci3n del borrador del pedido de Compra	2 días	jue 18/8/22	vie 19/8/22	574	Unidad de Servicios de									
578		Envío de borrador de pedido a Financiero para aprobaci3n	0 días	vie 19/8/22	vie 19/8/22	577	Unidad de Servicios de Proveeduría									
579		Visado de pedido en la UAF	3 días	lun 22/8/22	mi3 24/8/22	578										
580		Devoluci3n de pedido a Proveeduría	1 día	jue 25/8/22	jue 25/8/22	579										
581		Notificaci3n de Pedido de Compra	0 días	jue 25/8/22	jue 25/8/22	579;580	Unidad de Servicios de									
582		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	jue 25/8/22	jue 25/8/22	581										
583		Recepci3n de los items	13 días	jue 18/8/22	lun 5/9/22											
584		Entrega de los bienes/servicios	10 días	jue 18/8/22	mi3 31/8/22	574	Externo									
585		Recibido a satisfacci3n	3 días	jue 1/9/22	lun 5/9/22	584	Unidad Técnica									
586		Fin recepci3n de items	0 días	lun 5/9/22	lun 5/9/22	585										
587		Trámite de pago	36 días	mar 6/9/22	mi3 26/10/22											
588		Envío documentos a Financiero	1 día	mar 6/9/22	mar 6/9/22	586	Unidad de Servicios de									
589		Emisi3n de pago a Financiero	5 días	mi3 7/9/22	mar 13/9/22	588	Unidad de Administraci3n									
590		Pago de Tesorería Nacional	30 días	mi3 14/9/22	mi3 26/10/22	589										
591		Conclusi3n trámite licitaci3n	0 días	mi3 26/10/22	mi3 26/10/22	590										
592		UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACI3N (UTI)	331 días	mi3 22/9/21	jue 9/2/23											
593		2022LA-00005-503; UTI; Computador para la plataforma Synergy y Discos de almacenamiento (Segun demanda); envian especificaciones 15/3/2022; € 51.543.000,00/2022; Eneyda Flores - Ingrid Noguera	164 días	mar 15/3/22	jue 10/11/22											
594		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	mar 15/3/22	mar 15/3/22											
595		Confecci3n Documento complementario al cartel	17 días	mar 15/3/22	mi3 6/4/22											
596		Elaboraci3n de documento complementario al Cartel	5 días	mar 15/3/22	lun 21/3/22	594										
597		Revisi3n Jurídica de cartel UJI	7 días	mar 22/3/22	mi3 30/3/22	596	Unidad Técnica									
598		Revisi3n Técnica de cartel	7 días	mar 22/3/22	mi3 30/3/22	596	Unidad Jurídica Interna									
599		Incorporaci3n de ajustes y confecci3n de documento complementario al cartel	5 días	jue 31/3/22	mi3 6/4/22	598	Unidad de Servicios de Proveeduría									

Proyecto: Cronograma de comp
Fecha: jue 16/12/21



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023	T1	T2
600		Invitación a participar	28 días	jue 7/4/22	lun 23/5/22											
601		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	jue 7/4/22	mié 20/4/22	599										
602		Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en SICOP	5 días	jue 21/4/22	mié 27/4/22	601										
603		Invitación a participar en SICOP	1 día	jue 28/4/22	jue 28/4/22	602	Unidad de Servicios de									
604		Plazo para recibir ofertas	17 días	vie 29/4/22	lun 23/5/22	603										
605		Recurso de Objeción al Cartel	17 días	vie 29/4/22	lun 23/5/22											
606		Presentacion de Objeción al cartel	5 días	vie 29/4/22	jue 5/5/22	603	Externo									
607		Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en SICOP	1 día	vie 6/5/22	vie 6/5/22	606										
608		Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	0 días	vie 6/5/22	vie 6/5/22	607										
609		Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	lun 9/5/22	vie 13/5/22	608										
610		Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	lun 16/5/22	jue 19/5/22	609										
611		Comunicación de Resolución final	1 día	vie 20/5/22	vie 20/5/22	610										
612		Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	vie 6/5/22	lun 23/5/22	606										
613		Plazo para adjudicación	34 días	mar 24/5/22	vie 8/7/22											
614		Fecha máxima para adjudicar	34 días	mar 24/5/22	vie 8/7/22	612										
615		Recepción de ofertas	1 día	lun 23/5/22	mar 24/5/22											
616		Apertura de ofertas	0 días	lun 23/5/22	lun 23/5/22	612	Unidad de Servicios de									
617		Remisión en SICOP de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion para entrega de prevenciones Outlook)	1 día	mar 24/5/22	mar 24/5/22	616	Unidad de Servicios de Proveeduría									
618		Estudio y valoración de las ofertas.	17 días	mié 25/5/22	jue 16/6/22	617	Unidad Jurídica Interna									
619		Admisibilidad de ofertas (incluye reunión de admisibilidad)	5 días	mié 25/5/22	mar 31/5/22	617	Unidad de Servicios de Proveeduría									
620		Solicitud de información en SICOP a los oferentes para atender prevenciones	1 día	mié 1/6/22	mié 1/6/22	619										
621		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En SICOP)	5 días	jue 2/6/22	mié 8/6/22	620	Externo									
622		Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (SICOP)	0 días	mié 8/6/22	mié 8/6/22	621										
623		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	jue 9/6/22	lun 13/6/22	622	Unidad de Servicios de Proveeduría									
624		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	mar 14/6/22	jue 16/6/22	623										
625		Informe de recomendación	5 días	vie 17/6/22	jue 23/6/22											
626		Elaboración de Informe de recomendación	5 días	vie 17/6/22	jue 23/6/22	624										
627		Recomendación, adjudicación y comunicación	11 días	vie 24/6/22	vie 8/7/22											
628		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	vie 24/6/22	mar 28/6/22	626										
629		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 29/6/22	mié 29/6/22	628										
630		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 29/6/22	mié 29/6/22	629	Comision de adjudicación									
631		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	jue 30/6/22	jue 30/6/22	630	Unidad de Servicios de									
632		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicación (SICOP)	1 día	vie 1/7/22	vie 1/7/22	631										
633		Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	lun 4/7/22	vie 8/7/22	632										
634		Recurso de revocatoria	25 días	lun 4/7/22	mar 9/8/22											
635		Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	lun 4/7/22	vie 8/7/22	632	Externo									
636		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisibile (Art N°186 RLCA)	2 días	lun 11/7/22	mar 12/7/22	635										
637		Notificación al Adjudicatario del recurso en caso de ser admisible	0 días	mar 12/7/22	mar 12/7/22	636										
638		Plazo para recibir respuesta del adjudicatario (Art N°194 RLCA)	3 días	mié 13/7/22	vie 15/7/22	637										
639		Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Art N°195 RLCA)	15 días	lun 18/7/22	mar 9/8/22	638										
640		Notificacion de la resolución (SICOP)	0 días	mar 9/8/22	mar 9/8/22	639										
641		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	6 días	mié 10/8/22	jue 18/8/22	640										
642		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mié 10/8/22	vie 12/8/22	640										
643		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 10/8/22	mié 10/8/22	643										
644		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 10/8/22	mié 10/8/22	643	Comision de adjudicación									

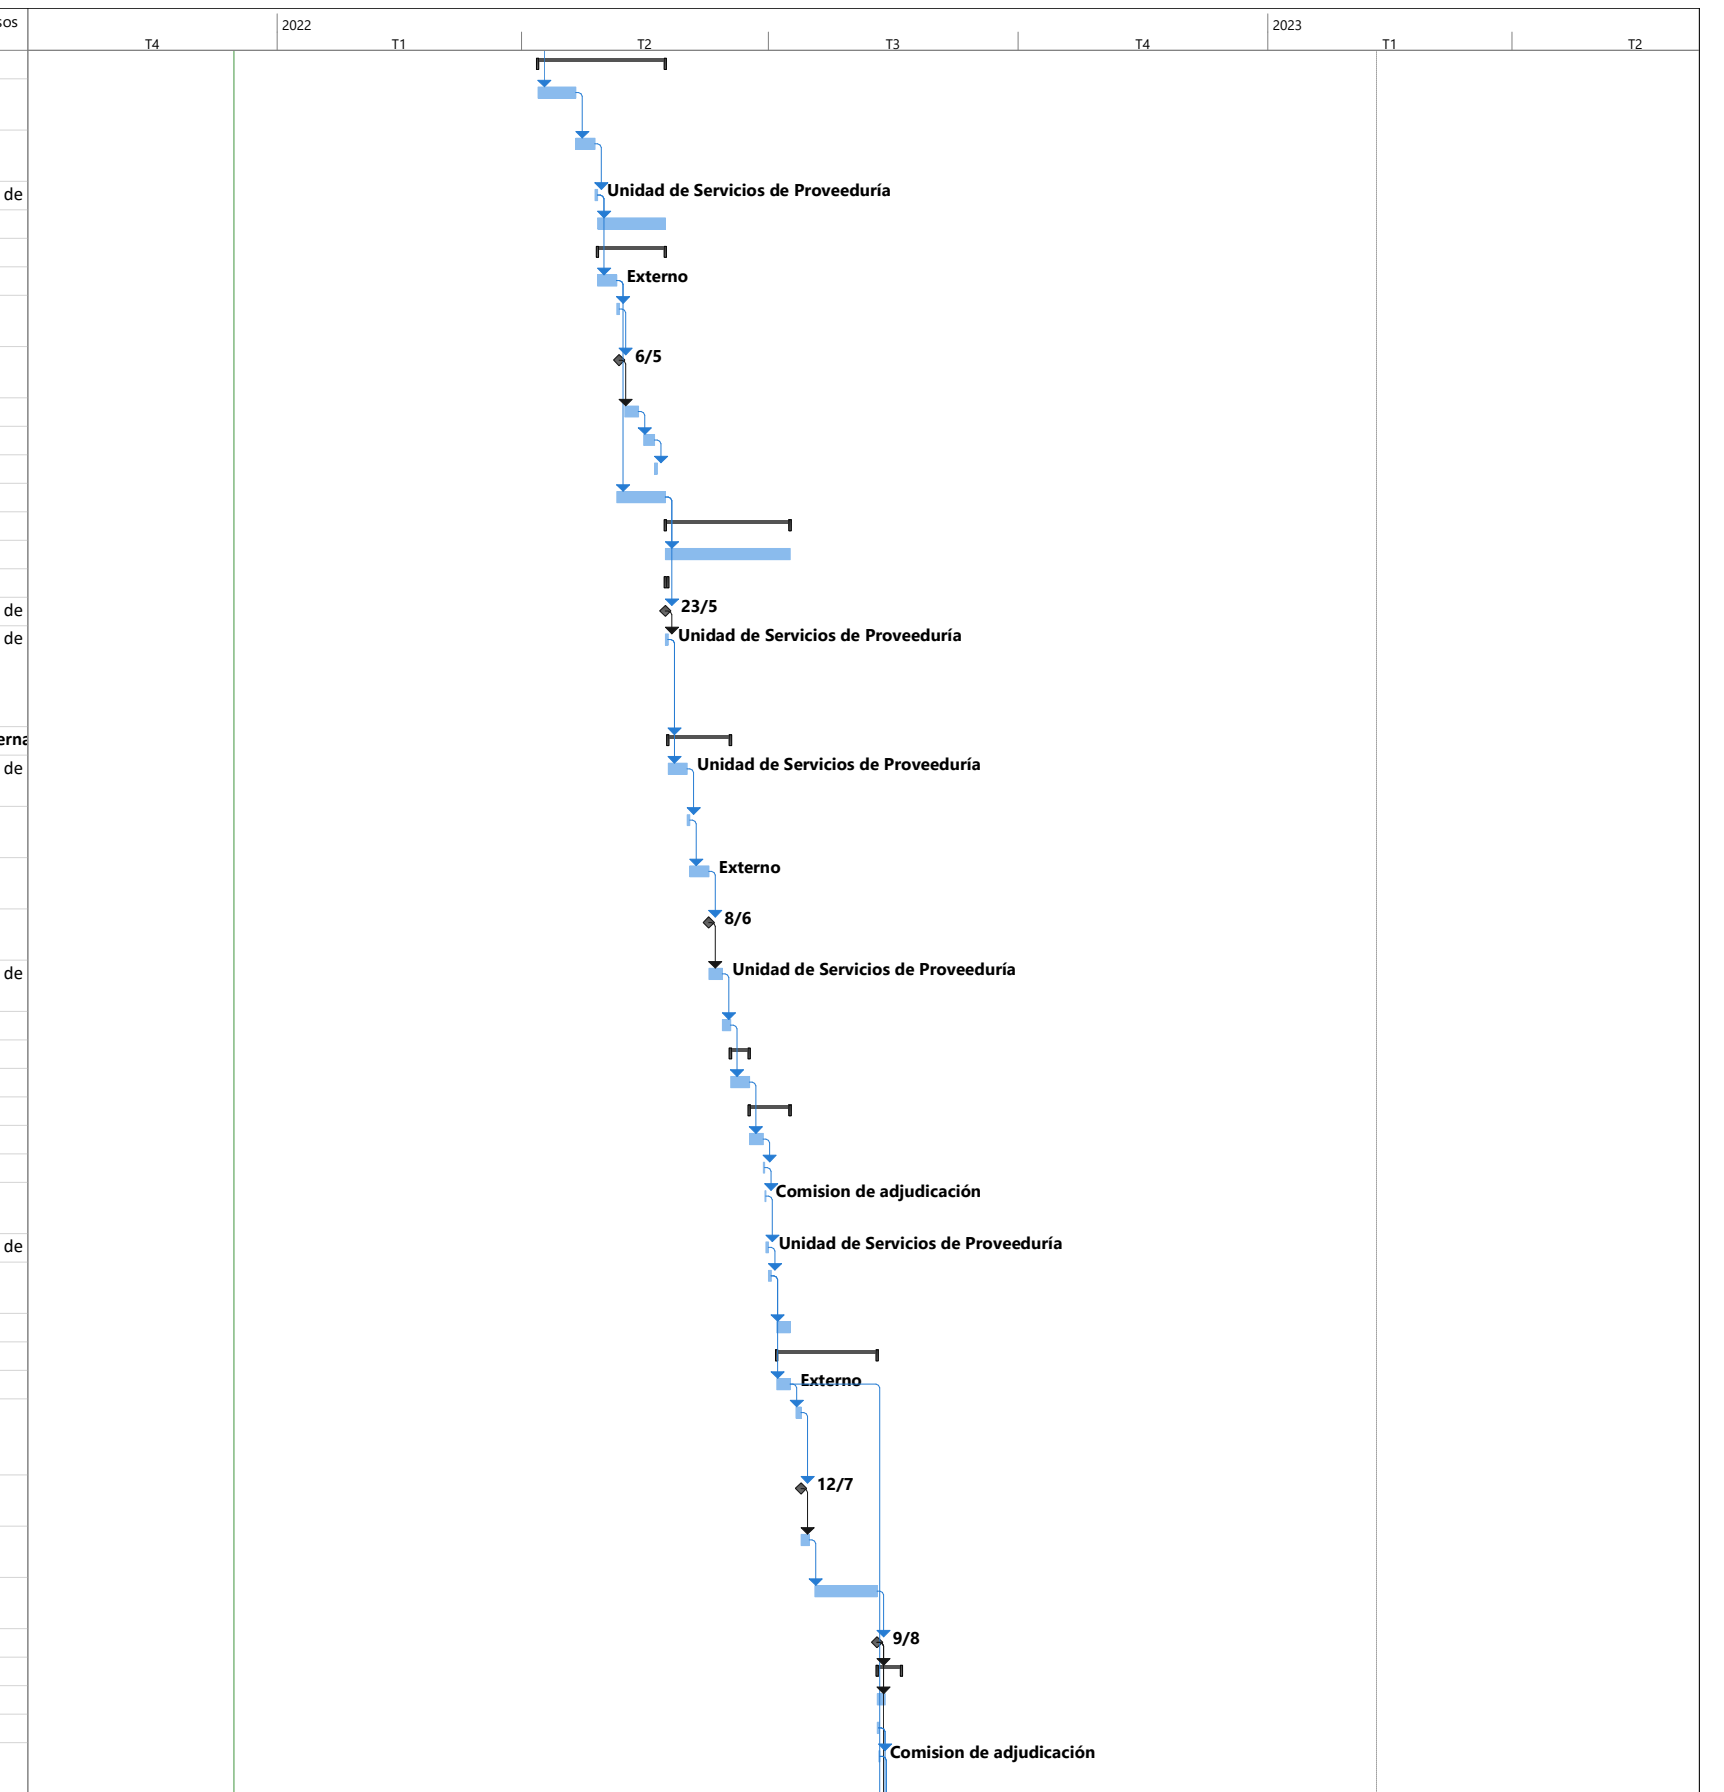

Proyecto: Cronograma de comp
 Fecha: jue 16/12/21


Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Progreso manual
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Progreso	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Gantt Chart (2022-2023)											
694		Plazo para adjudicación	34 días	mié 24/11/21	mar 25/1/22			[Gantt bar from 24/11/21 to 25/1/22]											
695		Fecha máxima para adjudicar	34 días	mié 24/11/21	mar 25/1/22	693		[Gantt bar from 24/11/21 to 25/1/22]											
696		Recepción de ofertas	1 día	mar 23/11/21	mié 24/11/21			[Gantt bar from 23/11/21 to 24/11/21]											
697		Apertura de ofertas	0 días	mar 23/11/21	mar 23/11/21	693	Unidad de Servicios de	[Gantt bar at 23/11/21]											
698		Remisión en SICOP de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion para entrega de prevenciones Outlook)	1 día	mié 24/11/21	mié 24/11/21	697	Unidad de Servicios de Proveeduría	[Gantt bar at 24/11/21]											
699		Estudio y valoración de las ofertas.	17 días	jue 25/11/21	lun 3/1/22	698	Unidad Jurídica Interna	[Gantt bar from 25/11/21 to 3/1/22]											
700		Admisibilidad de ofertas (incluye reunión de admisibilidad)	5 días	jue 25/11/21	jue 2/12/21	698	Unidad de Servicios de Proveeduría	[Gantt bar from 25/11/21 to 2/12/21]											
701		Solicitud de información en SICOP a los oferentes para atender prevenciones	1 día	vie 3/12/21	vie 3/12/21	700		[Gantt bar at 3/12/21]											
702		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En SICOP)	5 días	lun 6/12/21	vie 10/12/21	701	Externo	[Gantt bar from 6/12/21 to 10/12/21]											
703		Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (SICOP)	0 días	vie 10/12/21	vie 10/12/21	702		[Gantt bar at 10/12/21]											
704		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	lun 13/12/21	mié 15/12/21	703	Unidad de Servicios de Proveeduría	[Gantt bar from 13/12/21 to 15/12/21]											
705		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	jue 16/12/21	lun 3/1/22	704		[Gantt bar from 16/12/21 to 3/1/22]											
706		Informe de recomendación	5 días	mar 4/1/22	lun 10/1/22			[Gantt bar from 4/1/22 to 10/1/22]											
707		Elaboración de Informe de recomendación	5 días	mar 4/1/22	lun 10/1/22	705		[Gantt bar from 4/1/22 to 10/1/22]											
708		Recomendación, adjudicación y comunicación	11 días	mar 11/1/22	mar 25/1/22			[Gantt bar from 11/1/22 to 25/1/22]											
709		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mar 11/1/22	jue 13/1/22	707		[Gantt bar from 11/1/22 to 13/1/22]											
710		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	vie 14/1/22	vie 14/1/22	709		[Gantt bar at 14/1/22]											
711		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	vie 14/1/22	vie 14/1/22	710	Comision de adjudicación	[Gantt bar at 14/1/22]											
712		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	lun 17/1/22	lun 17/1/22	711	Unidad de Servicios de	[Gantt bar at 17/1/22]											
713		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (SICOP)	1 día	mar 18/1/22	mar 18/1/22	712		[Gantt bar at 18/1/22]											
714		Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	mié 19/1/22	mar 25/1/22	713		[Gantt bar from 19/1/22 to 25/1/22]											
715		Recurso de revocatoria	25 días	mié 19/1/22	mar 22/2/22			[Gantt bar from 19/1/22 to 22/2/22]											
716		Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	mié 19/1/22	mar 25/1/22	713	Externo	[Gantt bar from 19/1/22 to 25/1/22]											
717		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisibile (Art N°186 RLCA)	2 días	mié 26/1/22	jue 27/1/22	716		[Gantt bar from 26/1/22 to 27/1/22]											
718		Notificación al Adjudicatario del recurso en caso de ser admisible	0 días	jue 27/1/22	jue 27/1/22	717		[Gantt bar at 27/1/22]											
719		Plazo para recibir respuesta del adjudicatario (Art N°194 RLCA)	3 días	vie 28/1/22	mar 1/2/22	718		[Gantt bar from 28/1/22 to 1/2/22]											
720		Elaboracion de la resolucio final de la revocatoria (Art N°195 RLCA)	15 días	mié 2/2/22	mar 22/2/22	719		[Gantt bar from 2/2/22 to 22/2/22]											
721		Notificacion de la resolución (SICOP)	0 días	mar 22/2/22	mar 22/2/22	720		[Gantt bar at 22/2/22]											
722		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	6 días	mié 23/2/22	mié 2/3/22	721		[Gantt bar from 23/2/22 to 2/3/22]											
723		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mié 23/2/22	vie 25/2/22	721		[Gantt bar from 23/2/22 to 25/2/22]											
724		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mié 23/2/22	mié 23/2/22	723		[Gantt bar at 23/2/22]											
725		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mié 23/2/22	mié 23/2/22	724	Comision de adjudicación	[Gantt bar at 23/2/22]											
726		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	jue 24/2/22	jue 24/2/22	725		[Gantt bar at 24/2/22]											
727		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (SICOP)	0 días	jue 24/2/22	jue 24/2/22	726		[Gantt bar at 24/2/22]											
728		Adjudicación en firme	5 días	jue 24/2/22	mié 2/3/22	716;725	Comision de adjudicaci	[Gantt bar from 24/2/22 to 2/3/22]											
729		Trámite de contrato	16 días	mié 23/2/22	mié 16/3/22			[Gantt bar from 23/2/22 to 16/3/22]											
730		Elaboración del Contrato	5 días	mié 23/2/22	mié 2/3/22	724		[Gantt bar from 23/2/22 to 2/3/22]											
731		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	mié 23/2/22	mié 23/2/22	730CC		[Gantt bar at 23/2/22]											
732		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	mié 23/2/22	mié 2/3/22	731		[Gantt bar from 23/2/22 to 2/3/22]											
733		Firma de contrato oferente	1 día	mié 23/2/22	mié 23/2/22	721	Contralor General;Exte	[Gantt bar at 23/2/22]											
734		Envío de contrato para firma Gerente de División de Apoyo	0 días	mié 23/2/22	mié 23/2/22	733		[Gantt bar at 23/2/22]											
735		Firma de contrato	5 días	jue 24/2/22	mié 2/3/22	734		[Gantt bar from 24/2/22 to 2/3/22]											
736		Envío de contrato a aprobación interna	0 días	mié 2/3/22	mié 2/3/22	733;735	Unidad Jurídica Interna	[Gantt bar at 2/3/22]											
737		Aprobacion Interna de Contrato	10 días	jue 3/3/22	mié 16/3/22	736		[Gantt bar from 3/3/22 to 16/3/22]											
738		Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	mié 16/3/22	mié 16/3/22	737	Unidad de Servicios de Proveeduría	[Gantt bar at 16/3/22]											

Proyecto: Cronograma de comp
 Fecha: jue 16/12/21

Tarea	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Tarea manual	solo duración	solo el comienzo	solo fin	Tareas externas	Hitos externos	Fecha límite	Progreso manual
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Progreso					


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023	T1	T2
739		Trámite del Pedido	6 días	jue 17/3/22	jue 24/3/22											
740		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	jue 17/3/22	vie 18/3/22	737	Unidad de Servicios de									
741		Envío de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	vie 18/3/22	vie 18/3/22	740	Unidad de Servicios de Proveeduría									
742		Visado de pedido en la UAF	3 días	lun 21/3/22	mié 23/3/22	741										
743		Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	jue 24/3/22	jue 24/3/22	742										
744		Notificación de Pedido de Compra	0 días	jue 24/3/22	jue 24/3/22	742;743	Unidad de Servicios de									
745		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	jue 24/3/22	jue 24/3/22	744										
746		Recepción de los ítems	13 días	jue 17/3/22	lun 4/4/22											
747		Entrega de los bienes/servicios	10 días	jue 17/3/22	mié 30/3/22	737	Externo									
748		Recibido a satisfacción	3 días	jue 31/3/22	lun 4/4/22	747	Unidad Técnica									
749		Fin recepción de ítems	0 días	lun 4/4/22	lun 4/4/22	748										
750		Trámite de pago	36 días	mar 5/4/22	mar 31/5/22											
751		Envío documentos a Financiero	1 día	mar 5/4/22	mar 5/4/22	749	Unidad de Servicios de									
752		Emisión de pago en Financiero	5 días	mié 6/4/22	mar 19/4/22	751	Unidad de Administraci									
753		Pago de Tesorería Nacional	30 días	mié 20/4/22	mar 31/5/22	752										
754		Conclusión trámite licitación	0 días	mar 31/5/22	mar 31/5/22	753										
755		2022LA-00006-503; UTI; Internet fijo; Contrato finaliza 30/09/2021; € 33.875.000,00/2022; Carolina Guevara - Walter Araya	164 días	mié 17/11/21	mié 27/7/22											
756		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	mié 17/11/21	mié 17/11/21											
757		Confección Documento complementario al cartel	17 días	mié 17/11/21	vie 10/12/21		Unidad de Servicios de									
758		Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	mié 17/11/21	mar 23/11/21	756										
759		Revisión Jurídica de cartel UJI	7 días	mié 24/11/21	vie 3/12/21	758	Unidad Técnica									
760		Revisión Técnica de cartel	7 días	mié 24/11/21	vie 3/12/21	758	Unidad Jurídica Interna									
761		Incorporación de ajustes y confección de documento	5 días	lun 6/12/21	vie 10/12/21	760	Unidad de Servicios de									
762		Invitación a participar	28 días	lun 13/12/21	mié 2/2/22											
763		Buscar código de producto / solicitar la creación de có	5 días	lun 13/12/21	vie 17/12/21	761										
764		Elaboración de solicitud y confección de Cartel en SICOP	5 días	lun 3/1/22	vie 7/1/22	763										
765		Invitación a participar en SICOP	1 día	lun 10/1/22	lun 10/1/22	764	Unidad de Servicios de									
766		Plazo para recibir ofertas	17 días	mar 11/1/22	mié 2/2/22	765										
767		Recurso de Objeción al Cartel	17 días	mar 11/1/22	mié 2/2/22											
768		Presentación de Objeción al cartel	5 días	mar 11/1/22	lun 17/1/22	765	Externo									
769		Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación	1 día	mar 18/1/22	mar 18/1/22	768										
770		Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Uni	0 días	mar 18/1/22	mar 18/1/22	769										
771		Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	mié 19/1/22	mar 25/1/22	770										
772		Confección de Resolución a la Objeción	4 días	mié 26/1/22	lun 31/1/22	771										
773		Comunicación de Resolución final	1 día	mar 1/2/22	mar 1/2/22	772										
774		Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	mar 18/1/22	mié 2/2/22	768										
775		Plazo para adjudicación	34 días	jue 3/2/22	mar 22/3/22											
776		Fecha máxima para adjudicar	34 días	jue 3/2/22	mar 22/3/22	774										
777		Recepción de ofertas	1 día	mié 2/2/22	jue 3/2/22											
778		Apertura de ofertas	0 días	mié 2/2/22	mié 2/2/22	774	Unidad de Servicios de									
779		Remisión en SICOP de ofertas para realizar estudio de	1 día	jue 3/2/22	jue 3/2/22	778	Unidad de Servicios de									
780		Estudio y valoración de las ofertas.	17 días	vie 4/2/22	lun 28/2/22	779	Unidad Jurídica Interna									
781		Admisibilidad de ofertas (incluye reunión de admisib	5 días	vie 4/2/22	jue 10/2/22	779	Unidad de Servicios de									
782		Solicitud de información en SICOP a los oferentes par	1 día	vie 11/2/22	vie 11/2/22	781										
783		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a	5 días	lun 14/2/22	vie 18/2/22	782	Externo									
784		Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la	10 días	vie 18/2/22	vie 18/2/22	783										
785		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la	3 días	lun 21/2/22	mié 23/2/22	784	Unidad de Servicios de									
786		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	jue 24/2/22	lun 28/2/22	785										
787		Informe de recomendación	5 días	mar 1/3/22	lun 7/3/22											
788		Elaboración de Informe de recomendación	5 días	mar 1/3/22	lun 7/3/22	786										
789		Recomendación, adjudicación y comunicación	11 días	mar 8/3/22	mar 22/3/22											
790		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mar 8/3/22	jue 10/3/22	788										
791		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	vie 11/3/22	vie 11/3/22	790										
792		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	vie 11/3/22	vie 11/3/22	791	Comision de adjudicaci									
793		Elaboración de acuerdo de adjudicacion	1 día	lun 14/3/22	lun 14/3/22	792	Unidad de Servicios de									
794		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion	1 día	mar 15/3/22	mar 15/3/22	793										
795		Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	mié 16/3/22	mar 22/3/22	794										
796		Recurso de revocatoria	25 días	mié 16/3/22	mar 26/4/22											

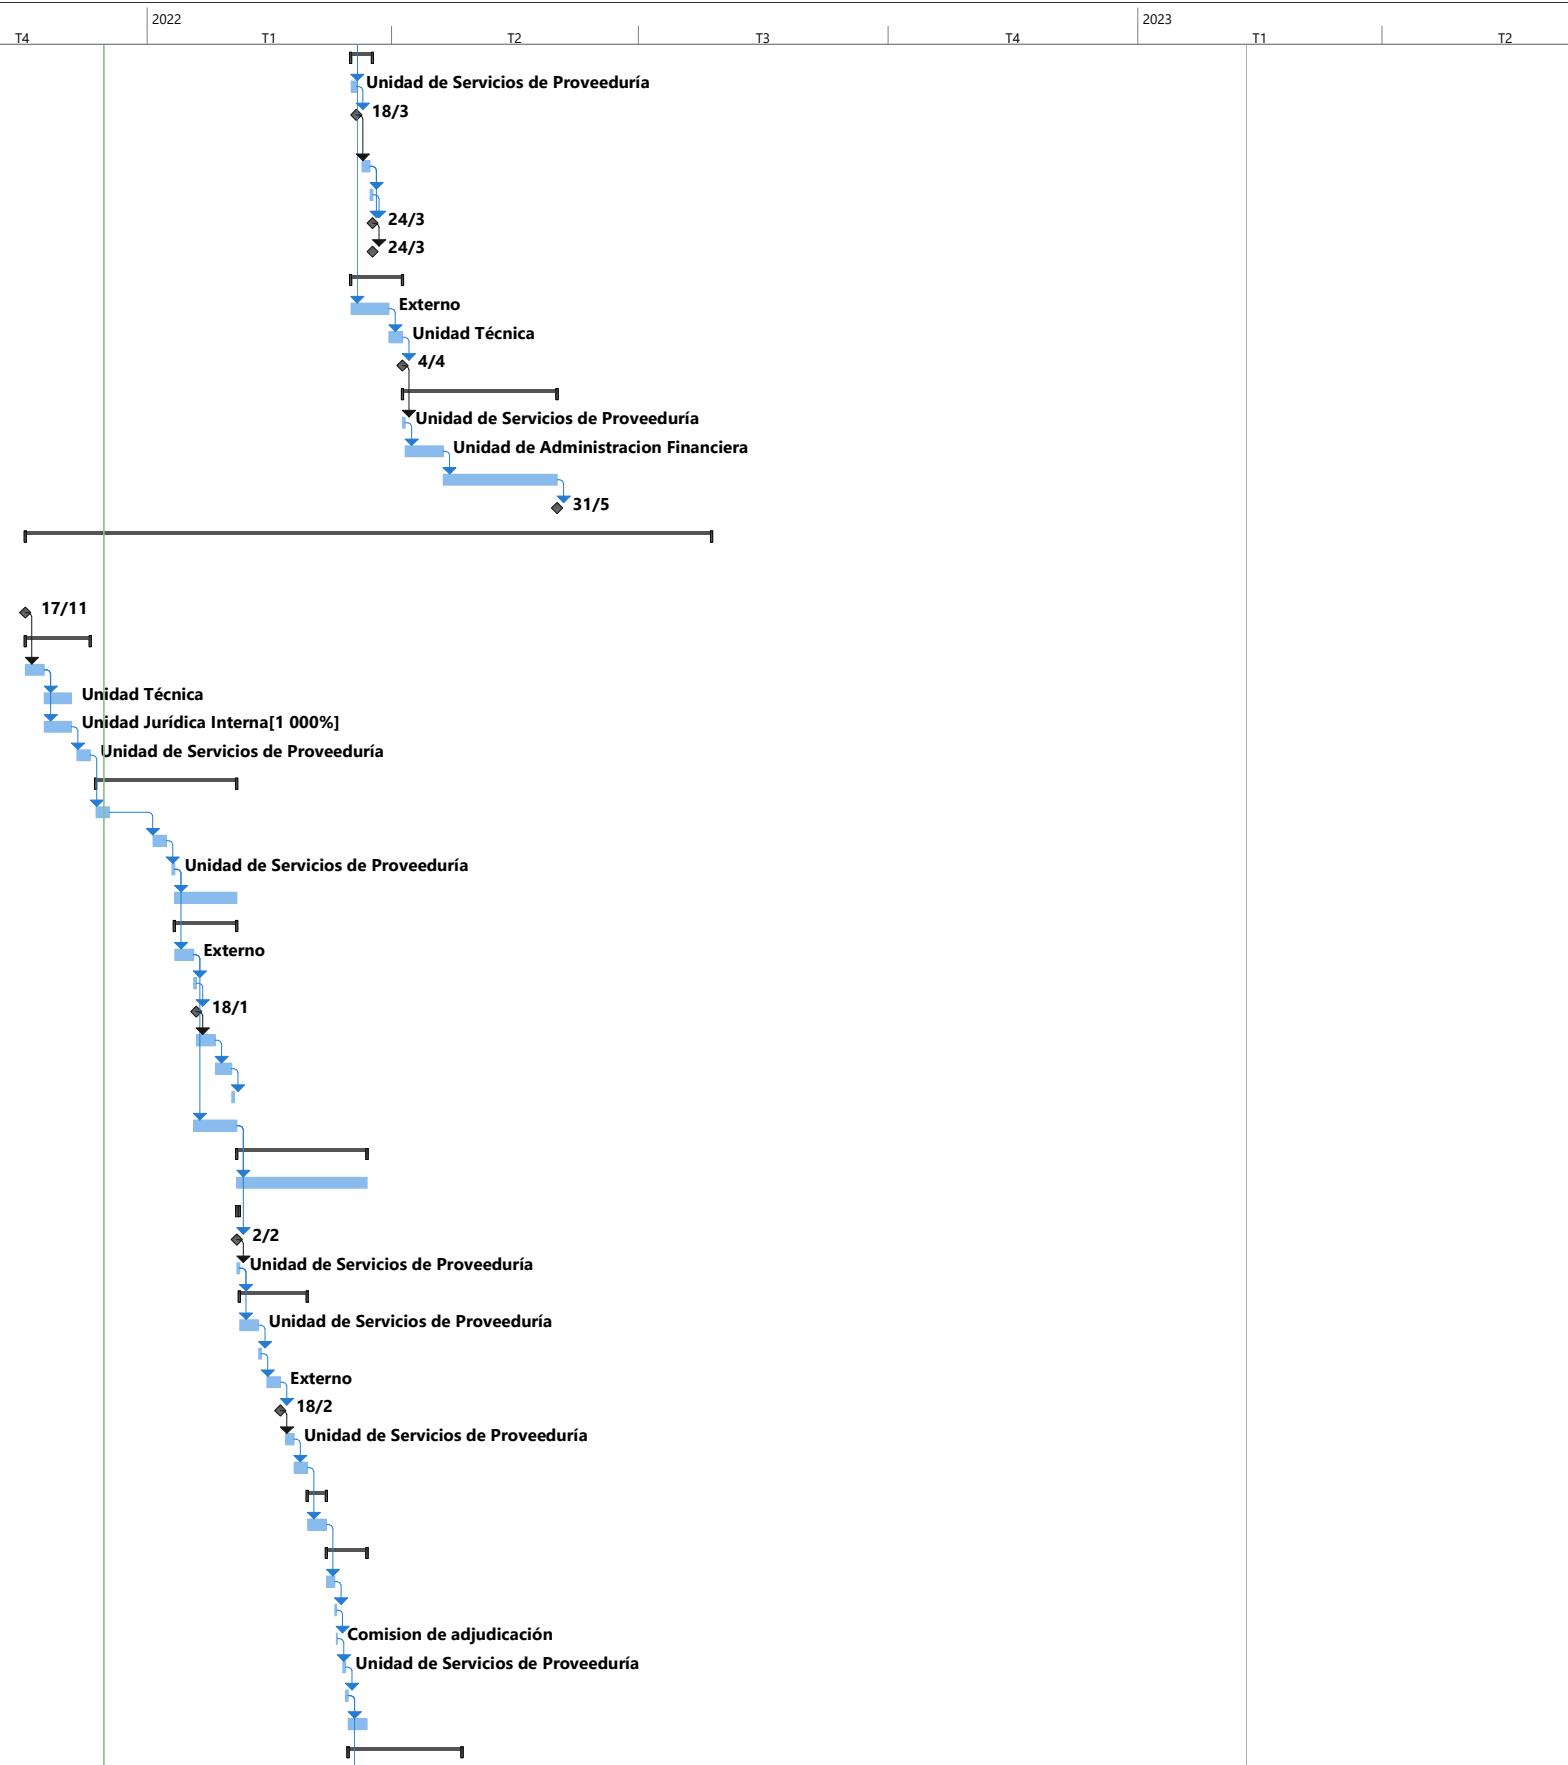

Proyecto: Cronograma de comp
Fecha: jue 16/12/21

Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		Progreso manual	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha limite			
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023	T1	T2
797		Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	mié 16/3/22	mar 22/3/22	794	Externo									
798		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación s	2 días	mié 23/3/22	jue 24/3/22	797										
799		Notificación al Adjudicatario del recurso en caso de se	0 días	jue 24/3/22	jue 24/3/22	798										
800		Plazo para recibir respuesta del adjudicatario (Art N°1	3 días	vie 25/3/22	mar 29/3/22	799										
801		Elaboracion de la resolucio final de la revocatoria (Ar	15 días	mié 30/3/22	mar 26/4/22	800										
802		Notificacion de la resolucio (SICOP)	0 días	mar 26/4/22	mar 26/4/22	801										
803		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	6 días	mié 27/4/22	mié 4/5/22	802										
804		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mié 27/4/22	vie 29/4/22	802										
805		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 27/4/22	mié 27/4/22											
806		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la	0,5 días	mié 27/4/22	mié 27/4/22	805	Comision de adjudicaci									
807		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	jue 28/4/22	jue 28/4/22	806										
808		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion	0 días	jue 28/4/22	jue 28/4/22	807										
809		Adjudicación en firme	5 días	jue 28/4/22	mié 4/5/22	797;806	Comision de adjudicaci									
810		Trámite de contrato	16 días	mié 27/4/22	mié 18/5/22											
811		Elaboración del Contrato	5 días	mié 27/4/22	mié 4/5/22	805										
812		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	mié 27/4/22	mié 27/4/22	811CC										
813		Presentación de documentos por parte de adjudicatar	5 días	mié 27/4/22	mié 4/5/22	812										
814		Firma de contrato oferente	1 día	mié 27/4/22	mié 27/4/22	802	Contralor General;Exte									
815		Envío de contrato para firma Gerente de División de	0 días	mié 27/4/22	mié 27/4/22	814										
816		Firma de contrato	5 días	jue 28/4/22	mié 4/5/22	815										
817		Envío de contrato a aprobación interna	0 días	mié 4/5/22	mié 4/5/22	814;816	Unidad Jurídica Interna									
818		Aprobación Interna de Contrato	10 días	jue 5/5/22	mié 18/5/22	817										
819		Comunicación a empresa de aprobación del contrato	0 días	mié 18/5/22	mié 18/5/22	818	Unidad de Servicios de									
820		Trámite del Pedido	6 días	jue 19/5/22	jue 26/5/22											
821		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	jue 19/5/22	vie 20/5/22	818	Unidad de Servicios de									
822		Envío de borrador de pedido a Financiero para aproba	0 días	vie 20/5/22	vie 20/5/22	821	Unidad de Servicios de									
823		Visado de pedido en la UAF	3 días	lun 23/5/22	mié 25/5/22	822										
824		Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	jue 26/5/22	jue 26/5/22	823										
825		Notificación de Pedido de Compra	0 días	jue 26/5/22	jue 26/5/22	823;824	Unidad de Servicios de									
826		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	jue 26/5/22	jue 26/5/22	825										
827		Recepción de los ítems	13 días	jue 19/5/22	lun 6/6/22											
828		Entrega de los bienes/servicios	10 días	jue 19/5/22	mié 1/6/22	818	Externo									
829		Recibido a satisfacción	3 días	jue 2/6/22	lun 6/6/22	828	Unidad Técnica									
830		Fin recepción de ítems	0 días	lun 6/6/22	lun 6/6/22	829										
831		Trámite de pago	36 días	mar 7/6/22	mié 27/7/22											
832		Envío documentos a Financiero	1 día	mar 7/6/22	mar 7/6/22	830	Unidad de Servicios de									
833		Emisión de pago en Financiero	5 días	mié 8/6/22	mar 14/6/22	832	Unidad de Administraci									
834		Pago de Tesorería Nacional	30 días	mié 15/6/22	mié 27/7/22	833										
835		Conclusión trámite licitación	0 días	mié 27/7/22	mié 27/7/22	834										
836		2022LA-00007-503; UTI; Internet fijo; Contrato finaliza	164 días	lun 6/6/22	jue 9/2/23											
		31/01/2023; envían especificaciones el 06/06/2022														
		26.433.000,00/2022; Carolina Guevara - Walter Araya														
837		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	lun 6/6/22	lun 6/6/22											
838		Confección Documento complementario al cartel	17 días	lun 6/6/22	mar 28/6/22		Unidad de Servicios de									
839		Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 6/6/22	vie 10/6/22	837										
840		Revisión Jurídica de cartel UJI	7 días	lun 13/6/22	mar 21/6/22	839	Unidad Técnica									
841		Revisión Técnica de cartel	7 días	lun 13/6/22	mar 21/6/22	839	Unidad Jurídica Interna									
842		Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al cartel	5 días	mié 22/6/22	mar 28/6/22	841	Unidad de Servicios de Proveeduría									
843		Invitación a participar	28 días	mié 29/6/22	mar 9/8/22											
844		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	mié 29/6/22	mar 5/7/22	842										
845		Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en SICOP	5 días	mié 6/7/22	mar 12/7/22	844										
846		Invitación a participar en SICOP	1 día	mié 13/7/22	mié 13/7/22	845	Unidad de Servicios de									
847		Plazo para recibir ofertas	17 días	jue 14/7/22	mar 9/8/22	846										
848		Recurso de Objeción al Cartel	17 días	jue 14/7/22	mar 9/8/22											
849		Presentacion de Objeción al cartel	5 días	jue 14/7/22	mié 20/7/22	846	Externo									

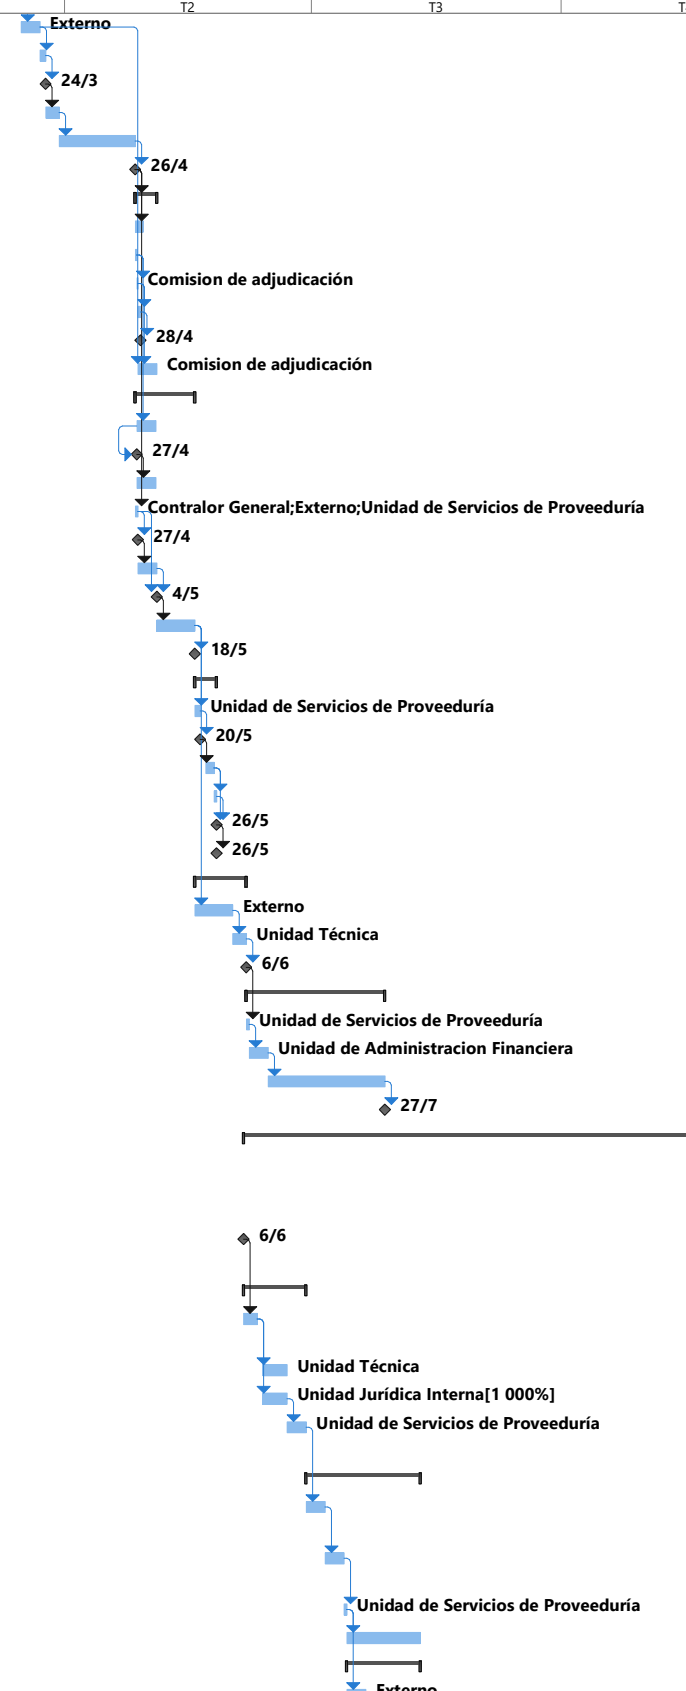

Proyecto: Cronograma de comp
Fecha: jue 16/12/21


Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		solo fin		Hito externo		Progreso manual	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso		Fecha límite			
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual									

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023	T1	T2
850		Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en SICOP	1 día	jue 21/7/22	jue 21/7/22	849										
851		Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	0 días	jue 21/7/22	jue 21/7/22	850										
852		Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	vie 22/7/22	vie 29/7/22	851										
853		Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	lun 1/8/22	vie 5/8/22	852										
854		Comunicación de Resolución final	1 día	lun 8/8/22	lun 8/8/22	853										
855		Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	jue 21/7/22	mar 9/8/22	849										
856		Plazo para adjudicación	34 días	mié 10/8/22	mié 28/9/22											
857		Fecha máxima para adjudicar	34 días	mié 10/8/22	mié 28/9/22	855										
858		Recepción de ofertas	1 día	mar 9/8/22	mié 10/8/22											
859		Apertura de ofertas	0 días	mar 9/8/22	mar 9/8/22	855	Unidad de Servicios de									
860		Remisión en SICOP de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (legal y técnico), convocar a reunion para entrega de prevenciones Outlook)	1 día	mié 10/8/22	mié 10/8/22	859	Unidad de Servicios de Proveeduría									
861		Estudio y valoración de las ofertas.	17 días	jue 11/8/22	lun 5/9/22	860	Unidad Jurídica Interna									
862		Admisibilidad de ofertas (incluye reunion de admisibilidad)	5 días	jue 11/8/22	jue 18/8/22	860	Unidad de Servicios de Proveeduría									
863		Solicitud de información en SICOP a los oferentes para atender prevenciones	1 día	vie 19/8/22	vie 19/8/22	862										
864		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En SICOP)	5 días	lun 22/8/22	vie 26/8/22	863	Externo									
865		Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (SICOP)	0 días	vie 26/8/22	vie 26/8/22	864										
866		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	lun 29/8/22	mié 31/8/22	865	Unidad de Servicios de Proveeduría									
867		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	jue 1/9/22	lun 5/9/22	866										
868		Informe de recomendación	5 días	mar 6/9/22	lun 12/9/22											
869		Elaboración de Informe de recomendación	5 días	mar 6/9/22	lun 12/9/22	867										
870		Recomendación, adjudicación y comunicación	11 días	mar 13/9/22	mié 28/9/22											
871		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mar 13/9/22	jue 15/9/22	869										
872		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	vie 16/9/22	vie 16/9/22	871										
873		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	vie 16/9/22	vie 16/9/22	872	Comision de adjudicación									
874		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mar 20/9/22	mar 20/9/22	873	Unidad de Servicios de									
875		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (SICOP)	1 día	mié 21/9/22	mié 21/9/22	874										
876		Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	jue 22/9/22	mié 28/9/22	875										
877		Recurso de revocatoria	25 días	jue 22/9/22	mié 26/10/22											
878		Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	jue 22/9/22	mié 28/9/22	875	Externo									
879		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisibile (Art N°186 RLCA)	2 días	jue 29/9/22	vie 30/9/22	878										
880		Notificación al Adjudicatario del recurso en caso de ser admisible	0 días	vie 30/9/22	vie 30/9/22	879										
881		Plazo para recibir respuesta del adjudicatario (Art N°194 RLCA)	3 días	lun 3/10/22	mié 5/10/22	880										
882		Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Art N°195 RLCA)	15 días	jue 6/10/22	mié 26/10/22	881										
883		Notificacion de la resolución (SICOP)	0 días	mié 26/10/22	mié 26/10/22	882										
884		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	6 días	jue 27/10/22	jue 3/11/22	883										
885		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	jue 27/10/22	lun 31/10/22	883										
886		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	jue 27/10/22	jue 27/10/22	885										
887		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	jue 27/10/22	jue 27/10/22	886	Comision de adjudicación									
888		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	vie 28/10/22	vie 28/10/22	887										
889		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (SICOP)	0 días	vie 28/10/22	vie 28/10/22	888										
890		Adjudicación en firme	5 días	vie 28/10/22	jue 3/11/22	878;887	Comision de adjudicaci									
891		Trámite de contrato	16 días	jue 27/10/22	jue 17/11/22											
892		Elaboración del Contrato	5 días	jue 27/10/22	jue 3/11/22	886										
893		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	jue 27/10/22	jue 27/10/22	892CC										
894		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, garantía, etc)	5 días	jue 27/10/22	jue 3/11/22	893										

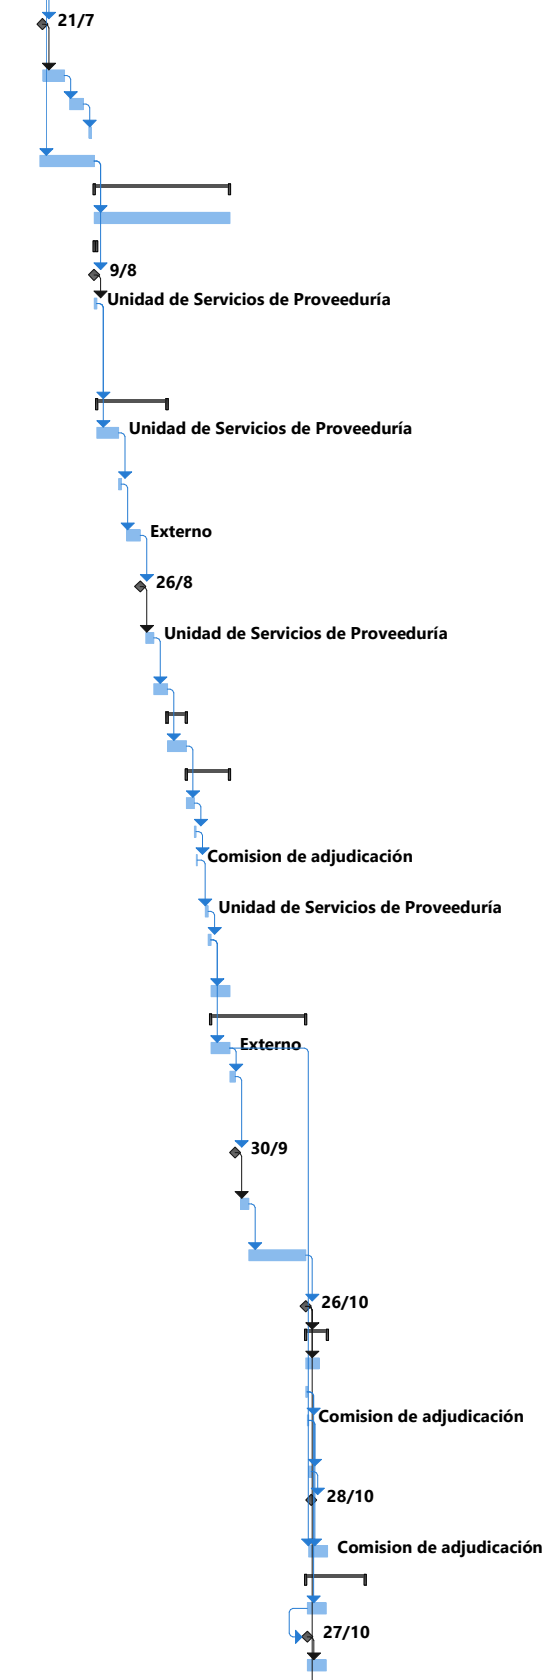


Proyecto: Cronograma de comp
 Fecha: jue 16/12/21


Tarea	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Tarea manual	solo duración	solo el comienzo	Hitos externos	Fecha límite	Progreso manual
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Progreso	Progreso		

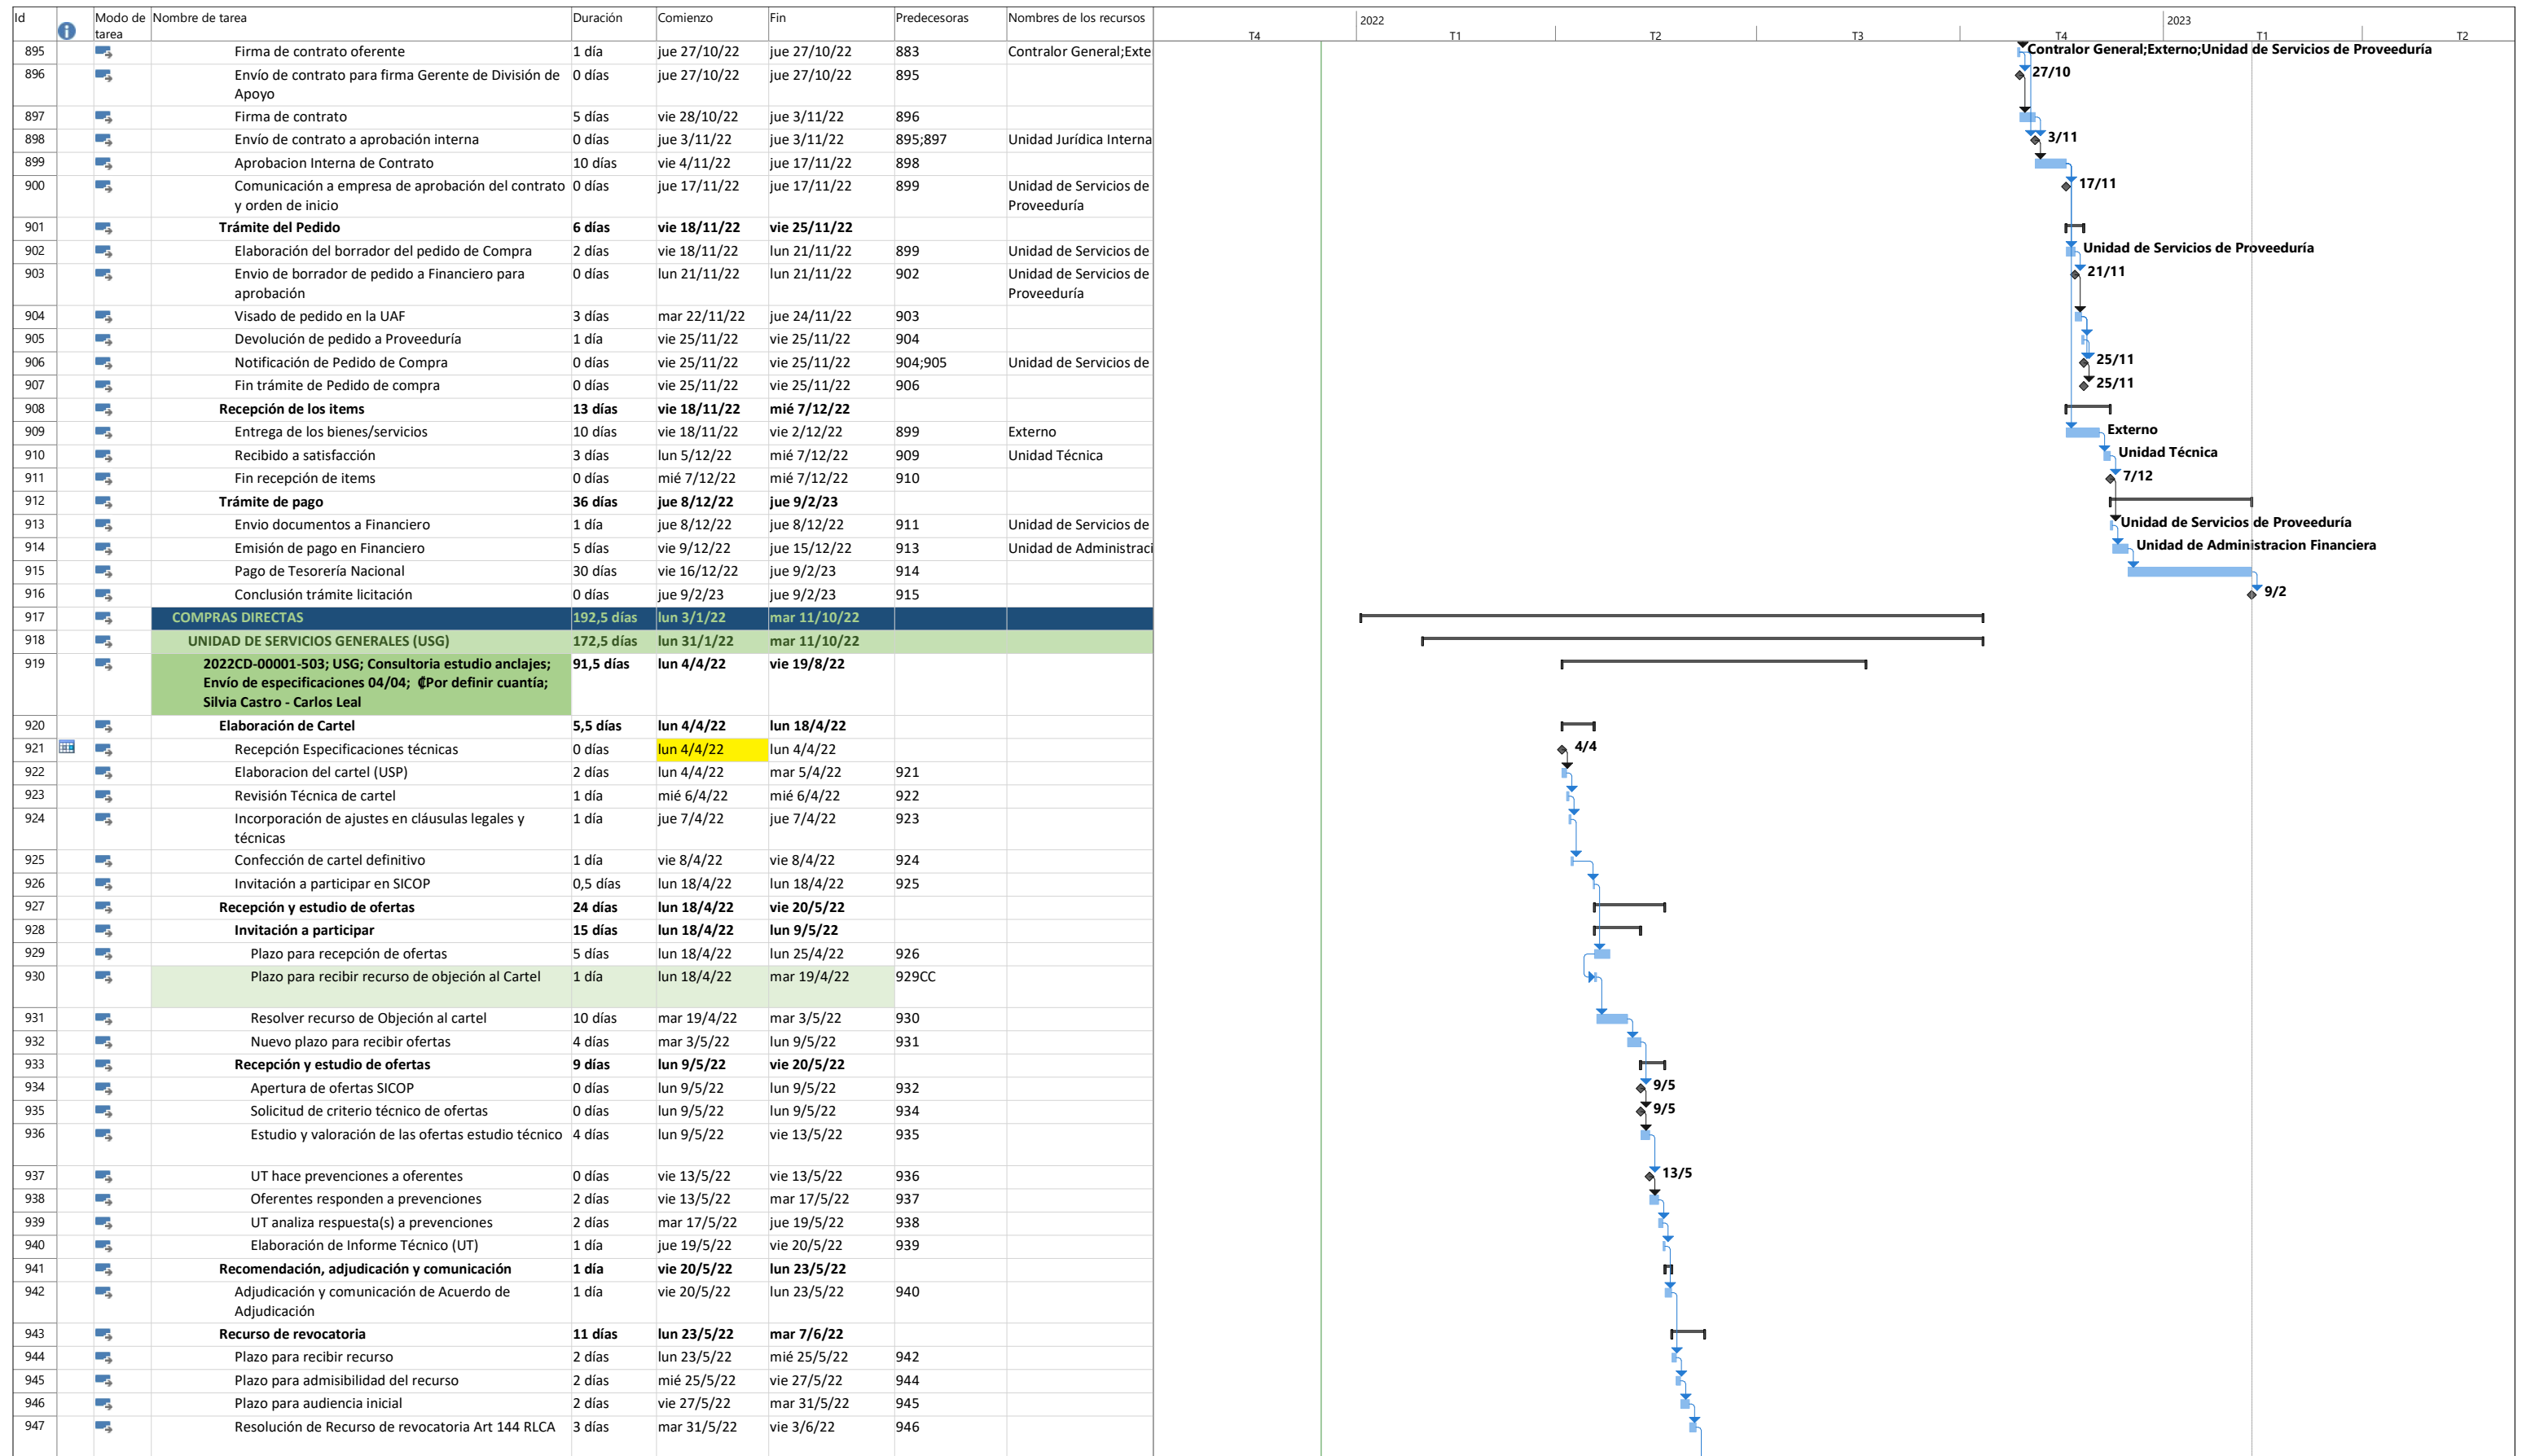

Proyecto: Cronograma de comp
Fecha: jue 16/12/21




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023	T1	T2
948		Adjudicación en firme	2 días	vie 3/6/22	mar 7/6/22	947										
949		Trámite del Pedido	5 días	mar 7/6/22	mar 14/6/22											
950		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 7/6/22	mié 8/6/22	948										
951		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 8/6/22	lun 13/6/22	950										
952		Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 13/6/22	mar 14/6/22	951										
953		Recepción de los ítems	13 días	mar 14/6/22	vie 1/7/22											
954		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 14/6/22	mar 28/6/22	952										
955		Recibido a satisfacción	3 días	mar 28/6/22	vie 1/7/22	954										
956		Trámite de pago	32 días	vie 1/7/22	vie 19/8/22											
957		Envío documentos a Financiero	2 días	vie 1/7/22	mar 5/7/22	955										
958		Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 5/7/22	vie 19/8/22	957										
959		Conclusión trámite de Contratación	0 días	vie 19/8/22	vie 19/8/22	958										
960		2022CD-0002-503; USG; Adquisición de andamios ; Envían especificaciones el 29/04/2022; \$2,500.000/2022; Gabriela Solano - Ingrid Noguera	91,5 días	vie 29/4/22	jue 8/9/22											
961		Elaboración de Cartel	5,5 días	vie 29/4/22	vie 6/5/22											
962		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	vie 29/4/22	vie 29/4/22											
963		Elaboración del cartel (USP)	2 días	vie 29/4/22	lun 2/5/22	962										
964		Revisión Técnica de cartel	1 día	mar 3/5/22	mar 3/5/22	963										
965		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	mié 4/5/22	mié 4/5/22	964										
966		Confección de cartel definitivo	1 día	jue 5/5/22	jue 5/5/22	965										
967		Invitación a participar en SICOP	0,5 días	vie 6/5/22	vie 6/5/22	966										
968		Recepción y estudio de ofertas	24 días	vie 6/5/22	jue 9/6/22											
969		Invitación a participar	15 días	vie 6/5/22	vie 27/5/22											
970		Plazo para recepción de ofertas	5 días	vie 6/5/22	vie 13/5/22	967										
971		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	vie 6/5/22	lun 9/5/22	970CC										
972		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	lun 9/5/22	lun 23/5/22	971										
973		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	lun 23/5/22	vie 27/5/22	972										
974		Recepción y estudio de ofertas	9 días	vie 27/5/22	jue 9/6/22											
975		Apertura de ofertas SICOP	0 días	vie 27/5/22	vie 27/5/22	973										
976		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	vie 27/5/22	vie 27/5/22	975										
977		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	vie 27/5/22	jue 2/6/22	976										
978		UT hace prevenciones a oferentes	0 días	jue 2/6/22	jue 2/6/22	977										
979		Oferentes responden a prevenciones	2 días	jue 2/6/22	lun 6/6/22	978										
980		UT analiza respuesta(s) a prevenciones	2 días	lun 6/6/22	mié 8/6/22	979										
981		Elaboración de Informe Técnico (UT)	1 día	mié 8/6/22	jue 9/6/22	980										
982		Recomendación, adjudicación y comunicación	1 día	jue 9/6/22	vie 10/6/22											
983		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	jue 9/6/22	vie 10/6/22	981										
984		Recurso de revocatoria	11 días	vie 10/6/22	lun 27/6/22											
985		Plazo para recibir recurso	2 días	vie 10/6/22	mar 14/6/22	983										
986		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mar 14/6/22	jue 16/6/22	985										
987		Plazo para audiencia inicial	2 días	jue 16/6/22	lun 20/6/22	986										
988		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	lun 20/6/22	jue 23/6/22	987										
989		Adjudicación en firme	2 días	jue 23/6/22	lun 27/6/22	988										
990		Trámite del Pedido	5 días	lun 27/6/22	lun 4/7/22											
991		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	lun 27/6/22	mar 28/6/22	989										
992		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mar 28/6/22	vie 1/7/22	991										
993		Notificación de Pedido de Compra	1 día	vie 1/7/22	lun 4/7/22	992										
994		Recepción de los ítems	13 días	lun 4/7/22	jue 21/7/22											
995		Entrega de los bienes/servicios	10 días	lun 4/7/22	lun 18/7/22	993										
996		Recibido a satisfacción	3 días	lun 18/7/22	jue 21/7/22	995										
997		Trámite de pago	32 días	jue 21/7/22	jue 8/9/22											
998		Envío documentos a Financiero	2 días	jue 21/7/22	mar 26/7/22	996										
999		Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 26/7/22	jue 8/9/22	998										
1000		Conclusión trámite de Contratación	0 días	jue 8/9/22	jue 8/9/22	999										

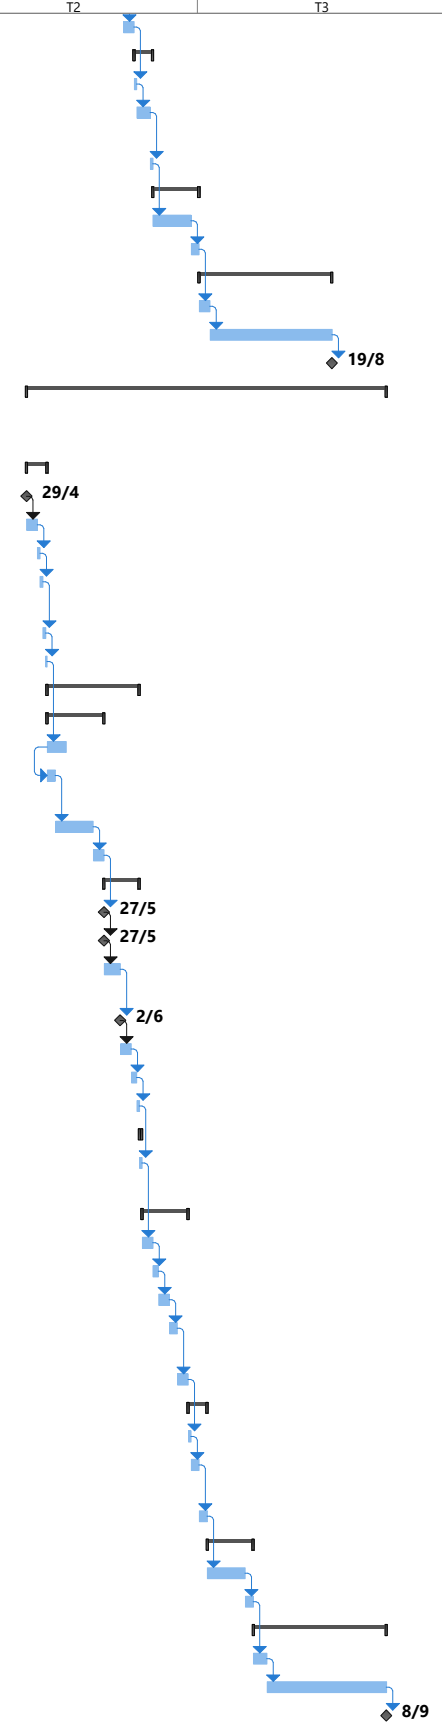

Proyecto: Cronograma de comp
Fecha: jue 16/12/21

Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		Progreso manual	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha limite			
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023	T1	T2
1001		2022CD-00003-503; USG; Reparación del parqueo sur (tapias y otros); Envían especificaciones 28/3/2022; €8.542.024 /2022; Yeimy Mora - Nazira Montero	91,5 días	lun 28/3/22	jue 11/8/22											
1002		Elaboración de Cartel	5,5 días	lun 28/3/22	lun 4/4/22											
1003		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 28/3/22	lun 28/3/22											
1004		Elaboración del cartel (USP)	2 días	lun 28/3/22	mar 29/3/22	1003										
1005		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 30/3/22	mié 30/3/22	1004										
1006		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 31/3/22	jue 31/3/22	1005										
1007		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 1/4/22	vie 1/4/22	1006										
1008		Invitación a participar en SICOP	0,5 días	lun 4/4/22	lun 4/4/22	1007										
1009		Recepción y estudio de ofertas	24 días	lun 4/4/22	vie 13/5/22											
1010		Invitación a participar	15 días	lun 4/4/22	lun 2/5/22											
1011		Plazo para recepción de ofertas	5 días	lun 4/4/22	lun 18/4/22	1008										
1012		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 4/4/22	mar 5/4/22	1011CC										
1013		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 5/4/22	mar 26/4/22	1012										
1014		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 26/4/22	lun 2/5/22	1013										
1015		Recepción y estudio de ofertas	9 días	lun 2/5/22	vie 13/5/22											
1016		Apertura de ofertas SICOP	0 días	lun 2/5/22	lun 2/5/22	1014										
1017		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 2/5/22	lun 2/5/22	1016										
1018		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 2/5/22	vie 6/5/22	1017										
1019		UT hace prevenciones a oferentes	0 días	vie 6/5/22	vie 6/5/22	1018										
1020		Oferentes responden a prevenciones	2 días	vie 6/5/22	mar 10/5/22	1019										
1021		UT analiza respuesta(s) a prevenciones	2 días	mar 10/5/22	jue 12/5/22	1020										
1022		Elaboración de Informe Técnico (UT)	1 día	jue 12/5/22	vie 13/5/22	1021										
1023		Recomendación, adjudicación y comunicación	1 día	vie 13/5/22	lun 16/5/22											
1024		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 13/5/22	lun 16/5/22	1022										
1025		Recurso de revocatoria	11 días	lun 16/5/22	mar 31/5/22											
1026		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 16/5/22	mié 18/5/22	1024										
1027		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 18/5/22	vie 20/5/22	1026										
1028		Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 20/5/22	mar 24/5/22	1027										
1029		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	mar 24/5/22	vie 27/5/22	1028										
1030		Adjudicación en firme	2 días	vie 27/5/22	mar 31/5/22	1029										
1031		Trámite del Pedido	5 días	mar 31/5/22	mar 7/6/22											
1032		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 31/5/22	mié 1/6/22	1030										
1033		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 1/6/22	lun 6/6/22	1032										
1034		Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 6/6/22	mar 7/6/22	1033										
1035		Recepción de los items	13 días	mar 7/6/22	vie 24/6/22											
1036		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 7/6/22	mar 21/6/22	1034										
1037		Recibido a satisfacción	3 días	mar 21/6/22	vie 24/6/22	1036										
1038		Trámite de pago	32 días	vie 24/6/22	jue 11/8/22											
1039		Envío documentos a Financiero	2 días	vie 24/6/22	mar 28/6/22	1037										
1040		Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 28/6/22	jue 11/8/22	1039										
1041		Conclusión trámite de Contratación	0 días	jue 11/8/22	jue 11/8/22	1040										
1042		2022CD-00004-503; USG; Puntos ecológicos para la disposición de residuos; Envían especificaciones 31/1/2022; €550.000/2022; Gabriela Solano - Nazira Montero	91,5 días	lun 31/1/22	mar 14/6/22											
1043		Elaboración de Cartel	5,5 días	lun 31/1/22	lun 7/2/22											
1044		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 31/1/22	lun 31/1/22											
1045		Elaboración del cartel (USP)	2 días	lun 31/1/22	mar 1/2/22	1044										
1046		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 2/2/22	mié 2/2/22	1045										
1047		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 3/2/22	jue 3/2/22	1046										
1048		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 4/2/22	vie 4/2/22	1047										
1049		Invitación a participar en SICOP	0,5 días	lun 7/2/22	lun 7/2/22	1048										
1050		Recepción y estudio de ofertas	24 días	lun 7/2/22	vie 11/3/22											
1051		Invitación a participar	15 días	lun 7/2/22	lun 28/2/22											

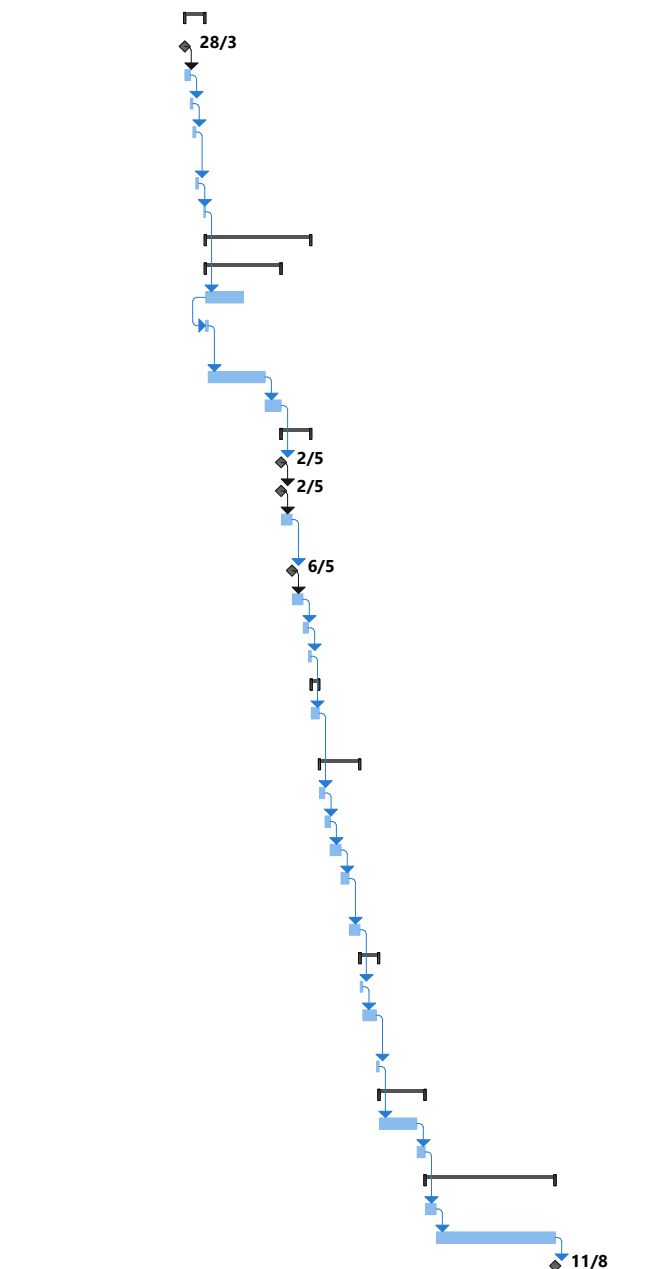

Proyecto: Cronograma de comp
Fecha: jue 16/12/21

Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		Progreso manual	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha limite			
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023	T1	T2
1052		Plazo para recepción de ofertas	5 días	lun 7/2/22	lun 14/2/22	1049										
1053		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 7/2/22	mar 8/2/22	1052CC										
1054		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 8/2/22	mar 22/2/22	1053										
1055		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 22/2/22	lun 28/2/22	1054										
1056		Recepción y estudio de ofertas	9 días	lun 28/2/22	vie 11/3/22											
1057		Apertura de ofertas SICOP	0 días	lun 28/2/22	lun 28/2/22	1055										
1058		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 28/2/22	lun 28/2/22	1057										
1059		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 28/2/22	vie 4/3/22	1058										
1060		UT hace prevenciones a oferentes	0 días	vie 4/3/22	vie 4/3/22	1059										
1061		Oferentes responden a prevenciones	2 días	vie 4/3/22	mar 8/3/22	1060										
1062		UT analiza respuesta(s) a prevenciones	2 días	mar 8/3/22	jue 10/3/22	1061										
1063		Elaboración de Informe Técnico (UT)	1 día	jue 10/3/22	vie 11/3/22	1062										
1064		Recomendación, adjudicación y comunicación	1 día	vie 11/3/22	lun 14/3/22											
1065		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 11/3/22	lun 14/3/22	1063										
1066		Recurso de revocatoria	11 días	lun 14/3/22	mar 29/3/22											
1067		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 14/3/22	mié 16/3/22	1065										
1068		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 16/3/22	vie 18/3/22	1067										
1069		Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 18/3/22	mar 22/3/22	1068										
1070		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	mar 22/3/22	vie 25/3/22	1069										
1071		Adjudicación en firme	2 días	vie 25/3/22	mar 29/3/22	1070										
1072		Trámite del Pedido	5 días	mar 29/3/22	mar 5/4/22											
1073		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 29/3/22	mié 30/3/22	1071										
1074		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 30/3/22	lun 4/4/22	1073										
1075		Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 4/4/22	mar 5/4/22	1074										
1076		Recepción de los ítems	13 días	mar 5/4/22	vie 29/4/22											
1077		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 5/4/22	mar 26/4/22	1075										
1078		Recibido a satisfacción	3 días	mar 26/4/22	vie 29/4/22	1077										
1079		Trámite de pago	32 días	vie 29/4/22	mar 14/6/22											
1080		Envío documentos a Financiero	2 días	vie 29/4/22	mar 3/5/22	1078										
1081		Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 3/5/22	mar 14/6/22	1080										
1082		Conclusión trámite de Contratación	0 días	mar 14/6/22	mar 14/6/22	1081										
1083		2022CD-00005-503; USG; Mantenimiento elevador edificio anexo; Contrato vence 14/5/2022; Envían especificaciones el 14/02/2022(\$1.500.000/ 2022; \$6,000.000/4 años; Carlos Leal - Yeimy Mora	91,5 días	lun 14/2/22	mar 28/6/22											
1084		Elaboración de Cartel	5,5 días	lun 14/2/22	lun 21/2/22											
1085		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 14/2/22	lun 14/2/22											
1086		Elaboración del cartel (USP)	2 días	lun 14/2/22	mar 15/2/22	1085										
1087		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 16/2/22	mié 16/2/22	1086										
1088		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 17/2/22	jue 17/2/22	1087										
1089		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 18/2/22	vie 18/2/22	1088										
1090		Invitación a participar en SICOP	0,5 días	lun 21/2/22	lun 21/2/22	1089										
1091		Recepción y estudio de ofertas	24 días	lun 21/2/22	vie 25/3/22											
1092		Invitación a participar	15 días	lun 21/2/22	lun 14/3/22											
1093		Plazo para recepción de ofertas	5 días	lun 21/2/22	lun 28/2/22	1090										
1094		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 21/2/22	mar 22/2/22	1093CC										
1095		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 22/2/22	mar 8/3/22	1094										
1096		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 8/3/22	lun 14/3/22	1095										
1097		Recepción y estudio de ofertas	9 días	lun 14/3/22	vie 25/3/22											
1098		Apertura de ofertas SICOP	0 días	lun 14/3/22	lun 14/3/22	1096										
1099		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 14/3/22	lun 14/3/22	1098										
1100		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 14/3/22	vie 18/3/22	1099										
1101		UT hace prevenciones a oferentes	0 días	vie 18/3/22	vie 18/3/22	1100										
1102		Oferentes responden a prevenciones	2 días	vie 18/3/22	mar 22/3/22	1101										
1103		UT analiza respuesta(s) a prevenciones	2 días	mar 22/3/22	jue 24/3/22	1102										

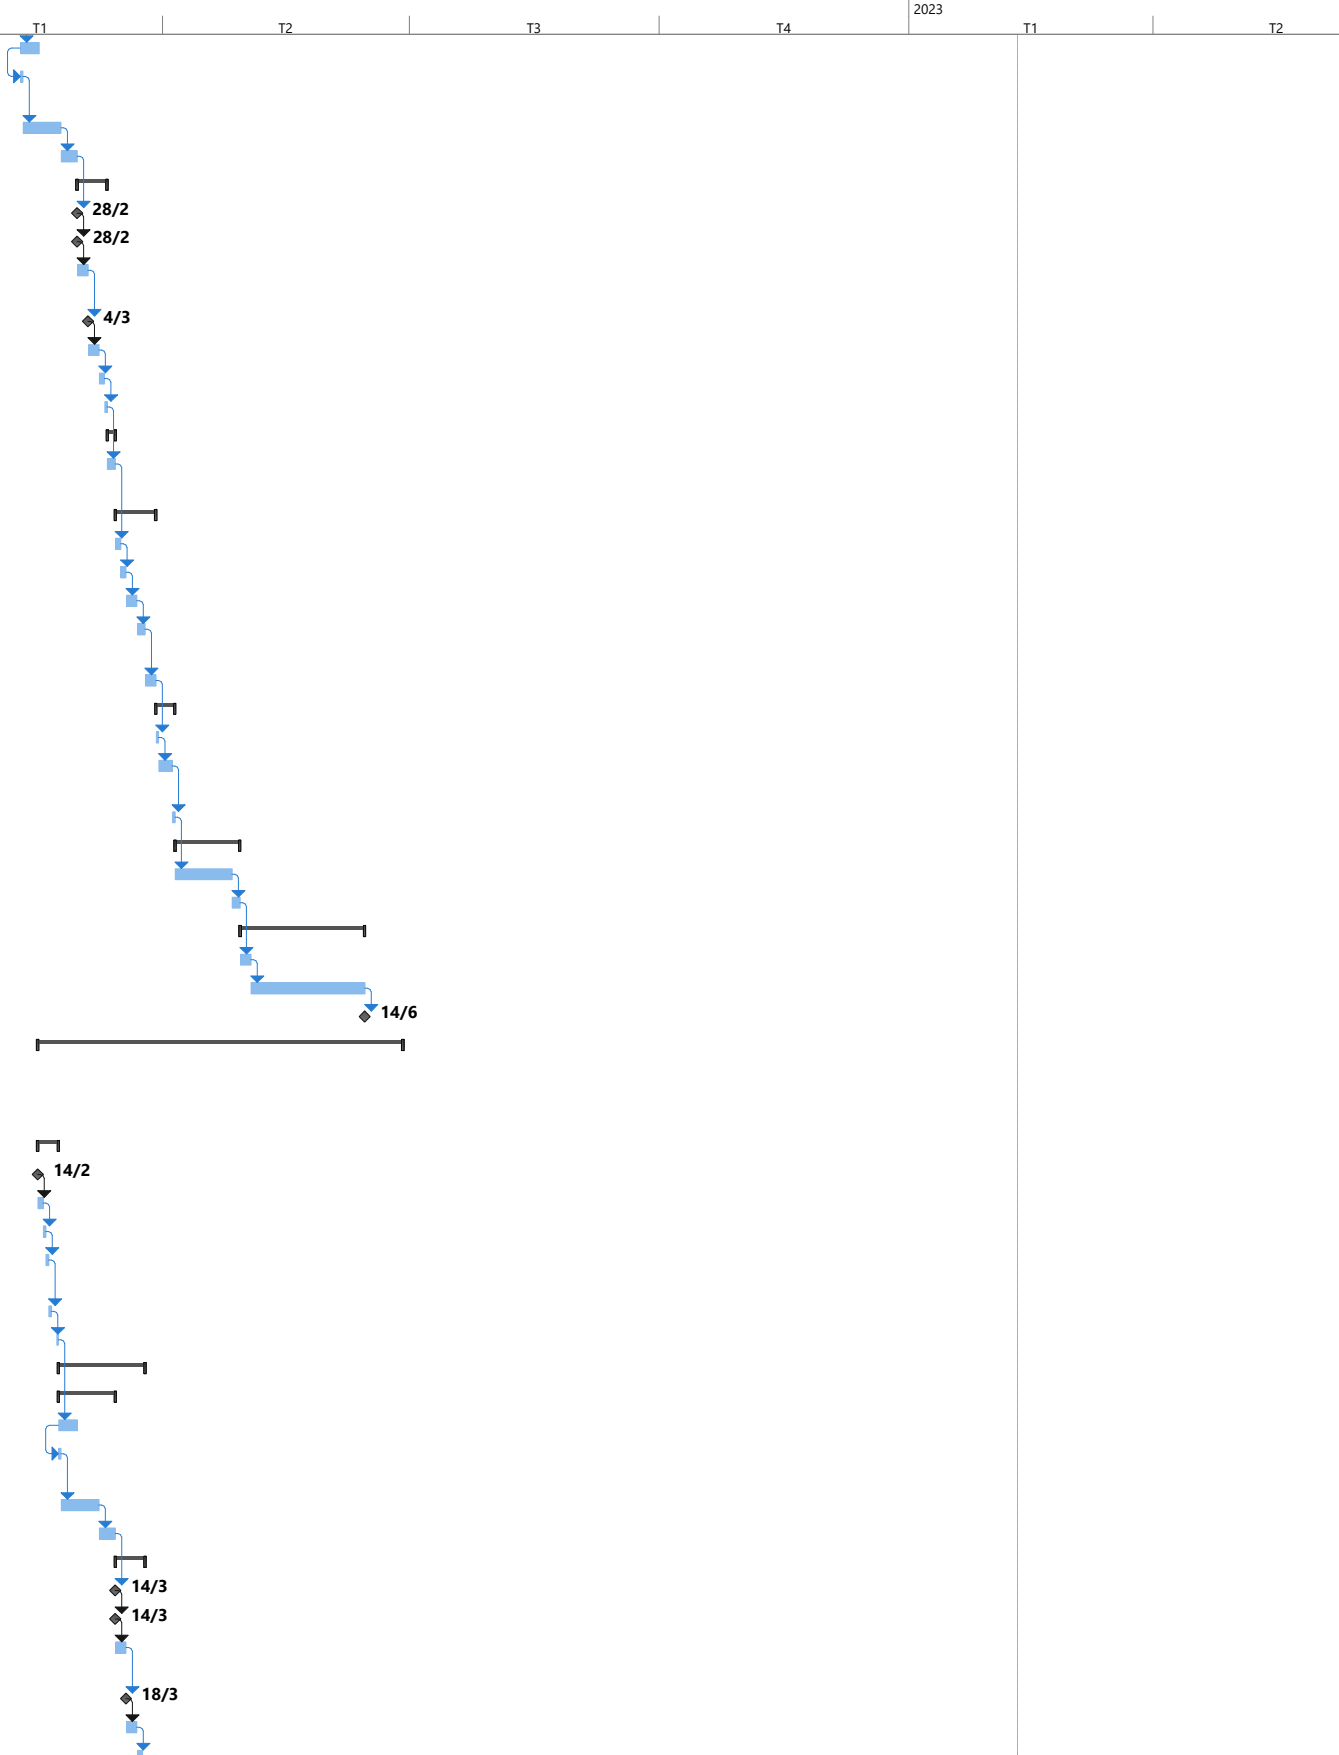

Proyecto: Cronograma de comp
 Fecha: jue 16/12/21

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Progreso manual
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Progreso	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023	T1	T2
1104		Elaboración de Informe Técnico (UT)	1 día	jue 24/3/22	vie 25/3/22	1103										
1105		Recomendación, adjudicación y comunicación	1 día	vie 25/3/22	lun 28/3/22											
1106		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 25/3/22	lun 28/3/22	1104										
1107		Recurso de revocatoria	11 días	lun 28/3/22	mar 19/4/22											
1108		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 28/3/22	mié 30/3/22	1106										
1109		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 30/3/22	vie 1/4/22	1108										
1110		Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 1/4/22	mar 5/4/22	1109										
1111		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	mar 5/4/22	vie 8/4/22	1110										
1112		Adjudicación en firme	2 días	vie 8/4/22	mar 19/4/22	1111										
1113		Trámite del Pedido	5 días	mar 19/4/22	mar 26/4/22											
1114		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 19/4/22	mié 20/4/22	1112										
1115		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 20/4/22	lun 25/4/22	1114										
1116		Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 25/4/22	mar 26/4/22	1115										
1117		Recepción de los items	13 días	mar 26/4/22	vie 13/5/22											
1118		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 26/4/22	mar 10/5/22	1116										
1119		Recibido a satisfacción	3 días	mar 10/5/22	vie 13/5/22	1118										
1120		Trámite de pago	32 días	vie 13/5/22	mar 28/6/22											
1121		Envío documentos a Financiero	2 días	vie 13/5/22	mar 17/5/22	1119										
1122		Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 17/5/22	mar 28/6/22	1121										
1123		Conclusión trámite de Contratación	0 días	mar 28/6/22	mar 28/6/22	1122										
1124		2022CD-00006-503; USG; Mantenimiento del sistema de alarmas; Envían especificaciones el 31/05; Contrato vence 5/12/2022; €800.000 /2022; €3,200.000/4 años; Carolina Guevara - Ingrid Noguera	91,5 días	mar 31/5/22	mar 11/10/22											
1125		Elaboración de Cartel	5,5 días	mar 31/5/22	mar 7/6/22											
1126		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	mar 31/5/22	mar 31/5/22											
1127		Elaboración del cartel (USP)	2 días	mar 31/5/22	mié 1/6/22	1126										
1128		Revisión Técnica de cartel	1 día	jue 2/6/22	jue 2/6/22	1127										
1129		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	vie 3/6/22	vie 3/6/22	1128										
1130		Confección de cartel definitivo	1 día	lun 6/6/22	lun 6/6/22	1129										
1131		Invitación a participar en SICOP	0,5 días	mar 7/6/22	mar 7/6/22	1130										
1132		Recepción y estudio de ofertas	24 días	mar 7/6/22	lun 11/7/22											
1133		Invitación a participar	15 días	mar 7/6/22	mar 28/6/22											
1134		Plazo para recepción de ofertas	5 días	mar 7/6/22	mar 14/6/22	1131										
1135		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	mar 7/6/22	mié 8/6/22	1134CC										
1136		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mié 8/6/22	mié 22/6/22	1135										
1137		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mié 22/6/22	mar 28/6/22	1136										
1138		Recepción y estudio de ofertas	9 días	mar 28/6/22	lun 11/7/22											
1139		Apertura de ofertas SICOP	0 días	mar 28/6/22	mar 28/6/22	1137										
1140		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	mar 28/6/22	mar 28/6/22	1139										
1141		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	mar 28/6/22	lun 4/7/22	1140										
1142		UT hace prevenciones a oferentes	0 días	lun 4/7/22	lun 4/7/22	1141										
1143		Oferentes responden a prevenciones	2 días	lun 4/7/22	mié 6/7/22	1142										
1144		UT analiza respuesta(s) a prevenciones	2 días	mié 6/7/22	vie 8/7/22	1143										
1145		Elaboración de Informe Técnico (UT)	1 día	vie 8/7/22	lun 11/7/22	1144										
1146		Recomendación, adjudicación y comunicación	1 día	lun 11/7/22	mar 12/7/22											
1147		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	lun 11/7/22	mar 12/7/22	1145										
1148		Recurso de revocatoria	11 días	mar 12/7/22	jue 28/7/22											
1149		Plazo para recibir recurso	2 días	mar 12/7/22	jue 14/7/22	1147										
1150		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	jue 14/7/22	lun 18/7/22	1149										
1151		Plazo para audiencia inicial	2 días	lun 18/7/22	mié 20/7/22	1150										
1152		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	mié 20/7/22	mar 26/7/22	1151										
1153		Adjudicación en firme	2 días	mar 26/7/22	jue 28/7/22	1152										
1154		Trámite del Pedido	5 días	jue 28/7/22	vie 5/8/22											
1155		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	jue 28/7/22	vie 29/7/22	1153										

Proyecto: Cronograma de comp
Fecha: jue 16/12/21


Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		Progreso manual	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha limite			
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Gantt Chart (2022-2023)											
1156		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	vie 29/7/22	jue 4/8/22	1155		[Gantt bar from 29/7/22 to 4/8/22]											
1157		Notificación de Pedido de Compra	1 día	jue 4/8/22	vie 5/8/22	1156		[Gantt bar from 4/8/22 to 5/8/22]											
1158		Recepción de los ítems	13 días	vie 5/8/22	jue 25/8/22			[Gantt bar from 5/8/22 to 25/8/22]											
1159		Entrega de los bienes/servicios	10 días	vie 5/8/22	lun 22/8/22	1157		[Gantt bar from 5/8/22 to 22/8/22]											
1160		Recibido a satisfacción	3 días	lun 22/8/22	jue 25/8/22	1159		[Gantt bar from 22/8/22 to 25/8/22]											
1161		Trámite de pago	32 días	jue 25/8/22	mar 11/10/22			[Gantt bar from 25/8/22 to 11/10/22]											
1162		Envío documentos a Financiero	2 días	jue 25/8/22	lun 29/8/22	1160		[Gantt bar from 25/8/22 to 29/8/22]											
1163		Emisión de pago en Financiero	30 días	lun 29/8/22	mar 11/10/22	1162		[Gantt bar from 29/8/22 to 11/10/22]											
1164		Conclusión trámite de Contratación	0 días	mar 11/10/22	mar 11/10/22	1163		[Gantt bar from 11/10/22 to 11/10/22]											
1165		2022CD-00007-503; USG; Inodoros de bajo consumo y mingitorios; Envían especificaciones el 30/05; Contrato vence 22/08/2022; \$1.000.000/2022; \$4.000.000/4 años; Gabriela Solano - Silvia Castro	91,5 días	lun 30/5/22	lun 10/10/22			[Gantt bar from 30/5/22 to 10/10/22]											
1166		Elaboración de Cartel	5,5 días	lun 30/5/22	lun 6/6/22			[Gantt bar from 30/5/22 to 6/6/22]											
1167		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 30/5/22	lun 30/5/22			[Gantt bar from 30/5/22 to 30/5/22]											
1168		Elaboración del cartel (USP)	2 días	lun 30/5/22	mar 31/5/22	1167		[Gantt bar from 30/5/22 to 31/5/22]											
1169		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 1/6/22	mié 1/6/22	1168		[Gantt bar from 1/6/22 to 1/6/22]											
1170		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 2/6/22	jue 2/6/22	1169		[Gantt bar from 2/6/22 to 2/6/22]											
1171		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 3/6/22	vie 3/6/22	1170		[Gantt bar from 3/6/22 to 3/6/22]											
1172		Invitación a participar en SICOP	0,5 días	lun 6/6/22	lun 6/6/22	1171		[Gantt bar from 6/6/22 to 6/6/22]											
1173		Recepción y estudio de ofertas	24 días	lun 6/6/22	vie 8/7/22			[Gantt bar from 6/6/22 to 8/7/22]											
1174		Invitación a participar	15 días	lun 6/6/22	lun 27/6/22			[Gantt bar from 6/6/22 to 27/6/22]											
1175		Plazo para recepción de ofertas	5 días	lun 6/6/22	lun 13/6/22	1172		[Gantt bar from 6/6/22 to 13/6/22]											
1176		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 6/6/22	mar 7/6/22	1175CC		[Gantt bar from 6/6/22 to 7/6/22]											
1177		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 7/6/22	mar 21/6/22	1176		[Gantt bar from 7/6/22 to 21/6/22]											
1178		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 21/6/22	lun 27/6/22	1177		[Gantt bar from 21/6/22 to 27/6/22]											
1179		Recepción y estudio de ofertas	9 días	lun 27/6/22	vie 8/7/22			[Gantt bar from 27/6/22 to 8/7/22]											
1180		Apertura de ofertas SICOP	0 días	lun 27/6/22	lun 27/6/22	1178		[Gantt bar from 27/6/22 to 27/6/22]											
1181		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 27/6/22	lun 27/6/22	1180		[Gantt bar from 27/6/22 to 27/6/22]											
1182		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 27/6/22	vie 1/7/22	1181		[Gantt bar from 27/6/22 to 1/7/22]											
1183		UT hace prevenciones a oferentes	0 días	vie 1/7/22	vie 1/7/22	1182		[Gantt bar from 1/7/22 to 1/7/22]											
1184		Oferentes responden a prevenciones	2 días	vie 1/7/22	mar 5/7/22	1183		[Gantt bar from 1/7/22 to 5/7/22]											
1185		UT analiza respuesta(s) a prevenciones	2 días	mar 5/7/22	jue 7/7/22	1184		[Gantt bar from 5/7/22 to 7/7/22]											
1186		Elaboración de Informe Técnico (UT)	1 día	jue 7/7/22	vie 8/7/22	1185		[Gantt bar from 7/7/22 to 8/7/22]											
1187		Recomendación, adjudicación y comunicación	1 día	vie 8/7/22	lun 11/7/22			[Gantt bar from 8/7/22 to 11/7/22]											
1188		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 8/7/22	lun 11/7/22	1186		[Gantt bar from 8/7/22 to 11/7/22]											
1189		Recurso de revocatoria	11 días	lun 11/7/22	mié 27/7/22			[Gantt bar from 11/7/22 to 27/7/22]											
1190		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 11/7/22	mié 13/7/22	1188		[Gantt bar from 11/7/22 to 13/7/22]											
1191		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 13/7/22	vie 15/7/22	1190		[Gantt bar from 13/7/22 to 15/7/22]											
1192		Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 15/7/22	mar 19/7/22	1191		[Gantt bar from 15/7/22 to 19/7/22]											
1193		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	mar 19/7/22	vie 22/7/22	1192		[Gantt bar from 19/7/22 to 22/7/22]											
1194		Adjudicación en firme	2 días	vie 22/7/22	mié 27/7/22	1193		[Gantt bar from 22/7/22 to 27/7/22]											
1195		Trámite del Pedido	5 días	mié 27/7/22	jue 4/8/22			[Gantt bar from 27/7/22 to 4/8/22]											
1196		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mié 27/7/22	jue 28/7/22	1194		[Gantt bar from 27/7/22 to 28/7/22]											
1197		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	jue 28/7/22	mié 3/8/22	1196		[Gantt bar from 28/7/22 to 3/8/22]											
1198		Notificación de Pedido de Compra	1 día	mié 3/8/22	jue 4/8/22	1197		[Gantt bar from 3/8/22 to 4/8/22]											
1199		Recepción de los ítems	13 días	jue 4/8/22	mié 24/8/22			[Gantt bar from 4/8/22 to 24/8/22]											
1200		Entrega de los bienes/servicios	10 días	jue 4/8/22	vie 19/8/22	1198		[Gantt bar from 4/8/22 to 19/8/22]											
1201		Recibido a satisfacción	3 días	vie 19/8/22	mié 24/8/22	1200		[Gantt bar from 19/8/22 to 24/8/22]											
1202		Trámite de pago	32 días	mié 24/8/22	lun 10/10/22			[Gantt bar from 24/8/22 to 10/10/22]											
1203		Envío documentos a Financiero	2 días	mié 24/8/22	vie 26/8/22	1201		[Gantt bar from 24/8/22 to 26/8/22]											
1204		Emisión de pago en Financiero	30 días	vie 26/8/22	lun 10/10/22	1203		[Gantt bar from 26/8/22 to 10/10/22]											
1205		Conclusión trámite de Contratación	0 días	lun 10/10/22	lun 10/10/22	1204		[Gantt bar from 10/10/22 to 10/10/22]											

Proyecto: Cronograma de comp
Fecha: jue 16/12/21

Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		Progreso manual	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha límite			
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023	T1	T2
1206		2022CD-00008-503; USG; dictámen psicológico para portación de armas; Contrato finaliza 6/9/2022; Envían especificaciones el 07/03/2022 \$135.000 / 2022; Gabriela Solano - Carolina Guevara	91,5 días	lun 7/3/22	mar 19/7/22											
1207		Elaboración de Cartel	5,5 días	lun 7/3/22	lun 14/3/22											
1208		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 7/3/22	lun 7/3/22											
1209		Elaboración del cartel (USP)	2 días	lun 7/3/22	mar 8/3/22	1208										
1210		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 9/3/22	mié 9/3/22	1209										
1211		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 10/3/22	jue 10/3/22	1210										
1212		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 11/3/22	vie 11/3/22	1211										
1213		Invitación a participar en SICOP	0,5 días	lun 14/3/22	lun 14/3/22	1212										
1214		Recepción y estudio de ofertas	24 días	lun 14/3/22	vie 22/4/22											
1215		Invitación a participar	15 días	lun 14/3/22	lun 4/4/22											
1216		Plazo para recepción de ofertas	5 días	lun 14/3/22	lun 21/3/22	1213										
1217		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 14/3/22	mar 15/3/22	1216CC										
1218		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 15/3/22	mar 29/3/22	1217										
1219		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 29/3/22	lun 4/4/22	1218										
1220		Recepción y estudio de ofertas	9 días	lun 4/4/22	vie 22/4/22											
1221		Apertura de ofertas SICOP	0 días	lun 4/4/22	lun 4/4/22	1219										
1222		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 4/4/22	lun 4/4/22	1221										
1223		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 4/4/22	vie 8/4/22	1222										
1224		UT hace prevenciones a oferentes	0 días	vie 8/4/22	vie 8/4/22	1223										
1225		Oferentes responden a prevenciones	2 días	vie 8/4/22	mar 19/4/22	1224										
1226		UT analiza respuesta(s) a prevenciones	2 días	mar 19/4/22	jue 21/4/22	1225										
1227		Elaboración de Informe Técnico (UT)	1 día	jue 21/4/22	vie 22/4/22	1226										
1228		Recomendación, adjudicación y comunicación	1 día	vie 22/4/22	lun 25/4/22											
1229		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 22/4/22	lun 25/4/22	1227										
1230		Recurso de revocatoria	11 días	lun 25/4/22	mar 10/5/22											
1231		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 25/4/22	mié 27/4/22	1229										
1232		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 27/4/22	vie 29/4/22	1231										
1233		Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 29/4/22	mar 3/5/22	1232										
1234		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	mar 3/5/22	vie 6/5/22	1233										
1235		Adjudicación en firme	2 días	vie 6/5/22	mar 10/5/22	1234										
1236		Trámite del Pedido	5 días	mar 10/5/22	mar 17/5/22											
1237		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 10/5/22	mié 11/5/22	1235										
1238		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 11/5/22	lun 16/5/22	1237										
1239		Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 16/5/22	mar 17/5/22	1238										
1240		Recepción de los items	13 días	mar 17/5/22	vie 3/6/22											
1241		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 17/5/22	mar 31/5/22	1239										
1242		Recibido a satisfacción	3 días	mar 31/5/22	vie 3/6/22	1241										
1243		Trámite de pago	32 días	vie 3/6/22	mar 19/7/22											
1244		Envío documentos a Financiero	2 días	vie 3/6/22	mar 7/6/22	1242										
1245		Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 7/6/22	mar 19/7/22	1244										
1246		Conclusión trámite de Contratación	0 días	mar 19/7/22	mar 19/7/22	1245										
1247		2022CD-00009-503; USG; Adquisición de puertas por demanda; Envían especificaciones 30/4/2022; \$500.000/2022; Yeimy Mora - Silvia Castro	91,5 días	lun 31/1/22	mar 14/6/22											
1248		Elaboración de Cartel	5,5 días	lun 31/1/22	lun 7/2/22											
1249		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 31/1/22	lun 31/1/22											
1250		Elaboración del cartel (USP)	2 días	lun 31/1/22	mar 1/2/22	1249										
1251		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 2/2/22	mié 2/2/22	1250										
1252		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 3/2/22	jue 3/2/22	1251										
1253		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 4/2/22	vie 4/2/22	1252										
1254		Invitación a participar en SICOP	0,5 días	lun 7/2/22	lun 7/2/22	1253										
1255		Recepción y estudio de ofertas	24 días	lun 7/2/22	vie 11/3/22											
1256		Invitación a participar	15 días	lun 7/2/22	lun 28/2/22											

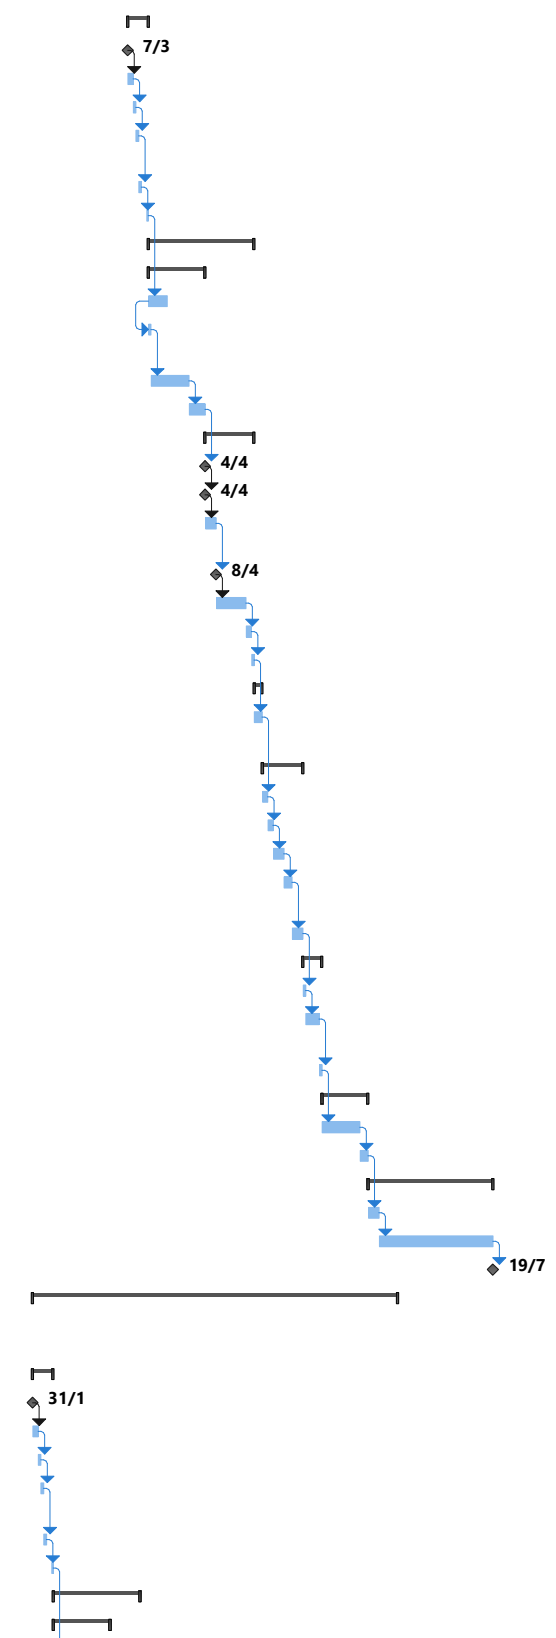

Proyecto: Cronograma de comp
Fecha: jue 16/12/21

Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		Progreso manual
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha limite		
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso		


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023	T1	T2
1257		Plazo para recepción de ofertas	5 días	lun 7/2/22	lun 14/2/22	1254										
1258		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 7/2/22	mar 8/2/22	1257CC										
1259		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 8/2/22	mar 22/2/22	1258										
1260		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 22/2/22	lun 28/2/22	1259										
1261		Recepción y estudio de ofertas	9 días	lun 28/2/22	vie 11/3/22											
1262		Apertura de ofertas SICOP	0 días	lun 28/2/22	lun 28/2/22	1260										
1263		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 28/2/22	lun 28/2/22	1262										
1264		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 28/2/22	vie 4/3/22	1263										
1265		UT hace prevenciones a oferentes	0 días	vie 4/3/22	vie 4/3/22	1264										
1266		Oferentes responden a prevenciones	2 días	vie 4/3/22	mar 8/3/22	1265										
1267		UT analiza respuesta(s) a prevenciones	2 días	mar 8/3/22	jue 10/3/22	1266										
1268		Elaboración de Informe Técnico (UT)	1 día	jue 10/3/22	vie 11/3/22	1267										
1269		Recomendación, adjudicación y comunicación	1 día	vie 11/3/22	lun 14/3/22											
1270		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 11/3/22	lun 14/3/22	1268										
1271		Recurso de revocatoria	11 días	lun 14/3/22	mar 29/3/22											
1272		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 14/3/22	mié 16/3/22	1270										
1273		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 16/3/22	vie 18/3/22	1272										
1274		Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 18/3/22	mar 22/3/22	1273										
1275		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	mar 22/3/22	vie 25/3/22	1274										
1276		Adjudicación en firme	2 días	vie 25/3/22	mar 29/3/22	1275										
1277		Trámite del Pedido	5 días	mar 29/3/22	mar 5/4/22											
1278		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 29/3/22	mié 30/3/22	1276										
1279		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 30/3/22	lun 4/4/22	1278										
1280		Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 4/4/22	mar 5/4/22	1279										
1281		Recepción de los ítems	13 días	mar 5/4/22	vie 29/4/22											
1282		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 5/4/22	mar 26/4/22	1280										
1283		Recibido a satisfacción	3 días	mar 26/4/22	vie 29/4/22	1282										
1284		Trámite de pago	32 días	vie 29/4/22	mar 14/6/22											
1285		Envío documentos a Financiero	2 días	vie 29/4/22	mar 3/5/22	1283										
1286		Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 3/5/22	mar 14/6/22	1285										
1287		Conclusión trámite de Contratación	0 días	mar 14/6/22	mar 14/6/22	1286										
1288		2022CD-00010; USG; Mantenimiento a la subestación eléctrica; envían especificaciones 31/3/2022; \$2.000.000 / 2022 Gabriela Solano- Carlos Leal	91,5 días	jue 31/3/22	mié 17/8/22											
1289		Elaboración de Cartel	5,5 días	jue 31/3/22	jue 7/4/22											
1290		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	jue 31/3/22	jue 31/3/22	1289										
1291		Elaboración del cartel (USP)	2 días	jue 31/3/22	vie 1/4/22	1290										
1292		Revisión Técnica de cartel	1 día	lun 4/4/22	lun 4/4/22	1291										
1293		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	mar 5/4/22	mar 5/4/22	1292										
1294		Confección de cartel definitivo	1 día	mié 6/4/22	mié 6/4/22	1293										
1295		Invitación a participar en SICOP	0,5 días	jue 7/4/22	jue 7/4/22	1294										
1296		Recepción y estudio de ofertas	24 días	jue 7/4/22	mié 18/5/22											
1297		Invitación a participar	15 días	jue 7/4/22	jue 5/5/22											
1298		Plazo para recepción de ofertas	5 días	jue 7/4/22	jue 21/4/22	1295										
1299		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	jue 7/4/22	vie 8/4/22	1298CC										
1300		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	vie 8/4/22	vie 29/4/22	1299										
1301		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	vie 29/4/22	jue 5/5/22	1300										
1302		Recepción y estudio de ofertas	9 días	jue 5/5/22	mié 18/5/22											
1303		Apertura de ofertas SICOP	0 días	jue 5/5/22	jue 5/5/22	1302										
1304		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	jue 5/5/22	jue 5/5/22	1303										
1305		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	jue 5/5/22	mié 11/5/22	1304										
1306		UT hace prevenciones a oferentes	0 días	mié 11/5/22	mié 11/5/22	1305										
1307		Oferentes responden a prevenciones	2 días	mié 11/5/22	vie 13/5/22	1306										
1308		UT analiza respuesta(s) a prevenciones	2 días	vie 13/5/22	mar 17/5/22	1307										
1309		Elaboración de Informe Técnico (UT)	1 día	mar 17/5/22	mié 18/5/22	1308										

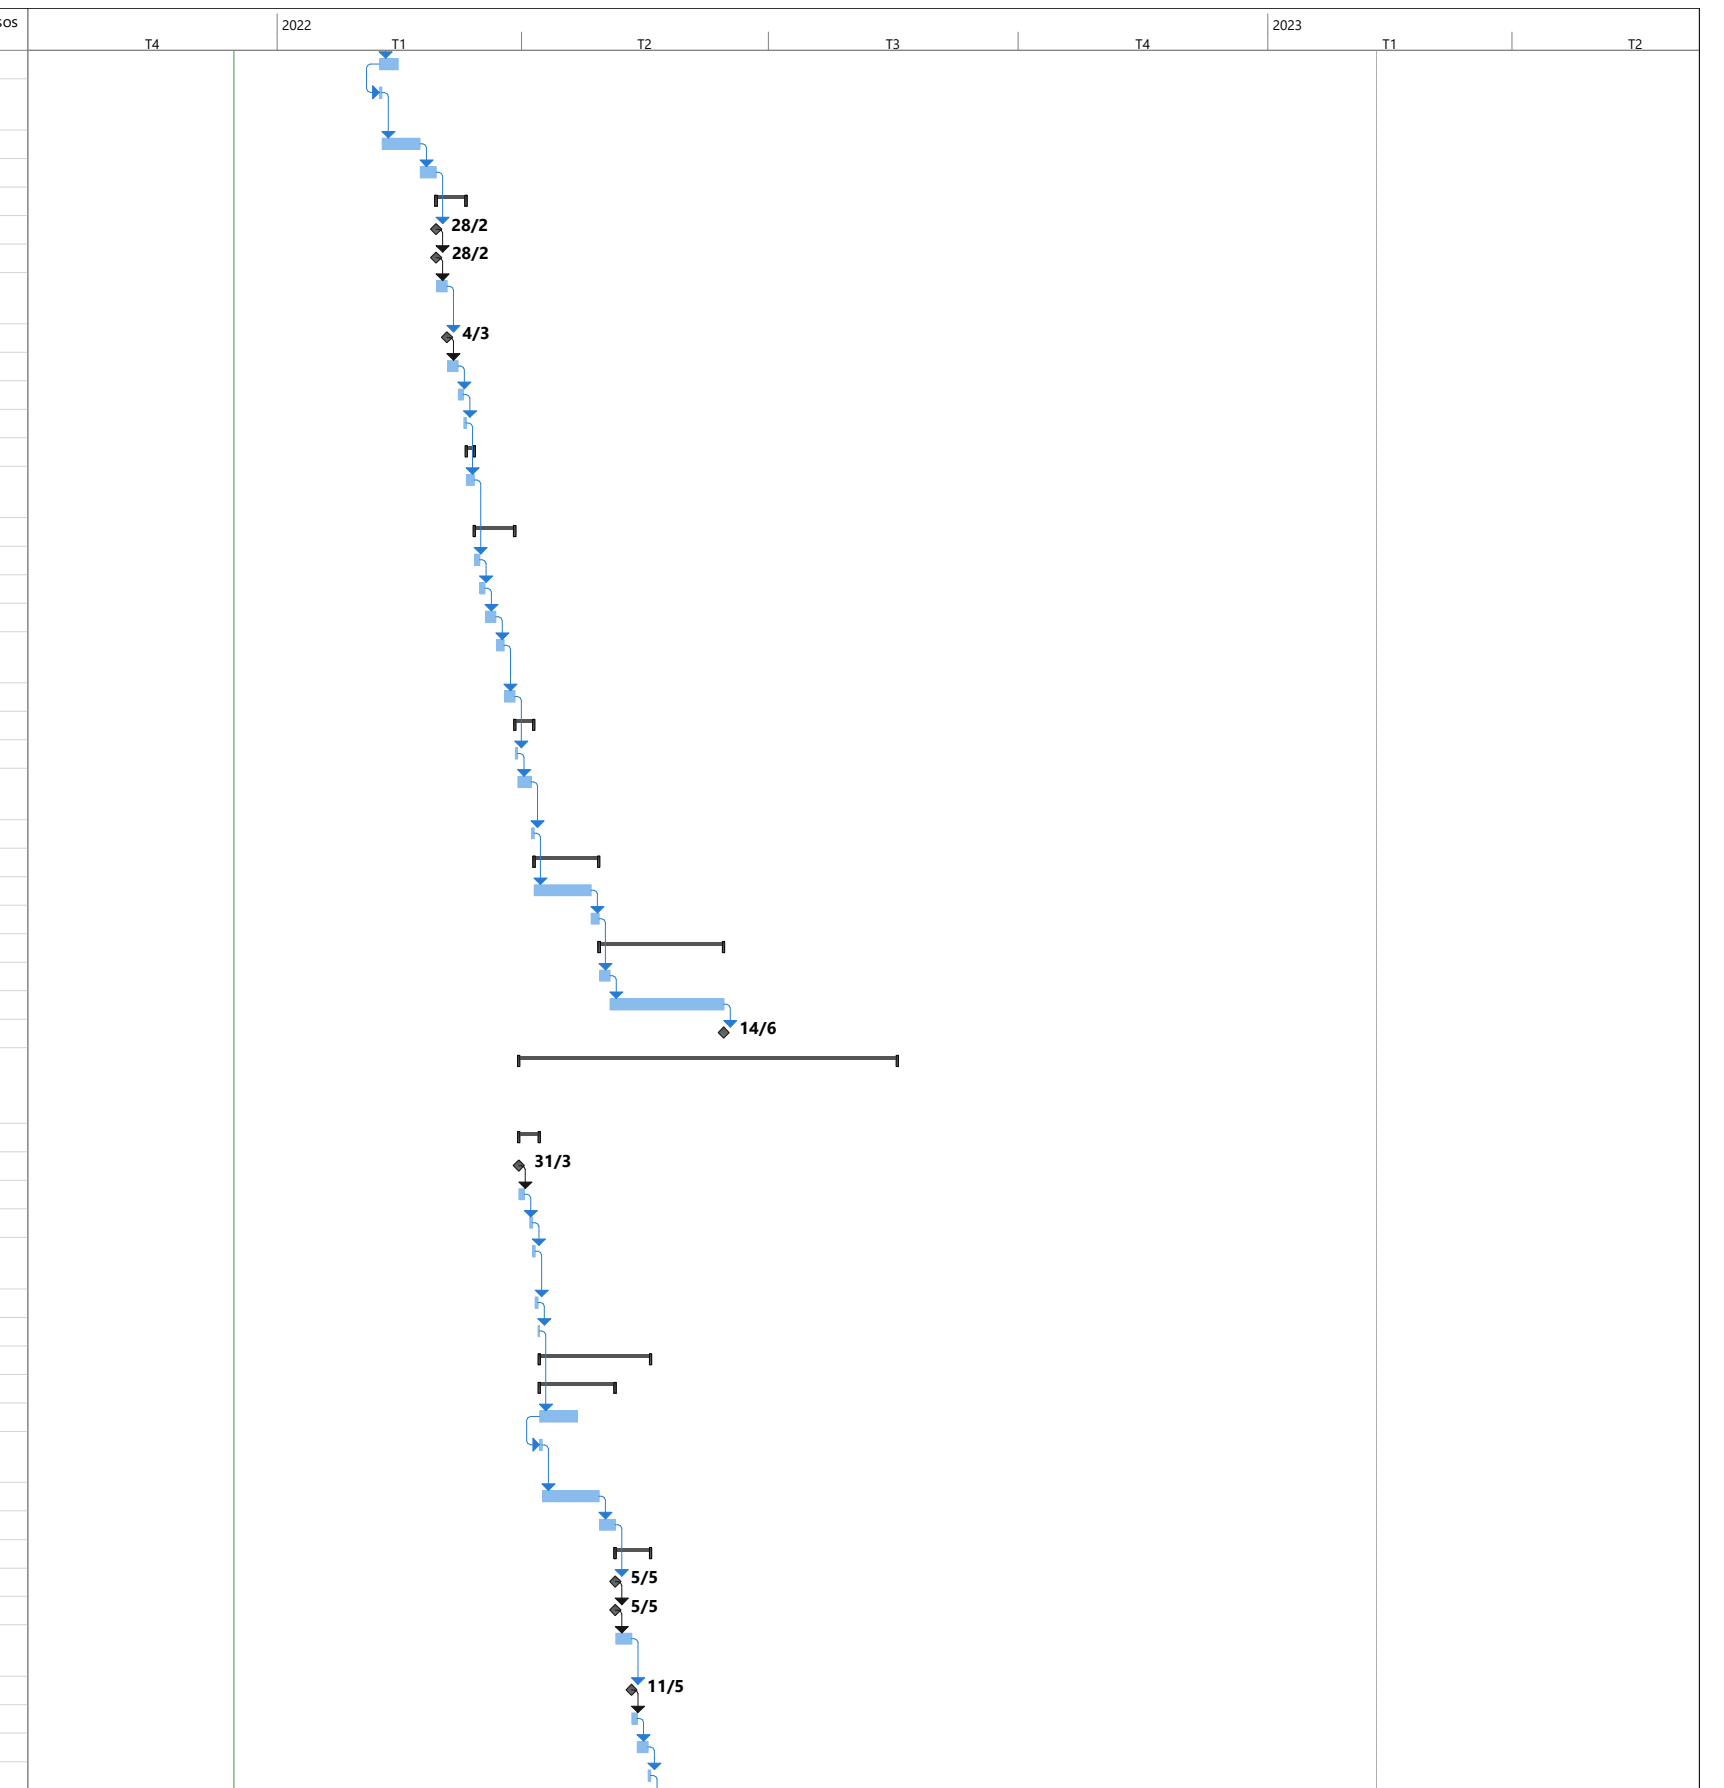

Proyecto: Cronograma de comp
 Fecha: jue 16/12/21

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Progreso manual
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Progreso	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023	T1	T2
1310		Recomendación, adjudicación y comunicación	1 día	mié 18/5/22	jue 19/5/22											
1311		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	mié 18/5/22	jue 19/5/22	1309										
1312		Recurso de revocatoria	11 días	jue 19/5/22	vie 3/6/22											
1313		Plazo para recibir recurso	2 días	jue 19/5/22	lun 23/5/22	1311										
1314		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	lun 23/5/22	mié 25/5/22	1313										
1315		Plazo para audiencia inicial	2 días	mié 25/5/22	vie 27/5/22	1314										
1316		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	vie 27/5/22	mié 1/6/22	1315										
1317		Adjudicación en firme	2 días	mié 1/6/22	vie 3/6/22	1316										
1318		Trámite del Pedido	5 días	vie 3/6/22	vie 10/6/22											
1319		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	vie 3/6/22	lun 6/6/22	1317										
1320		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	lun 6/6/22	jue 9/6/22	1319										
1321		Notificación de Pedido de Compra	1 día	jue 9/6/22	vie 10/6/22	1320										
1322		Recepción de los items	13 días	vie 10/6/22	mié 29/6/22											
1323		Entrega de los bienes/servicios	10 días	vie 10/6/22	vie 24/6/22	1321										
1324		Recibido a satisfacción	3 días	vie 24/6/22	mié 29/6/22	1323										
1325		Trámite de pago	32 días	mié 29/6/22	mié 17/8/22											
1326		Envío documentos a Financiero	2 días	mié 29/6/22	vie 1/7/22	1324										
1327		Emisión de pago en Financiero	30 días	vie 1/7/22	mié 17/8/22	1326										
1328		Conclusión trámite de Contratación	0 días	mié 17/8/22	mié 17/8/22	1327										
1329		2022CD-00011-503; USG; Sillas especiales y descansapiés; contrato finaliza 12/8/2022; \$700.000 /2022; Carlos Leal - Gabriela Solano	91,5 días	lun 18/4/22	vie 26/8/22											
1330		Elaboración de Cartel	5,5 días	lun 18/4/22	lun 25/4/22											
1331		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 18/4/22	lun 18/4/22											
1332		Elaboración del cartel (USP)	2 días	lun 18/4/22	mar 19/4/22	1331										
1333		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 20/4/22	mié 20/4/22	1332										
1334		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 21/4/22	jue 21/4/22	1333										
1335		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 22/4/22	vie 22/4/22	1334										
1336		Invitación a participar en SICOP	0,5 días	lun 25/4/22	lun 25/4/22	1335										
1337		Recepción y estudio de ofertas	24 días	lun 25/4/22	vie 27/5/22											
1338		Invitación a participar	15 días	lun 25/4/22	lun 16/5/22											
1339		Plazo para recepción de ofertas	5 días	lun 25/4/22	lun 2/5/22	1336										
1340		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 25/4/22	mar 26/4/22	1339CC										
1341		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 26/4/22	mar 10/5/22	1340										
1342		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 10/5/22	lun 16/5/22	1341										
1343		Recepción y estudio de ofertas	9 días	lun 16/5/22	vie 27/5/22											
1344		Apertura de ofertas SICOP	0 días	lun 16/5/22	lun 16/5/22	1342										
1345		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 16/5/22	lun 16/5/22	1344										
1346		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 16/5/22	vie 20/5/22	1345										
1347		UT hace prevenciones a oferentes	0 días	vie 20/5/22	vie 20/5/22	1346										
1348		Oferentes responden a prevenciones	2 días	vie 20/5/22	mar 24/5/22	1347										
1349		UT analiza respuesta(s) a prevenciones	2 días	mar 24/5/22	jue 26/5/22	1348										
1350		Elaboración de Informe Técnico (UT)	1 día	jue 26/5/22	vie 27/5/22	1349										
1351		Recomendación, adjudicación y comunicación	1 día	vie 27/5/22	lun 30/5/22											
1352		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 27/5/22	lun 30/5/22	1350										
1353		Recurso de revocatoria	11 días	lun 30/5/22	mar 14/6/22											
1354		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 30/5/22	mié 1/6/22	1352										
1355		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 1/6/22	vie 3/6/22	1354										
1356		Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 3/6/22	mar 7/6/22	1355										
1357		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	mar 7/6/22	vie 10/6/22	1356										
1358		Adjudicación en firme	2 días	vie 10/6/22	mar 14/6/22	1357										
1359		Trámite del Pedido	5 días	mar 14/6/22	mar 21/6/22											
1360		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 14/6/22	mié 15/6/22	1358										
1361		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 15/6/22	lun 20/6/22	1360										

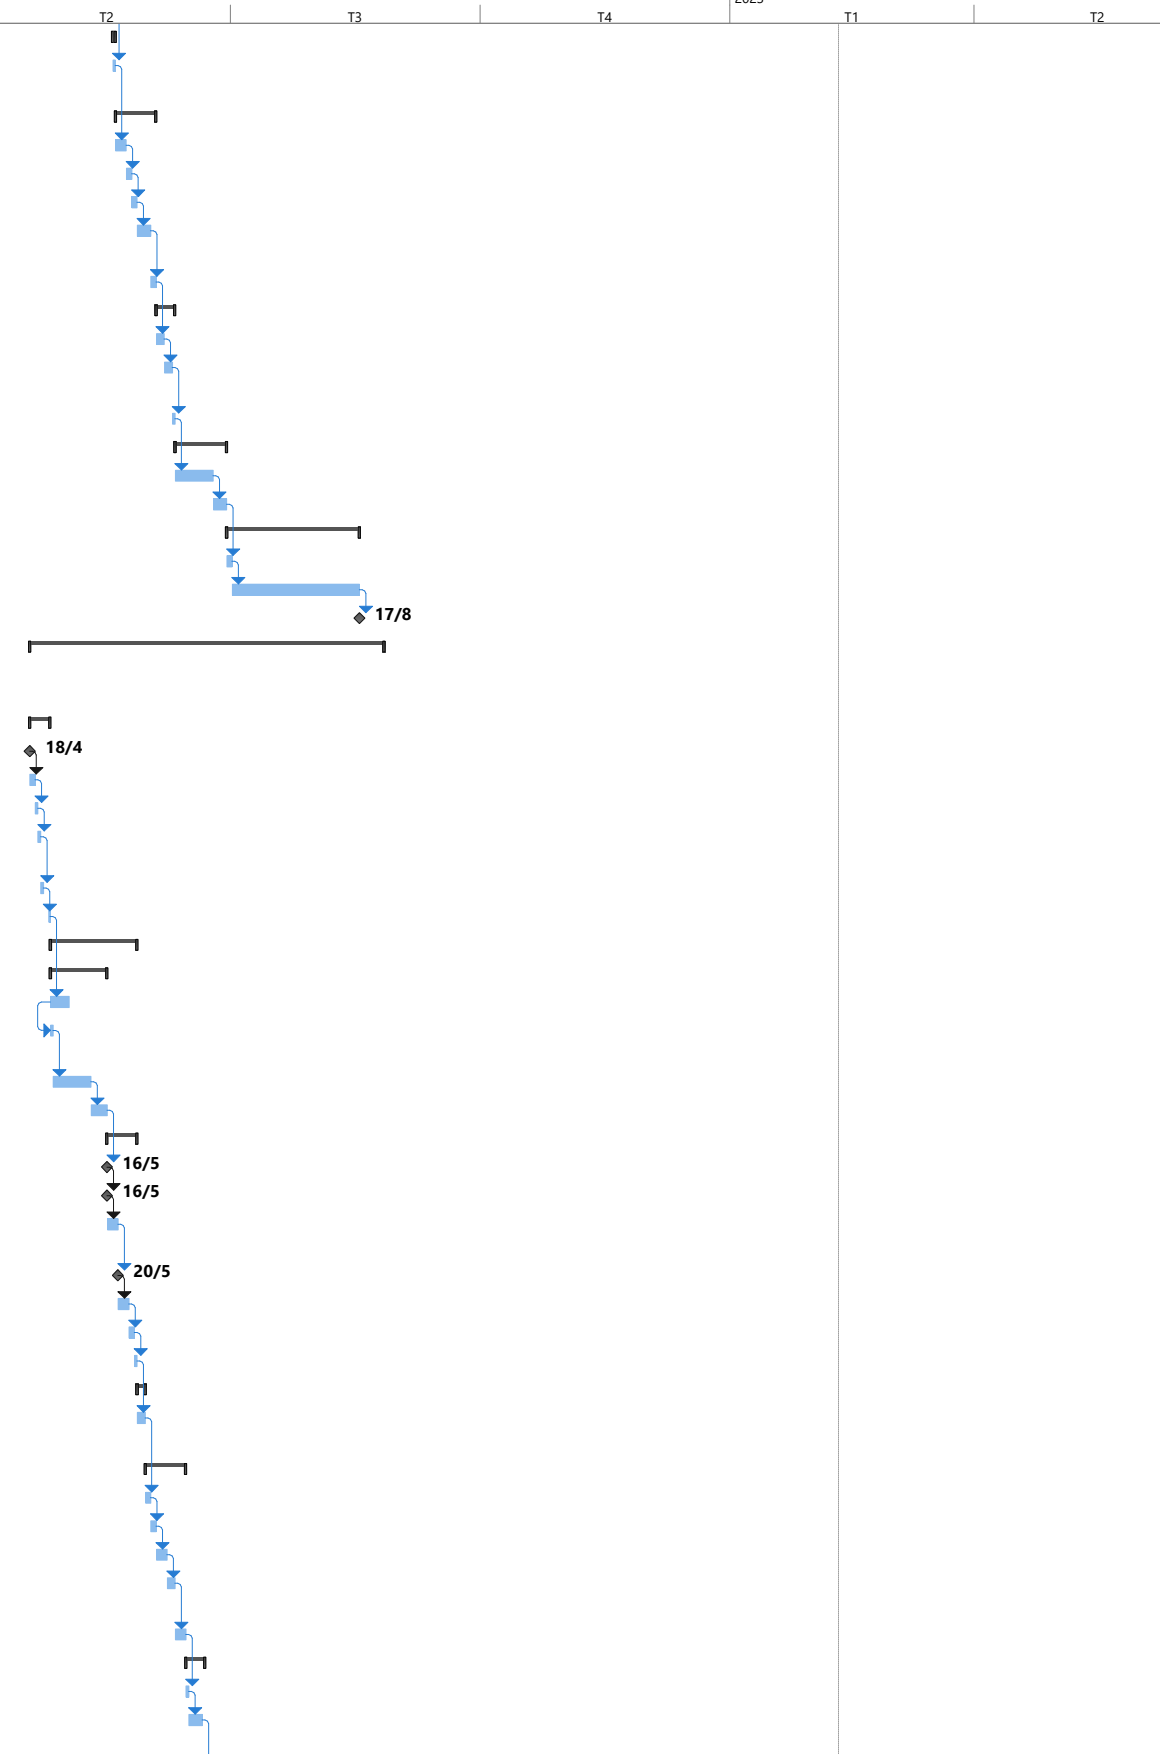

Proyecto: Cronograma de comp
Fecha: jue 16/12/21

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Progreso manual
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Progreso	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023	T1	T2
1362		Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 20/6/22	mar 21/6/22	1361										
1363		Recepción de los items	13 días	mar 21/6/22	vie 8/7/22											
1364		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 21/6/22	mar 5/7/22	1362										
1365		Recibido a satisfacción	3 días	mar 5/7/22	vie 8/7/22	1364										
1366		Trámite de pago	32 días	vie 8/7/22	vie 26/8/22											
1367		Envío documentos a Financiero	2 días	vie 8/7/22	mar 12/7/22	1365										
1368		Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 12/7/22	vie 26/8/22	1367										
1369		Conclusión trámite de Contratación	0 días	vie 26/8/22	vie 26/8/22	1368										
1370		UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (UTI)	110,5 días	lun 7/3/22	jue 18/8/22											
1371		2022CD-00012-503; UTI; Certificado digital para servidores; Contrato vence 05/09/2022; Envían especificaciones el 07/03/2022@2,506.000 / 2022; Carlos Leal - Yeimy Mora	91,5 días	lun 7/3/22	mar 19/7/22											
1372		Elaboración de Cartel	5,5 días	lun 7/3/22	lun 14/3/22											
1373		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 7/3/22	lun 7/3/22											
1374		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 7/3/22	mar 8/3/22	1373										
1375		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 9/3/22	mié 9/3/22	1374										
1376		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 10/3/22	jue 10/3/22	1375										
1377		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 11/3/22	vie 11/3/22	1376										
1378		Invitación a participar en SICOP	0,5 días	lun 14/3/22	lun 14/3/22	1377										
1379		Recepción y estudio de ofertas	24 días	lun 14/3/22	vie 22/4/22											
1380		Invitación a participar	15 días	lun 14/3/22	lun 4/4/22											
1381		Plazo para recepción de ofertas	5 días	lun 14/3/22	lun 21/3/22	1378										
1382		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 14/3/22	mar 15/3/22	1381CC										
1383		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 15/3/22	mar 29/3/22	1382										
1384		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 29/3/22	lun 4/4/22	1383										
1385		Recepción y estudio de ofertas	9 días	lun 4/4/22	vie 22/4/22											
1386		Apertura de ofertas SICOP	0 días	lun 4/4/22	lun 4/4/22	1384										
1387		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 4/4/22	lun 4/4/22	1386										
1388		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 4/4/22	vie 8/4/22	1387										
1389		UT hace prevenciones a oferentes	0 días	vie 8/4/22	vie 8/4/22	1388										
1390		Oferentes responden a prevenciones	2 días	vie 8/4/22	mar 19/4/22	1389										
1391		UT analiza respuesta(s) a prevenciones	2 días	mar 19/4/22	jue 21/4/22	1390										
1392		Elaboración de Informe Técnico (UT)	1 día	jue 21/4/22	vie 22/4/22	1391										
1393		Recomendación, adjudicación y comunicación	1 día	vie 22/4/22	lun 25/4/22											
1394		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 22/4/22	lun 25/4/22	1392										
1395		Recurso de revocatoria	11 días	lun 25/4/22	mar 10/5/22											
1396		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 25/4/22	mié 27/4/22	1394										
1397		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 27/4/22	vie 29/4/22	1396										
1398		Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 29/4/22	mar 3/5/22	1397										
1399		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	mar 3/5/22	vie 6/5/22	1398										
1400		Adjudicación en firme	2 días	vie 6/5/22	mar 10/5/22	1399										
1401		Trámite del Pedido	5 días	mar 10/5/22	mar 17/5/22											
1402		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 10/5/22	mié 11/5/22	1400										
1403		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 11/5/22	lun 16/5/22	1402										
1404		Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 16/5/22	mar 17/5/22	1403										
1405		Recepción de los items	13 días	mar 17/5/22	vie 3/6/22											
1406		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 17/5/22	mar 31/5/22	1404										
1407		Recibido a satisfacción	3 días	mar 31/5/22	vie 3/6/22	1406										
1408		Trámite de pago	32 días	vie 3/6/22	mar 19/7/22											
1409		Envío documentos a Financiero	2 días	vie 3/6/22	mar 7/6/22	1407										
1410		Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 7/6/22	mar 19/7/22	1409										
1411		Conclusión trámite de Contratación	0 días	mar 19/7/22	mar 19/7/22	1410										
1412		2022CD-00013-503; UTI; Accesorios; envían especificaciones 01/04/2022; @2,995.000/2022; Ingrid Noguera - Gabriela Solano	91,5 días	vie 1/4/22	jue 18/8/22											
1413		Elaboración de Cartel	5,5 días	vie 1/4/22	vie 8/4/22											

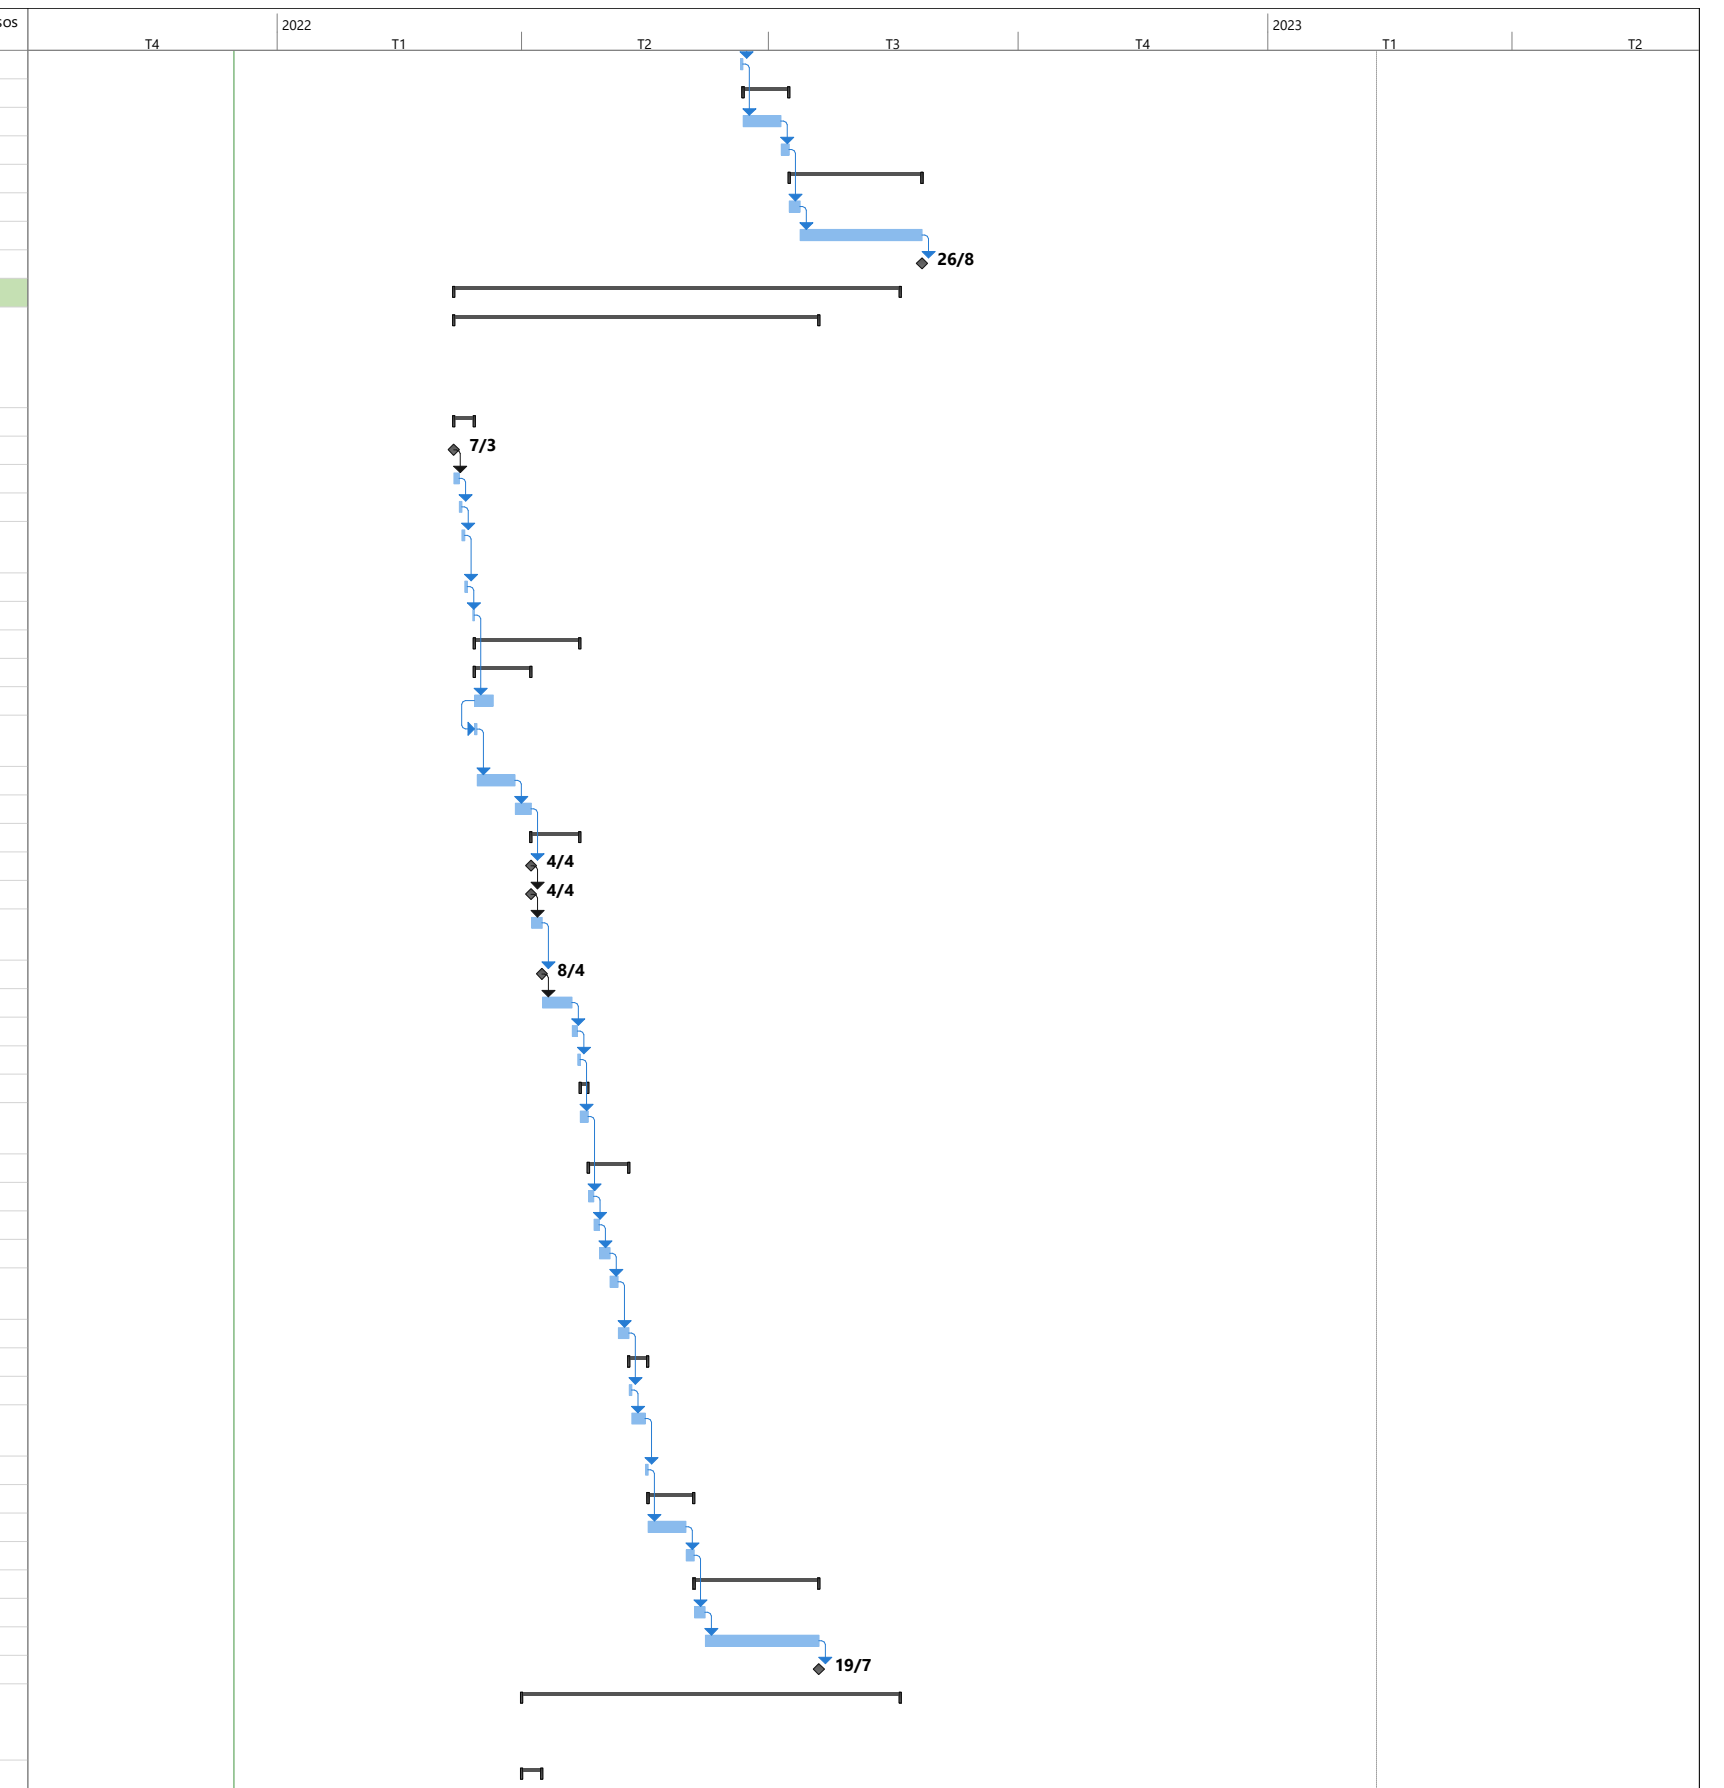

Proyecto: Cronograma de comp
Fecha: jue 16/12/21


Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		Progreso manual	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha limite			
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023	T1	T2
1414		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	vie 1/4/22	vie 1/4/22						1/4					
1415		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	vie 1/4/22	lun 4/4/22	1414										
1416		Revisión Técnica de cartel	1 día	mar 5/4/22	mar 5/4/22	1415										
1417		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	mié 6/4/22	mié 6/4/22	1416										
1418		Confección de cartel definitivo	1 día	jue 7/4/22	jue 7/4/22	1417										
1419		Invitación a participar en SICOP	0,5 días	vie 8/4/22	vie 8/4/22	1418										
1420		Recepción y estudio de ofertas	24 días	vie 8/4/22	jue 19/5/22											
1421		Invitación a participar	15 días	vie 8/4/22	vie 6/5/22											
1422		Plazo para recepción de ofertas	5 días	vie 8/4/22	vie 22/4/22	1419										
1423		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	vie 8/4/22	lun 18/4/22	1422CC										
1424		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	lun 18/4/22	lun 2/5/22	1423										
1425		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	lun 2/5/22	vie 6/5/22	1424										
1426		Recepción y estudio de ofertas	9 días	vie 6/5/22	jue 19/5/22											
1427		Apertura de ofertas SICOP	0 días	vie 6/5/22	vie 6/5/22	1425					6/5					
1428		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	vie 6/5/22	vie 6/5/22	1427					6/5					
1429		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	vie 6/5/22	jue 12/5/22	1428										
1430		UT hace prevenciones a oferentes	0 días	jue 12/5/22	jue 12/5/22	1429										
1431		Oferentes responden a prevenciones	2 días	jue 12/5/22	lun 16/5/22	1430										
1432		UT analiza respuesta(s) a prevenciones	2 días	lun 16/5/22	mié 18/5/22	1431										
1433		Elaboración de Informe Técnico (UT)	1 día	mié 18/5/22	jue 19/5/22	1432										
1434		Recomendación, adjudicación y comunicación	1 día	jue 19/5/22	vie 20/5/22											
1435		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	jue 19/5/22	vie 20/5/22	1433										
1436		Recurso de revocatoria	11 días	vie 20/5/22	lun 6/6/22											
1437		Plazo para recibir recurso	2 días	vie 20/5/22	mar 24/5/22	1435										
1438		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mar 24/5/22	jue 26/5/22	1437										
1439		Plazo para audiencia inicial	2 días	jue 26/5/22	lun 30/5/22	1438										
1440		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	lun 30/5/22	jue 2/6/22	1439										
1441		Adjudicación en firme	2 días	jue 2/6/22	lun 6/6/22	1440										
1442		Trámite del Pedido	5 días	lun 6/6/22	lun 13/6/22											
1443		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	lun 6/6/22	mar 7/6/22	1441										
1444		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mar 7/6/22	vie 10/6/22	1443										
1445		Notificación de Pedido de Compra	1 día	vie 10/6/22	lun 13/6/22	1444										
1446		Recepción de los items	13 días	lun 13/6/22	jue 30/6/22											
1447		Entrega de los bienes/servicios	10 días	lun 13/6/22	lun 27/6/22	1445										
1448		Recibido a satisfacción	3 días	lun 27/6/22	jue 30/6/22	1447										
1449		Trámite de pago	32 días	jue 30/6/22	jue 18/8/22											
1450		Envío documentos a Financiero	2 días	jue 30/6/22	lun 4/7/22	1448										
1451		Emisión de pago en Financiero	30 días	lun 4/7/22	jue 18/8/22	1450										
1452		Conclusión trámite de Contratación	0 días	jue 18/8/22	jue 18/8/22	1451										
1453		AUDITORÍA INTERNA	91,5 días	lun 7/3/22	mar 19/7/22											
1454		2022CD-00014-503; AI; Revisión entre pares; contratado agosto 2022; Envían especificaciones el 07/03/2022@1,000.000/2022; Walter Araya - Carlos Leal	91,5 días	lun 7/3/22	mar 19/7/22											
1455		Elaboración de Cartel	5,5 días	lun 7/3/22	lun 14/3/22											
1456		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 7/3/22	lun 7/3/22						7/3					
1457		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 7/3/22	mar 8/3/22	1456										
1458		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 9/3/22	mié 9/3/22	1457										
1459		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 10/3/22	jue 10/3/22	1458										
1460		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 11/3/22	vie 11/3/22	1459										
1461		Invitación a participar en SICOP	0,5 días	lun 14/3/22	lun 14/3/22	1460										
1462		Recepción y estudio de ofertas	24 días	lun 14/3/22	vie 22/4/22											
1463		Invitación a participar	15 días	lun 14/3/22	lun 4/4/22											
1464		Plazo para recepción de ofertas	5 días	lun 14/3/22	lun 21/3/22	1461										
1465		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 14/3/22	mar 15/3/22	1464CC										

Proyecto: Cronograma de comp
Fecha: jue 16/12/21

Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		Progreso manual	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha limite			
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023	T1	T2
1466		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 15/3/22	mar 29/3/22	1465										
1467		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 29/3/22	lun 4/4/22	1466										
1468		Recepción y estudio de ofertas	9 días	lun 4/4/22	vie 22/4/22											
1469		Apertura de ofertas SICOP	0 días	lun 4/4/22	lun 4/4/22	1467										
1470		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 4/4/22	lun 4/4/22	1469										
1471		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 4/4/22	vie 8/4/22	1470										
1472		UT hace prevenciones a oferentes	0 días	vie 8/4/22	vie 8/4/22	1471										
1473		Oferentes responden a prevenciones	2 días	vie 8/4/22	mar 19/4/22	1472										
1474		UT analiza respuesta(s) a prevenciones	2 días	mar 19/4/22	jue 21/4/22	1473										
1475		Elaboración de Informe Técnico (UT)	1 día	jue 21/4/22	vie 22/4/22	1474										
1476		Recomendación, adjudicación y comunicación	1 día	vie 22/4/22	lun 25/4/22											
1477		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 22/4/22	lun 25/4/22	1475										
1478		Recurso de revocatoria	11 días	lun 25/4/22	mar 10/5/22											
1479		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 25/4/22	mié 27/4/22	1477										
1480		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 27/4/22	vie 29/4/22	1479										
1481		Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 29/4/22	mar 3/5/22	1480										
1482		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	mar 3/5/22	vie 6/5/22	1481										
1483		Adjudicación en firme	2 días	vie 6/5/22	mar 10/5/22	1482										
1484		Trámite del Pedido	5 días	mar 10/5/22	mar 17/5/22											
1485		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 10/5/22	mié 11/5/22	1483										
1486		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 11/5/22	lun 16/5/22	1485										
1487		Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 16/5/22	mar 17/5/22	1486										
1488		Recepción de los items	13 días	mar 17/5/22	vie 3/6/22											
1489		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 17/5/22	mar 31/5/22	1487										
1490		Recibido a satisfacción	3 días	mar 31/5/22	vie 3/6/22	1489										
1491		Trámite de pago	32 días	vie 3/6/22	mar 19/7/22											
1492		Envío documentos a Financiero	2 días	vie 3/6/22	mar 7/6/22	1490										
1493		Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 7/6/22	mar 19/7/22	1492										
1494		Conclusión trámite de Contratación	0 días	mar 19/7/22	mar 19/7/22	1493										
1495		DIVISIÓN JURÍDICA	91,5 días	lun 7/2/22	mar 21/6/22											
1496		2022CD-00015-503; DJ; Servicios de filología; Contrato vence 24/05/2022; Envían especificaciones el 07/02/2022 \$341.000 /2022; Gabriela Solano - Silvia Castro	91,5 días	lun 7/2/22	mar 21/6/22											
1497		Elaboración de Cartel	5,5 días	lun 7/2/22	lun 14/2/22											
1498		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 7/2/22	lun 7/2/22	1497										
1499		Elaboración del cartel (USP)	2 días	lun 7/2/22	mar 8/2/22	1498										
1500		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 9/2/22	mié 9/2/22	1499										
1501		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 10/2/22	jue 10/2/22	1500										
1502		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 11/2/22	vie 11/2/22	1501										
1503		Invitación a participar en SICOP	0,5 días	lun 14/2/22	lun 14/2/22	1502										
1504		Recepción y estudio de ofertas	24 días	lun 14/2/22	vie 18/3/22											
1505		Invitación a participar	15 días	lun 14/2/22	lun 7/3/22											
1506		Plazo para recepción de ofertas	5 días	lun 14/2/22	lun 21/2/22	1503										
1507		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 14/2/22	mar 15/2/22	1506CC										
1508		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 15/2/22	mar 1/3/22	1507										
1509		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 1/3/22	lun 7/3/22	1508										
1510		Recepción y estudio de ofertas	9 días	lun 7/3/22	vie 18/3/22											
1511		Apertura de ofertas SICOP	0 días	lun 7/3/22	lun 7/3/22	1509										
1512		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 7/3/22	lun 7/3/22	1511										
1513		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 7/3/22	vie 11/3/22	1512										
1514		UT hace prevenciones a oferentes	0 días	vie 11/3/22	vie 11/3/22	1513										
1515		Oferentes responden a prevenciones	2 días	vie 11/3/22	mar 15/3/22	1514										
1516		UT analiza respuesta(s) a prevenciones	2 días	mar 15/3/22	jue 17/3/22	1515										
1517		Elaboración de Informe Técnico (UT)	1 día	jue 17/3/22	vie 18/3/22	1516										
1518		Recomendación, adjudicación y comunicación	1 día	vie 18/3/22	lun 21/3/22											

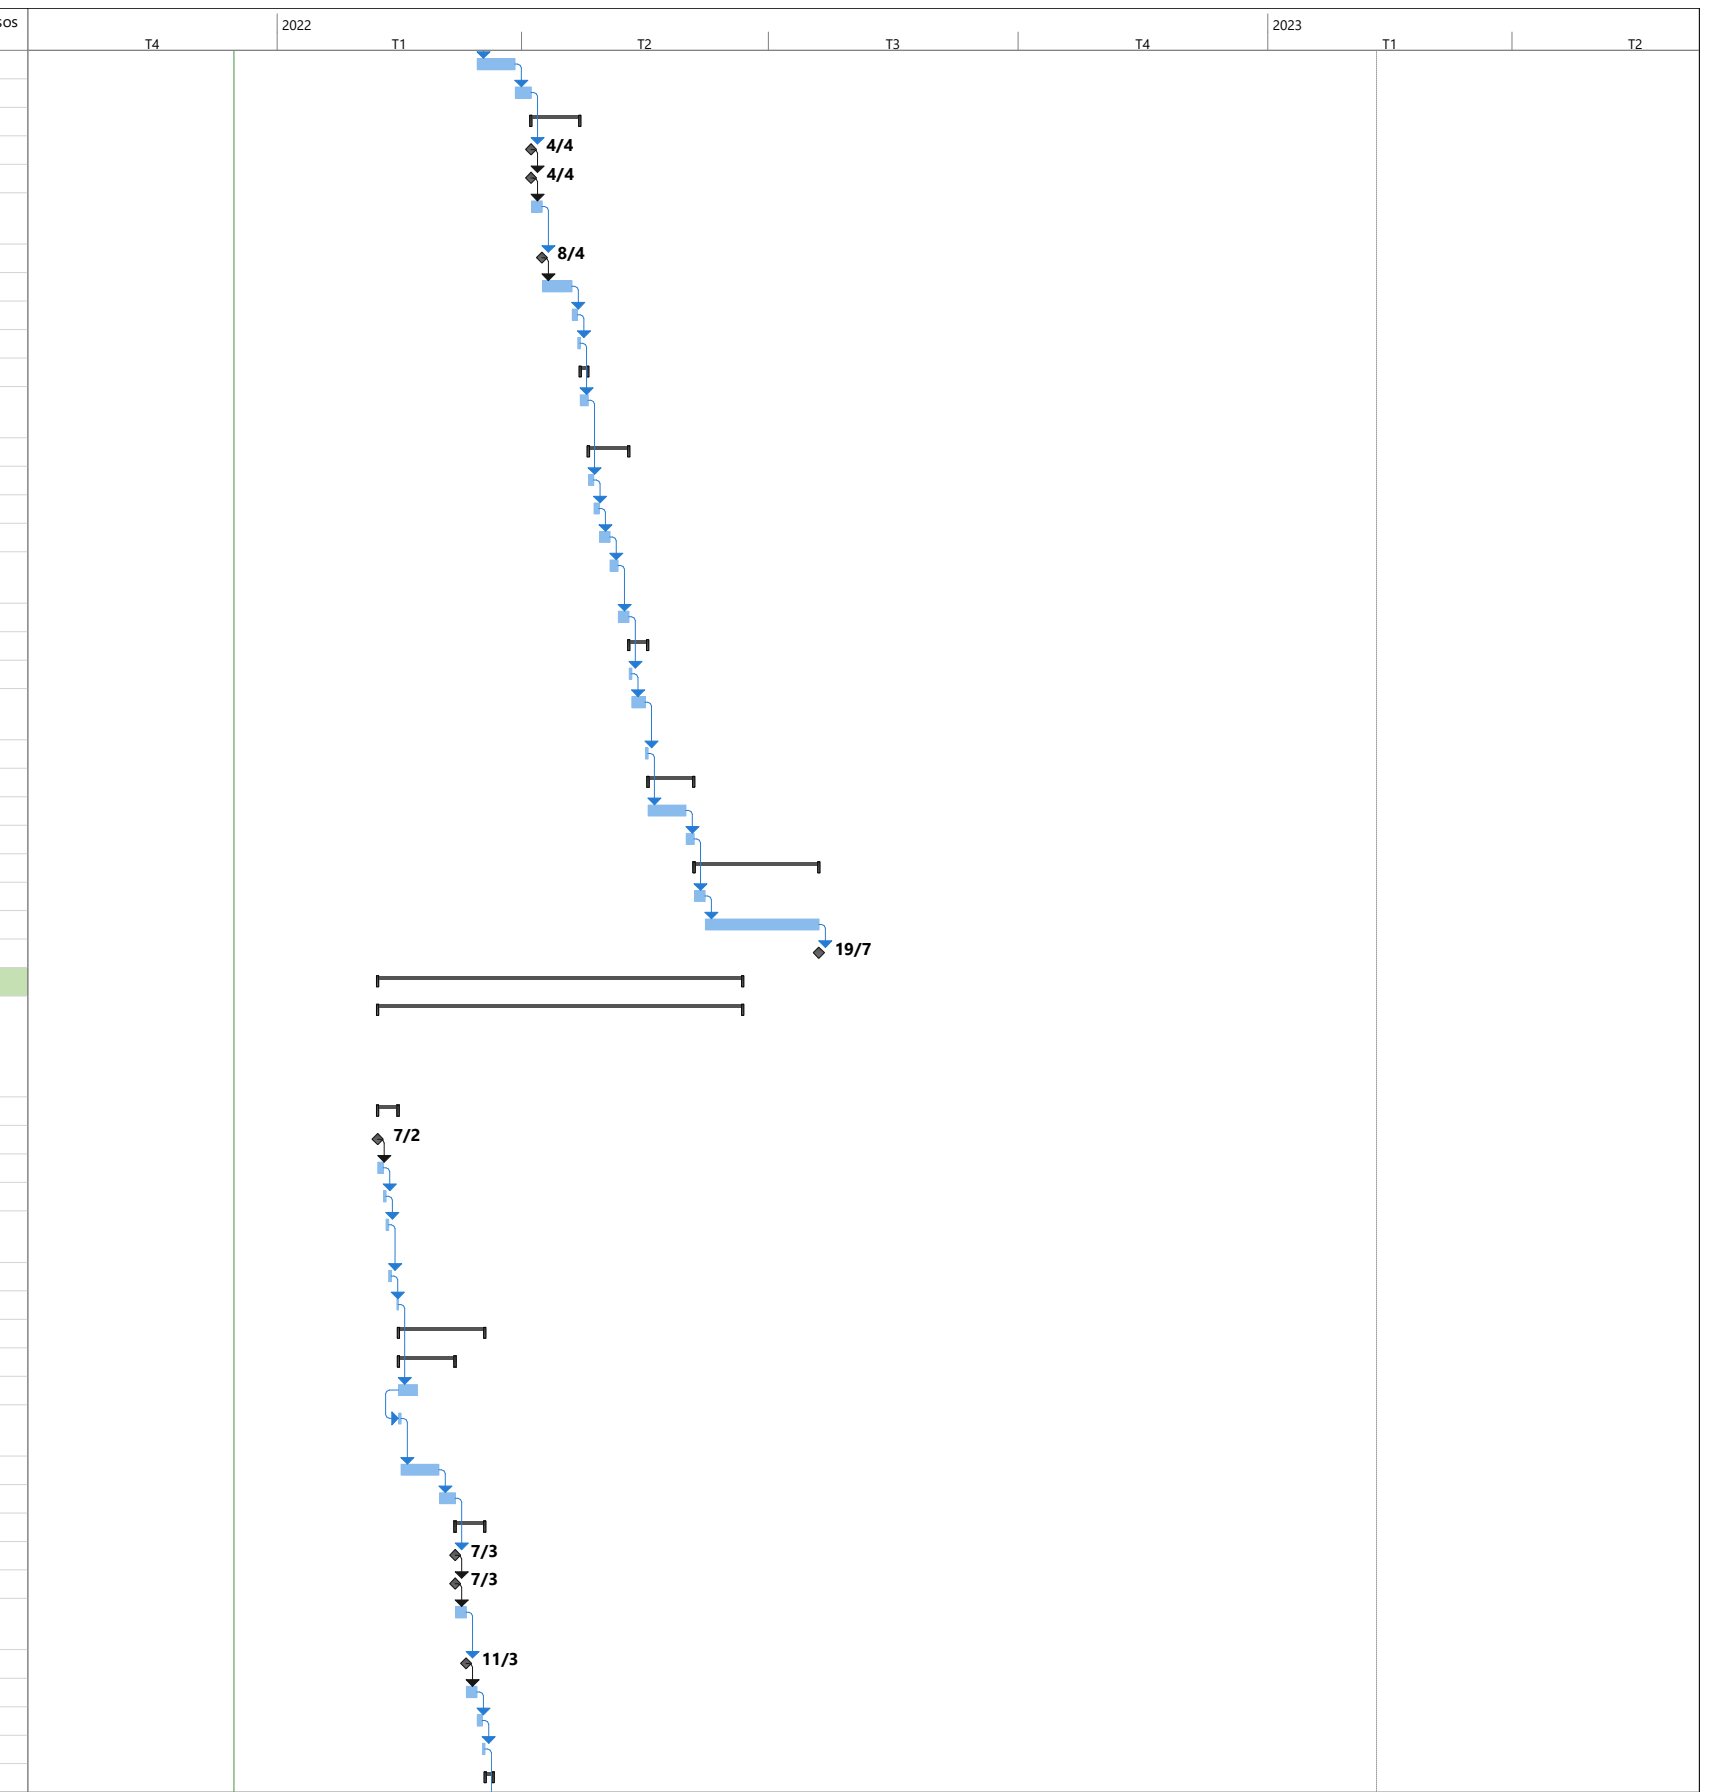

Proyecto: Cronograma de comp
Fecha: jue 16/12/21

Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		Progreso manual	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha limite			
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023	T1	T2
1519		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 18/3/22	lun 21/3/22	1517										
1520		Recurso de revocatoria	11 días	lun 21/3/22	mar 5/4/22											
1521		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 21/3/22	mié 23/3/22	1519										
1522		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 23/3/22	vie 25/3/22	1521										
1523		Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 25/3/22	mar 29/3/22	1522										
1524		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	mar 29/3/22	vie 1/4/22	1523										
1525		Adjudicación en firme	2 días	vie 1/4/22	mar 5/4/22	1524										
1526		Trámite del Pedido	5 días	mar 5/4/22	mar 19/4/22											
1527		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 5/4/22	mié 6/4/22	1525										
1528		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 6/4/22	lun 18/4/22	1527										
1529		Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 18/4/22	mar 19/4/22	1528										
1530		Recepción de los items	13 días	mar 19/4/22	vie 6/5/22											
1531		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 19/4/22	mar 3/5/22	1529										
1532		Recibido a satisfacción	3 días	mar 3/5/22	vie 6/5/22	1531										
1533		Trámite de pago	32 días	vie 6/5/22	mar 21/6/22											
1534		Envío documentos a Financiero	2 días	vie 6/5/22	mar 10/5/22	1532										
1535		Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 10/5/22	mar 21/6/22	1534										
1536		Conclusión trámite de Contratación	0 días	mar 21/6/22	mar 21/6/22	1535										
1537		UNIDAD DE GESTIÓN DE POTENCIAL HUMANO (UGPH)	156,5 días	lun 3/1/22	vie 19/8/22											
1538		2022CD-00016-503; UGPH; Pruebas MIL por demanda ; Contrato vence 27/11/2022; 1 Envian especificaciones el 04/04/2022año prorrogable 3 periodos adicionales; €7,000.000/2022; Ingrid Noguera - Eneyda Flores	91,5 días	lun 4/4/22	vie 19/8/22											
1539		Elaboración de Cartel	5,5 días	lun 4/4/22	lun 18/4/22											
1540		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 4/4/22	lun 4/4/22											
1541		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 4/4/22	mar 5/4/22	1540										
1542		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 6/4/22	mié 6/4/22	1541										
1543		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 7/4/22	jue 7/4/22	1542										
1544		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 8/4/22	vie 8/4/22	1543										
1545		Invitación a participar en SICOP	0,5 días	lun 18/4/22	lun 18/4/22	1544										
1546		Recepción y estudio de ofertas	24 días	lun 18/4/22	vie 20/5/22											
1547		Invitación a participar	15 días	lun 18/4/22	lun 9/5/22											
1548		Plazo para recepción de ofertas	5 días	lun 18/4/22	lun 25/4/22	1545										
1549		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 18/4/22	mar 19/4/22	1548CC										
1550		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 19/4/22	mar 3/5/22	1549										
1551		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 3/5/22	lun 9/5/22	1550										
1552		Recepción y estudio de ofertas	9 días	lun 9/5/22	vie 20/5/22											
1553		Apertura de ofertas SICOP	0 días	lun 9/5/22	lun 9/5/22	1551										
1554		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 9/5/22	lun 9/5/22	1553										
1555		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 9/5/22	vie 13/5/22	1554										
1556		UT hace prevenciones a oferentes	0 días	vie 13/5/22	vie 13/5/22	1555										
1557		Oferentes responden a prevenciones	2 días	vie 13/5/22	mar 17/5/22	1556										
1558		UT analiza respuesta(s) a prevenciones	2 días	mar 17/5/22	jue 19/5/22	1557										
1559		Elaboración de Informe Técnico (UT)	1 día	jue 19/5/22	vie 20/5/22	1558										
1560		Recomendación, adjudicación y comunicación	1 día	vie 20/5/22	lun 23/5/22											
1561		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 20/5/22	lun 23/5/22	1559										
1562		Recurso de revocatoria	11 días	lun 23/5/22	mar 7/6/22											
1563		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 23/5/22	mié 25/5/22	1561										
1564		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 25/5/22	vie 27/5/22	1563										
1565		Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 27/5/22	mar 31/5/22	1564										
1566		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	mar 31/5/22	vie 3/6/22	1565										
1567		Adjudicación en firme	2 días	vie 3/6/22	mar 7/6/22	1566										
1568		Trámite del Pedido	5 días	mar 7/6/22	mar 14/6/22											
1569		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 7/6/22	mié 8/6/22	1567										

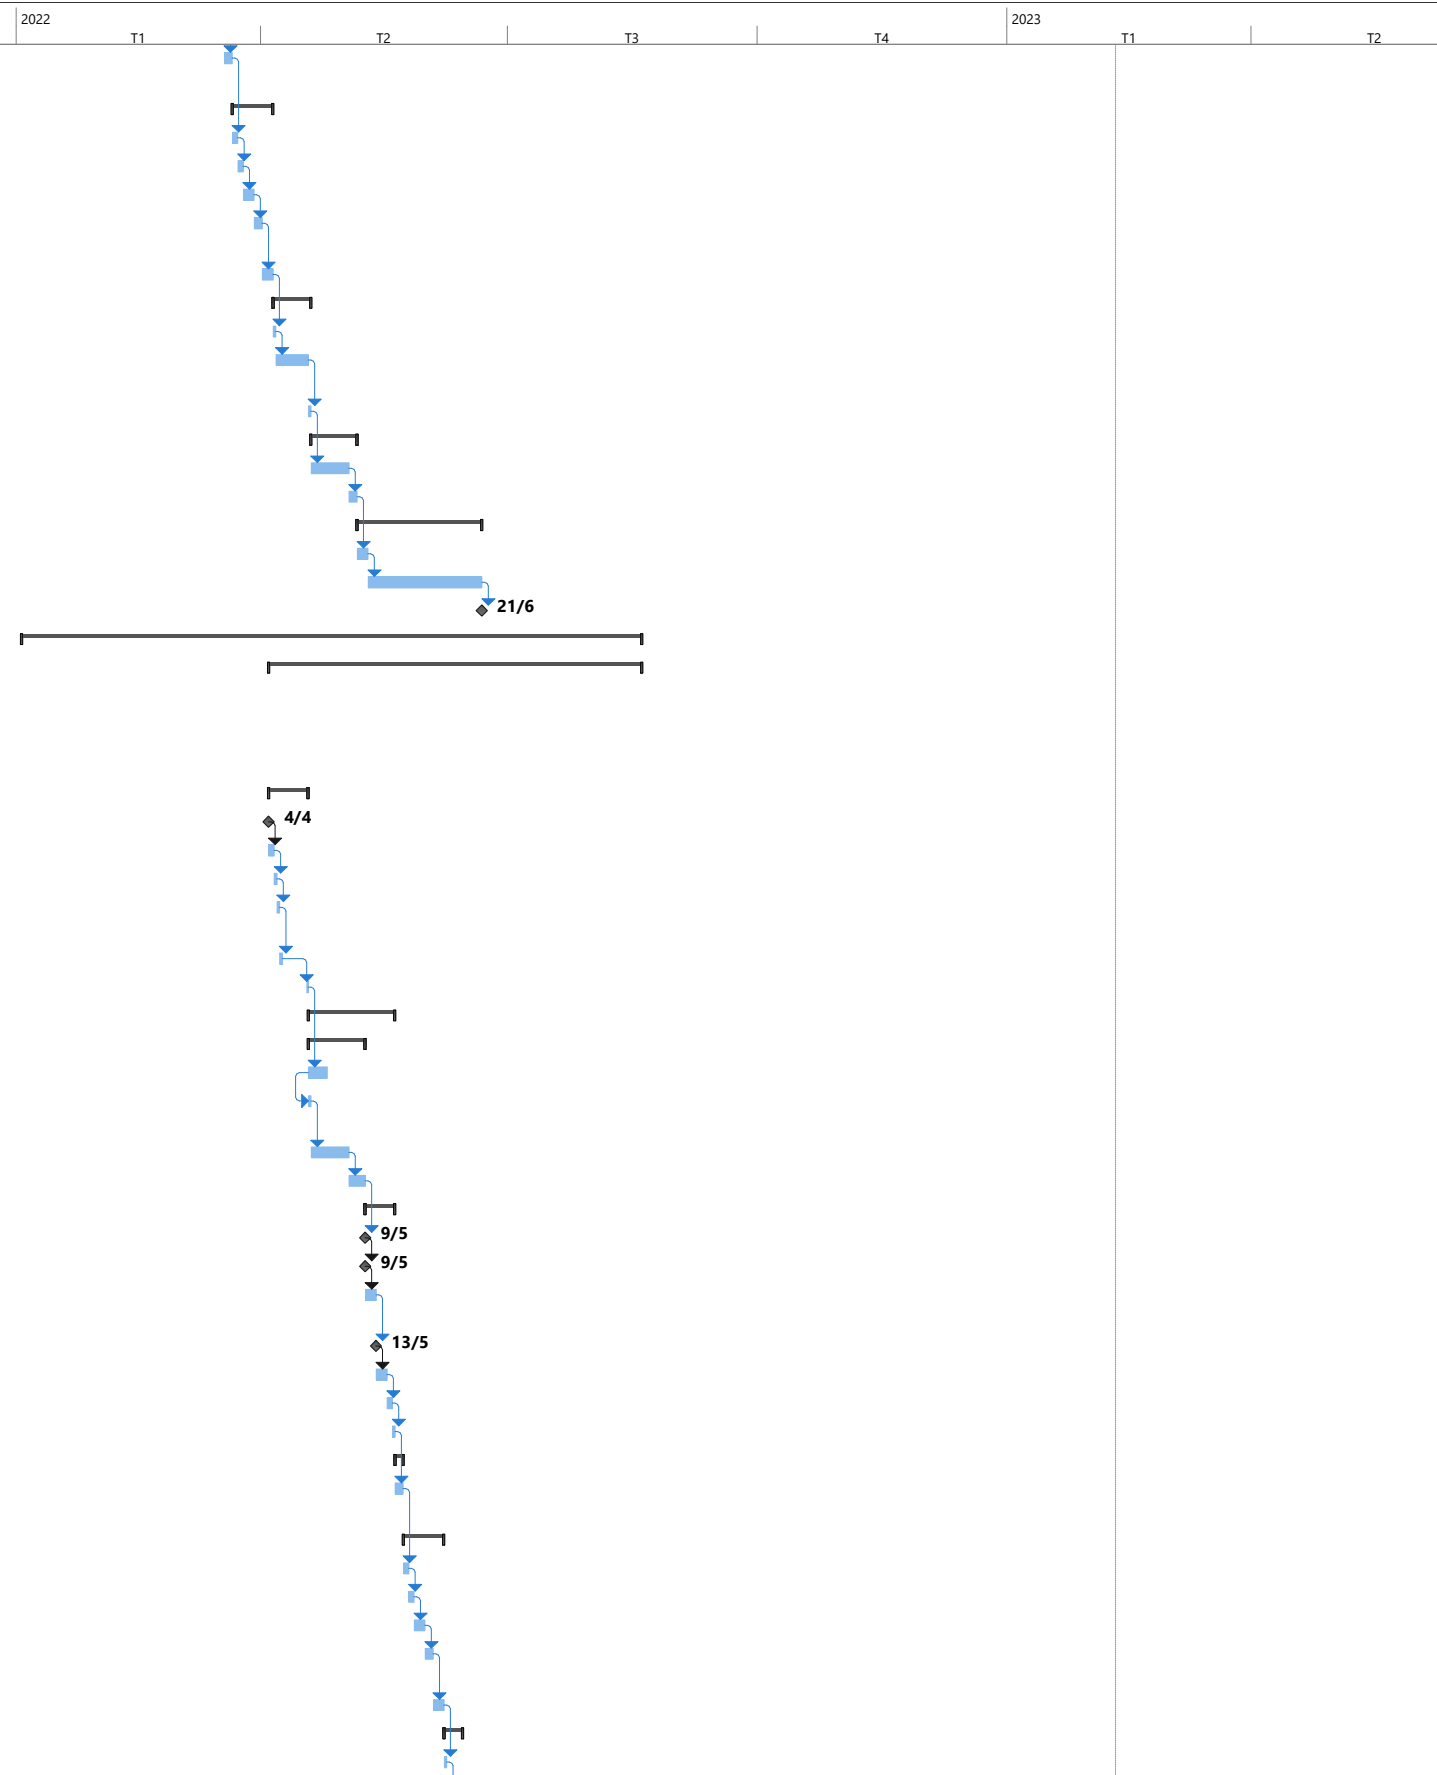

Proyecto: Cronograma de comp
Fecha: jue 16/12/21

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Progreso manual
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Progreso	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023	T1	T2
1570		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 8/6/22	lun 13/6/22	1569										
1571		Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 13/6/22	mar 14/6/22	1570										
1572		Recepción de los ítems	13 días	mar 14/6/22	vie 1/7/22											
1573		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 14/6/22	mar 28/6/22	1571										
1574		Recibido a satisfacción	3 días	mar 28/6/22	vie 1/7/22	1573										
1575		Trámite de pago	32 días	vie 1/7/22	vie 19/8/22											
1576		Envío documentos a Financiero	2 días	vie 1/7/22	mar 5/7/22	1574										
1577		Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 5/7/22	vie 19/8/22	1576										
1578		Conclusión trámite de Contratación	0 días	vie 19/8/22	vie 19/8/22	1577										
1579		2022CD-00017-503; UGPH; Capacitación; \$71.898.000/2022	91,5 días	lun 3/1/22	mar 17/5/22											
1580		Elaboración de Cartel	5,5 días	lun 3/1/22	lun 10/1/22											
1581		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 3/1/22	lun 3/1/22											
1582		Elaboración del cartel (USP)	2 días	lun 3/1/22	mar 4/1/22	1581										
1583		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 5/1/22	mié 5/1/22	1582										
1584		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 6/1/22	jue 6/1/22	1583										
1585		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 7/1/22	vie 7/1/22	1584										
1586		Invitación a participar en SICOP	0,5 días	lun 10/1/22	lun 10/1/22	1585										
1587		Recepción y estudio de ofertas	24 días	lun 10/1/22	vie 11/2/22											
1588		Invitación a participar	15 días	lun 10/1/22	lun 31/1/22											
1589		Plazo para recepción de ofertas	5 días	lun 10/1/22	lun 17/1/22	1588										
1590		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 10/1/22	mar 11/1/22	1589CC										
1591		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 11/1/22	mar 25/1/22	1590										
1592		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 25/1/22	lun 31/1/22	1591										
1593		Recepción y estudio de ofertas	9 días	lun 31/1/22	vie 11/2/22											
1594		Apertura de ofertas SICOP	0 días	lun 31/1/22	lun 31/1/22	1592										
1595		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 31/1/22	lun 31/1/22	1594										
1596		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 31/1/22	vie 4/2/22	1595										
1597		UT hace prevenciones a oferentes	0 días	vie 4/2/22	vie 4/2/22	1596										
1598		Oferentes responden a prevenciones	2 días	vie 4/2/22	mar 8/2/22	1597										
1599		UT analiza respuesta(s) a prevenciones	2 días	mar 8/2/22	jue 10/2/22	1598										
1600		Elaboración de Informe Técnico (UT)	1 día	jue 10/2/22	vie 11/2/22	1599										
1601		Recomendación, adjudicación y comunicación	1 día	vie 11/2/22	lun 14/2/22											
1602		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 11/2/22	lun 14/2/22	1601										
1603		Recurso de revocatoria	11 días	lun 14/2/22	mar 1/3/22											
1604		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 14/2/22	mié 16/2/22	1603										
1605		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 16/2/22	vie 18/2/22	1604										
1606		Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 18/2/22	mar 22/2/22	1605										
1607		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	mar 22/2/22	vie 25/2/22	1606										
1608		Adjudicación en firme	2 días	vie 25/2/22	mar 1/3/22	1607										
1609		Trámite del Pedido	5 días	mar 1/3/22	mar 8/3/22											
1610		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 1/3/22	mié 2/3/22	1609										
1611		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 2/3/22	lun 7/3/22	1610										
1612		Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 7/3/22	mar 8/3/22	1611										
1613		Recepción de los ítems	13 días	mar 8/3/22	vie 25/3/22											
1614		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 8/3/22	mar 22/3/22	1613										
1615		Recibido a satisfacción	3 días	mar 22/3/22	vie 25/3/22	1614										
1616		Trámite de pago	32 días	vie 25/3/22	mar 17/5/22											
1617		Envío documentos a Financiero	2 días	vie 25/3/22	mar 29/3/22	1616										
1618		Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 29/3/22	mar 17/5/22	1617										
1619		Conclusión trámite de Contratación	0 días	mar 17/5/22	mar 17/5/22	1618										
1620		UNIDAD DE SERVICIOS DE PROVEEDURÍA (USP)	131,5 días	lun 7/2/22	vie 19/8/22											
1621		2022CD-00018-503; SPI; Suministros de oficina, limpieza y ferretería; Envían especificaciones el 07/02/2022 \$7,966.000 /2022; Ingrid Noguera - Yeimy Mora	91,5 días	lun 7/2/22	mar 21/6/22											

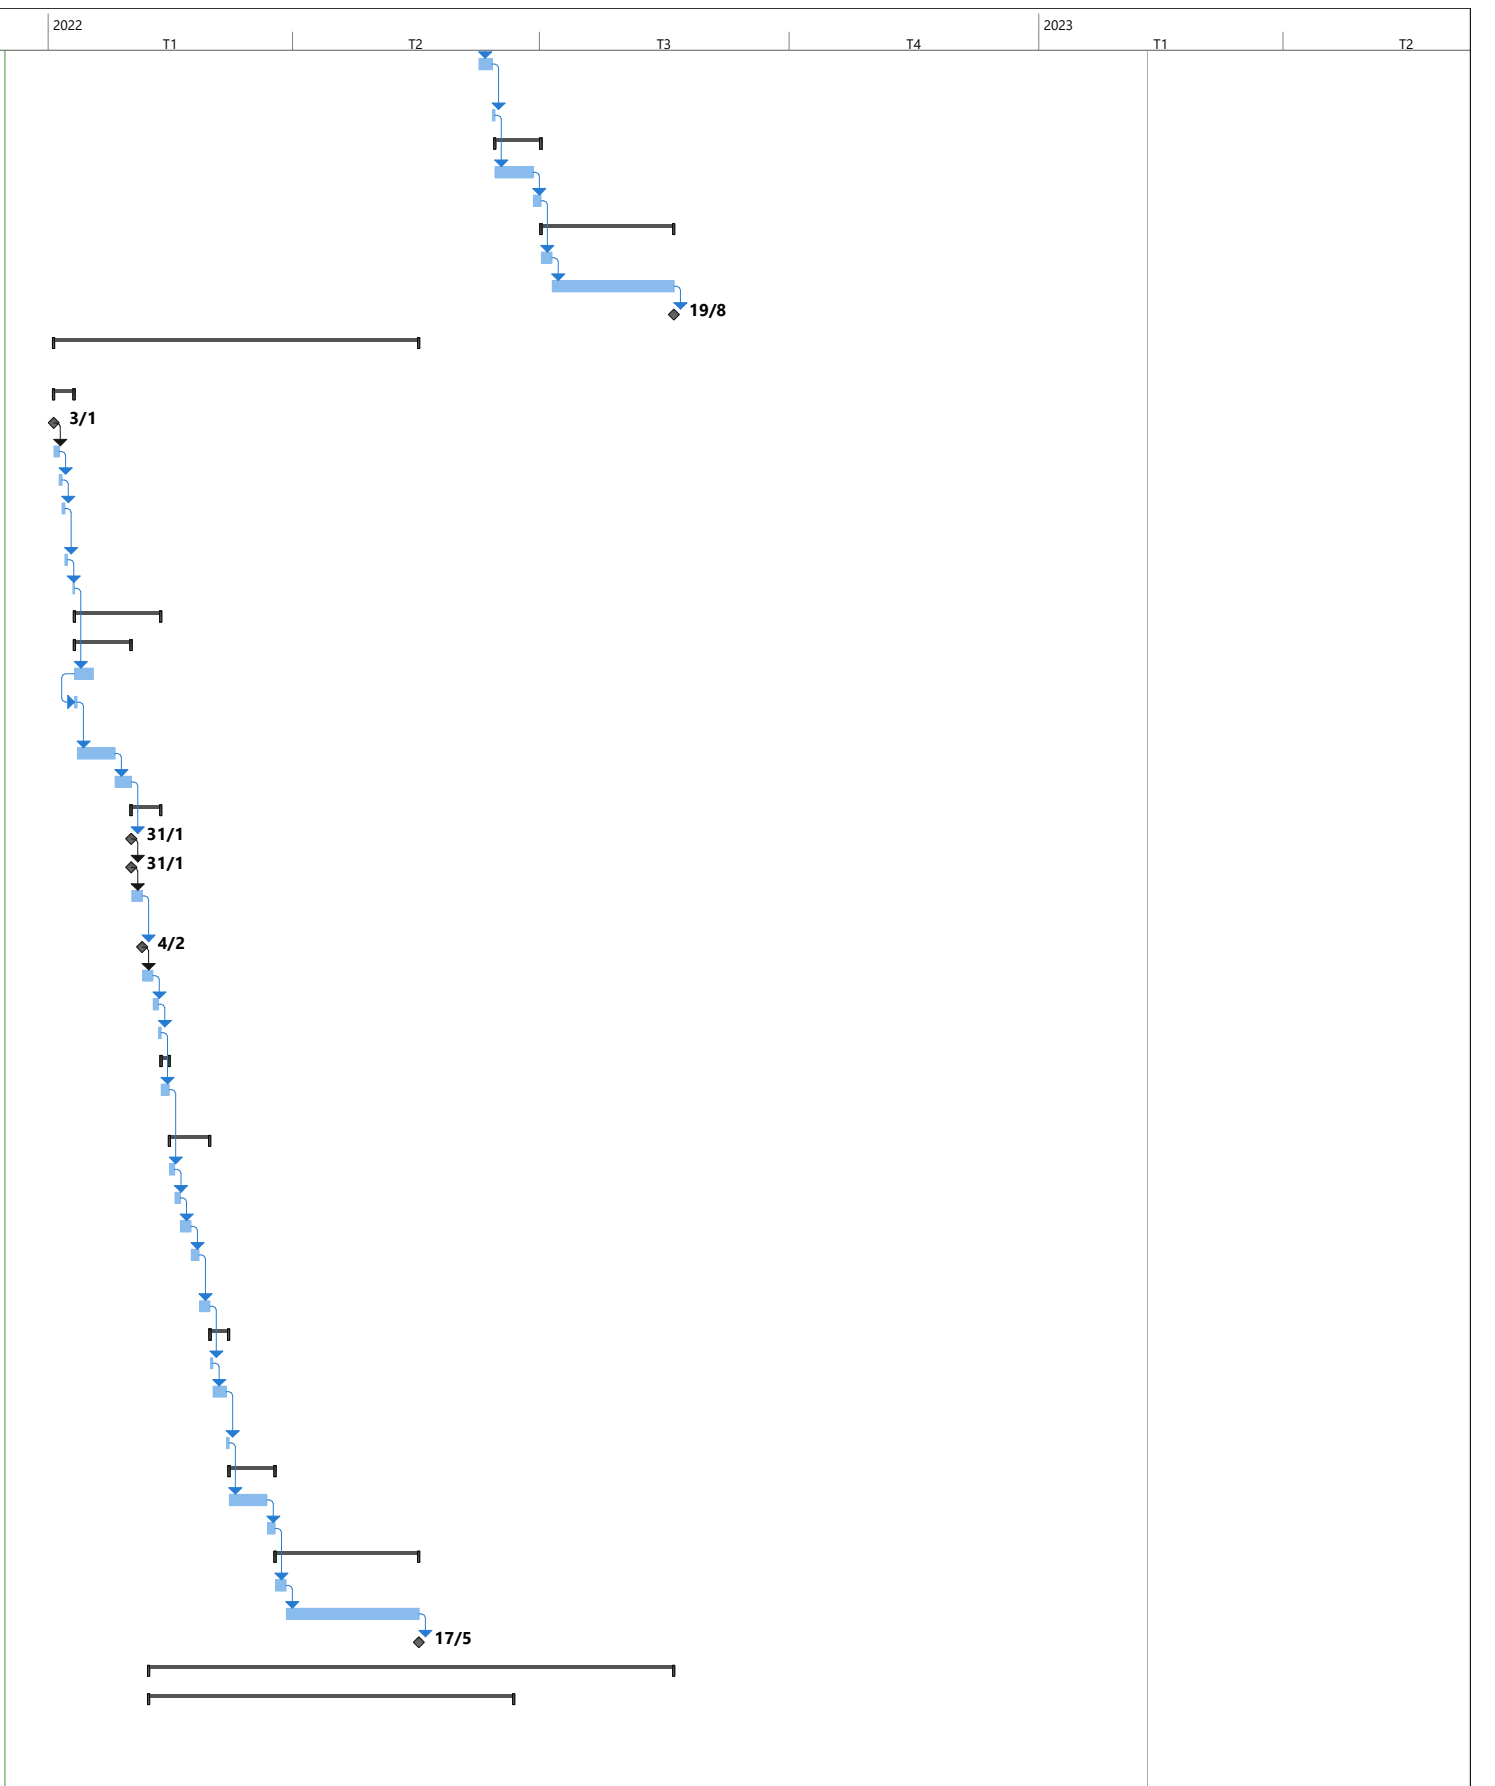

Proyecto: Cronograma de comp
Fecha: jue 16/12/21

Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		Progreso manual	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha límite			
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023	T1	T2
1622		Elaboración de Cartel	5,5 días	lun 7/2/22	lun 14/2/22											
1623		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 7/2/22	lun 7/2/22											
1624		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 7/2/22	mar 8/2/22	1623										
1625		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 9/2/22	mié 9/2/22	1624										
1626		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 10/2/22	jue 10/2/22	1625										
1627		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 11/2/22	vie 11/2/22	1626										
1628		Invitación a participar en SICOP	0,5 días	lun 14/2/22	lun 14/2/22	1627										
1629		Recepción y estudio de ofertas	24 días	lun 14/2/22	vie 18/3/22											
1630		Invitación a participar	15 días	lun 14/2/22	lun 7/3/22											
1631		Plazo para recepción de ofertas	5 días	lun 14/2/22	lun 21/2/22	1628										
1632		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 14/2/22	mar 15/2/22	1631CC										
1633		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 15/2/22	mar 1/3/22	1632										
1634		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 1/3/22	lun 7/3/22	1633										
1635		Recepción y estudio de ofertas	9 días	lun 7/3/22	vie 18/3/22											
1636		Apertura de ofertas SICOP	0 días	lun 7/3/22	lun 7/3/22	1634										
1637		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 7/3/22	lun 7/3/22	1636										
1638		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 7/3/22	vie 11/3/22	1637										
1639		UT hace prevenciones a oferentes	0 días	vie 11/3/22	vie 11/3/22	1638										
1640		Oferentes responden a prevenciones	2 días	vie 11/3/22	mar 15/3/22	1639										
1641		UT analiza respuesta(s) a prevenciones	2 días	mar 15/3/22	jue 17/3/22	1640										
1642		Elaboración de Informe Técnico (UT)	1 día	jue 17/3/22	vie 18/3/22	1641										
1643		Recomendación, adjudicación y comunicación	1 día	vie 18/3/22	lun 21/3/22											
1644		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 18/3/22	lun 21/3/22	1642										
1645		Recurso de revocatoria	11 días	lun 21/3/22	mar 5/4/22											
1646		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 21/3/22	mié 23/3/22	1644										
1647		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 23/3/22	vie 25/3/22	1646										
1648		Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 25/3/22	mar 29/3/22	1647										
1649		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	mar 29/3/22	vie 1/4/22	1648										
1650		Adjudicación en firme	2 días	vie 1/4/22	mar 5/4/22	1649										
1651		Trámite del Pedido	5 días	mar 5/4/22	mar 19/4/22											
1652		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 5/4/22	mié 6/4/22	1650										
1653		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 6/4/22	lun 18/4/22	1652										
1654		Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 18/4/22	mar 19/4/22	1653										
1655		Recepción de los items	13 días	mar 19/4/22	vie 6/5/22											
1656		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 19/4/22	mar 3/5/22	1654										
1657		Recibido a satisfacción	3 días	mar 3/5/22	vie 6/5/22	1656										
1658		Trámite de pago	32 días	vie 6/5/22	mar 21/6/22											
1659		Envío documentos a Financiero	2 días	vie 6/5/22	mar 10/5/22	1657										
1660		Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 10/5/22	mar 21/6/22	1659										
1661		Conclusión trámite de Contratación	0 días	mar 21/6/22	mar 21/6/22	1660										
1662		2022CD-00019-503; SPI;Tintas, tonner, diluyentes y pinturas; Envían especificaciones el 07/03/2022; \$1,236.000 /2022; Ingrid Noguera - Yeimy Mora	91,5 días	lun 7/3/22	mar 19/7/22											
1663		Elaboración de Cartel	5,5 días	lun 7/3/22	lun 14/3/22											
1664		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 7/3/22	lun 7/3/22											
1665		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 7/3/22	mar 8/3/22	1664										
1666		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 9/3/22	mié 9/3/22	1665										
1667		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 10/3/22	jue 10/3/22	1666										
1668		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 11/3/22	vie 11/3/22	1667										
1669		Invitación a participar en SICOP	0,5 días	lun 14/3/22	lun 14/3/22	1668										
1670		Recepción y estudio de ofertas	24 días	lun 14/3/22	vie 22/4/22											
1671		Invitación a participar	15 días	lun 14/3/22	lun 4/4/22											
1672		Plazo para recepción de ofertas	5 días	lun 14/3/22	lun 21/3/22	1669										
1673		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 14/3/22	mar 15/3/22	1672CC										
1674		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 15/3/22	mar 29/3/22	1673										

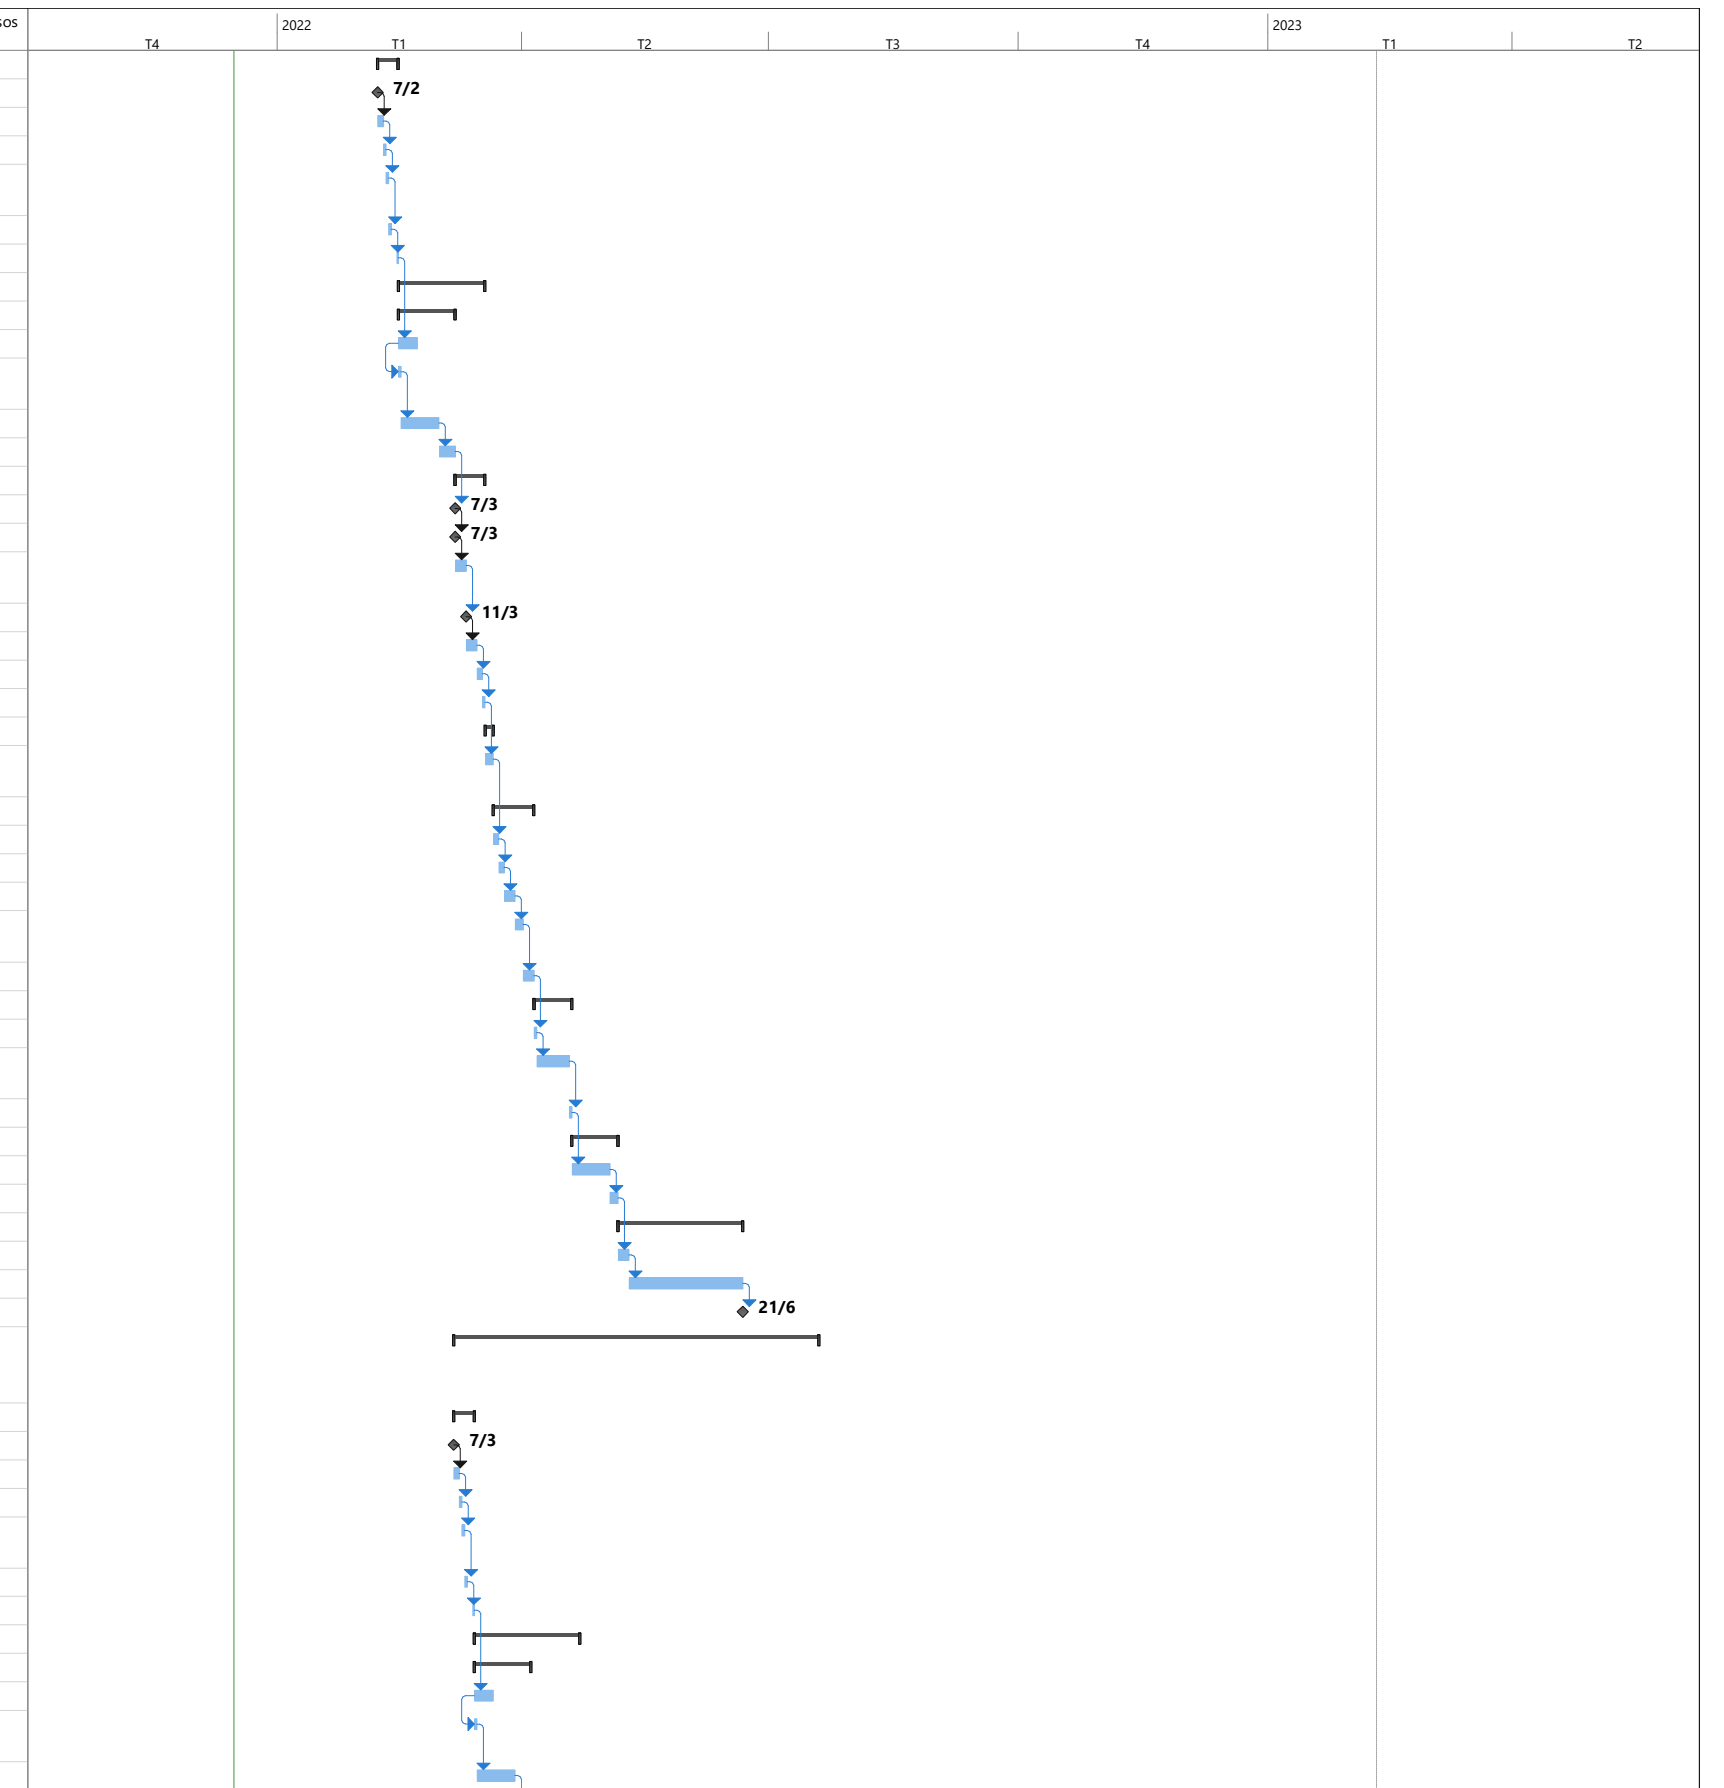

Proyecto: Cronograma de comp
Fecha: jue 16/12/21

Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		Progreso manual	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha limite			
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023	T1	T2
1675		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 29/3/22	lun 4/4/22	1674										
1676		Recepción y estudio de ofertas	9 días	lun 4/4/22	vie 22/4/22											
1677		Apertura de ofertas SICOP	0 días	lun 4/4/22	lun 4/4/22	1675										
1678		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 4/4/22	lun 4/4/22	1677										
1679		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 4/4/22	vie 8/4/22	1678										
1680		UT hace prevenciones a oferentes	0 días	vie 8/4/22	vie 8/4/22	1679										
1681		Oferentes responden a prevenciones	2 días	vie 8/4/22	mar 19/4/22	1680										
1682		UT analiza respuesta(s) a prevenciones	2 días	mar 19/4/22	jue 21/4/22	1681										
1683		Elaboración de Informe Técnico (UT)	1 día	jue 21/4/22	vie 22/4/22	1682										
1684		Recomendación, adjudicación y comunicación	1 día	vie 22/4/22	lun 25/4/22											
1685		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 22/4/22	lun 25/4/22	1683										
1686		Recurso de revocatoria	11 días	lun 25/4/22	mar 10/5/22											
1687		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 25/4/22	mié 27/4/22	1685										
1688		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 27/4/22	vie 29/4/22	1687										
1689		Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 29/4/22	mar 3/5/22	1688										
1690		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	mar 3/5/22	vie 6/5/22	1689										
1691		Adjudicación en firme	2 días	vie 6/5/22	mar 10/5/22	1690										
1692		Trámite del Pedido	5 días	mar 10/5/22	mar 17/5/22											
1693		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 10/5/22	mié 11/5/22	1691										
1694		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 11/5/22	lun 16/5/22	1693										
1695		Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 16/5/22	mar 17/5/22	1694										
1696		Recepción de los items	13 días	mar 17/5/22	vie 3/6/22											
1697		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 17/5/22	mar 31/5/22	1695										
1698		Recibido a satisfacción	3 días	mar 31/5/22	vie 3/6/22	1697										
1699		Trámite de pago	32 días	vie 3/6/22	mar 19/7/22											
1700		Envío documentos a Financiero	2 días	vie 3/6/22	mar 7/6/22	1698										
1701		Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 7/6/22	mar 19/7/22	1700										
1702		Conclusión trámite de Contratación	0 días	mar 19/7/22	mar 19/7/22	1701										
1703		2022CD-00020-503; SPI; Papel higiénico entregas según demanda; Contrato vence 6/11/2022; Envían especificaciones 04/04/2022; \$3,753.000/2022; Yeimy Mora - Ingrid Noguera	91,5 días	lun 4/4/22	vie 19/8/22											
1704		Elaboración de Cartel	5,5 días	lun 4/4/22	lun 18/4/22											
1705		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 4/4/22	lun 4/4/22	1704										
1706		Elaboración del cartel (USP)	2 días	lun 4/4/22	mar 5/4/22	1705										
1707		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 6/4/22	mié 6/4/22	1706										
1708		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 7/4/22	jue 7/4/22	1707										
1709		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 8/4/22	vie 8/4/22	1708										
1710		Invitación a participar en SICOP	0,5 días	lun 18/4/22	lun 18/4/22	1709										
1711		Recepción y estudio de ofertas	24 días	lun 18/4/22	vie 20/5/22											
1712		Invitación a participar	15 días	lun 18/4/22	lun 9/5/22											
1713		Plazo para recepción de ofertas	5 días	lun 18/4/22	lun 25/4/22	1710										
1714		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 18/4/22	mar 19/4/22	1713CC										
1715		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 19/4/22	mar 3/5/22	1714										
1716		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 3/5/22	lun 9/5/22	1715										
1717		Recepción y estudio de ofertas	9 días	lun 9/5/22	vie 20/5/22											
1718		Apertura de ofertas SICOP	0 días	lun 9/5/22	lun 9/5/22	1716										
1719		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 9/5/22	lun 9/5/22	1718										
1720		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 9/5/22	vie 13/5/22	1719										
1721		UT hace prevenciones a oferentes	0 días	vie 13/5/22	vie 13/5/22	1720										
1722		Oferentes responden a prevenciones	2 días	vie 13/5/22	mar 17/5/22	1721										
1723		UT analiza respuesta(s) a prevenciones	2 días	mar 17/5/22	jue 19/5/22	1722										
1724		Elaboración de Informe Técnico (UT)	1 día	jue 19/5/22	vie 20/5/22	1723										
1725		Recomendación, adjudicación y comunicación	1 día	vie 20/5/22	lun 23/5/22											
1726		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 20/5/22	lun 23/5/22	1724										

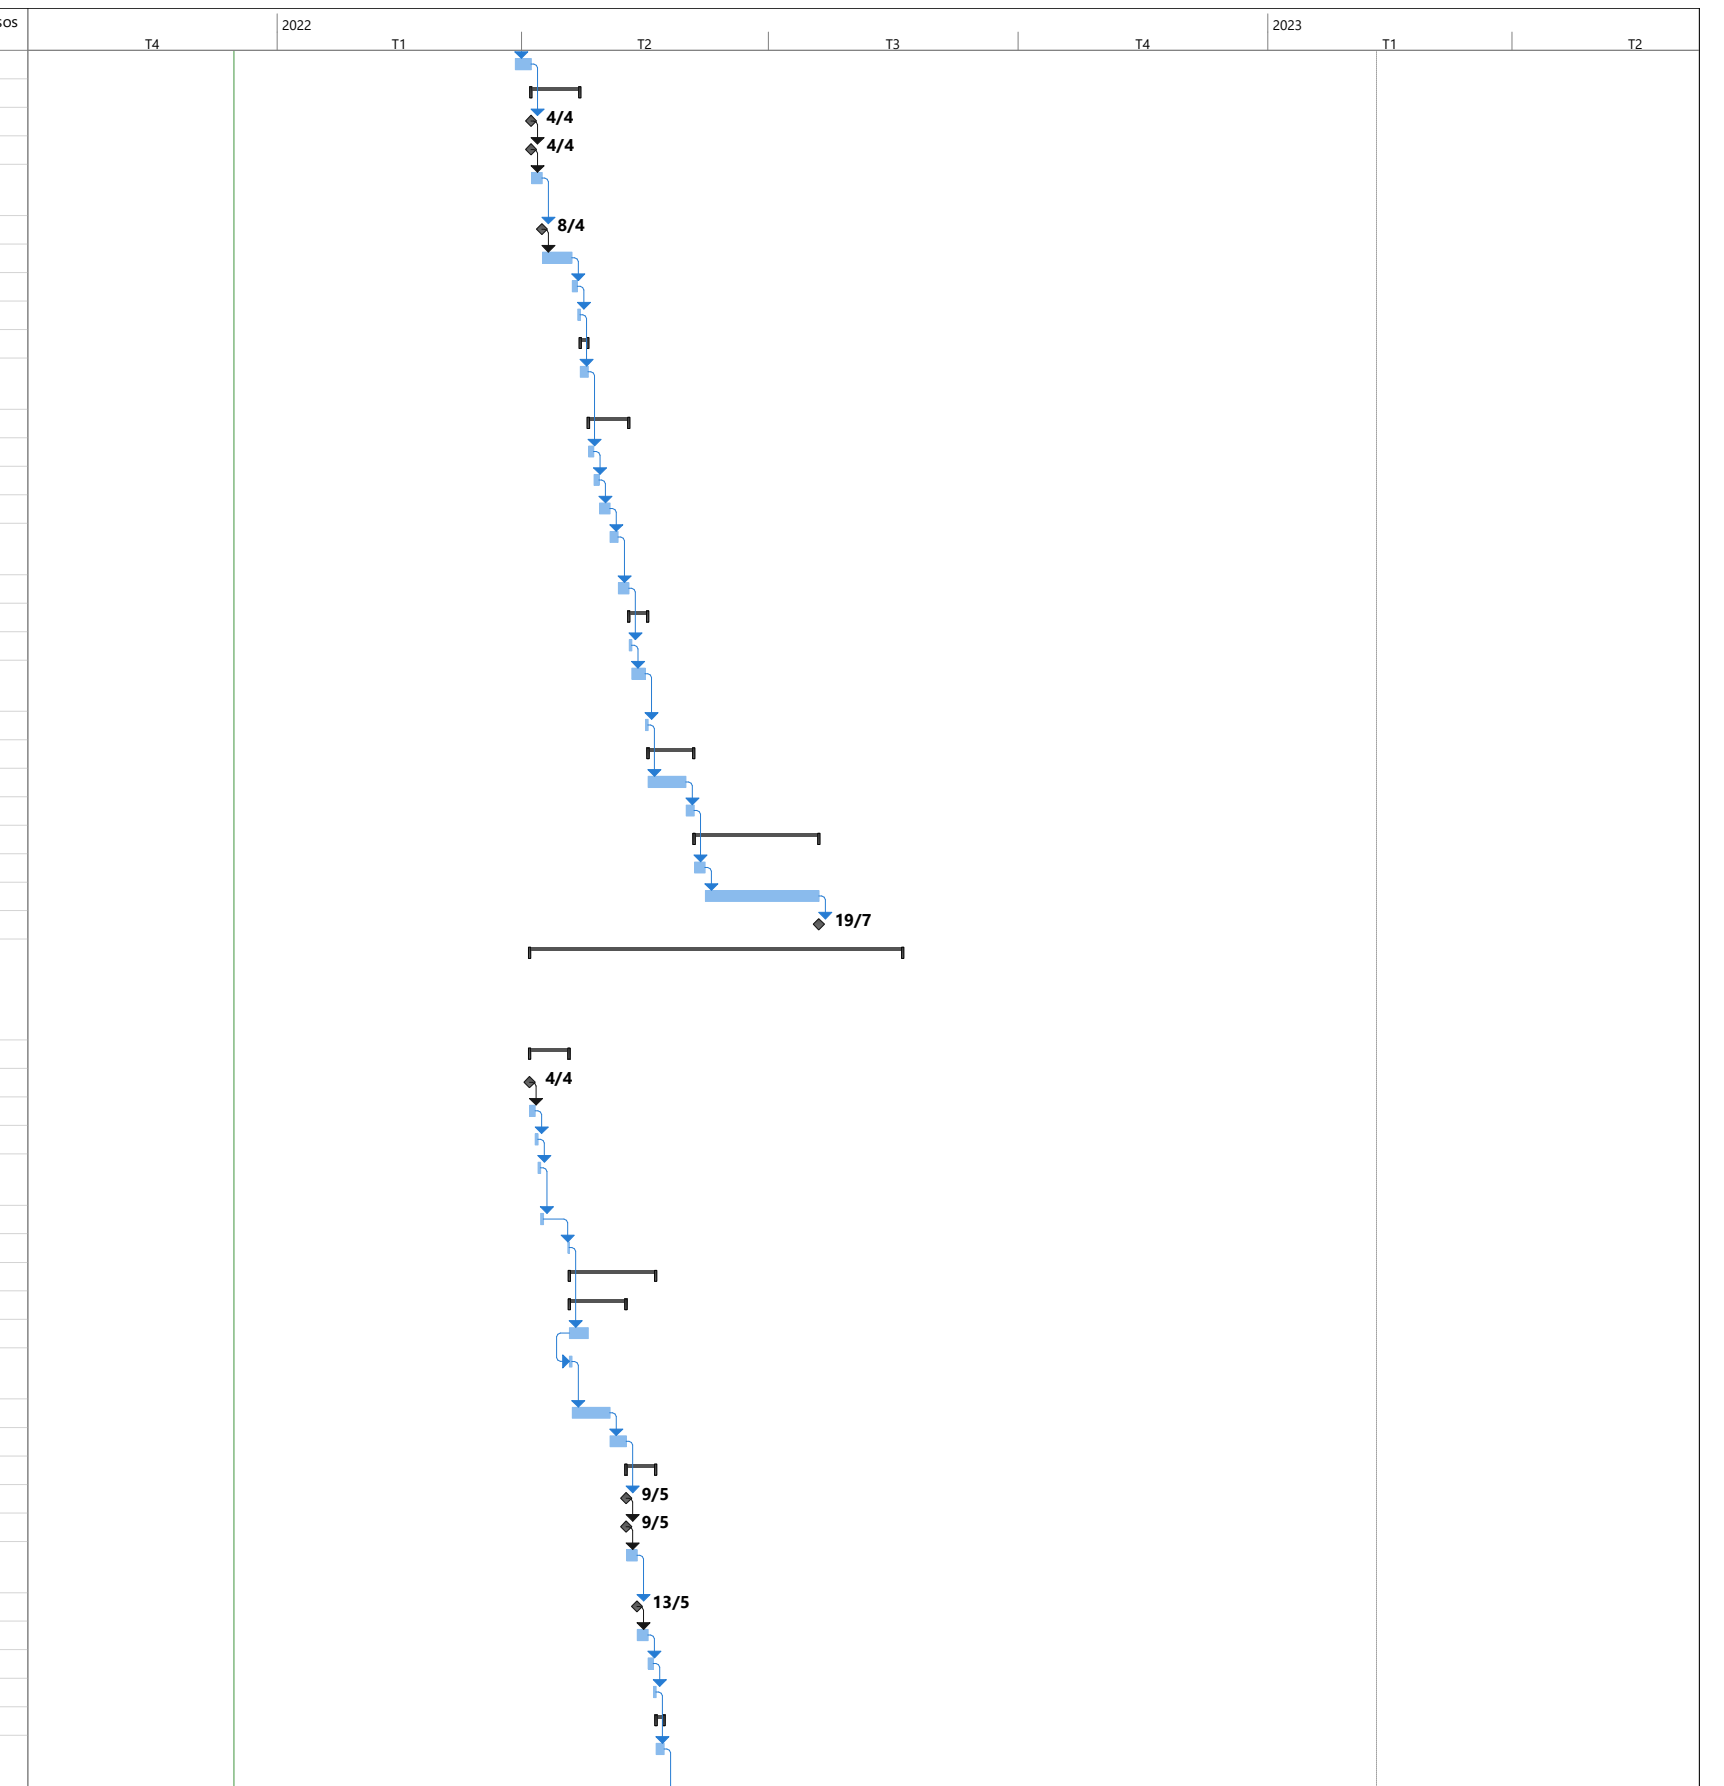

Proyecto: Cronograma de comp
 Fecha: jue 16/12/21


Tarea	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Progreso manual
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite	Progreso
			Resumen manual	Tareas externas		

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023	T1	T2
1727		Recurso de revocatoria	11 días	lun 23/5/22	mar 7/6/22											
1728		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 23/5/22	mié 25/5/22	1726										
1729		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 25/5/22	vie 27/5/22	1728										
1730		Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 27/5/22	mar 31/5/22	1729										
1731		Resolución de Recurso de revocatoria Art 144 RLCA	3 días	mar 31/5/22	vie 3/6/22	1730										
1732		Adjudicación en firme	2 días	vie 3/6/22	mar 7/6/22	1731										
1733		Trámite del Pedido	5 días	mar 7/6/22	mar 14/6/22											
1734		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 7/6/22	mié 8/6/22	1732										
1735		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 8/6/22	lun 13/6/22	1734										
1736		Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 13/6/22	mar 14/6/22	1735										
1737		Recepción de los items	13 días	mar 14/6/22	vie 1/7/22											
1738		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 14/6/22	mar 28/6/22	1736										
1739		Recibido a satisfacción	3 días	mar 28/6/22	vie 1/7/22	1738										
1740		Trámite de pago	32 días	vie 1/7/22	vie 19/8/22											
1741		Envío documentos a Financiero	2 días	vie 1/7/22	mar 5/7/22	1739										
1742		Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 5/7/22	vie 19/8/22	1741										
1743		Conclusión trámite de Contratación	0 días	vie 19/8/22	vie 19/8/22	1742										
1744		ARTÍCULO 138 RLCA	36 días	lun 29/11/21	mar 1/2/22											
1760		ARTÍCULO 139 RLCA	146 días	lun 3/1/22	mié 3/8/22											
1761		DIVISIÓN DE GESTIÓN DE APOYO (GDGA)	66 días	lun 3/1/22	lun 4/4/22											
1762		2022CD-00020-503; GDGA; Publicaciones en Gaceta; €4.850.000/2022; Silvia Castro - Eneyda Flores	66 días	lun 3/1/22	lun 4/4/22											
1763		Elaboración de Cartel	6 días	lun 3/1/22	lun 10/1/22											
1764		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 3/1/22	lun 3/1/22											
1765		Creación de Código en SICOP	5 días	lun 3/1/22	vie 7/1/22	1764										
1766		Confección de cartel definitivo	1 día	lun 10/1/22	lun 10/1/22	1765										
1767		Invitación a participar en Mer- Link	0 días	lun 10/1/22	lun 10/1/22	1766										
1768		Recepción y estudio de ofertas	0 días	lun 10/1/22	lun 10/1/22											
1769		Invitación a participar	0 días	lun 10/1/22	lun 10/1/22											
1770		Envío de invitación	0 días	lun 10/1/22	lun 10/1/22	1767										
1771		Objeción al cartel	1 día	mar 11/1/22	mar 11/1/22	1770										
1772		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mié 12/1/22	mar 25/1/22	1771										
1773		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mié 12/1/22	lun 17/1/22	1771										
1774		Nuevo plazo para recibir ofertas	5,8 días	mar 11/1/22	mié 19/1/22	1771										
1775		Recepción y estudio de ofertas	5,8 días	mar 11/1/22	mié 19/1/22											
1776		Apertura de ofertas SICOP	0 días	mar 11/1/22	mar 11/1/22											
1777		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	mar 11/1/22	mar 11/1/22	1776										
1778		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	0,8 días	mié 12/1/22	mié 12/1/22	1777										
1779		UT hace prevenciones a oferentes	0 días	mié 12/1/22	mié 12/1/22	1778										
1780		Oferentes responden a prevenciones	3 días	mié 12/1/22	lun 17/1/22	1779										
1781		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	lun 17/1/22	mié 19/1/22	1780										
1782		Elaboración de Informe Técnico	0 días	mié 19/1/22	mié 19/1/22	1781										
1783		Recomendación, adjudicación y comunicación	0,2 días	mié 19/1/22	mié 19/1/22											
1784		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	0,2 días	mié 19/1/22	mié 19/1/22	1782										
1785		Recurso de revocatoria	15 días	jue 20/1/22	mié 9/2/22											
1786		Plazo para recibir recurso	2 días	jue 20/1/22	vie 21/1/22	1784										
1787		Resolución de Recurso de revocatoria	10 días	lun 24/1/22	vie 4/2/22	1786										
1788		Adjudicación en firme	3 días	lun 7/2/22	mié 9/2/22	1787										
1789		Trámite del Pedido	2 días	jue 10/2/22	vie 11/2/22											
1790		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	jue 10/2/22	jue 10/2/22	1788										
1791		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	1 día	vie 11/2/22	vie 11/2/22	1790										
1792		Notificación de Pedido de Compra	0 días	vie 11/2/22	vie 11/2/22	1791										
1793		Recepción de los items	4 días	lun 14/2/22	jue 17/2/22											
1794		Entrega de los bienes/servicios	1 día	lun 14/2/22	lun 14/2/22	1792										
1795		Recibido a satisfacción	3 días	mar 15/2/22	jue 17/2/22	1794										
1796		Trámite de pago	32 días	vie 18/2/22	lun 4/4/22											
1797		Envío documentos a Financiero	2 días	vie 18/2/22	lun 21/2/22	1795										

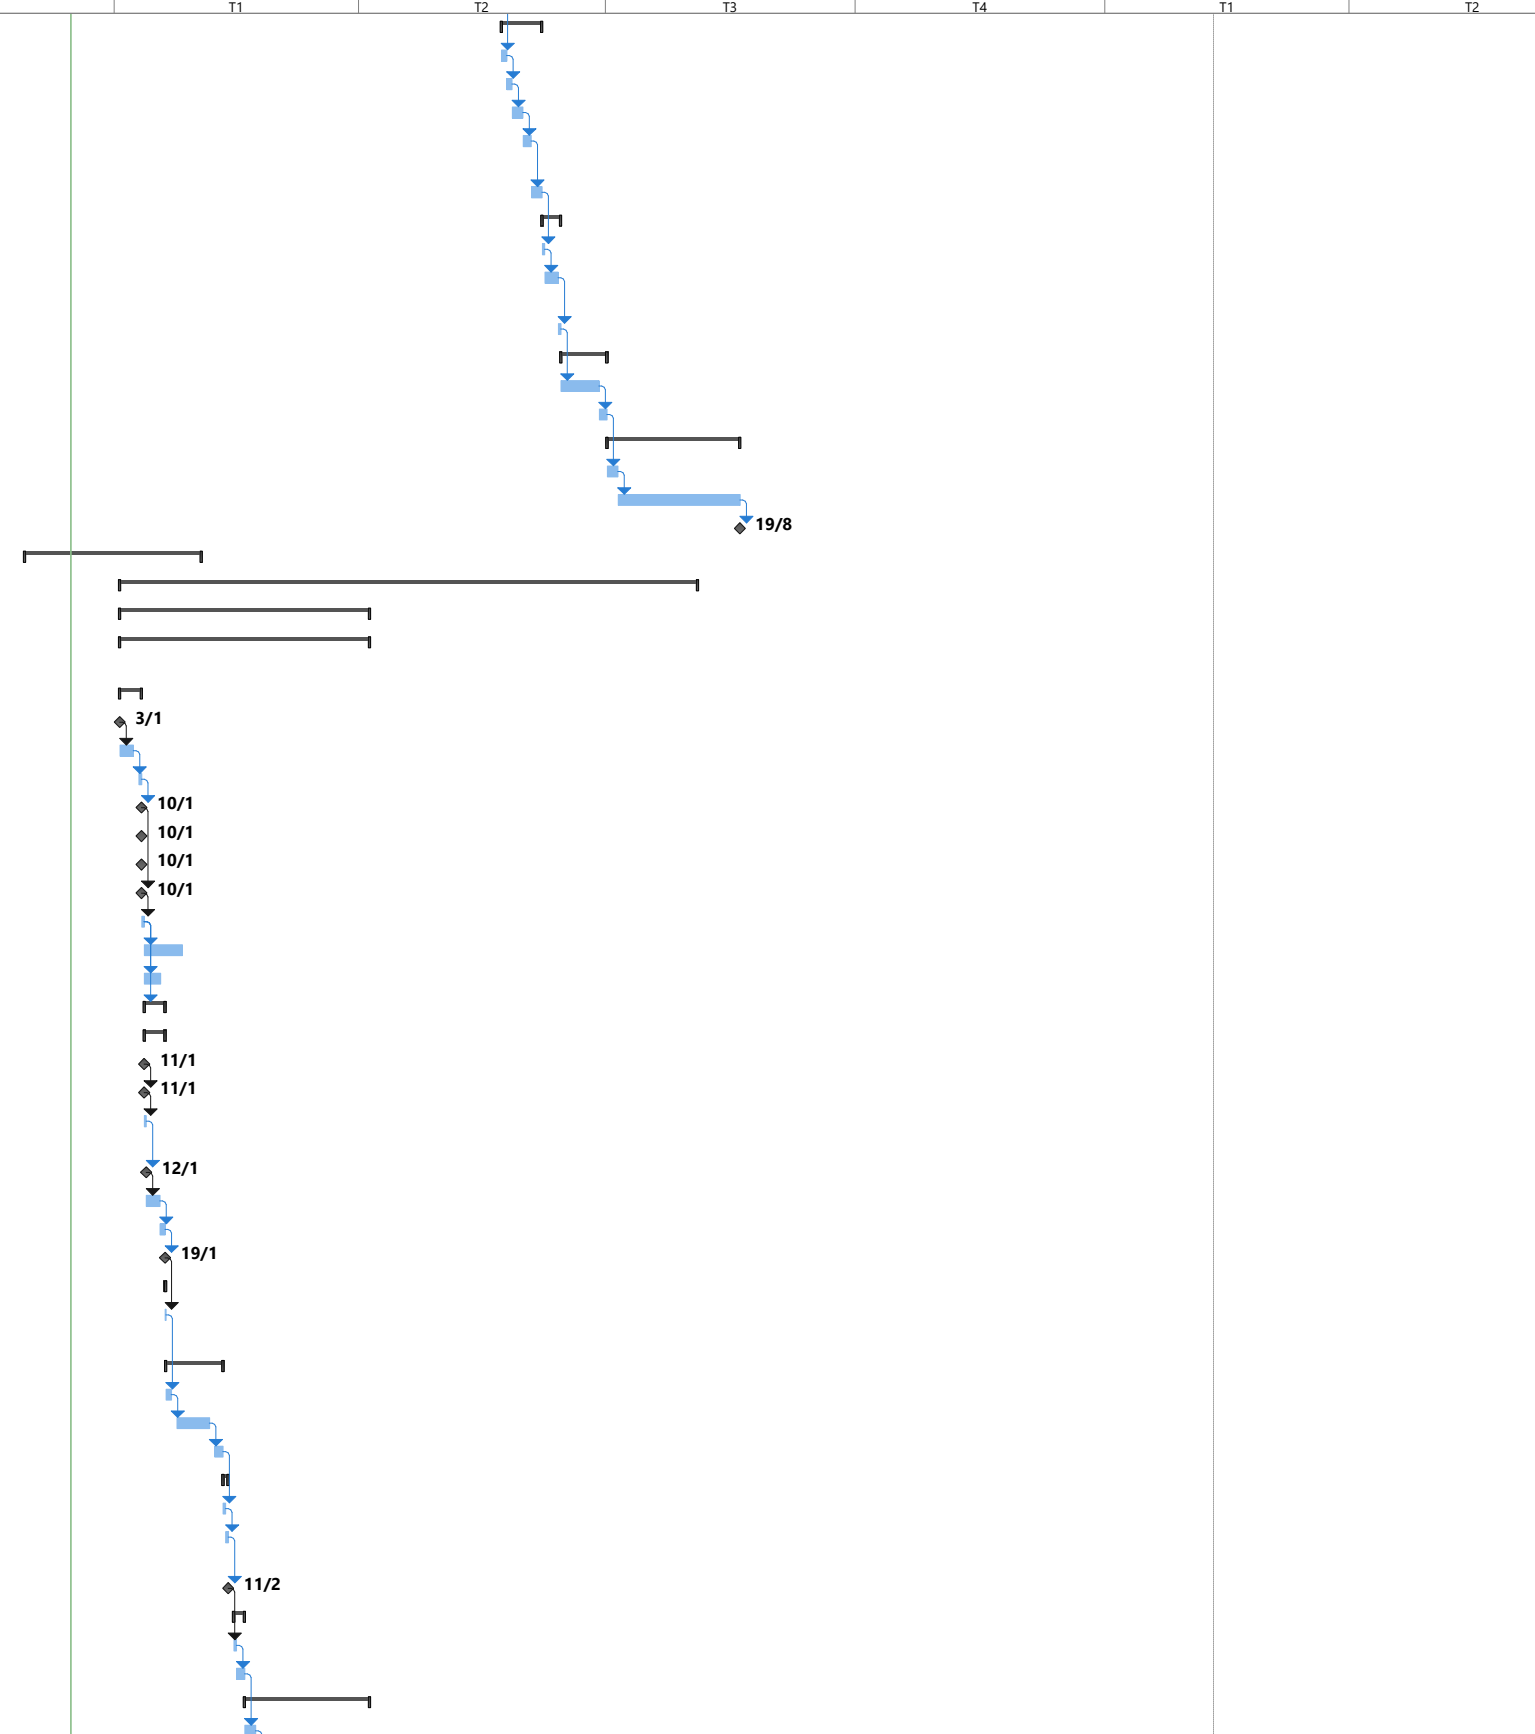


Proyecto: Cronograma de comp
Fecha: jue 16/12/21


Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		Progreso manual	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha limite			
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso			

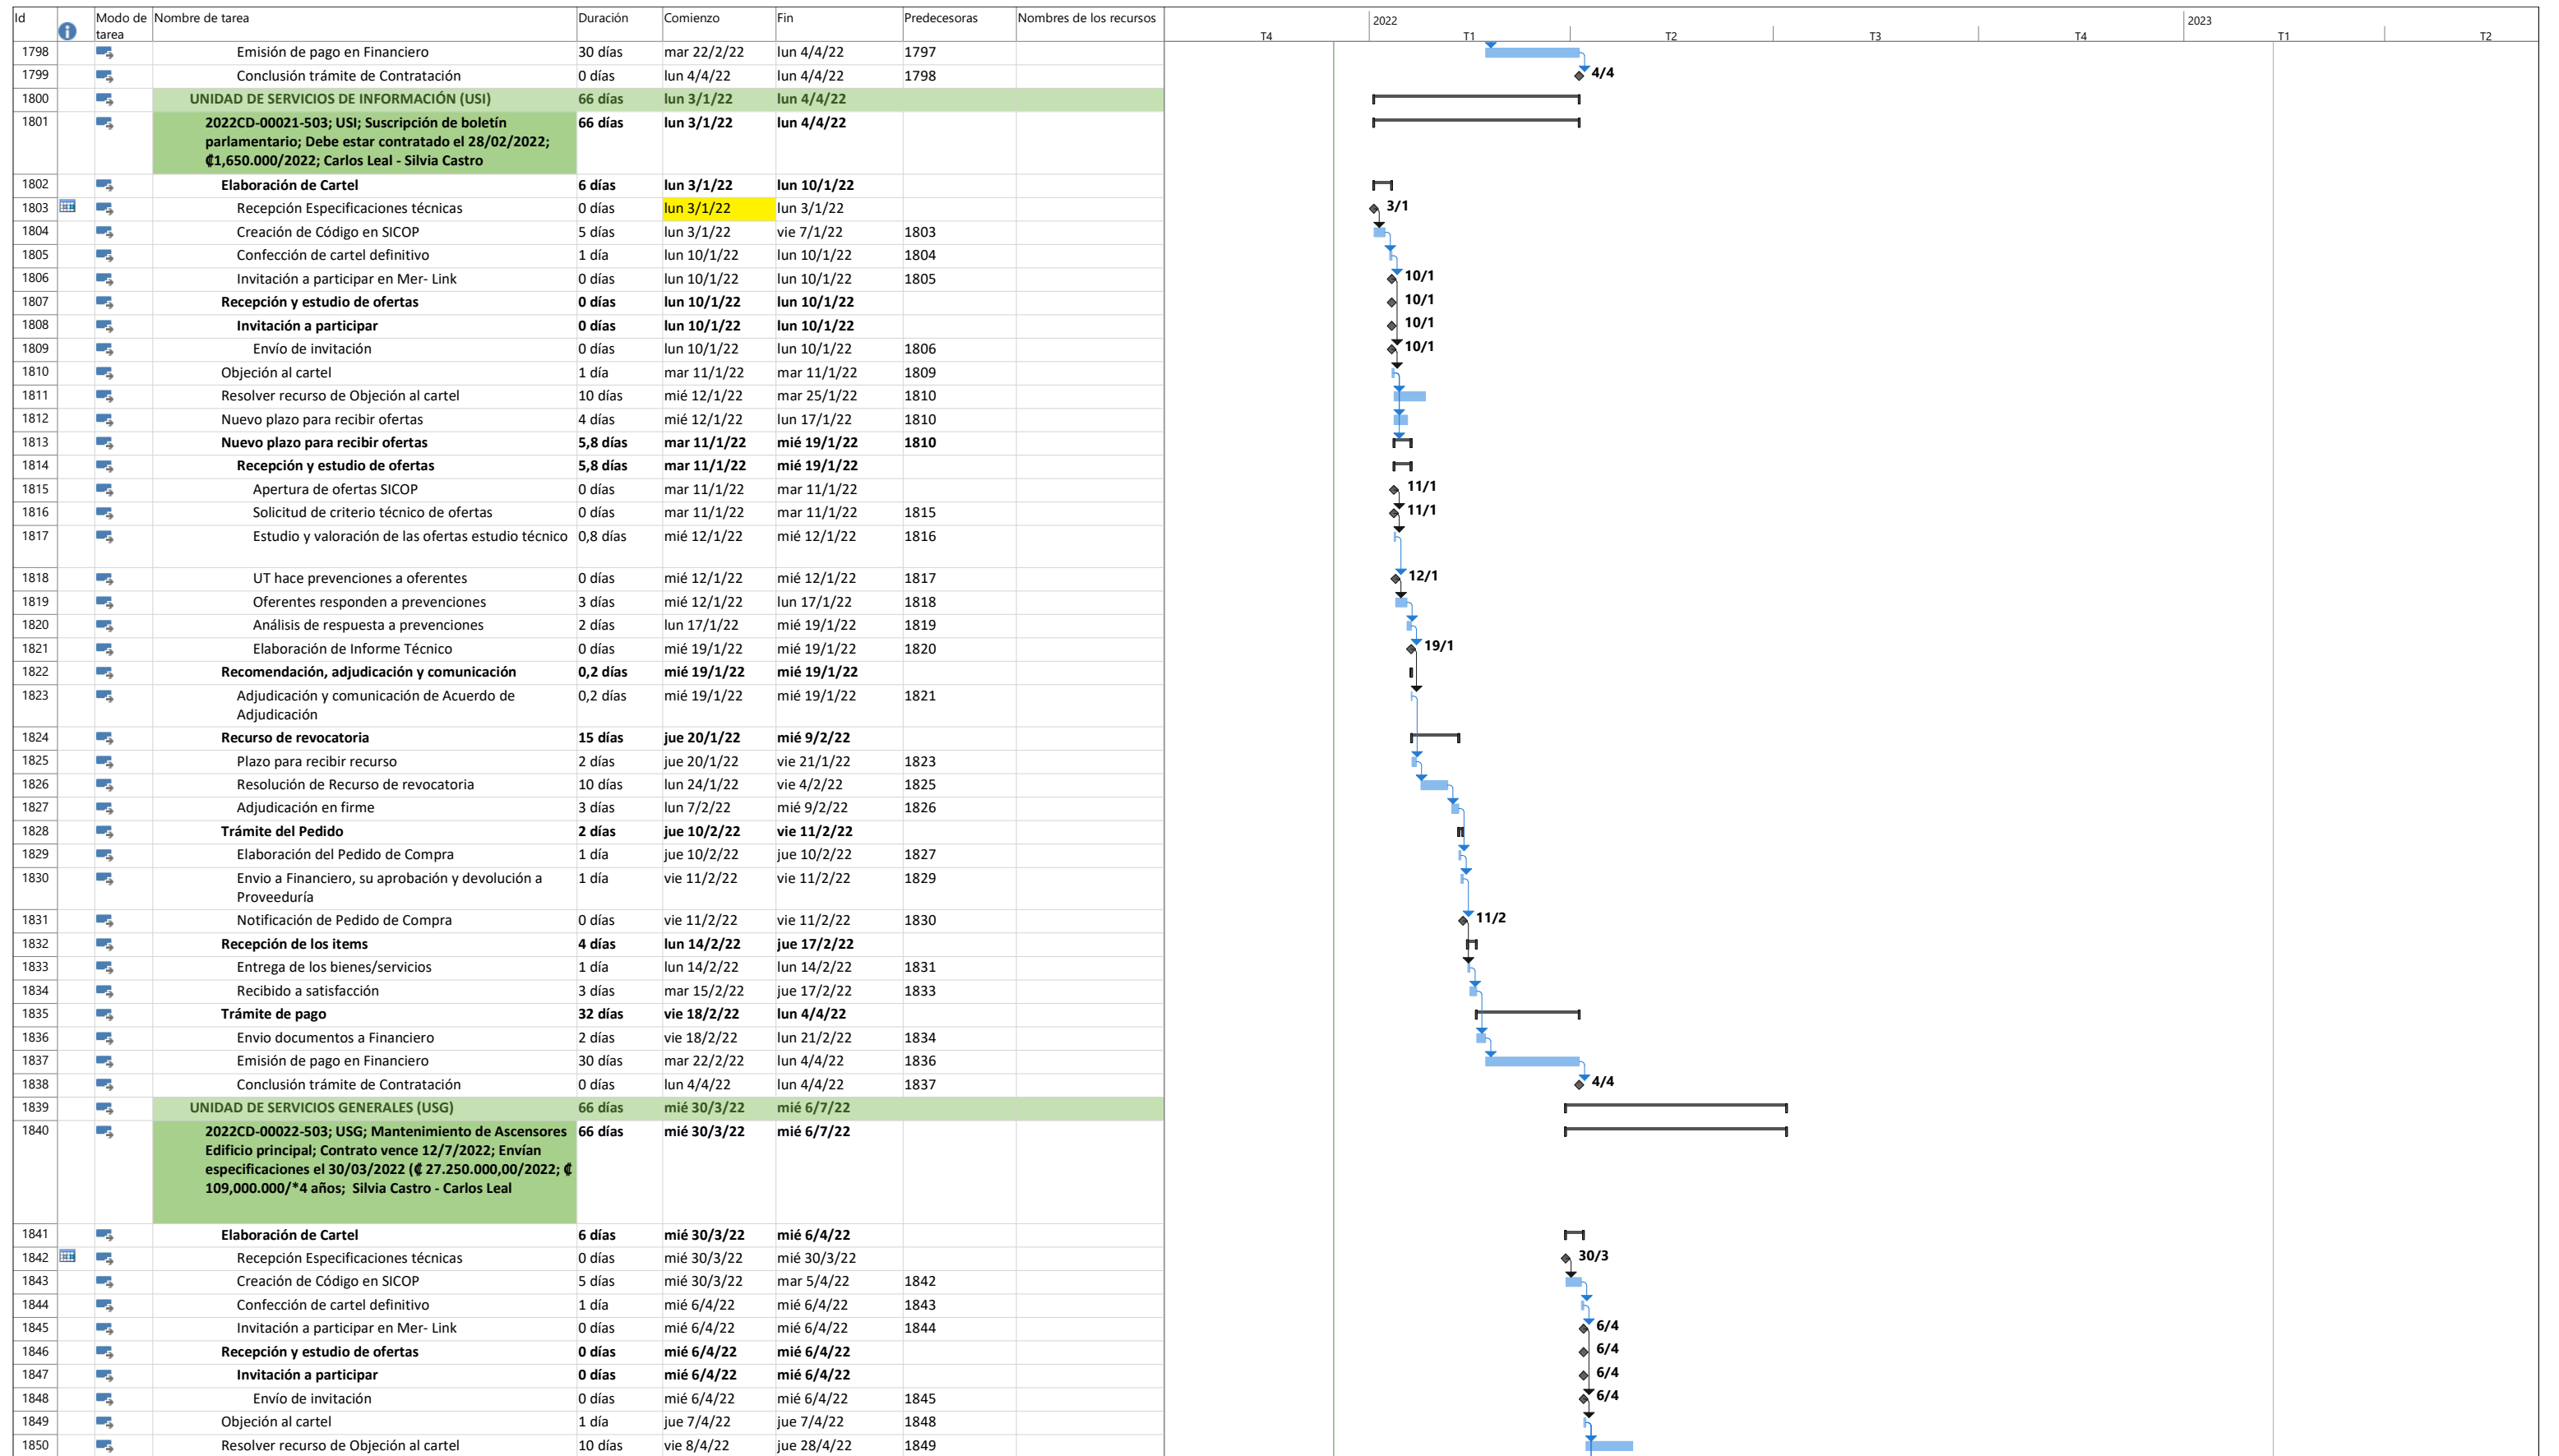

Proyecto: Cronograma de comp
Fecha: jue 16/12/21



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	2022					2023			
								T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2		
1851		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	vie 8/4/22	mié 20/4/22	1849										
1852		Nuevo plazo para recibir ofertas	5,8 días	jue 7/4/22	vie 22/4/22	1849										
1853		Recepción y estudio de ofertas	5,8 días	jue 7/4/22	vie 22/4/22											
1854		Apertura de ofertas SICOP	0 días	jue 7/4/22	jue 7/4/22											
1855		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	jue 7/4/22	jue 7/4/22	1854										
1856		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	0,8 días	vie 8/4/22	vie 8/4/22	1855										
1857		UT hace prevenciones a oferentes	0 días	vie 8/4/22	vie 8/4/22	1856										
1858		Oferentes responden a prevenciones	3 días	vie 8/4/22	mié 20/4/22	1857										
1859		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mié 20/4/22	vie 22/4/22	1858										
1860		Elaboración de Informe Técnico	0 días	vie 22/4/22	vie 22/4/22	1859										
1861		Recomendación, adjudicación y comunicación	0,2 días	vie 22/4/22	vie 22/4/22											
1862		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	0,2 días	vie 22/4/22	vie 22/4/22	1860										
1863		Recurso de revocatoria	15 días	lun 25/4/22	vie 13/5/22											
1864		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 25/4/22	mar 26/4/22	1862										
1865		Resolución de Recurso de revocatoria	10 días	mié 27/4/22	mar 10/5/22	1864										
1866		Adjudicación en firme	3 días	mié 11/5/22	vie 13/5/22	1865										
1867		Trámite del Pedido	2 días	lun 16/5/22	mar 17/5/22											
1868		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	lun 16/5/22	lun 16/5/22	1866										
1869		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	1 día	mar 17/5/22	mar 17/5/22	1868										
1870		Notificación de Pedido de Compra	0 días	mar 17/5/22	mar 17/5/22	1869										
1871		Recepción de los items	4 días	mié 18/5/22	lun 23/5/22											
1872		Entrega de los bienes/servicios	1 día	mié 18/5/22	mié 18/5/22	1870										
1873		Recibido a satisfacción	3 días	jue 19/5/22	lun 23/5/22	1872										
1874		Trámite de pago	32 días	mar 24/5/22	mié 6/7/22											
1875		Envío documentos a Financiero	2 días	mar 24/5/22	mié 25/5/22	1873										
1876		Emisión de pago en Financiero	30 días	jue 26/5/22	mié 6/7/22	1875										
1877		Conclusión trámite de Contratación	0 días	mié 6/7/22	mié 6/7/22	1876										
1878		UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (UTI)	116 días	lun 14/2/22	mié 3/8/22											
1879		2022CD-00023-503; UTI; Licencias Oracle y soporte; Contrato vence 29/7/2022; Envían especificaciones el 14/02/2022@ 19.043.000,00 /2022; Carolina Guevara - Eneyda Flores	66 días	lun 14/2/22	lun 23/5/22											
1880		Elaboración de Cartel	6 días	lun 14/2/22	lun 21/2/22											
1881		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 14/2/22	lun 14/2/22											
1882		Creación de Código en SICOP	5 días	lun 14/2/22	vie 18/2/22	1881										
1883		Confección de cartel definitivo	1 día	lun 21/2/22	lun 21/2/22	1882										
1884		Invitación a participar en Mer- Link	0 días	lun 21/2/22	lun 21/2/22	1883										
1885		Recepción y estudio de ofertas	0 días	lun 21/2/22	lun 21/2/22											
1886		Invitación a participar	0 días	lun 21/2/22	lun 21/2/22											
1887		Envío de invitación	0 días	lun 21/2/22	lun 21/2/22	1884										
1888		Objeción al cartel	1 día	mar 22/2/22	mar 22/2/22	1887										
1889		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mié 23/2/22	mar 8/3/22	1888										
1890		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mié 23/2/22	lun 28/2/22	1888										
1891		Nuevo plazo para recibir ofertas	5,8 días	mar 22/2/22	mié 2/3/22	1888										
1892		Recepción y estudio de ofertas	5,8 días	mar 22/2/22	mié 2/3/22											
1893		Apertura de ofertas SICOP	0 días	mar 22/2/22	mar 22/2/22											
1894		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	mar 22/2/22	mar 22/2/22	1893										
1895		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	0,8 días	mié 23/2/22	mié 23/2/22	1894										
1896		UT hace prevenciones a oferentes	0 días	mié 23/2/22	mié 23/2/22	1895										
1897		Oferentes responden a prevenciones	3 días	mié 23/2/22	lun 28/2/22	1896										
1898		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	lun 28/2/22	mié 2/3/22	1897										
1899		Elaboración de Informe Técnico	0 días	mié 2/3/22	mié 2/3/22	1898										
1900		Recomendación, adjudicación y comunicación	0,2 días	mié 2/3/22	mié 2/3/22											
1901		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	0,2 días	mié 2/3/22	mié 2/3/22	1899										
1902		Recurso de revocatoria	15 días	jue 3/3/22	mié 23/3/22											
1903		Plazo para recibir recurso	2 días	jue 3/3/22	vie 4/3/22	1901										
1904		Resolución de Recurso de revocatoria	10 días	lun 7/3/22	vie 18/3/22	1903										

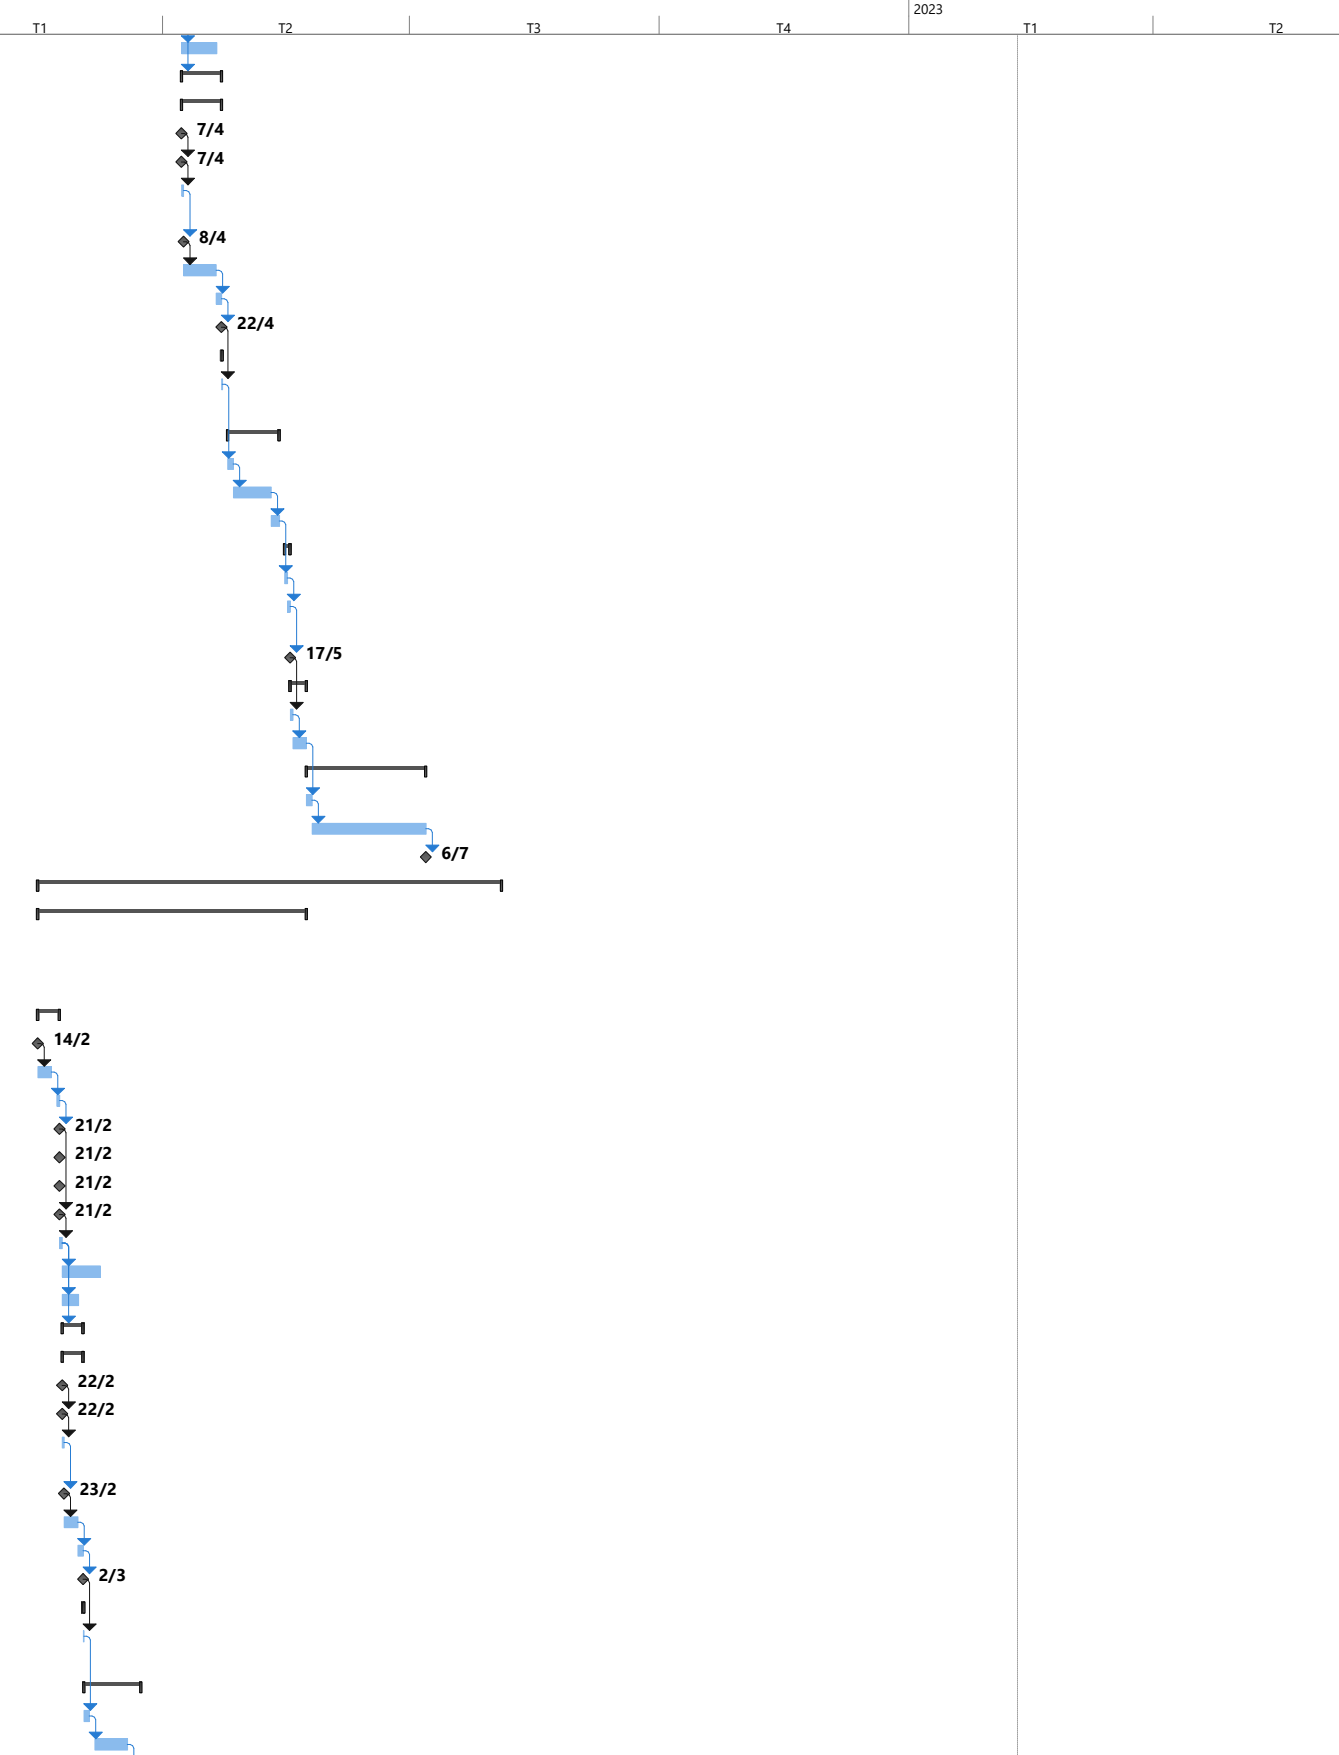

Proyecto: Cronograma de comp
Fecha: jue 16/12/21

Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		Progreso manual	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha limite			
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023	T1	T2
1905		Adjudicación en firme	3 días	lun 21/3/22	mié 23/3/22	1904										
1906		Trámite del Pedido	2 días	jue 24/3/22	vie 25/3/22											
1907		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	jue 24/3/22	jue 24/3/22	1905										
1908		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	1 día	vie 25/3/22	vie 25/3/22	1907										
1909		Notificación de Pedido de Compra	0 días	vie 25/3/22	vie 25/3/22	1908										
1910		Recepción de los items	4 días	lun 28/3/22	jue 31/3/22											
1911		Entrega de los bienes/servicios	1 día	lun 28/3/22	lun 28/3/22	1909										
1912		Recibido a satisfacción	3 días	mar 29/3/22	jue 31/3/22	1911										
1913		Trámite de pago	32 días	vie 1/4/22	lun 23/5/22											
1914		Envío documentos a Financiero	2 días	vie 1/4/22	lun 4/4/22	1912										
1915		Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 5/4/22	lun 23/5/22	1914										
1916		Conclusión trámite de Contratación	0 días	lun 23/5/22	lun 23/5/22	1915										
1917		2022CD-00024-503; UTI; Licencias IDEA; Contrato vence 26/11/2022 ; € 20.860.000,00 /2022; Carolina Guevara - Eneyda Flores	66 días	lun 2/5/22	mié 3/8/22											
1918		Elaboración de Cartel	6 días	lun 2/5/22	lun 9/5/22											
1919		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 2/5/22	lun 2/5/22											
1920		Creación de Código en SICOP	5 días	lun 2/5/22	vie 6/5/22	1919										
1921		Confección de cartel definitivo	1 día	lun 9/5/22	lun 9/5/22	1920										
1922		Invitación a participar en Mer- Link	0 días	lun 9/5/22	lun 9/5/22	1921										
1923		Recepción y estudio de ofertas	0 días	lun 9/5/22	lun 9/5/22											
1924		Invitación a participar	0 días	lun 9/5/22	lun 9/5/22											
1925		Envío de invitación	0 días	lun 9/5/22	lun 9/5/22	1922										
1926		Objeción al cartel	1 día	mar 10/5/22	mar 10/5/22	1925										
1927		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mié 11/5/22	mar 24/5/22	1926										
1928		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mié 11/5/22	lun 16/5/22	1926										
1929		Nuevo plazo para recibir ofertas	5,8 días	mar 10/5/22	mié 18/5/22	1926										
1930		Recepción y estudio de ofertas	5,8 días	mar 10/5/22	mié 18/5/22											
1931		Apertura de ofertas SICOP	0 días	mar 10/5/22	mar 10/5/22											
1932		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	mar 10/5/22	mar 10/5/22	1931										
1933		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	0,8 días	mié 11/5/22	mié 11/5/22	1932										
1934		UT hace prevenciones a oferentes	0 días	mié 11/5/22	mié 11/5/22	1933										
1935		Oferentes responden a prevenciones	3 días	mié 11/5/22	lun 16/5/22	1934										
1936		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	lun 16/5/22	mié 18/5/22	1935										
1937		Elaboración de Informe Técnico	0 días	mié 18/5/22	mié 18/5/22	1936										
1938		Recomendación, adjudicación y comunicación	0,2 días	mié 18/5/22	mié 18/5/22											
1939		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	0,2 días	mié 18/5/22	mié 18/5/22	1937										
1940		Recurso de revocatoria	15 días	jue 19/5/22	mié 8/6/22											
1941		Plazo para recibir recurso	2 días	jue 19/5/22	vie 20/5/22	1939										
1942		Resolución de Recurso de revocatoria	10 días	lun 23/5/22	vie 3/6/22	1941										
1943		Adjudicación en firme	3 días	lun 6/6/22	mié 8/6/22	1942										
1944		Trámite del Pedido	2 días	jue 9/6/22	vie 10/6/22											
1945		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	jue 9/6/22	jue 9/6/22	1943										
1946		Envío a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	1 día	vie 10/6/22	vie 10/6/22	1945										
1947		Notificación de Pedido de Compra	0 días	vie 10/6/22	vie 10/6/22	1946										
1948		Recepción de los items	4 días	lun 13/6/22	jue 16/6/22											
1949		Entrega de los bienes/servicios	1 día	lun 13/6/22	lun 13/6/22	1947										
1950		Recibido a satisfacción	3 días	mar 14/6/22	jue 16/6/22	1949										
1951		Trámite de pago	32 días	vie 17/6/22	mié 3/8/22											
1952		Envío documentos a Financiero	2 días	vie 17/6/22	lun 20/6/22	1950										
1953		Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 21/6/22	mié 3/8/22	1952										
1954		Conclusión trámite de Contratación	0 días	mié 3/8/22	mié 3/8/22	1953										

Proyecto: Cronograma de comp
Fecha: jue 16/12/21

Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		Progreso manual	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha limite			
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso			
