


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre						2º semestre											
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic						
1		<b>CRONOGRAMAS COMPRAS CGR - 2023</b>	350 días?	mié 22/11/23	mié 7/5/25																		
2		<b>LICITACIONES MAYORES (LGCP N° 9986, art 55 al 59; mayores a ¢ 238 223 960)</b>	328 días?	lun 8/1/24	mié 7/5/25																		
3		<b>UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (UTI)</b>	328 días?	lun 8/1/24	mié 7/5/25																		
92		<b>LICITACIONES MENORES (LGCP N° 9986, Art 60 y 61; mayores a ¢ 59 555 990 y menores a ¢ 238 223 960)</b>	290 días?	lun 8/1/24	vie 14/3/25																		
93		<b>UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (USG)</b>	205 días?	mié 15/5/24	vie 14/3/25																		
94		<b>2024LE-00000XX-000540/USG/Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema contra incendio de la CGR (vigente al 28/02/2025; iniciar en 2024); ¢24,000.000/2024, ¢96,000.000/4 años; Eneyda Flores/ Silvia Castro Codigo SICOP: 43222640/81112202</b>	205 días?	mié 15/5/24	vie 14/3/25																		
95		<b>Elaboración de pliego de condiciones</b>	0 días	mié 15/5/24	mié 15/5/24																		
96		Envío de especificaciones técnicas y estudios previos	0 días	mié 15/5/24	mié 15/5/24																		
97		<b>Elaboración documento complementario al pliego de condiciones</b>	27 días	mié 15/5/24	jue 20/6/24																		
98		Elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	5 días	mié 15/5/24	mar 21/5/24																		
99		Revision de cartel jefatura y/o colaboradores	3 días	mié 22/5/24	vie 24/5/24																		
100		Revisión jurídica de documento complementario al pliego de condiciones	5 días	lun 27/5/24	vie 31/5/24																		
101		Revisión técnica de documento complementario al pliego de condiciones	5 días	lun 3/6/24	vie 7/6/24																		
102		Atención de observaciones (Tentativo)	2 días	lun 10/6/24	mar 11/6/24																		
103		Sesión de trabajo (Pueden participar jefaturas)	2 días	mié 12/6/24	jue 13/6/24																		
104		Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	5 días	vie 14/6/24	jue 20/6/24																		
105		<b>Preparación previa a publicacion en SICOP</b>	11 días	vie 21/6/24	vie 5/7/24																		
106		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	vie 21/6/24	jue 27/6/24																		
107		Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en SICOP	5 días	vie 28/6/24	jue 4/7/24																		
108		Invitación a participar en SICOP	1 día	vie 5/7/24	vie 5/7/24																		
109		<b>Plazo para recibir ofertas (plazo entre 5dh y 15dh Art.173); Plazo para adjudicar doble del plazo para recibir ofertas Art 159 RLGCP</b>	15 días	vie 5/7/24	jue 25/7/24																		
110		Plazo para recibir ofertas	15 días	vie 5/7/24	jue 25/7/24																		
111		<b>Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (3dh p/objetar; 5dh p/resolver (Resuelve la Administración) Art. 284 RLGCP</b>	8 días	lun 8/7/24	mié 17/7/24																		
112		Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones	3 días	lun 8/7/24	mié 10/7/24																		
113		Resolución y comunicación de recurso	5 días	jue 11/7/24	mié 17/7/24																		
114		<b>Estudio de ofertas</b>	18 días	jue 18/7/24	mié 14/8/24																		
115		Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y técnico	1 día	jue 18/7/24	jue 18/7/24																		
116		Valoración de ofertas	5 días	vie 19/7/24	jue 25/7/24																		

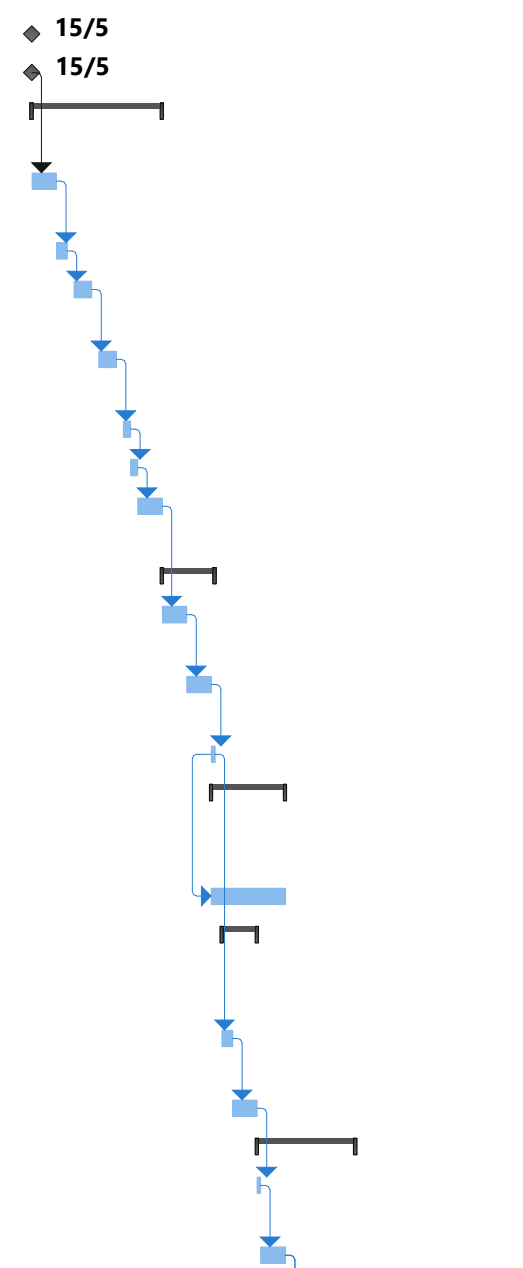

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: vie 22/3/24

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre						2º semestre								
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic			
117	→	Reunión de admisibilidad	1 día	vie 26/7/24	vie 26/7/24															
118	→	Previsiones a los oferentes	1 día	vie 26/7/24	vie 26/7/24															
119	→	Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes)	3 días	mar 30/7/24	jue 1/8/24															
120	→	Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	lun 5/8/24	mié 7/8/24															
121	→	Informe de admisibilidad (UJI)	5 días	jue 8/8/24	mié 14/8/24															
122	→	<b>Informe de recomendación</b>	<b>6 días</b>	<b>jue 8/8/24</b>	<b>jue 15/8/24</b>															
123	→	Elaboración de Informe de recomendación	6 días	jue 8/8/24	jue 15/8/24															
124	→	<b>Adjudicación y notificación</b>	<b>11 días</b>	<b>vie 16/8/24</b>	<b>lun 2/9/24</b>															
125	→	Convocatoria a la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones	3 días	vie 16/8/24	mié 21/8/24															
126	→	Sesión de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones	0,5 días	jue 22/8/24	jue 22/8/24															
127	→	Recomendación de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones	0,5 días	jue 22/8/24	jue 22/8/24															
128	→	Elaboración de acuerdo de adjudicación	1 día	vie 23/8/24	vie 23/8/24															
129	→	Notificación del acto de adjudicación (SICOP)	1 día	lun 26/8/24	lun 26/8/24															
130	→	Firmeza del acto de adjudicación	5 días	mar 27/8/24	lun 2/9/24															
131	→	<b>Plazo recepción de recurso revocatoria (5 dh Art N°99 LGCP)</b>	<b>5 días</b>	<b>mar 27/8/24</b>	<b>lun 2/9/24</b>															
132	→	Plazo recepción recurso de revocatoria	5 días	mar 27/8/24	lun 2/9/24															
133	→	<b>Recurso de revocatoria Presentación en 5dh; 3dh admisibilidad; 5dh audiencia inicial; 10 dh p/resolver (resuelve la Administración) Art 99 LGCP Art. 284 y Art. 285 NOTA: Se indican los plazos dispuestos en la ley</b>	<b>18 días</b>	<b>mar 3/9/24</b>	<b>jue 26/9/24</b>															
134	→	Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inac	3 días	mar 3/9/24	jue 5/9/24															
135	→	Audiencia inicial	5 días	vie 6/9/24	jue 12/9/24															
136	→	Resolución de recurso	10 días	vie 13/9/24	jue 26/9/24															
137	→	Notificación de la resolución (SICOP)	0 días	jue 26/9/24	jue 26/9/24															
138	→	<b>Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones</b>	<b>10 días</b>	<b>vie 27/9/24</b>	<b>jue 10/10/24</b>															
139	→	Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	vie 27/9/24	mar 1/10/24															
140	→	Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 2/10/24	mié 2/10/24															
141	→	Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comisión de A	0,5 días	mié 2/10/24	mié 2/10/24															
142	→	Elaboración de acuerdo de adjudicación	1 día	jue 3/10/24	jue 3/10/24															
143	→	Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicación (SICOP)	0 días	jue 3/10/24	jue 3/10/24															
144	→	Adjudicación en firme	5 días	vie 4/10/24	jue 10/10/24															
145	→	<b>Trámite de contrato</b>	<b>26 días</b>	<b>vie 11/10/24</b>	<b>vie 15/11/24</b>															
146	→	Elaboración de contrato e informe	4 días	vie 11/10/24	mié 16/10/24															
147	→	Solicitud de documentos al adjudicatario	1 día	jue 17/10/24	jue 17/10/24															
148	→	Presentación de timbres y garantía de cumplimiento por parte del ad	5 días	vie 18/10/24	jue 24/10/24															
149	→	Firma de contrato oferente	1 día	vie 25/10/24	vie 25/10/24															
150	→	Envío de contrato para firma Gerente de División de Apoyo	0 días	vie 25/10/24	vie 25/10/24															
151	→	Firma de contrato	5 días	lun 28/10/24	vie 1/11/24															
152	→	Envío de contrato a refrendo interno a la UJI	0 días	vie 1/11/24	vie 1/11/24															

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: vie 22/3/24

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre						2º semestre								
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic			
153		Refrendo interno a contrato	10 días	lun 4/11/24	vie 15/11/24															
154		Comunicación a la contratista del refendo de contrato y orden de inicio	0 días	vie 15/11/24	vie 15/11/24															
155		<b>Trámite de la orden de pedido</b>	<b>6 días</b>	<b>lun 18/11/24</b>	<b>lun 25/11/24</b>															
156		Elaboración de orden de pedido temporal	2 días	lun 18/11/24	mar 19/11/24															
157		Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	mar 19/11/24	mar 19/11/24															
158		Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	mié 20/11/24	vie 22/11/24															
159		Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24															
160		Firma de pedido por Proveedor	0 días	lun 25/11/24	lun 25/11/24															
161		Notificación de la orden de pedido	0 días	lun 25/11/24	lun 25/11/24															
162		<b>Recepción de los bienes y/o servicios</b>	<b>30 días</b>	<b>mar 26/11/24</b>	<b>lun 20/1/25</b>															
163		Trámite de exoneración de bienes	10 días	mar 26/11/24	lun 9/12/24															
164		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 10/12/24	lun 6/1/25															
165		Recibido a satisfacción	10 días	mar 7/1/25	lun 20/1/25															
166		<b>Trámite de pago</b>	<b>39 días?</b>	<b>mar 21/1/25</b>	<b>vie 14/3/25</b>															
167		Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mar 21/1/25	mar 21/1/25															
168		Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mié 22/1/25	mié 22/1/25															
169		Generación y firma de trámite de pago	1 día	jue 23/1/25	jue 23/1/25															
170		Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	vie 24/1/25	vie 24/1/25															
171		Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	lun 27/1/25	vie 31/1/25															
172		Pago de Tesorería Nacional	30 días	lun 3/2/25	vie 14/3/25															
173		Fin	0 días	vie 14/3/25	vie 14/3/25															
174		<b>UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (UTI)</b>	<b>260 días?</b>	<b>lun 8/1/24</b>	<b>vie 31/1/25</b>															
415		<b>LICITACIONES REDUCIDAS (LGCP Nº 9986, Art 62, 63; menores a ¢ 59 555 990)</b>	<b>268 días?</b>	<b>mié 22/11/23</b>	<b>lun 13/1/25</b>															
416		<b>UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (USG)</b>	<b>268 días?</b>	<b>mié 22/11/23</b>	<b>lun 13/1/25</b>															
417		<b>2024LD-0000XX-000540/USG y SPI/Impermeabilizantes, pinturas y diluyentes; Envían especificaciones 12/06/2024; ¢800.000/2024 ; Silvia Castro / Yeimy Mora Código SICOP:31201631</b>	<b>141 días?</b>	<b>mié 12/6/24</b>	<b>lun 13/1/25</b>															
418		Elaboración de pliego de condiciones	0 días	mié 12/6/24	mié 12/6/24															
419		Envío de especificaciones técnicas y estudios previos	0 días	mié 12/6/24	mié 12/6/24															
420		<b>Confección documento complementario al pliego de condiciones</b>	<b>8 días</b>	<b>mié 12/6/24</b>	<b>vie 21/6/24</b>															
421		Elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	2 días	mié 12/6/24	jue 13/6/24															
422		Revisión de documento colaborador USP	2 días	vie 14/6/24	lun 17/6/24															
423		Revisión Técnica de documento complementario al pliego de condiciones	3 días	mar 18/6/24	jue 20/6/24															
424		Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	1 día	vie 21/6/24	vie 21/6/24															
425		<b>Preparación previa a publicación en SICOP</b>	<b>15 días</b>	<b>lun 24/6/24</b>	<b>vie 12/7/24</b>															
426		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	lun 24/6/24	vie 28/6/24															

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: vie 22/3/24

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre						2º semestre					
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
427		Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en SICOP	5 días	lun 1/7/24	vie 5/7/24												
428		<b>Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh)</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 8/7/24</b>	<b>vie 12/7/24</b>												
429		<b>Plazo para recepción de ofertas (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 RLGCP)</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 15/7/24</b>	<b>vie 19/7/24</b>												
430		Plazo para recibir ofertas	5 días	lun 15/7/24	vie 19/7/24												
431		<b>Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284)</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 15/7/24</b>	<b>vie 19/7/24</b>												
432		Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones	2 días	lun 15/7/24	mar 16/7/24												
433		Resolución y comunicación de recurso	3 días	mié 17/7/24	vie 19/7/24												
434		<b>Estudio de ofertas</b>	<b>6,5 días</b>	<b>lun 22/7/24</b>	<b>mié 31/7/24</b>												
435		Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y técnico	1 día	lun 22/7/24	lun 22/7/24												
436		Valoración de ofertas	1 día	mar 23/7/24	mar 23/7/24												
437		Previsiones a los oferentes	0,5 días	mié 24/7/24	mié 24/7/24												
438		Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes)	2 días	mié 24/7/24	vie 26/7/24												
439		Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT	2 días	vie 26/7/24	mié 31/7/24												
440		<b>Recomendación de adjudicación (UT)</b>	<b>3 días</b>	<b>mié 31/7/24</b>	<b>mar 6/8/24</b>												
441		Recomendación de adjudicación (UT)	1 día	mié 31/7/24	jue 1/8/24												
442		Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT y Fiscalizador USP)	2 días	jue 1/8/24	mar 6/8/24												
443		<b>Adjudicación y notificación</b>	<b>0,5 días</b>	<b>mar 6/8/24</b>	<b>mar 6/8/24</b>												
444		Elaboración de acuerdo de adjudicación	0,5 días	mar 6/8/24	mar 6/8/24												
445		Notificación del acto de adjudicación (SICOP)	0 días	mar 6/8/24	mar 6/8/24												
446		<b>Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP)</b>	<b>2 días</b>	<b>mié 7/8/24</b>	<b>jue 8/8/24</b>												
447		<b>Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA)</b>	<b>2 días</b>	<b>mié 7/8/24</b>	<b>jue 8/8/24</b>												
448		Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	mié 7/8/24	jue 8/8/24												
449		<b>Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)</b>	<b>2 días</b>	<b>mié 7/8/24</b>	<b>jue 8/8/24</b>												
450		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 7/8/24	jue 8/8/24												
451		<b>Plazo para audiencia inicial</b>	<b>5 días</b>	<b>vie 9/8/24</b>	<b>jue 15/8/24</b>												
452		Resolución de Recurso de revocatoria	3 días	vie 9/8/24	mar 13/8/24												
453		Adjudicación en firme	2 días	mié 14/8/24	jue 15/8/24												
454		<b>Trámite de contrato</b>	<b>11 días?</b>	<b>vie 16/8/24</b>	<b>lun 2/9/24</b>												
455		Elaboración del Contrato	4 días	vie 16/8/24	jue 22/8/24												
456		Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	vie 23/8/24	vie 23/8/24												
457		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, patente, etc)	5 días	lun 26/8/24	vie 30/8/24												
458		Firma de contrato Proveedor USP	1 día?	lun 2/9/24	lun 2/9/24												
459		Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa	0 días	lun 2/9/24	lun 2/9/24												
460		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>6 días</b>	<b>mar 3/9/24</b>	<b>mar 10/9/24</b>												

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: vie 22/3/24


Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre						2º semestre						
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
461		Elaboración de orden de pedido temporal	2 días	mar 3/9/24	mié 4/9/24													
462		Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	mié 4/9/24	mié 4/9/24													
463		Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	jue 5/9/24	lun 9/9/24													
464		Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	mar 10/9/24	mar 10/9/24													
465		Firma de pedido por Proveedor USP	0 días	mar 10/9/24	mar 10/9/24													
466		Notificación de la orden de pedido	0 días	mar 10/9/24	mar 10/9/24													
467		<b>Recepción de los bienes y/o servicios</b>	<b>40 días</b>	<b>mié 11/9/24</b>	<b>mar 5/11/24</b>													
468		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mié 11/9/24	mar 24/9/24													
469		Recibido a satisfacción	30 días	mié 25/9/24	mar 5/11/24													
470		<b>Trámite de pago</b>	<b>39 días?</b>	<b>mié 6/11/24</b>	<b>lun 13/1/25</b>													
471		Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mié 6/11/24	mié 6/11/24													
472		Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	jue 7/11/24	jue 7/11/24													
473		Generación y firma de trámite de pago	1 día?	vie 8/11/24	vie 8/11/24													
474		Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	lun 11/11/24	lun 11/11/24													
475		Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	mar 12/11/24	lun 18/11/24													
476		Pago de Tesorería Nacional	30 días	mar 19/11/24	lun 13/1/25													
477		Fin	0 días	lun 13/1/25	lun 13/1/25													
478		<b>2024LD-0000XX-000540/USG y SPI/Lámina de fibra mineral para cielo raso; (Contratado al 24/11/2024; \$2,356.000/2024 ; Gabriela Solano / Ingrid Noguera Código SICOP:311628</b>	<b>141 días?</b>	<b>lun 4/3/24</b>	<b>lun 30/9/24</b>													
479		Elaboración de pliego de condiciones	0 días	lun 4/3/24	lun 4/3/24													
480		Envío de especificaciones técnicas y estudios previos	0 días	lun 4/3/24	lun 4/3/24													
481		Confección documento complementario al pliego de condiciones	8 días	lun 4/3/24	mié 13/3/24													
482		Elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	2 días	lun 4/3/24	mar 5/3/24													
483		Revisión de documento colaborador USP	2 días	mié 6/3/24	jue 7/3/24													
484		Revisión Técnica de documento complementario al pliego de condiciones	3 días	vie 8/3/24	mar 12/3/24													
485		Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	1 día	mié 13/3/24	mié 13/3/24													
486		<b>Preparación previa a publicación en SICOP</b>	<b>15 días</b>	<b>jue 14/3/24</b>	<b>mié 10/4/24</b>													
487		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	jue 14/3/24	mié 20/3/24													
488		Elaboración de solicitud y confección de pliego de condiciones en SICOP	5 días	jue 21/3/24	mié 3/4/24													
489		Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh)	5 días	jue 4/4/24	mié 10/4/24													
490		<b>Plazo para recepción de ofertas (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 RLGCP)</b>	<b>5 días</b>	<b>jue 11/4/24</b>	<b>jue 18/4/24</b>													
491		Plazo para recibir ofertas	5 días	jue 11/4/24	jue 18/4/24													
492		<b>Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284)</b>	<b>5 días</b>	<b>jue 11/4/24</b>	<b>jue 18/4/24</b>													
493		Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones	2 días	jue 11/4/24	vie 12/4/24													

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: vie 22/3/24

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre						2º semestre											
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic						
494		Resolución y comunicación de recurso	3 días	mar 16/4/24	jue 18/4/24																		
495		<b>Estudio de ofertas</b>	<b>6,5 días</b>	<b>vie 19/4/24</b>	<b>lun 29/4/24</b>																		
496		Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y técnico	1 día	vie 19/4/24	vie 19/4/24																		
497		Valoración de ofertas	1 día	lun 22/4/24	lun 22/4/24																		
498		Previsiones a los oferentes	0,5 días	mar 23/4/24	mar 23/4/24																		
499		Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes)	2 días	mar 23/4/24	jue 25/4/24																		
500		Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT	2 días	jue 25/4/24	lun 29/4/24																		
501		<b>Recomendación de adjudicación (UT)</b>	<b>3 días</b>	<b>lun 29/4/24</b>	<b>vie 3/5/24</b>																		
502		Recomendación de adjudicación (UT)	1 día	lun 29/4/24	mar 30/4/24																		
503		Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT y Fiscalizador USP)	2 días	mar 30/4/24	vie 3/5/24																		
504		<b>Adjudicación y notificación</b>	<b>0,5 días</b>	<b>vie 3/5/24</b>	<b>vie 3/5/24</b>																		
505		Elaboración de acuerdo de adjudicación	0,5 días	vie 3/5/24	vie 3/5/24																		
506		Notificación del acto de adjudicación (SICOP)	0 días	vie 3/5/24	vie 3/5/24																		
507		<b>Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP)</b>	<b>2 días</b>	<b>lun 6/5/24</b>	<b>mar 7/5/24</b>																		
508		<b>Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA)</b>	<b>2 días</b>	<b>lun 6/5/24</b>	<b>mar 7/5/24</b>																		
509		Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	lun 6/5/24	mar 7/5/24																		
510		<b>Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)</b>	<b>2 días</b>	<b>lun 6/5/24</b>	<b>mar 7/5/24</b>																		
511		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	lun 6/5/24	mar 7/5/24																		
512		<b>Plazo para audiencia inicial</b>	<b>5 días</b>	<b>mié 8/5/24</b>	<b>mar 14/5/24</b>																		
513		Resolución de Recurso de revocatoria	3 días	mié 8/5/24	vie 10/5/24																		
514		Adjudicación en firme	2 días	lun 13/5/24	mar 14/5/24																		
515		<b>Trámite de contrato</b>	<b>11 días?</b>	<b>mié 15/5/24</b>	<b>mié 29/5/24</b>																		
516		Elaboración del Contrato	4 días	mié 15/5/24	lun 20/5/24																		
517		Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	mar 21/5/24	mar 21/5/24																		
518		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, patente, etc)	5 días	mié 22/5/24	mar 28/5/24																		
519		Firma de contrato Proveedor USP	1 día?	mié 29/5/24	mié 29/5/24																		
520		Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa	0 días	mié 29/5/24	mié 29/5/24																		
521		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>6 días</b>	<b>jue 30/5/24</b>	<b>jue 6/6/24</b>																		
522		Elaboración de orden de pedido temporal	2 días	jue 30/5/24	vie 31/5/24																		
523		Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	vie 31/5/24	vie 31/5/24																		
524		Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	lun 3/6/24	mié 5/6/24																		
525		Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	jue 6/6/24	jue 6/6/24																		
526		Firma de pedido por Proveedor USP	0 días	jue 6/6/24	jue 6/6/24																		
527		Notificación de la orden de pedido	0 días	jue 6/6/24	jue 6/6/24																		
528		<b>Recepción de los bienes y/o servicios</b>	<b>40 días</b>	<b>vie 7/6/24</b>	<b>lun 5/8/24</b>																		
529		Entrega de los bienes/servicios	10 días	vie 7/6/24	jue 20/6/24																		
530		Recibido a satisfacción	30 días	vie 21/6/24	lun 5/8/24																		

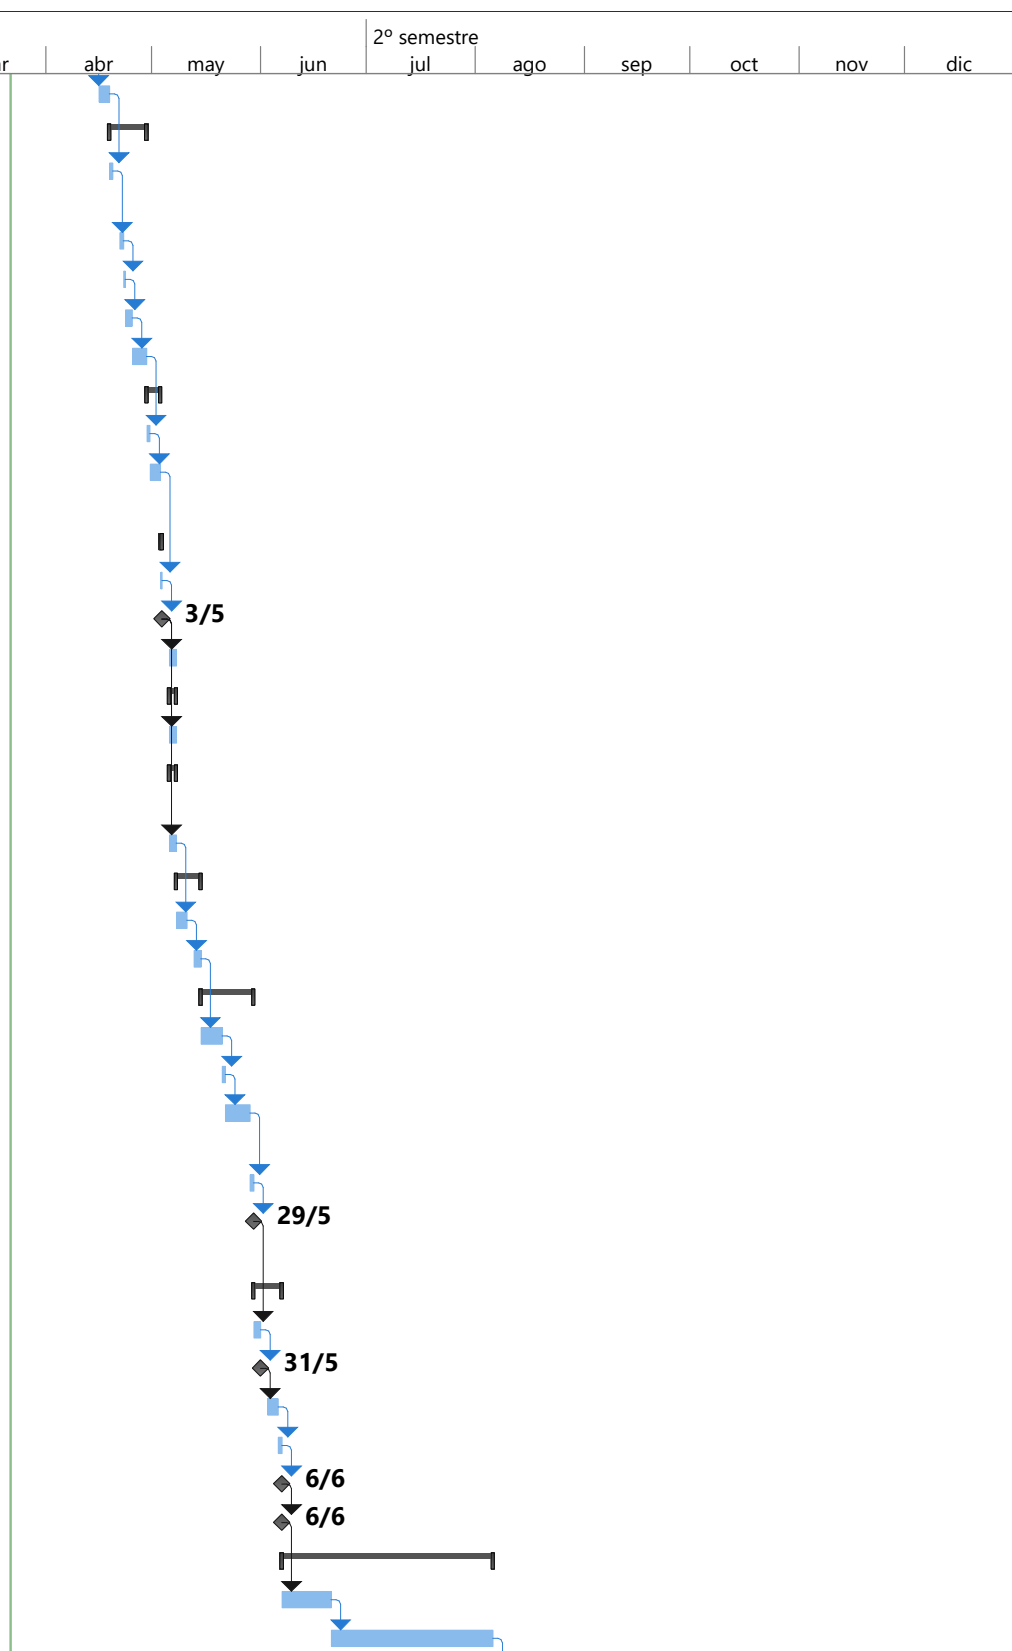


Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: vie 22/3/24

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre						2º semestre								
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic			
562		<b>Recomendación de adjudicación (UT)</b>	<b>3 días</b>	<b>vie 23/2/24</b>	<b>mié 28/2/24</b>															
563		Recomendación de adjudicación (UT)	1 día	vie 23/2/24	lun 26/2/24															
564		Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT y Fiscalizador USP)	2 días	lun 26/2/24	mié 28/2/24															
565		<b>Adjudicación y notificación</b>	<b>0,5 días</b>	<b>mié 28/2/24</b>	<b>mié 28/2/24</b>															
566		Elaboración de acuerdo de adjudicación	0,5 días	mié 28/2/24	mié 28/2/24															
567		Notificación del acto de adjudicación (SICOP)	0 días	mié 28/2/24	mié 28/2/24															
568		<b>Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP)</b>	<b>2 días</b>	<b>jue 29/2/24</b>	<b>vie 1/3/24</b>															
569		<b>Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA)</b>	<b>2 días</b>	<b>jue 29/2/24</b>	<b>vie 1/3/24</b>															
570		Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	jue 29/2/24	vie 1/3/24															
571		<b>Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)</b>	<b>2 días</b>	<b>jue 29/2/24</b>	<b>vie 1/3/24</b>															
572		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	jue 29/2/24	vie 1/3/24															
573		<b>Plazo para audiencia inicial</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 4/3/24</b>	<b>vie 8/3/24</b>															
574		Resolución de Recurso de revocatoria	3 días	lun 4/3/24	mié 6/3/24															
575		Adjudicación en firme	2 días	jue 7/3/24	vie 8/3/24															
576		<b>Trámite de contrato</b>	<b>11 días?</b>	<b>lun 11/3/24</b>	<b>lun 1/4/24</b>															
577		Elaboración del Contrato	4 días	lun 11/3/24	jue 14/3/24															
578		Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	vie 15/3/24	vie 15/3/24															
579		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, patente, etc)	5 días	lun 18/3/24	vie 22/3/24															
580		Firma de contrato Proveedor USP	1 día?	lun 1/4/24	lun 1/4/24															
581		Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa	0 días	lun 1/4/24	lun 1/4/24															
582		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>6 días</b>	<b>mar 2/4/24</b>	<b>mar 9/4/24</b>															
583		Elaboración de orden de pedido temporal	2 días	mar 2/4/24	mié 3/4/24															
584		Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	mié 3/4/24	mié 3/4/24															
585		Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	jue 4/4/24	lun 8/4/24															
586		Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	mar 9/4/24	mar 9/4/24															
587		Firma de pedido por Proveedor USP	0 días	mar 9/4/24	mar 9/4/24															
588		Notificación de la orden de pedido	0 días	mar 9/4/24	mar 9/4/24															
589		<b>Recepción de los bienes y/o servicios</b>	<b>40 días</b>	<b>mié 10/4/24</b>	<b>jue 6/6/24</b>															
590		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mié 10/4/24	mié 24/4/24															
591		Recibido a satisfacción	30 días	jue 25/4/24	jue 6/6/24															
592		<b>Trámite de pago</b>	<b>39 días?</b>	<b>vie 7/6/24</b>	<b>jue 1/8/24</b>															
593		Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	vie 7/6/24	vie 7/6/24															
594		Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	lun 10/6/24	lun 10/6/24															
595		Generación y firma de trámite de pago	1 día?	mar 11/6/24	mar 11/6/24															
596		Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	mié 12/6/24	mié 12/6/24															
597		Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	jue 13/6/24	mié 19/6/24															
598		Pago de Tesorería Nacional	30 días	jue 20/6/24	jue 1/8/24															
599		Fin	0 días	jue 1/8/24	jue 1/8/24															

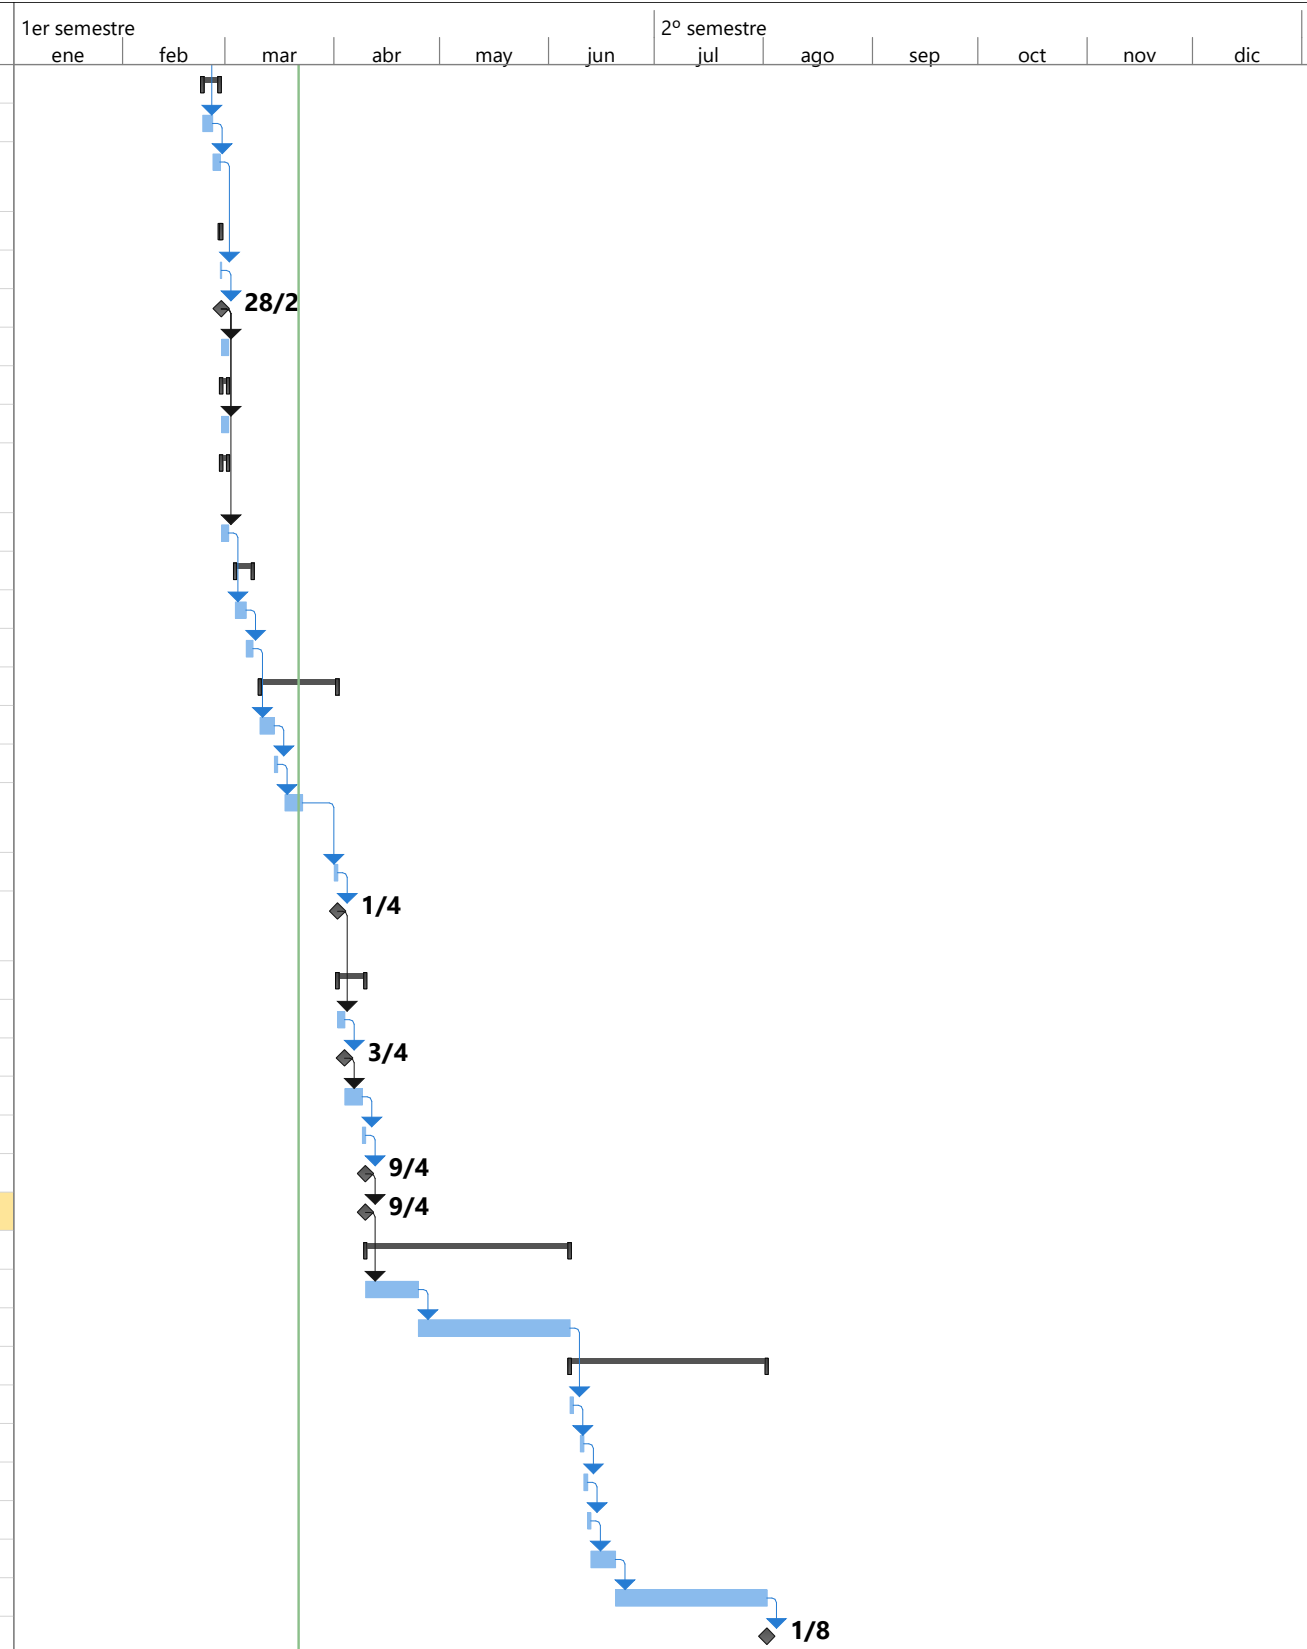


Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: vie 22/3/24

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre						2º semestre					
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
630		<b>Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA)</b>	2 días	mar 25/6/24	mié 26/6/24												
631		Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	mar 25/6/24	mié 26/6/24												
632		<b>Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)</b>	2 días	mar 25/6/24	mié 26/6/24												
633		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mar 25/6/24	mié 26/6/24												
634		<b>Plazo para audiencia inicial</b>	5 días	jue 27/6/24	mié 3/7/24												
635		Resolución de Recurso de revocatoria	3 días	jue 27/6/24	lun 1/7/24												
636		Adjudicación en firme	2 días	mar 2/7/24	mié 3/7/24												
637		<b>Trámite de contrato</b>	11 días?	jue 4/7/24	jue 18/7/24												
638		Elaboración del Contrato	4 días	jue 4/7/24	mar 9/7/24												
639		Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	mié 10/7/24	mié 10/7/24												
640		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, patente, etc)	5 días	jue 11/7/24	mié 17/7/24												
641		Firma de contrato Proveedor USP	1 día?	jue 18/7/24	jue 18/7/24												
642		Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa	0 días	jue 18/7/24	jue 18/7/24												
643		<b>Trámite del Pedido</b>	6 días	vie 19/7/24	vie 26/7/24												
644		Elaboración de orden de pedido temporal	2 días	vie 19/7/24	lun 22/7/24												
645		Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	lun 22/7/24	lun 22/7/24												
646		Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	mar 23/7/24	jue 25/7/24												
647		Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	vie 26/7/24	vie 26/7/24												
648		Firma de pedido por Proveedor USP	0 días	vie 26/7/24	vie 26/7/24												
649		Notificación de la orden de pedido	0 días	vie 26/7/24	vie 26/7/24												
650		<b>Recepción de los bienes y/o servicios</b>	40 días	mar 30/7/24	mié 25/9/24												
651		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 30/7/24	mar 13/8/24												
652		Recibido a satisfacción	30 días	mié 14/8/24	mié 25/9/24												
653		<b>Trámite de pago</b>	39 días?	jue 26/9/24	mar 19/11/24												
654		Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	jue 26/9/24	jue 26/9/24												
655		Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	vie 27/9/24	vie 27/9/24												
656		Generación y firma de trámite de pago	1 día?	lun 30/9/24	lun 30/9/24												
657		Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	mar 1/10/24	mar 1/10/24												
658		Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	mié 2/10/24	mar 8/10/24												
659		Pago de Tesorería Nacional	30 días	mié 9/10/24	mar 19/11/24												
660		Fin	0 días	mar 19/11/24	mar 19/11/24												
661		<b>2024LD-00000XX-000540/USG/Compra de herramientas (Contratado al 30/06/2024); \$4.400.000/2024; / Código SICOP:271127</b>	141 días?	lun 22/1/24	vie 16/8/24												
662		<b>Elaboración de pliego de condiciones</b>	0 días	lun 22/1/24	lun 22/1/24												
663		Envío de especificaciones técnicas y estudios previos	0 días	lun 22/1/24	lun 22/1/24												
664		<b>Confección documento complementario al pliego de condiciones</b>	8 días	lun 22/1/24	mié 31/1/24												
665		Elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	2 días	lun 22/1/24	mar 23/1/24												
666		Revisión de documento colaborador USP	2 días	mié 24/1/24	jue 25/1/24												

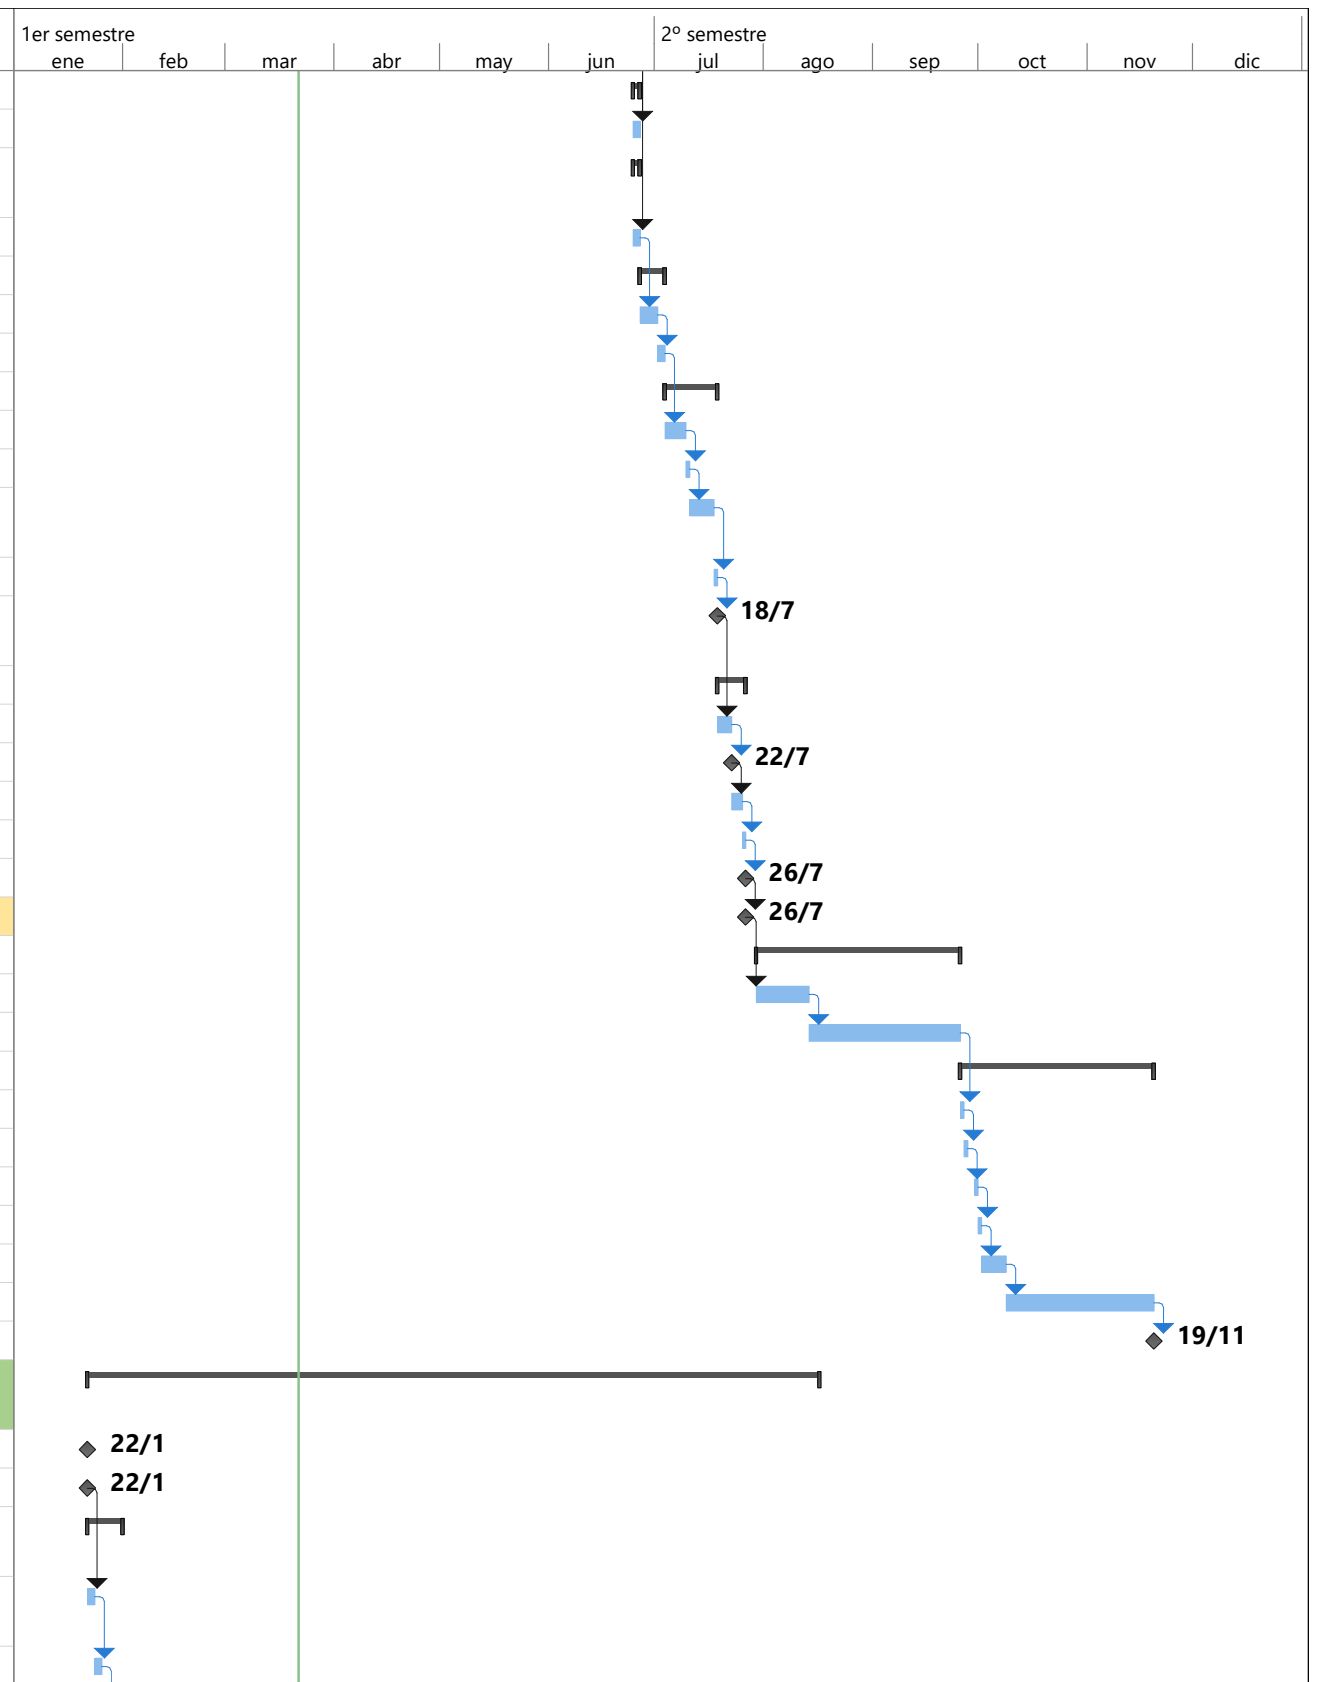

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: vie 22/3/24


Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre						2º semestre								
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic			
667	→	Revisión Técnica de documento complementario al pliego de condiciones	3 días	vie 26/1/24	mar 30/1/24															
668	→	Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	1 día	mié 31/1/24	mié 31/1/24															
669	→	<b>Preparación previa a publicacion en SICOP</b>	<b>15 días</b>	<b>jue 1/2/24</b>	<b>mié 21/2/24</b>															
670	→	Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	jue 1/2/24	mié 7/2/24															
671	→	Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en SICOP	5 días	jue 8/2/24	mié 14/2/24															
672	→	<b>Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh)</b>	<b>5 días</b>	<b>jue 15/2/24</b>	<b>mié 21/2/24</b>															
673	→	<b>Plazo para recepción de ofertas (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 RLGCP)</b>	<b>5 días</b>	<b>jue 22/2/24</b>	<b>mié 28/2/24</b>															
674	→	Plazo para recibir ofertas	5 días	jue 22/2/24	mié 28/2/24															
675	→	<b>Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284)</b>	<b>5 días</b>	<b>jue 22/2/24</b>	<b>mié 28/2/24</b>															
676	→	Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones	2 días	jue 22/2/24	vie 23/2/24															
677	→	Resolución y comunicación de recurso	3 días	lun 26/2/24	mié 28/2/24															
678	→	<b>Estudio de ofertas</b>	<b>6,5 días</b>	<b>jue 29/2/24</b>	<b>vie 8/3/24</b>															
679	→	Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y técnico	1 día	jue 29/2/24	jue 29/2/24															
680	→	Valoración de ofertas	1 día	vie 1/3/24	vie 1/3/24															
681	→	Previsiones a los oferentes	0,5 días	lun 4/3/24	lun 4/3/24															
682	→	Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes)	2 días	lun 4/3/24	mié 6/3/24															
683	→	Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT	2 días	mié 6/3/24	vie 8/3/24															
684	→	<b>Recomendación de adjudicación (UT)</b>	<b>3 días</b>	<b>vie 8/3/24</b>	<b>mié 13/3/24</b>															
685	→	Recomendación de adjudicación (UT)	1 día	vie 8/3/24	lun 11/3/24															
686	→	Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT y Fiscalizador USP)	2 días	lun 11/3/24	mié 13/3/24															
687	→	<b>Adjudicación y notificación</b>	<b>0,5 días</b>	<b>mié 13/3/24</b>	<b>mié 13/3/24</b>															
688	→	Elaboración de acuerdo de adjudicación	0,5 días	mié 13/3/24	mié 13/3/24															
689	→	Notificación del acto de adjudicación (SICOP)	0 días	mié 13/3/24	mié 13/3/24															
690	→	<b>Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP)</b>	<b>2 días</b>	<b>jue 14/3/24</b>	<b>vie 15/3/24</b>															
691	→	<b>Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA)</b>	<b>2 días</b>	<b>jue 14/3/24</b>	<b>vie 15/3/24</b>															
692	→	Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	jue 14/3/24	vie 15/3/24															
693	→	<b>Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)</b>	<b>2 días</b>	<b>jue 14/3/24</b>	<b>vie 15/3/24</b>															
694	→	Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	jue 14/3/24	vie 15/3/24															
695	→	<b>Plazo para audiencia inicial</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 18/3/24</b>	<b>vie 22/3/24</b>															
696	→	Resolución de Recurso de revocatoria	3 días	lun 18/3/24	mié 20/3/24															
697	→	Adjudicación en firme	2 días	jue 21/3/24	vie 22/3/24															
698	→	<b>Trámite de contrato</b>	<b>11 días?</b>	<b>lun 1/4/24</b>	<b>mar 16/4/24</b>															
699	→	Elaboración del Contrato	4 días	lun 1/4/24	jue 4/4/24															

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: vie 22/3/24

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre						2º semestre								
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic			
700		Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	vie 5/4/24	vie 5/4/24															
701		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, patente, etc)	5 días	lun 8/4/24	vie 12/4/24															
702		Firma de contrato Proveedor USP	1 día?	mar 16/4/24	mar 16/4/24															
703		Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa	0 días	mar 16/4/24	mar 16/4/24															
704		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>6 días</b>	<b>mié 17/4/24</b>	<b>mié 24/4/24</b>															
705		Elaboración de orden de pedido temporal	2 días	mié 17/4/24	jue 18/4/24															
706		Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	jue 18/4/24	jue 18/4/24															
707		Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	vie 19/4/24	mar 23/4/24															
708		Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	mié 24/4/24	mié 24/4/24															
709		Firma de pedido por Proveedor USP	0 días	mié 24/4/24	mié 24/4/24															
710		Notificación de la orden de pedido	0 días	mié 24/4/24	mié 24/4/24															
711		<b>Recepción de los bienes y/o servicios</b>	<b>40 días</b>	<b>jue 25/4/24</b>	<b>jue 20/6/24</b>															
712		Entrega de los bienes/servicios	10 días	jue 25/4/24	jue 9/5/24															
713		Recibido a satisfacción	30 días	vie 10/5/24	jue 20/6/24															
714		<b>Trámite de pago</b>	<b>39 días?</b>	<b>vie 21/6/24</b>	<b>vie 16/8/24</b>															
715		Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	vie 21/6/24	vie 21/6/24															
716		Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	lun 24/6/24	lun 24/6/24															
717		Generación y firma de trámite de pago	1 día?	mar 25/6/24	mar 25/6/24															
718		Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	mié 26/6/24	mié 26/6/24															
719		Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	jue 27/6/24	mié 3/7/24															
720		Pago de Tesorería Nacional	30 días	jue 4/7/24	vie 16/8/24															
721		Fin	0 días	vie 16/8/24	vie 16/8/24															
722		<b>2024LD-0000XX-000540/USG/Limpieza de tanques (potable, negra y pluviales) y análisis de calidad del agua potable, vigente al 12/05/2024; \$2.553.000/2024; / Código SICOP:72154055</b>	<b>141 días?</b>	<b>mié 20/3/24</b>	<b>mié 16/10/24</b>															
723		Elaboración de pliego de condiciones	0 días	mié 20/3/24	mié 20/3/24															
724		Envío de especificaciones técnicas y estudios previos	0 días	mié 20/3/24	mié 20/3/24															
725		Confección documento complementario al pliego de condiciones	8 días	mié 20/3/24	vie 5/4/24															
726		Elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	2 días	mié 20/3/24	jue 21/3/24															
727		Revisión de documento colaborador USP	2 días	vie 22/3/24	lun 1/4/24															
728		Revisión Técnica de documento complementario al pliego de condiciones	3 días	mar 2/4/24	jue 4/4/24															
729		Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	1 día	vie 5/4/24	vie 5/4/24															
730		<b>Preparación previa a publicación en SICOP</b>	<b>15 días</b>	<b>lun 8/4/24</b>	<b>lun 29/4/24</b>															
731		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	lun 8/4/24	vie 12/4/24															
732		Elaboración de solicitud y confección de pliego de condiciones en SICOP	5 días	mar 16/4/24	lun 22/4/24															

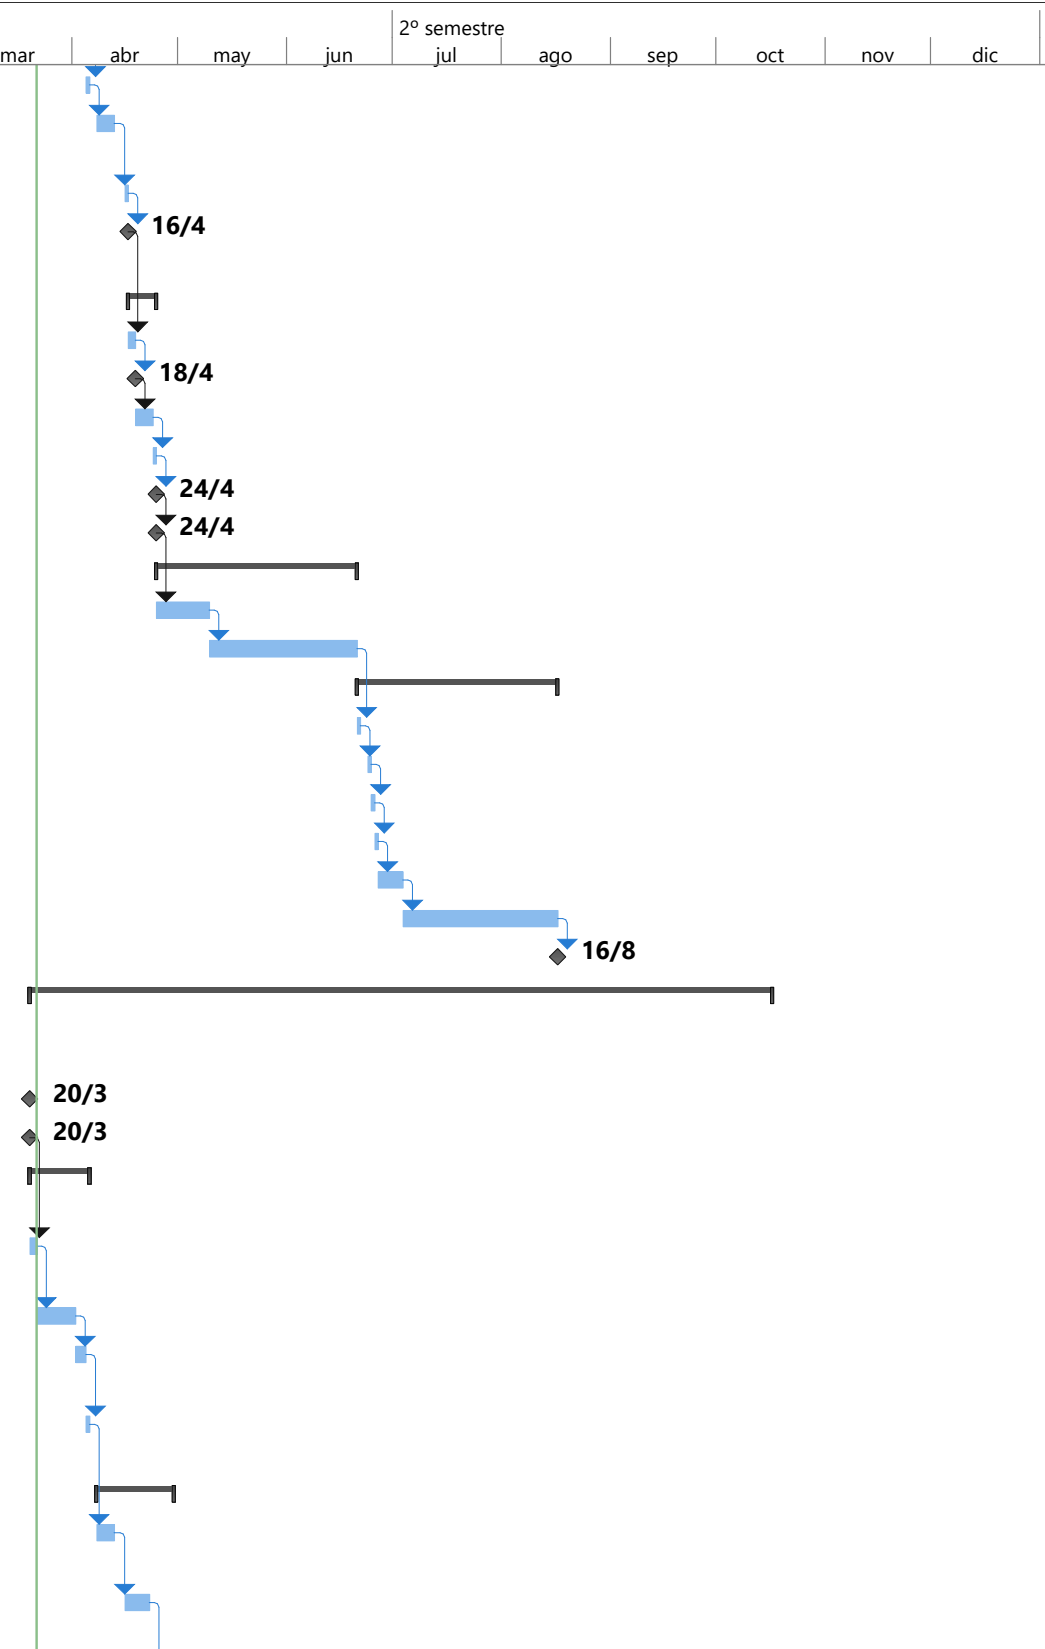

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: vie 22/3/24

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre						2º semestre										
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic					
733		<b>Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh)</b>	5 días	mar 23/4/24	lun 29/4/24																	
734		<b>Plazo para recepción de ofertas (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 RLGCP)</b>	5 días	mar 30/4/24	mar 7/5/24																	
735		Plazo para recibir ofertas	5 días	mar 30/4/24	mar 7/5/24																	
736		<b>Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284)</b>	5 días	mar 30/4/24	mar 7/5/24																	
737		Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones	2 días	mar 30/4/24	jue 2/5/24																	
738		Resolución y comunicación de recurso	3 días	vie 3/5/24	mar 7/5/24																	
739		<b>Estudio de ofertas</b>	6,5 días	mié 8/5/24	jue 16/5/24																	
740		Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y técnico	1 día	mié 8/5/24	mié 8/5/24																	
741		Valoración de ofertas	1 día	jue 9/5/24	jue 9/5/24																	
742		Previsiones a los oferentes	0,5 días	vie 10/5/24	vie 10/5/24																	
743		Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes)	2 días	vie 10/5/24	mar 14/5/24																	
744		Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT	2 días	mar 14/5/24	jue 16/5/24																	
745		<b>Recomendación de adjudicación (UT)</b>	3 días	jue 16/5/24	mar 21/5/24																	
746		Recomendación de adjudicación (UT)	1 día	jue 16/5/24	vie 17/5/24																	
747		Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT y Fiscalizador USP)	2 días	vie 17/5/24	mar 21/5/24																	
748		<b>Adjudicación y notificación</b>	0,5 días	mar 21/5/24	mar 21/5/24																	
749		Elaboración de acuerdo de adjudicación	0,5 días	mar 21/5/24	mar 21/5/24																	
750		Notificación del acto de adjudicación (SICOP)	0 días	mar 21/5/24	mar 21/5/24																	
751		<b>Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP)</b>	2 días	mié 22/5/24	jue 23/5/24																	
752		<b>Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA)</b>	2 días	mié 22/5/24	jue 23/5/24																	
753		Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	mié 22/5/24	jue 23/5/24																	
754		<b>Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)</b>	2 días	mié 22/5/24	jue 23/5/24																	
755		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 22/5/24	jue 23/5/24																	
756		<b>Plazo para audiencia inicial</b>	5 días	vie 24/5/24	jue 30/5/24																	
757		Resolución de Recurso de revocatoria	3 días	vie 24/5/24	mar 28/5/24																	
758		Adjudicación en firme	2 días	mié 29/5/24	jue 30/5/24																	
759		<b>Trámite de contrato</b>	11 días?	vie 31/5/24	vie 14/6/24																	
760		Elaboración del Contrato	4 días	vie 31/5/24	mié 5/6/24																	
761		Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	jue 6/6/24	jue 6/6/24																	
762		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, patente, etc)	5 días	vie 7/6/24	jue 13/6/24																	
763		Firma de contrato Proveedor USP	1 día?	vie 14/6/24	vie 14/6/24																	
764		Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa	0 días	vie 14/6/24	vie 14/6/24																	
765		<b>Trámite del Pedido</b>	6 días	lun 17/6/24	lun 24/6/24																	
766		Elaboración de orden de pedido temporal	2 días	lun 17/6/24	mar 18/6/24																	
767		Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	mar 18/6/24	mar 18/6/24																	

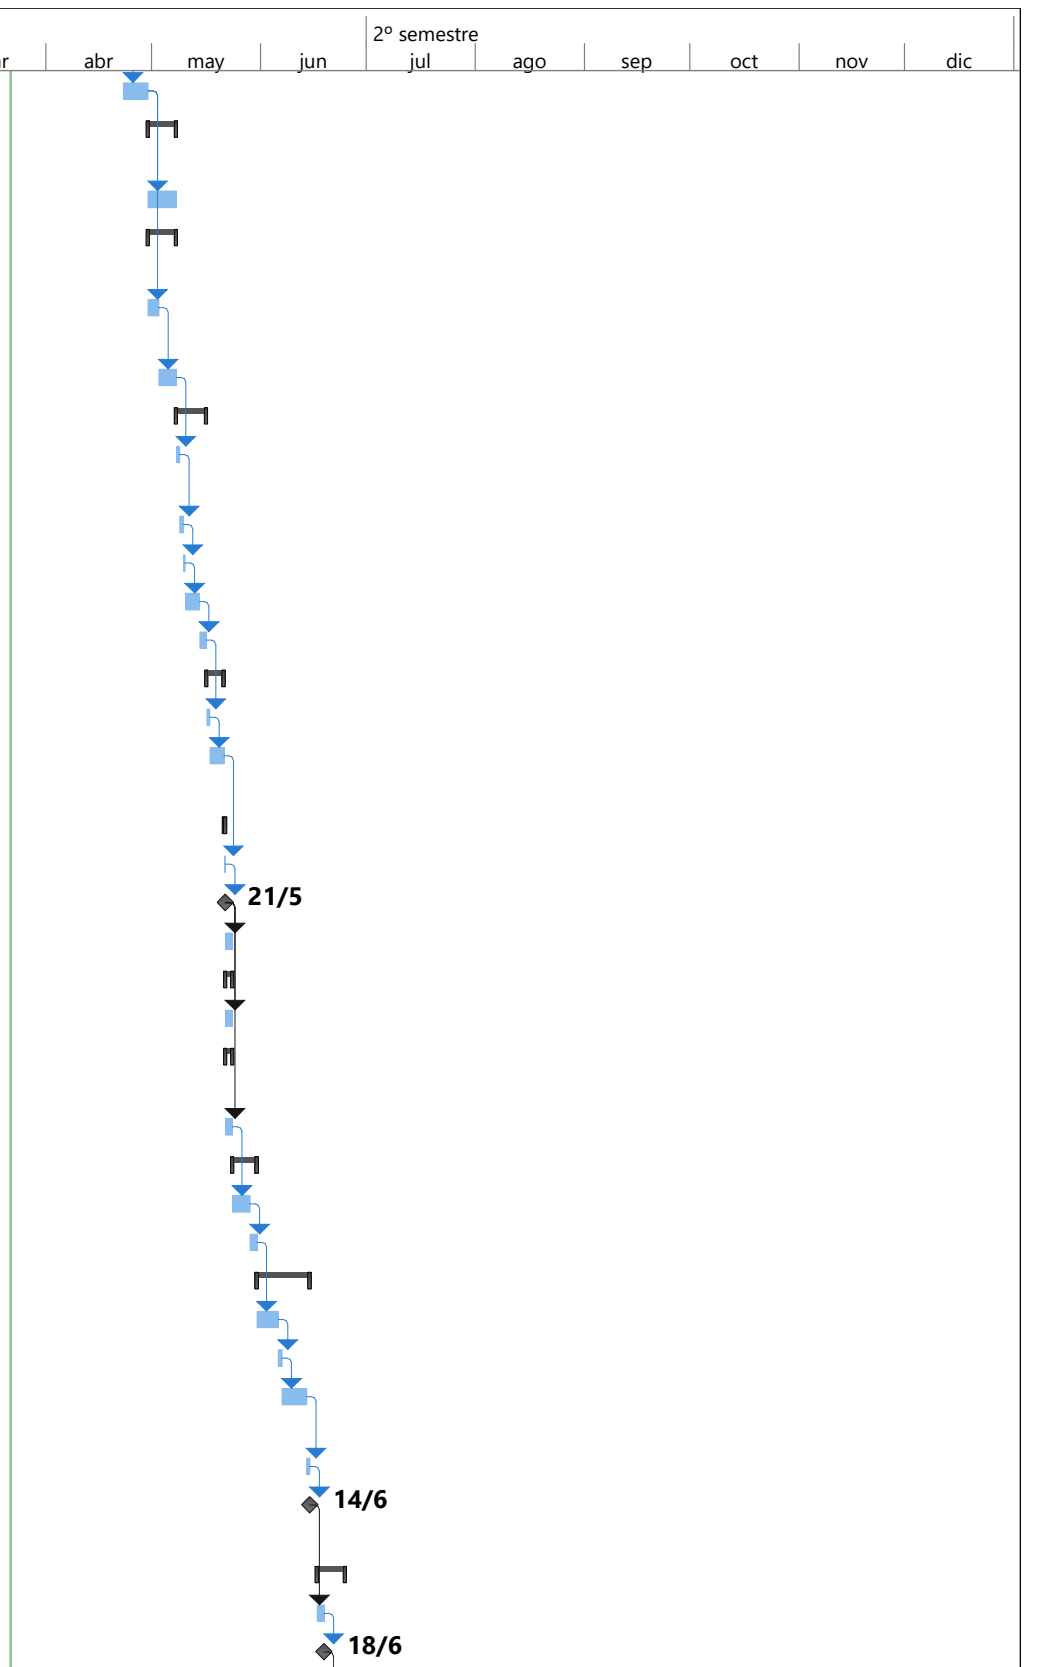

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: vie 22/3/24

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo	[	Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin	]	Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre						2º semestre								
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic			
768		Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	mié 19/6/24	vie 21/6/24															
769		Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	lun 24/6/24	lun 24/6/24															
770		Firma de pedido por Proveedor USP	0 días	lun 24/6/24	lun 24/6/24															
771		Notificación de la orden de pedido	0 días	lun 24/6/24	lun 24/6/24															
772		<b>Recepción de los bienes y/o servicios</b>	<b>40 días</b>	<b>mar 25/6/24</b>	<b>jue 22/8/24</b>															
773		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 25/6/24	lun 8/7/24															
774		Recibido a satisfacción	30 días	mar 9/7/24	jue 22/8/24															
775		<b>Trámite de pago</b>	<b>39 días?</b>	<b>vie 23/8/24</b>	<b>mié 16/10/24</b>															
776		Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	vie 23/8/24	vie 23/8/24															
777		Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	lun 26/8/24	lun 26/8/24															
778		Generación y firma de trámite de pago	1 día?	mar 27/8/24	mar 27/8/24															
779		Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	mié 28/8/24	mié 28/8/24															
780		Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	jue 29/8/24	mié 4/9/24															
781		Pago de Tesorería Nacional	30 días	jue 5/9/24	mié 16/10/24															
782		Fin	0 días	mié 16/10/24	mié 16/10/24															
783		<b>2024LD-00000XX-000540/USG/Mantenimiento preventivo y correctivo anual del transformador principal de la CGR (Contrato vence 04/05/2024); \$765,000/2024; / Código SICOP:73152108</b>	<b>141 días?</b>	<b>lun 1/4/24</b>	<b>lun 21/10/24</b>															
784		Elaboración de pliego de condiciones	0 días	lun 1/4/24	lun 1/4/24															
785		Envío de especificaciones técnicas y estudios previos	0 días	lun 1/4/24	lun 1/4/24															
786		Confección documento complementario al pliego de condiciones	8 días	lun 1/4/24	mié 10/4/24															
787		Elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	2 días	lun 1/4/24	mar 2/4/24															
788		Revisión de documento colaborador USP	2 días	mié 3/4/24	jue 4/4/24															
789		Revisión Técnica de documento complementario al pliego de condiciones	3 días	vie 5/4/24	mar 9/4/24															
790		Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	1 día	mié 10/4/24	mié 10/4/24															
791		<b>Preparación previa a publicación en SICOP</b>	<b>15 días</b>	<b>jue 11/4/24</b>	<b>vie 3/5/24</b>															
792		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	jue 11/4/24	jue 18/4/24															
793		Elaboración de solicitud y confección de pliego de condiciones en SICOP	5 días	vie 19/4/24	jue 25/4/24															
794		<b>Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh)</b>	<b>5 días</b>	<b>vie 26/4/24</b>	<b>vie 3/5/24</b>															
795		<b>Plazo para recepción de ofertas (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 RLGCP)</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 6/5/24</b>	<b>vie 10/5/24</b>															
796		Plazo para recibir ofertas	5 días	lun 6/5/24	vie 10/5/24															
797		<b>Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284)</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 6/5/24</b>	<b>vie 10/5/24</b>															
798		Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones	2 días	lun 6/5/24	mar 7/5/24															
799		Resolución y comunicación de recurso	3 días	mié 8/5/24	vie 10/5/24															
800		<b>Estudio de ofertas</b>	<b>6,5 días</b>	<b>lun 13/5/24</b>	<b>mar 21/5/24</b>															

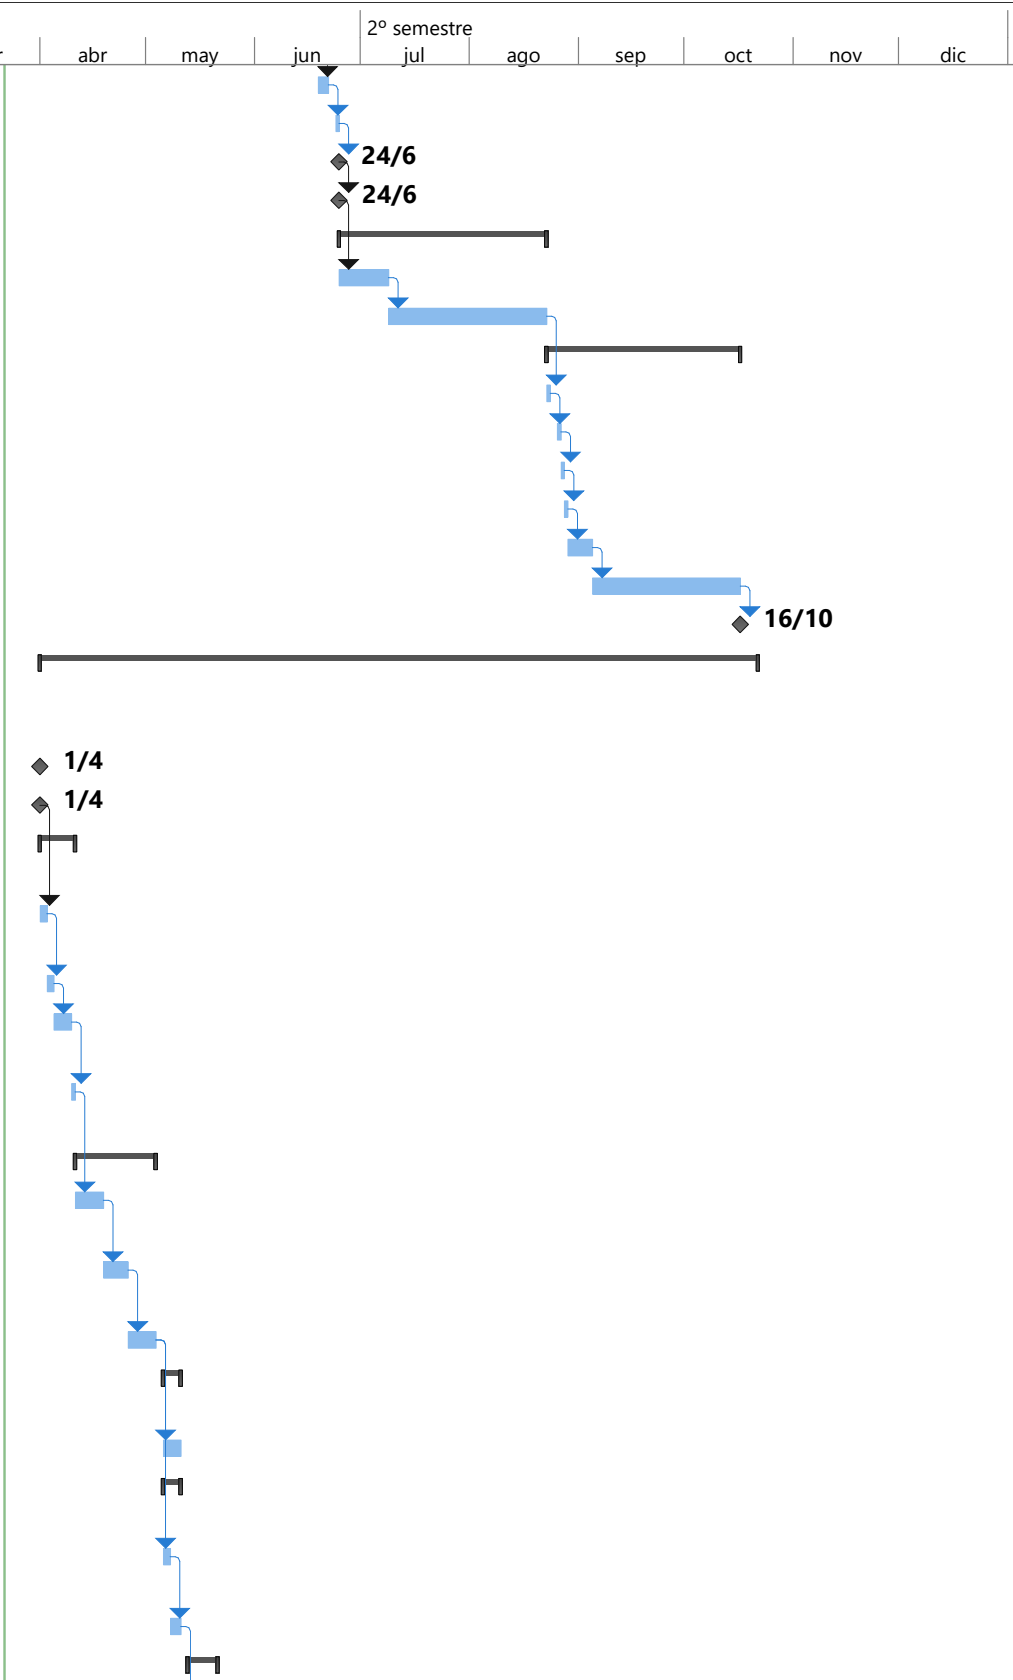

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: vie 22/3/24

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre					2º semestre									
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic			
801		Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y técnico	1 día	lun 13/5/24	lun 13/5/24															
802		Valoración de ofertas	1 día	mar 14/5/24	mar 14/5/24															
803		Previsiones a los oferentes	0,5 días	mié 15/5/24	mié 15/5/24															
804		Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes)	2 días	mié 15/5/24	vie 17/5/24															
805		Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT	2 días	vie 17/5/24	mar 21/5/24															
806		<b>Recomendación de adjudicación (UT)</b>	<b>3 días</b>	<b>mar 21/5/24</b>	<b>vie 24/5/24</b>															
807		Recomendación de adjudicación (UT)	1 día	mar 21/5/24	mié 22/5/24															
808		Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT y Fiscalizador USP)	2 días	mié 22/5/24	vie 24/5/24															
809		<b>Adjudicación y notificación</b>	<b>0,5 días</b>	<b>vie 24/5/24</b>	<b>vie 24/5/24</b>															
810		Elaboración de acuerdo de adjudicación	0,5 días	vie 24/5/24	vie 24/5/24															
811		Notificación del acto de adjudicación (SICOP)	0 días	vie 24/5/24	vie 24/5/24															
812		<b>Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP)</b>	<b>2 días</b>	<b>lun 27/5/24</b>	<b>mar 28/5/24</b>															
813		<b>Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA)</b>	<b>2 días</b>	<b>lun 27/5/24</b>	<b>mar 28/5/24</b>															
814		Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	lun 27/5/24	mar 28/5/24															
815		<b>Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)</b>	<b>2 días</b>	<b>lun 27/5/24</b>	<b>mar 28/5/24</b>															
816		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	lun 27/5/24	mar 28/5/24															
817		<b>Plazo para audiencia inicial</b>	<b>5 días</b>	<b>mié 29/5/24</b>	<b>mar 4/6/24</b>															
818		Resolución de Recurso de revocatoria	3 días	mié 29/5/24	vie 31/5/24															
819		Adjudicación en firme	2 días	lun 3/6/24	mar 4/6/24															
820		<b>Trámite de contrato</b>	<b>11 días?</b>	<b>mié 5/6/24</b>	<b>mié 19/6/24</b>															
821		Elaboración del Contrato	4 días	mié 5/6/24	lun 10/6/24															
822		Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	mar 11/6/24	mar 11/6/24															
823		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, patente, etc)	5 días	mié 12/6/24	mar 18/6/24															
824		Firma de contrato Proveedor USP	1 día?	mié 19/6/24	mié 19/6/24															
825		Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa	0 días	mié 19/6/24	mié 19/6/24															
826		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>6 días</b>	<b>jue 20/6/24</b>	<b>jue 27/6/24</b>															
827		Elaboración de orden de pedido temporal	2 días	jue 20/6/24	vie 21/6/24															
828		Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	vie 21/6/24	vie 21/6/24															
829		Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	lun 24/6/24	mié 26/6/24															
830		Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	jue 27/6/24	jue 27/6/24															
831		Firma de pedido por Proveedor USP	0 días	jue 27/6/24	jue 27/6/24															
832		Notificación de la orden de pedido	0 días	jue 27/6/24	jue 27/6/24															
833		<b>Recepción de los bienes y/o servicios</b>	<b>40 días</b>	<b>vie 28/6/24</b>	<b>mar 27/8/24</b>															
834		Entrega de los bienes/servicios	10 días	vie 28/6/24	jue 11/7/24															
835		Recibido a satisfacción	30 días	vie 12/7/24	mar 27/8/24															
836		<b>Trámite de pago</b>	<b>39 días?</b>	<b>mié 28/8/24</b>	<b>lun 21/10/24</b>															
837		Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mié 28/8/24	mié 28/8/24															

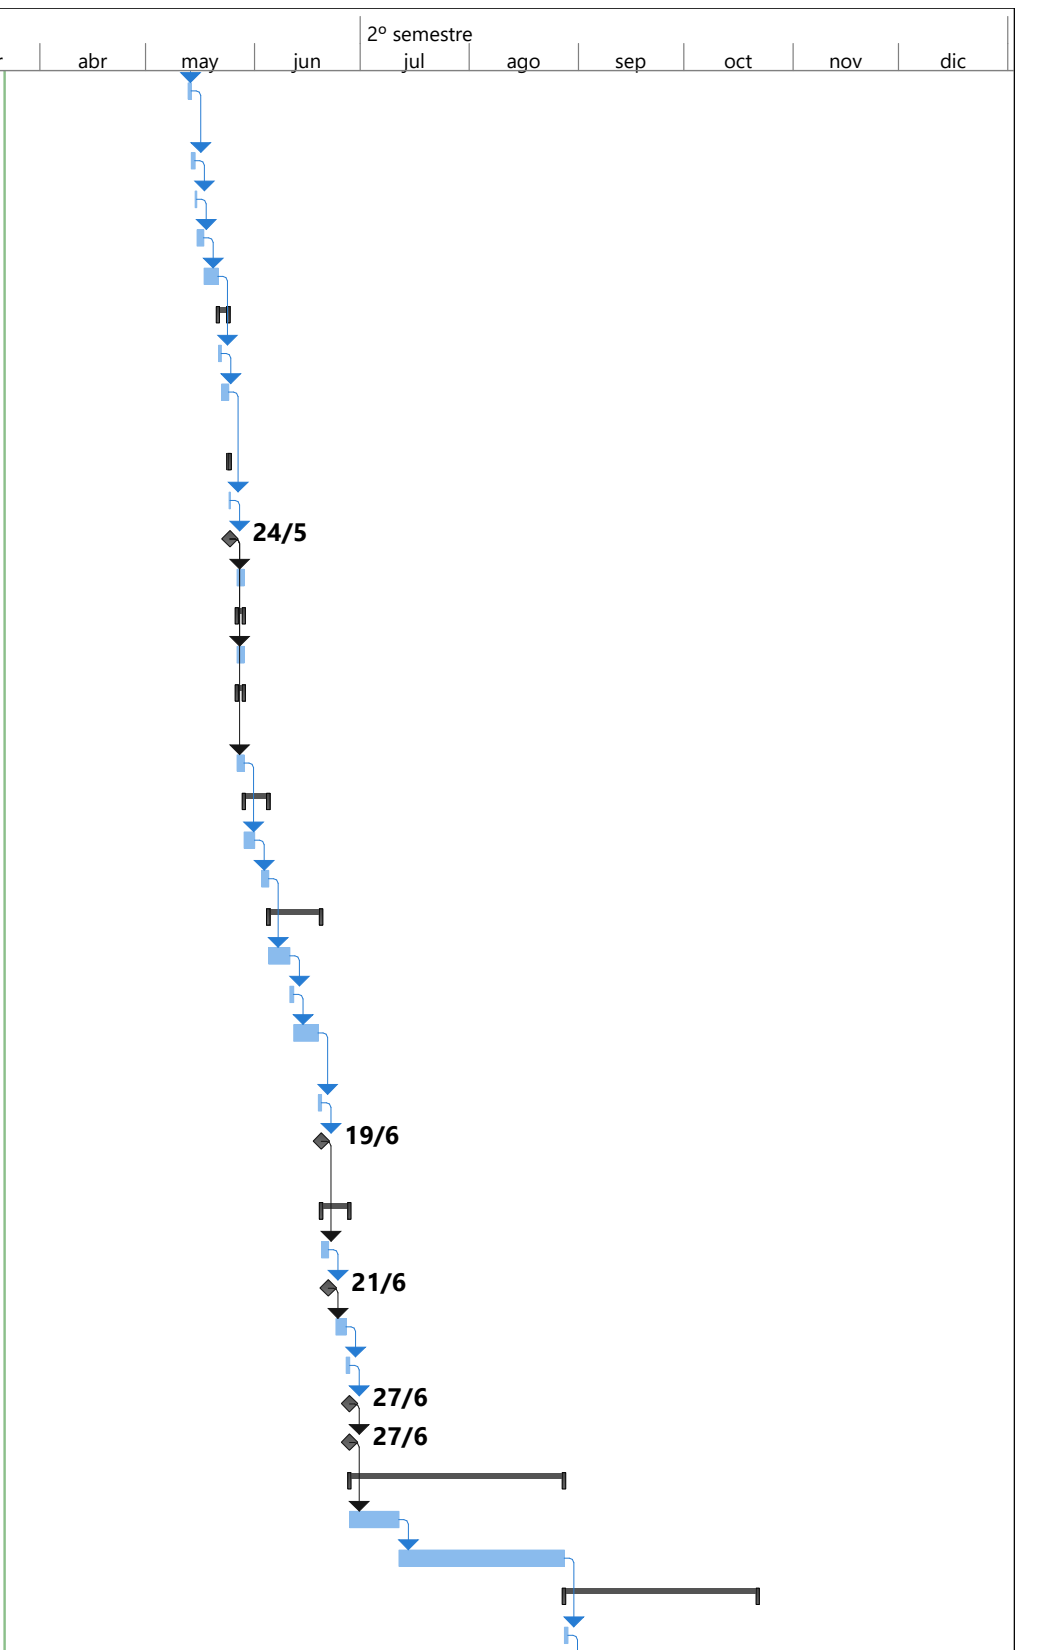

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: vie 22/3/24

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre						2º semestre								
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic			
838		Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	jue 29/8/24	jue 29/8/24															
839		Generación y firma de trámite de pago	1 día?	vie 30/8/24	vie 30/8/24															
840		Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	lun 2/9/24	lun 2/9/24															
841		Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	mar 3/9/24	lun 9/9/24															
842		Pago de Tesorería Nacional	30 días	mar 10/9/24	lun 21/10/24															
843		Fin	0 días	lun 21/10/24	lun 21/10/24															
844		<b>2024LD-00000XX-000540/USG/Mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de energía eléctrica de emergencia de la Contraloría General de la República (CGR), vigente al 16/07/2024; \$1.500.000/2024; / Código SICOP:81101705</b>	<b>141 días?</b>	<b>mié 15/5/24</b>	<b>lun 2/12/24</b>															
845		<b>Elaboración de pliego de condiciones</b>	<b>0 días</b>	<b>mié 15/5/24</b>	<b>mié 15/5/24</b>															
846		Envío de especificaciones técnicas y estudios previos	0 días	mié 15/5/24	mié 15/5/24															
847		<b>Confección documento complementario al pliego de condiciones</b>	<b>8 días</b>	<b>mié 15/5/24</b>	<b>vie 24/5/24</b>															
848		Elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	2 días	mié 15/5/24	jue 16/5/24															
849		Revisión de documento colaborador USP	2 días	vie 17/5/24	lun 20/5/24															
850		Revisión Técnica de documento complementario al pliego de condiciones	3 días	mar 21/5/24	jue 23/5/24															
851		Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	1 día	vie 24/5/24	vie 24/5/24															
852		<b>Preparación previa a publicacion en SICOP</b>	<b>15 días</b>	<b>lun 27/5/24</b>	<b>vie 14/6/24</b>															
853		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	lun 27/5/24	vie 31/5/24															
854		Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en SICOP	5 días	lun 3/6/24	vie 7/6/24															
855		<b>Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh)</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 10/6/24</b>	<b>vie 14/6/24</b>															
856		<b>Plazo para recepción de ofertas (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 RLGCP)</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 17/6/24</b>	<b>vie 21/6/24</b>															
857		Plazo para recibir ofertas	5 días	lun 17/6/24	vie 21/6/24															
858		<b>Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284)</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 17/6/24</b>	<b>vie 21/6/24</b>															
859		Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones	2 días	lun 17/6/24	mar 18/6/24															
860		Resolución y comunicación de recurso	3 días	mié 19/6/24	vie 21/6/24															
861		<b>Estudio de ofertas</b>	<b>6,5 días</b>	<b>lun 24/6/24</b>	<b>mar 2/7/24</b>															
862		Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y técnico	1 día	lun 24/6/24	lun 24/6/24															
863		Valoración de ofertas	1 día	mar 25/6/24	mar 25/6/24															
864		Previsiones a los oferentes	0,5 días	mié 26/6/24	mié 26/6/24															
865		Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes)	2 días	mié 26/6/24	vie 28/6/24															
866		Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT	2 días	vie 28/6/24	mar 2/7/24															
867		<b>Recomendación de adjudicación (UT)</b>	<b>3 días</b>	<b>mar 2/7/24</b>	<b>vie 5/7/24</b>															
868		Recomendación de adjudicación (UT)	1 día	mar 2/7/24	mié 3/7/24															

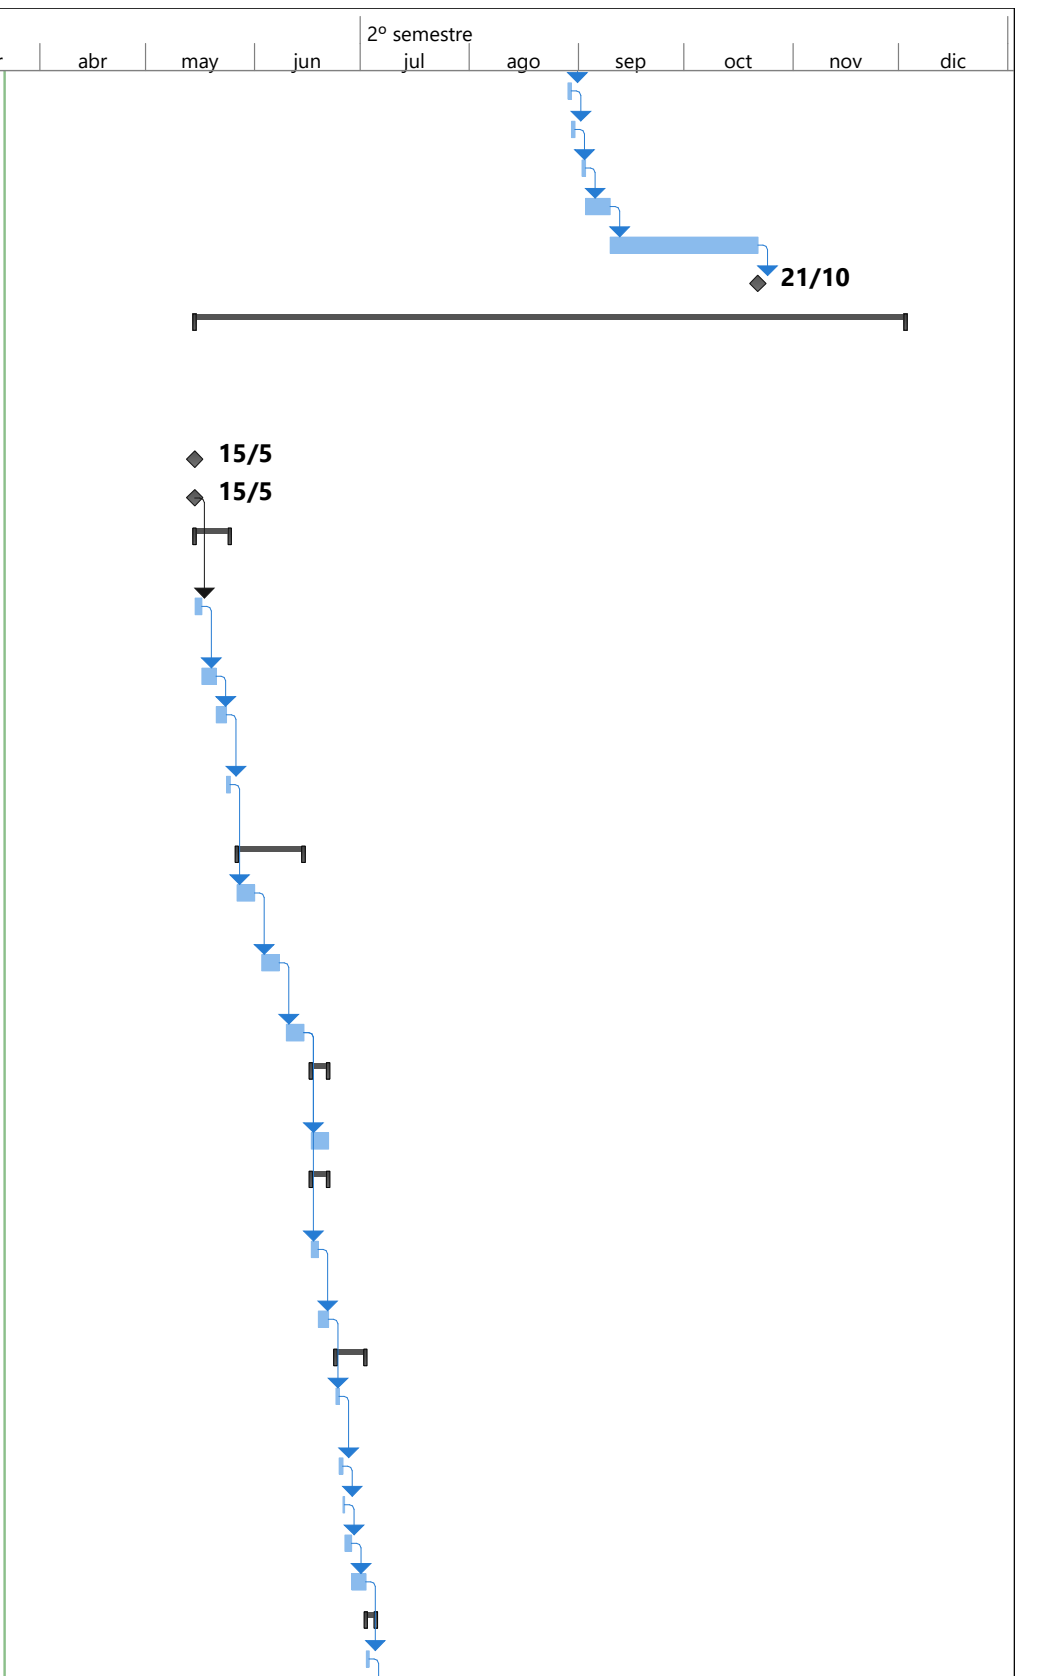

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: vie 22/3/24

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre						2º semestre					
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
869		Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT y Fiscalizador USP)	2 días	mié 3/7/24	vie 5/7/24												
870		<b>Adjudicación y notificación</b>	<b>0,5 días</b>	<b>vie 5/7/24</b>	<b>vie 5/7/24</b>												
871		Elaboración de acuerdo de adjudicación	0,5 días	vie 5/7/24	vie 5/7/24												
872		Notificación del acto de adjudicación (SICOP)	0 días	vie 5/7/24	vie 5/7/24												
873		<b>Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP)</b>	<b>2 días</b>	<b>lun 8/7/24</b>	<b>mar 9/7/24</b>												
874		<b>Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA)</b>	<b>2 días</b>	<b>lun 8/7/24</b>	<b>mar 9/7/24</b>												
875		Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	lun 8/7/24	mar 9/7/24												
876		<b>Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)</b>	<b>2 días</b>	<b>lun 8/7/24</b>	<b>mar 9/7/24</b>												
877		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	lun 8/7/24	mar 9/7/24												
878		<b>Plazo para audiencia inicial</b>	<b>5 días</b>	<b>mié 10/7/24</b>	<b>mar 16/7/24</b>												
879		Resolución de Recurso de revocatoria	3 días	mié 10/7/24	vie 12/7/24												
880		Adjudicación en firme	2 días	lun 15/7/24	mar 16/7/24												
881		<b>Trámite de contrato</b>	<b>11 días?</b>	<b>mié 17/7/24</b>	<b>jue 1/8/24</b>												
882		Elaboración del Contrato	4 días	mié 17/7/24	lun 22/7/24												
883		Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	mar 23/7/24	mar 23/7/24												
884		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, patente, etc)	5 días	mié 24/7/24	mié 31/7/24												
885		Firma de contrato Proveedor USP	1 día?	jue 1/8/24	jue 1/8/24												
886		Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa	0 días	jue 1/8/24	jue 1/8/24												
887		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>6 días</b>	<b>lun 5/8/24</b>	<b>lun 12/8/24</b>												
888		Elaboración de orden de pedido temporal	2 días	lun 5/8/24	mar 6/8/24												
889		Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	mar 6/8/24	mar 6/8/24												
890		Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	mié 7/8/24	vie 9/8/24												
891		Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	lun 12/8/24	lun 12/8/24												
892		Firma de pedido por Proveedor USP	0 días	lun 12/8/24	lun 12/8/24												
893		Notificación de la orden de pedido	0 días	lun 12/8/24	lun 12/8/24												
894		<b>Recepción de los bienes y/o servicios</b>	<b>40 días</b>	<b>mar 13/8/24</b>	<b>mar 8/10/24</b>												
895		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 13/8/24	mar 27/8/24												
896		Recibido a satisfacción	30 días	mié 28/8/24	mar 8/10/24												
897		<b>Trámite de pago</b>	<b>39 días?</b>	<b>mié 9/10/24</b>	<b>lun 2/12/24</b>												
898		Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mié 9/10/24	mié 9/10/24												
899		Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	jue 10/10/24	jue 10/10/24												
900		Generación y firma de trámite de pago	1 día?	vie 11/10/24	vie 11/10/24												
901		Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	lun 14/10/24	lun 14/10/24												
902		Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	mar 15/10/24	lun 21/10/24												
903		Pago de Tesorería Nacional	30 días	mar 22/10/24	lun 2/12/24												
904		Fin	0 días	lun 2/12/24	lun 2/12/24												
905		<b>2024LD-0000XX-000540/USG/Mantenimiento preventivo y correctivo de unidades de aire acondicionado (Contrato vence 6/4/2024); \$300,000/2024; / Código SICOP:72101511</b>	<b>141 días?</b>	<b>lun 8/1/24</b>	<b>jue 1/8/24</b>												

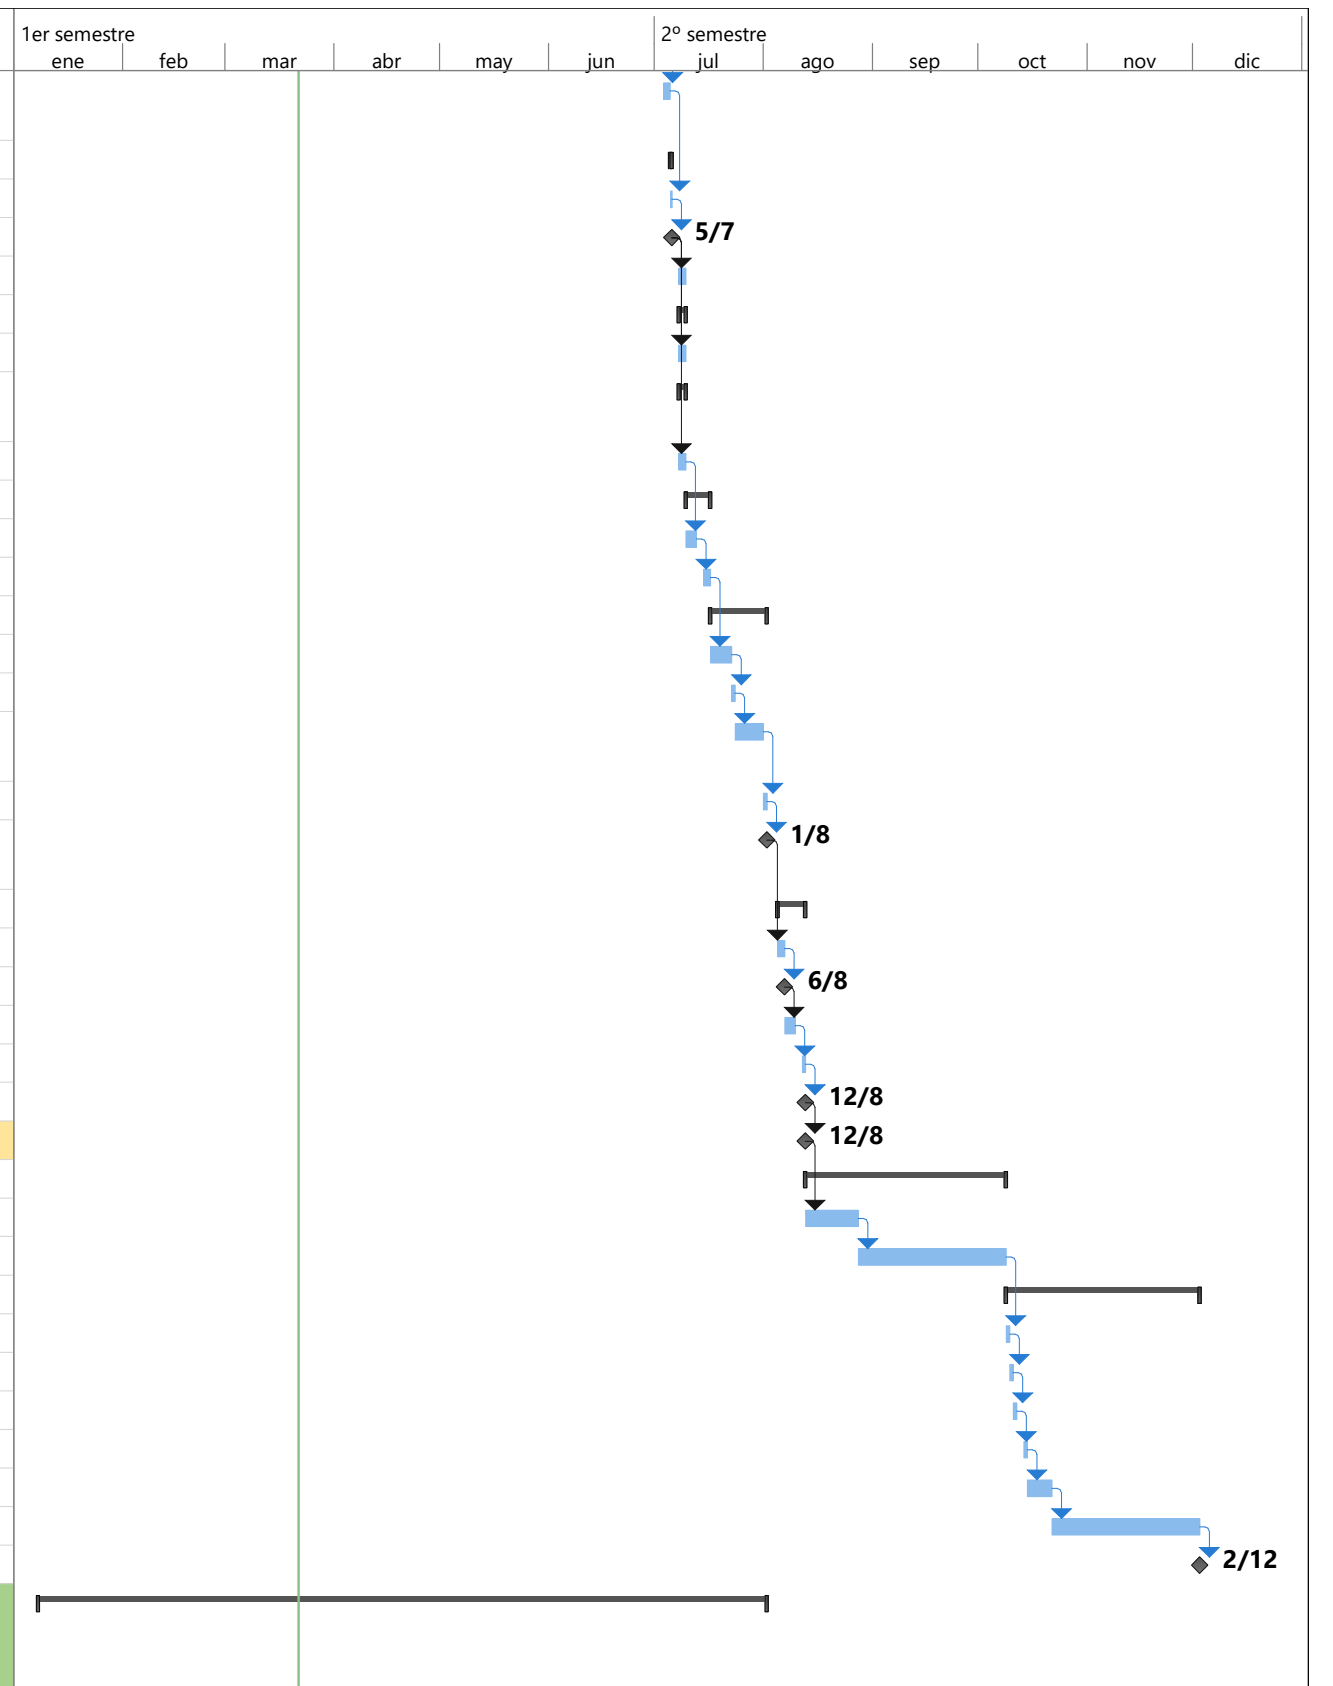

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: vie 22/3/24


Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre						2º semestre								
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic			
906		<b>Elaboración de pliego de condiciones</b>	0 días	lun 8/1/24	lun 8/1/24	8/1														
907		Envío de especificaciones técnicas y estudios previos	0 días	lun 8/1/24	lun 8/1/24	8/1														
908		<b>Confección documento complementario al pliego de condiciones</b>	8 días	lun 8/1/24	mié 17/1/24															
909		Elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	2 días	lun 8/1/24	mar 9/1/24															
910		Revisión de documento colaborador USP	2 días	mié 10/1/24	jue 11/1/24															
911		Revisión Técnica de documento complementario al pliego de condiciones	3 días	vie 12/1/24	mar 16/1/24															
912		Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	1 día	mié 17/1/24	mié 17/1/24															
913		<b>Preparación previa a publicación en SICOP</b>	15 días	jue 18/1/24	mié 7/2/24															
914		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	jue 18/1/24	mié 24/1/24															
915		Elaboración de solicitud y confección de pliego de condiciones en SICOP	5 días	jue 25/1/24	mié 31/1/24															
916		<b>Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh)</b>	5 días	jue 1/2/24	mié 7/2/24															
917		<b>Plazo para recepción de ofertas (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 RLGCP)</b>	5 días	jue 8/2/24	mié 14/2/24															
918		Plazo para recibir ofertas	5 días	jue 8/2/24	mié 14/2/24															
919		<b>Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284)</b>	5 días	jue 8/2/24	mié 14/2/24															
920		Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones	2 días	jue 8/2/24	vie 9/2/24															
921		Resolución y comunicación de recurso	3 días	lun 12/2/24	mié 14/2/24															
922		<b>Estudio de ofertas</b>	6,5 días	jue 15/2/24	vie 23/2/24															
923		Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y técnico	1 día	jue 15/2/24	jue 15/2/24															
924		Valoración de ofertas	1 día	vie 16/2/24	vie 16/2/24															
925		Previsiones a los oferentes	0,5 días	lun 19/2/24	lun 19/2/24															
926		Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes)	2 días	lun 19/2/24	mié 21/2/24															
927		Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT	2 días	mié 21/2/24	vie 23/2/24															
928		<b>Recomendación de adjudicación (UT)</b>	3 días	vie 23/2/24	mié 28/2/24															
929		Recomendación de adjudicación (UT)	1 día	vie 23/2/24	lun 26/2/24															
930		Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT y Fiscalizador USP)	2 días	lun 26/2/24	mié 28/2/24															
931		<b>Adjudicación y notificación</b>	0,5 días	mié 28/2/24	mié 28/2/24															
932		Elaboración de acuerdo de adjudicación	0,5 días	mié 28/2/24	mié 28/2/24															
933		Notificación del acto de adjudicación (SICOP)	0 días	mié 28/2/24	mié 28/2/24															
934		<b>Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP)</b>	2 días	jue 29/2/24	vie 1/3/24															
935		<b>Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA)</b>	2 días	jue 29/2/24	vie 1/3/24															
936		Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	jue 29/2/24	vie 1/3/24															
937		<b>Recurso de revocatoria Presentación de recurso 2dh; 3dh p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)</b>	2 días	jue 29/2/24	vie 1/3/24															

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: vie 22/3/24

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre						2º semestre								
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic			
938		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	jue 29/2/24	vie 1/3/24															
939		<b>Plazo para audiencia inicial</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 4/3/24</b>	<b>vie 8/3/24</b>															
940		Resolución de Recurso de revocatoria	3 días	lun 4/3/24	mié 6/3/24															
941		Adjudicación en firme	2 días	jue 7/3/24	vie 8/3/24															
942		<b>Trámite de contrato</b>	<b>11 días?</b>	<b>lun 11/3/24</b>	<b>lun 1/4/24</b>															
943		Elaboración del Contrato	4 días	lun 11/3/24	jue 14/3/24															
944		Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	vie 15/3/24	vie 15/3/24															
945		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, patente, etc)	5 días	lun 18/3/24	vie 22/3/24															
946		Firma de contrato Proveedor USP	1 día?	lun 1/4/24	lun 1/4/24															
947		Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa	0 días	lun 1/4/24	lun 1/4/24															
948		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>6 días</b>	<b>mar 2/4/24</b>	<b>mar 9/4/24</b>															
949		Elaboración de orden de pedido temporal	2 días	mar 2/4/24	mié 3/4/24															
950		Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	mié 3/4/24	mié 3/4/24															
951		Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	jue 4/4/24	lun 8/4/24															
952		Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	mar 9/4/24	mar 9/4/24															
953		Firma de pedido por Proveedor USP	0 días	mar 9/4/24	mar 9/4/24															
954		Notificación de la orden de pedido	0 días	mar 9/4/24	mar 9/4/24															
955		<b>Recepción de los bienes y/o servicios</b>	<b>40 días</b>	<b>mié 10/4/24</b>	<b>jue 6/6/24</b>															
956		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mié 10/4/24	mié 24/4/24															
957		Recibido a satisfacción	30 días	jue 25/4/24	jue 6/6/24															
958		<b>Trámite de pago</b>	<b>39 días?</b>	<b>vie 7/6/24</b>	<b>jue 1/8/24</b>															
959		Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	vie 7/6/24	vie 7/6/24															
960		Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	lun 10/6/24	lun 10/6/24															
961		Generación y firma de trámite de pago	1 día?	mar 11/6/24	mar 11/6/24															
962		Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	mié 12/6/24	mié 12/6/24															
963		Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	jue 13/6/24	mié 19/6/24															
964		Pago de Tesorería Nacional	30 días	jue 20/6/24	jue 1/8/24															
965		Fin	0 días	jue 1/8/24	jue 1/8/24															
966		<b>2024LD-0000XX-000540/USG/Mantenimiento y Reparación de Vehículos (Mecánica y carrocería), (Debe estar vigente al 19/01/2025); \$10.000.000/2024; / Código SICOP:78181507</b>	<b>141 días?</b>	<b>lun 6/5/24</b>	<b>jue 21/11/24</b>															
967		<b>Elaboración de pliego de condiciones</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 6/5/24</b>	<b>lun 6/5/24</b>															
968		Envío de especificaciones técnicas y estudios previos	0 días	lun 6/5/24	lun 6/5/24															
969		<b>Confeción documento complementario al pliego de condiciones</b>	<b>8 días</b>	<b>lun 6/5/24</b>	<b>mié 15/5/24</b>															
970		Elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	2 días	lun 6/5/24	mar 7/5/24															
971		Revisión de documento colaborador USP	2 días	mié 8/5/24	jue 9/5/24															
972		Revisión Técnica de documento complementario al pliego de condiciones	3 días	vie 10/5/24	mar 14/5/24															

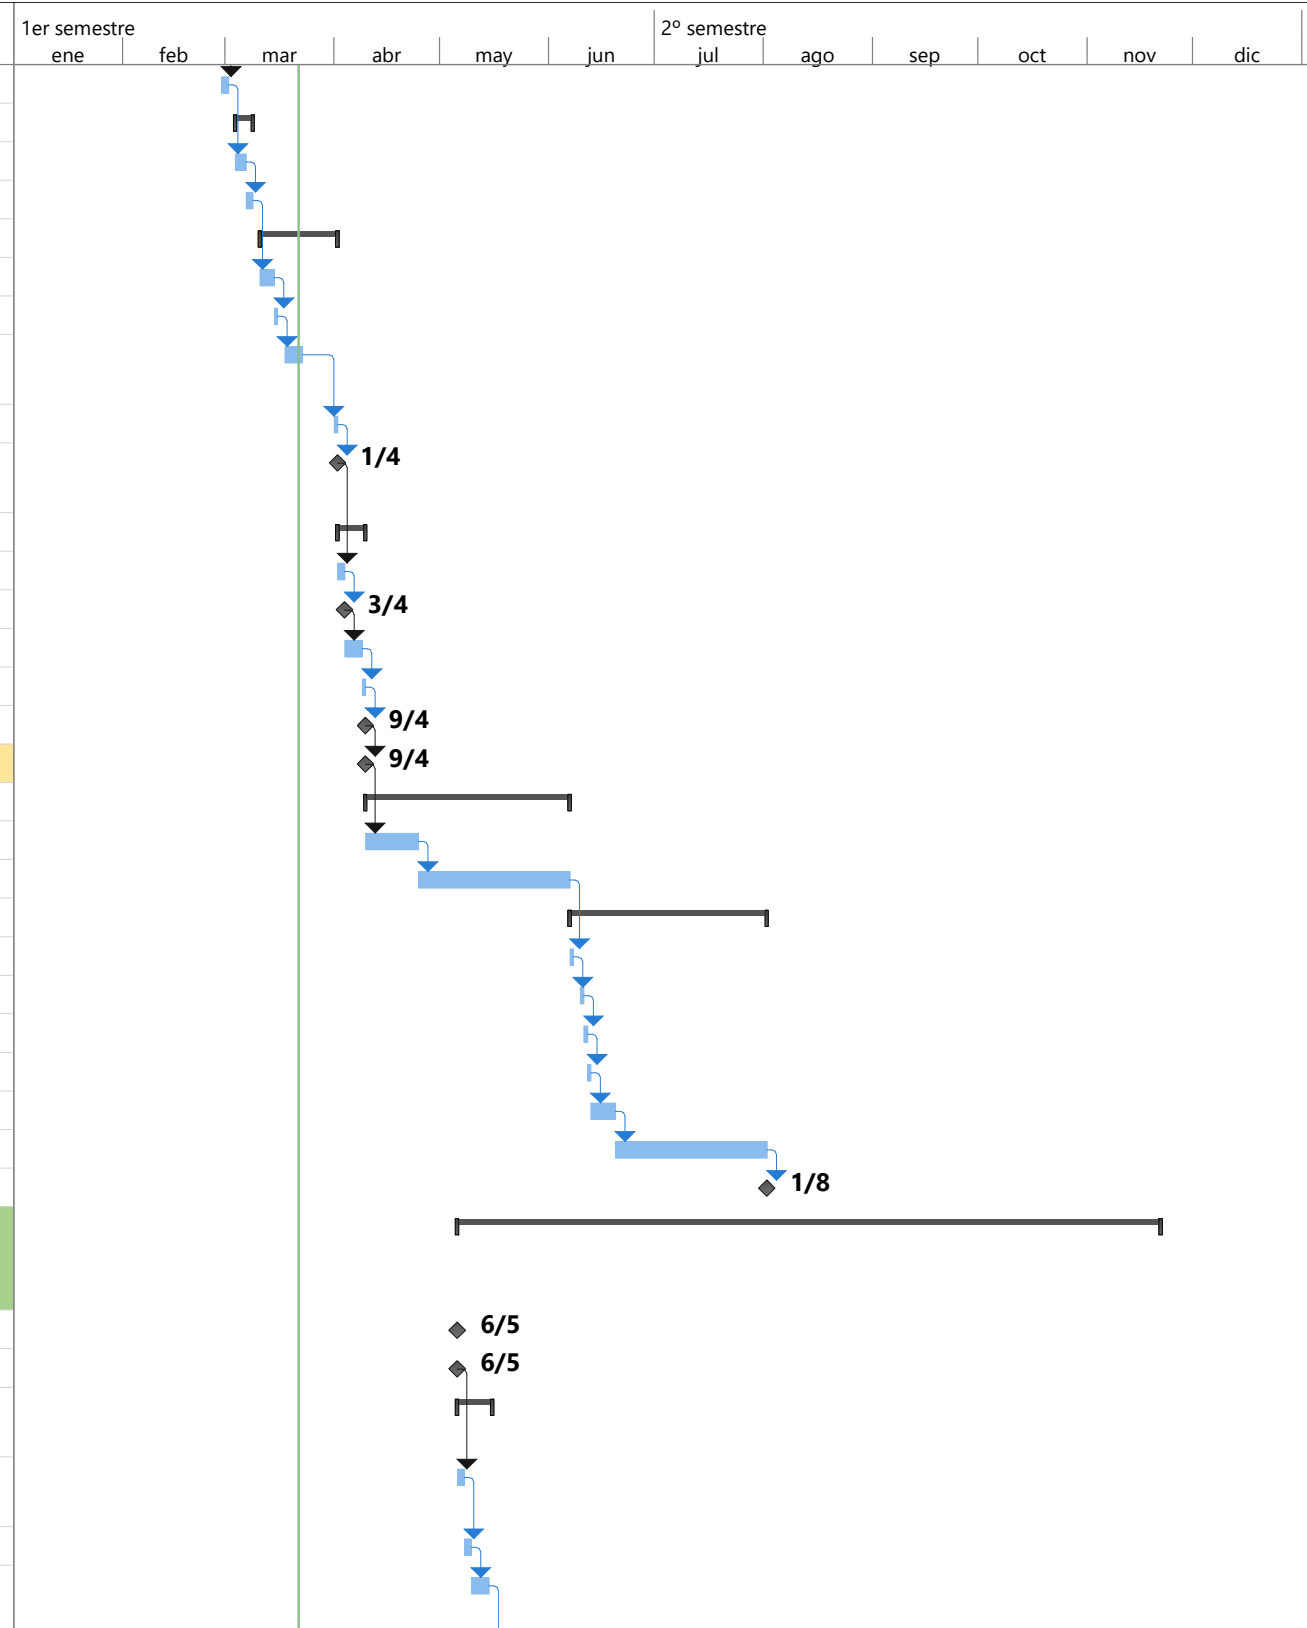

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: vie 22/3/24


Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre					2º semestre									
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic			
973		Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	1 día	mié 15/5/24	mié 15/5/24															
974		<b>Preparación previa a publicacion en SICOP</b>	<b>15 días</b>	<b>jue 16/5/24</b>	<b>mié 5/6/24</b>															
975		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	jue 16/5/24	mié 22/5/24															
976		Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en SICOP	5 días	jue 23/5/24	mié 29/5/24															
977		<b>Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh)</b>	<b>5 días</b>	<b>jue 30/5/24</b>	<b>mié 5/6/24</b>															
978		<b>Plazo para recepción de ofertas (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 RLGCP)</b>	<b>5 días</b>	<b>jue 6/6/24</b>	<b>mié 12/6/24</b>															
979		Plazo para recibir ofertas	5 días	jue 6/6/24	mié 12/6/24															
980		<b>Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284)</b>	<b>5 días</b>	<b>jue 6/6/24</b>	<b>mié 12/6/24</b>															
981		Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones	2 días	jue 6/6/24	vie 7/6/24															
982		Resolución y comunicación de recurso	3 días	lun 10/6/24	mié 12/6/24															
983		<b>Estudio de ofertas</b>	<b>6,5 días</b>	<b>jue 13/6/24</b>	<b>vie 21/6/24</b>															
984		Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y técnico	1 día	jue 13/6/24	jue 13/6/24															
985		Valoración de ofertas	1 día	vie 14/6/24	vie 14/6/24															
986		Previsiones a los oferentes	0,5 días	lun 17/6/24	lun 17/6/24															
987		Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes)	2 días	lun 17/6/24	mié 19/6/24															
988		Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT	2 días	mié 19/6/24	vie 21/6/24															
989		<b>Recomendación de adjudicación (UT)</b>	<b>3 días</b>	<b>vie 21/6/24</b>	<b>mié 26/6/24</b>															
990		Recomendación de adjudicación (UT)	1 día	vie 21/6/24	lun 24/6/24															
991		Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT y Fiscalizador USP)	2 días	lun 24/6/24	mié 26/6/24															
992		<b>Adjudicación y notificación</b>	<b>0,5 días</b>	<b>mié 26/6/24</b>	<b>mié 26/6/24</b>															
993		Elaboración de acuerdo de adjudicación	0,5 días	mié 26/6/24	mié 26/6/24															
994		Notificación del acto de adjudicación (SICOP)	0 días	mié 26/6/24	mié 26/6/24															
995		<b>Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP)</b>	<b>2 días</b>	<b>jue 27/6/24</b>	<b>vie 28/6/24</b>															
996		<b>Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA)</b>	<b>2 días</b>	<b>jue 27/6/24</b>	<b>vie 28/6/24</b>															
997		Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	jue 27/6/24	vie 28/6/24															
998		<b>Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)</b>	<b>2 días</b>	<b>jue 27/6/24</b>	<b>vie 28/6/24</b>															
999		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	jue 27/6/24	vie 28/6/24															
1000		<b>Plazo para audiencia inicial</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 1/7/24</b>	<b>vie 5/7/24</b>															
1001		Resolución de Recurso de revocatoria	3 días	lun 1/7/24	mié 3/7/24															
1002		Adjudicación en firme	2 días	jue 4/7/24	vie 5/7/24															
1003		<b>Trámite de contrato</b>	<b>11 días?</b>	<b>lun 8/7/24</b>	<b>lun 22/7/24</b>															
1004		Elaboración del Contrato	4 días	lun 8/7/24	jue 11/7/24															
1005		Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	vie 12/7/24	vie 12/7/24															

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: vie 22/3/24

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre						2º semestre					
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
1006		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, patente, etc)	5 días	lun 15/7/24	vie 19/7/24												
1007		Firma de contrato Proveedor USP	1 día?	lun 22/7/24	lun 22/7/24												
1008		Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa	0 días	lun 22/7/24	lun 22/7/24												
1009		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>6 días</b>	<b>mar 23/7/24</b>	<b>mié 31/7/24</b>												
1010		Elaboración de orden de pedido temporal	2 días	mar 23/7/24	mié 24/7/24												
1011		Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	mié 24/7/24	mié 24/7/24												
1012		Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	jue 25/7/24	mar 30/7/24												
1013		Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	mié 31/7/24	mié 31/7/24												
1014		Firma de pedido por Proveedor USP	0 días	mié 31/7/24	mié 31/7/24												
1015		Notificación de la orden de pedido	0 días	mié 31/7/24	mié 31/7/24												
1016		<b>Recepción de los bienes y/o servicios</b>	<b>40 días</b>	<b>jue 1/8/24</b>	<b>vie 27/9/24</b>												
1017		Entrega de los bienes/servicios	10 días	jue 1/8/24	jue 15/8/24												
1018		Recibido a satisfacción	30 días	vie 16/8/24	vie 27/9/24												
1019		<b>Trámite de pago</b>	<b>39 días?</b>	<b>lun 30/9/24</b>	<b>jue 21/11/24</b>												
1020		Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	lun 30/9/24	lun 30/9/24												
1021		Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mar 1/10/24	mar 1/10/24												
1022		Generación y firma de trámite de pago	1 día?	mié 2/10/24	mié 2/10/24												
1023		Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	jue 3/10/24	jue 3/10/24												
1024		Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	vie 4/10/24	jue 10/10/24												
1025		Pago de Tesorería Nacional	30 días	vie 11/10/24	jue 21/11/24												
1026		Fin	0 días	jue 21/11/24	jue 21/11/24												
1027		<b>2024LD-0000XX-000540/USG/Mejoras en el sistema eléctrico de la CGR (Envían especificaciones el 1/abril/2024); \$25,000.000/2024; /Codigo SICOP:72101507</b>	<b>141 días?</b>	<b>lun 1/4/24</b>	<b>lun 21/10/24</b>												
1028		<b>Elaboración de pliego de condiciones</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 1/4/24</b>	<b>lun 1/4/24</b>												
1029		Envío de especificaciones técnicas y estudios previos	0 días	lun 1/4/24	lun 1/4/24												
1030		<b>Confección documento complementario al pliego de condiciones</b>	<b>8 días</b>	<b>lun 1/4/24</b>	<b>mié 10/4/24</b>												
1031		Elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	2 días	lun 1/4/24	mar 2/4/24												
1032		Revisión de documento colaborador USP	2 días	mié 3/4/24	jue 4/4/24												
1033		Revisión Técnica de documento complementario al pliego de condiciones	3 días	vie 5/4/24	mar 9/4/24												
1034		Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	1 día	mié 10/4/24	mié 10/4/24												
1035		<b>Preparación previa a publicación en SICOP</b>	<b>15 días</b>	<b>jue 11/4/24</b>	<b>vie 3/5/24</b>												
1036		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	jue 11/4/24	jue 18/4/24												
1037		Elaboración de solicitud y confección de pliego de condiciones en SICOP	5 días	vie 19/4/24	jue 25/4/24												
1038		<b>Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh)</b>	<b>5 días</b>	<b>vie 26/4/24</b>	<b>vie 3/5/24</b>												

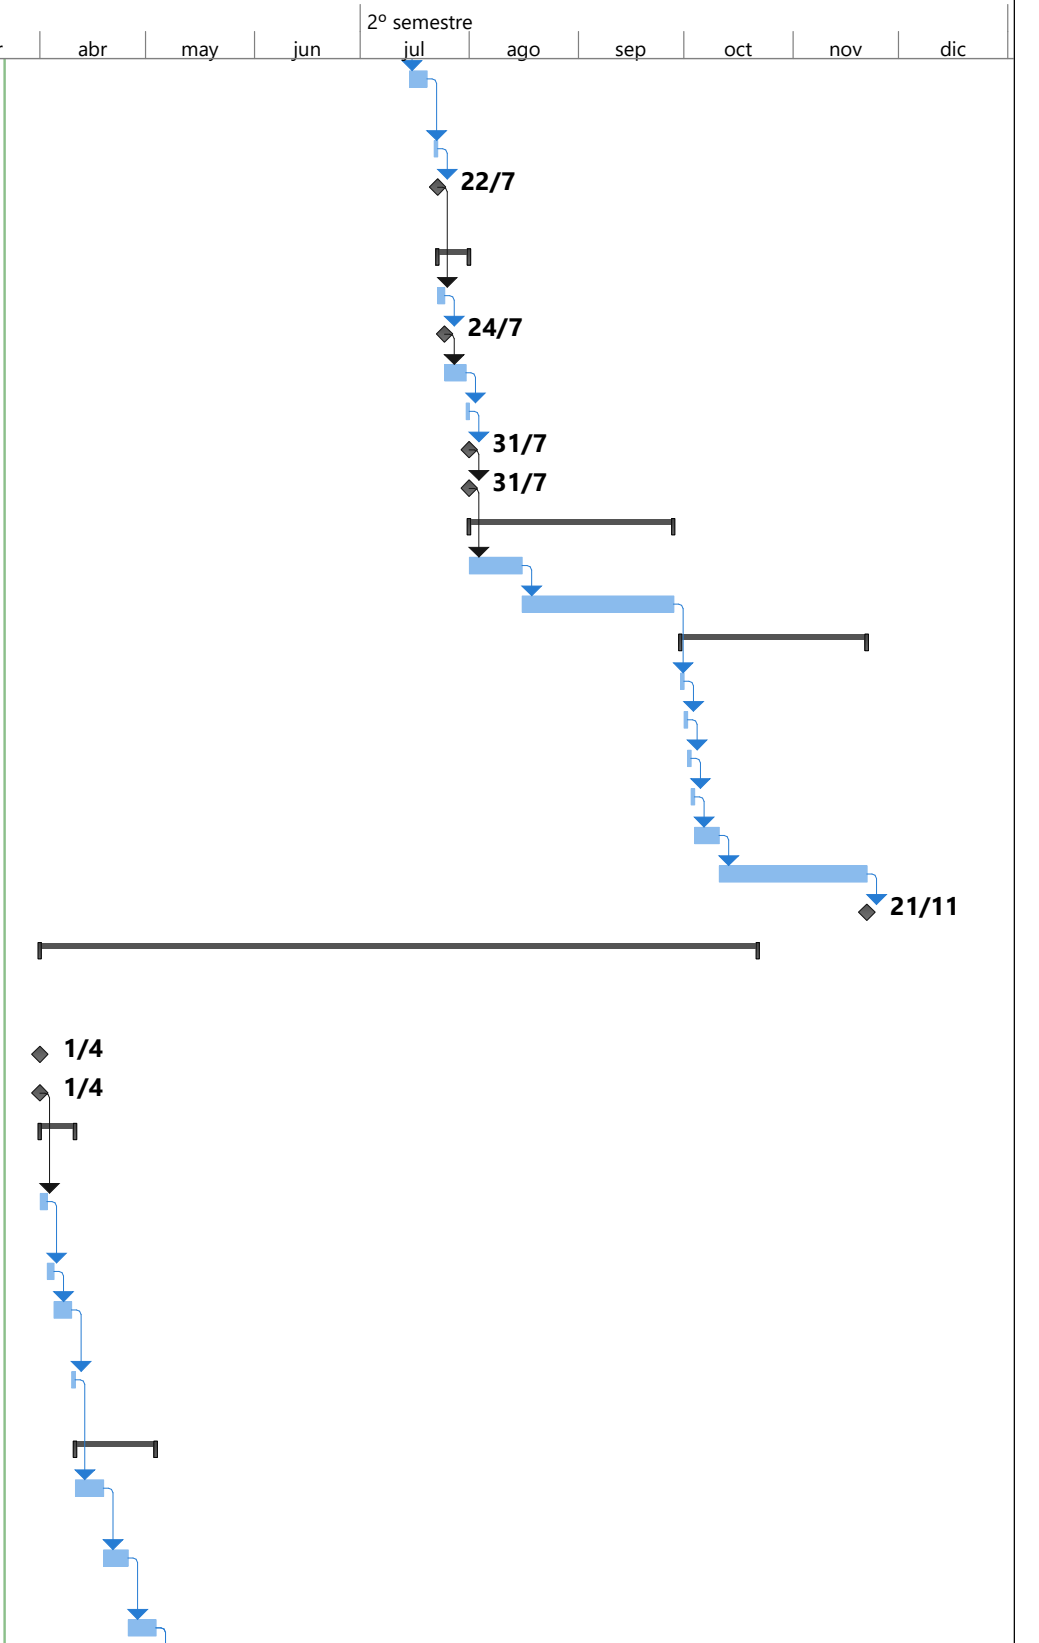


Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: vie 22/3/24

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre						2º semestre					
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
1074		Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	jue 27/6/24	jue 27/6/24												
1075		Firma de pedido por Proveedor USP	0 días	jue 27/6/24	jue 27/6/24												
1076		Notificación de la orden de pedido	0 días	jue 27/6/24	jue 27/6/24												
1077		<b>Recepción de los bienes y/o servicios</b>	<b>40 días</b>	<b>vie 28/6/24</b>	<b>mar 27/8/24</b>												
1078		Entrega de los bienes/servicios	10 días	vie 28/6/24	jue 11/7/24												
1079		Recibido a satisfacción	30 días	vie 12/7/24	mar 27/8/24												
1080		<b>Trámite de pago</b>	<b>39 días?</b>	<b>mié 28/8/24</b>	<b>lun 21/10/24</b>												
1081		Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mié 28/8/24	mié 28/8/24												
1082		Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	jue 29/8/24	jue 29/8/24												
1083		Generación y firma de trámite de pago	1 día?	vie 30/8/24	vie 30/8/24												
1084		Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	lun 2/9/24	lun 2/9/24												
1085		Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	mar 3/9/24	lun 9/9/24												
1086		Pago de Tesorería Nacional	30 días	mar 10/9/24	lun 21/10/24												
1087		Fin	0 días	lun 21/10/24	lun 21/10/24												
1088		<b>2024LD-0000XX-000540/USG/Puntos ecológicos y contenedores para desechos (basura) (Contratado al 31/05/2024); \$1.900.000/2024; / Código SICOP:47121702 y 64111705</b>	<b>141 días?</b>	<b>lun 1/4/24</b>	<b>lun 21/10/24</b>												
1089		<b>Elaboración de pliego de condiciones</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 1/4/24</b>	<b>lun 1/4/24</b>												
1090		Envío de especificaciones técnicas y estudios previos	0 días	lun 1/4/24	lun 1/4/24												
1091		<b>Confección documento complementario al pliego de condiciones</b>	<b>8 días</b>	<b>lun 1/4/24</b>	<b>mié 10/4/24</b>												
1092		Elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	2 días	lun 1/4/24	mar 2/4/24												
1093		Revisión de documento colaborador USP	2 días	mié 3/4/24	jue 4/4/24												
1094		Revisión Técnica de documento complementario al pliego de condiciones	3 días	vie 5/4/24	mar 9/4/24												
1095		Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	1 día	mié 10/4/24	mié 10/4/24												
1096		<b>Preparación previa a publicación en SICOP</b>	<b>15 días</b>	<b>jue 11/4/24</b>	<b>vie 3/5/24</b>												
1097		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	jue 11/4/24	jue 18/4/24												
1098		Elaboración de solicitud y confección de pliego de condiciones en SICOP	5 días	vie 19/4/24	jue 25/4/24												
1099		<b>Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh)</b>	<b>5 días</b>	<b>vie 26/4/24</b>	<b>vie 3/5/24</b>												
1100		<b>Plazo para recepción de ofertas (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 RLGCP)</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 6/5/24</b>	<b>vie 10/5/24</b>												
1101		Plazo para recibir ofertas	5 días	lun 6/5/24	vie 10/5/24												
1102		<b>Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284)</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 6/5/24</b>	<b>vie 10/5/24</b>												
1103		Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones	2 días	lun 6/5/24	mar 7/5/24												
1104		Resolución y comunicación de recurso	3 días	mié 8/5/24	vie 10/5/24												
1105		<b>Estudio de ofertas</b>	<b>6,5 días</b>	<b>lun 13/5/24</b>	<b>mar 21/5/24</b>												
1106		Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y técnico	1 día	lun 13/5/24	lun 13/5/24												

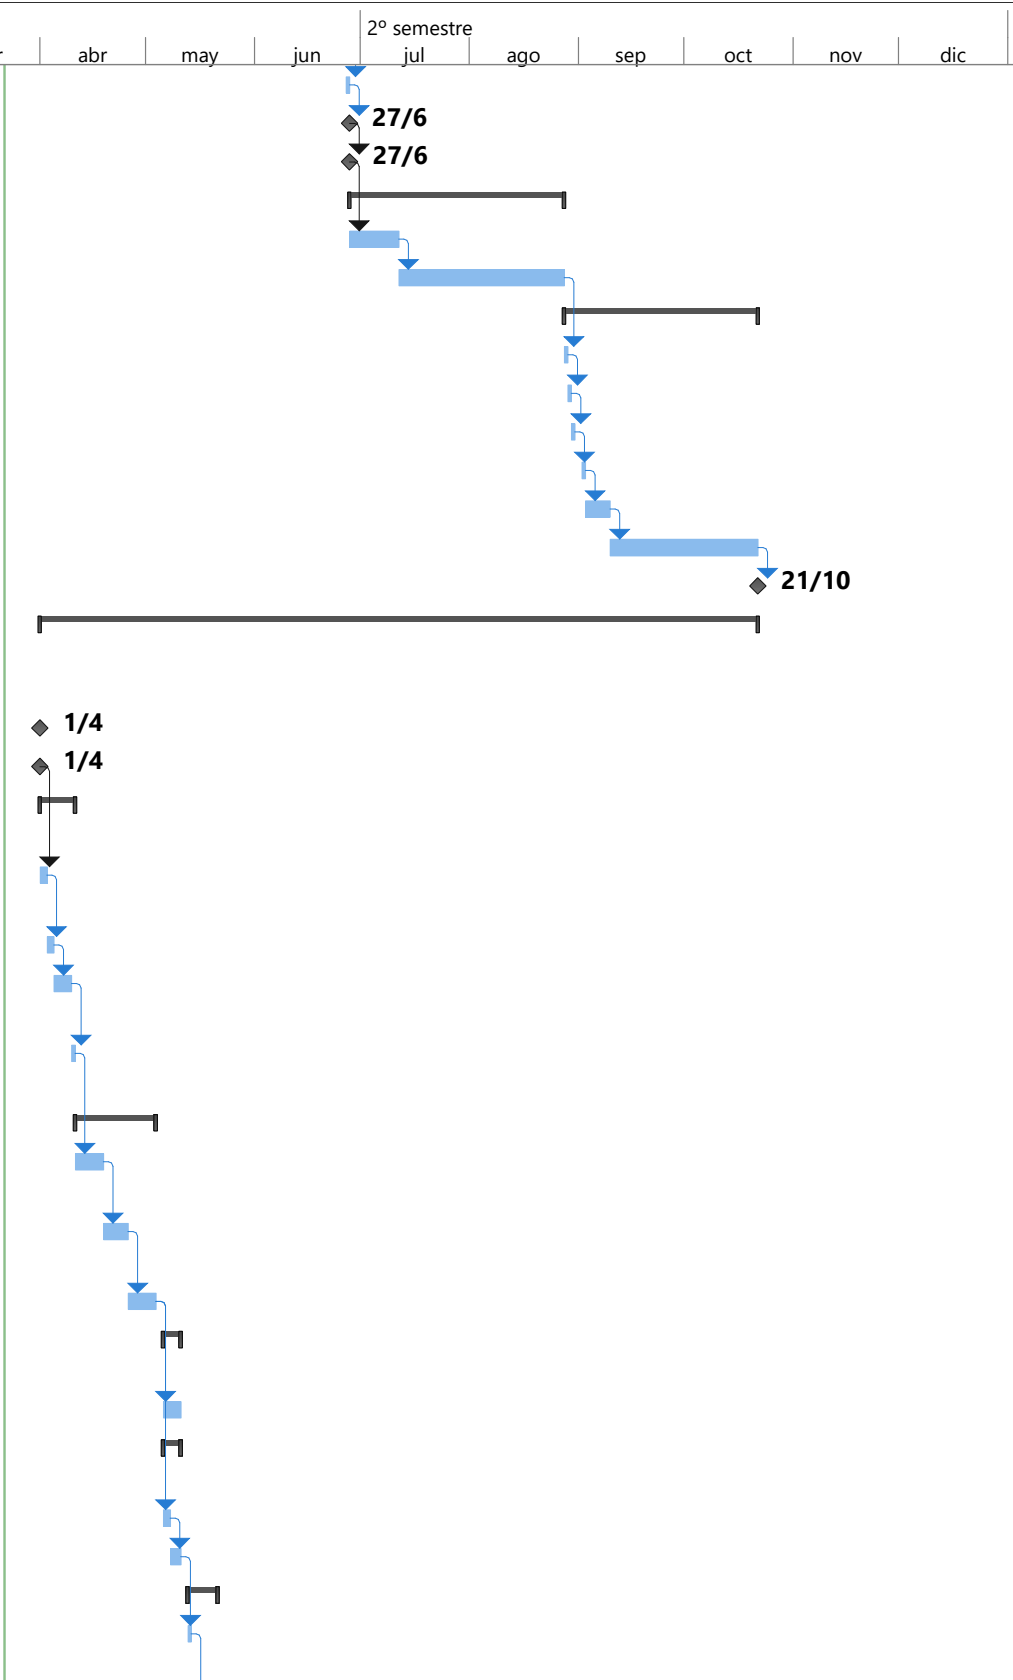

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: vie 22/3/24

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre					2º semestre									
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic			
1107		Valoración de ofertas	1 día	mar 14/5/24	mar 14/5/24															
1108		Previsiones a los oferentes	0,5 días	mié 15/5/24	mié 15/5/24															
1109		Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes)	2 días	mié 15/5/24	vie 17/5/24															
1110		Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT	2 días	vie 17/5/24	mar 21/5/24															
1111		<b>Recomendación de adjudicación (UT)</b>	<b>3 días</b>	<b>mar 21/5/24</b>	<b>vie 24/5/24</b>															
1112		Recomendación de adjudicación (UT)	1 día	mar 21/5/24	mié 22/5/24															
1113		Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT y Fiscalizador USP)	2 días	mié 22/5/24	vie 24/5/24															
1114		<b>Adjudicación y notificación</b>	<b>0,5 días</b>	<b>vie 24/5/24</b>	<b>vie 24/5/24</b>															
1115		Elaboración de acuerdo de adjudicación	0,5 días	vie 24/5/24	vie 24/5/24															
1116		Notificación del acto de adjudicación (SICOP)	0 días	vie 24/5/24	vie 24/5/24															
1117		<b>Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP)</b>	<b>2 días</b>	<b>lun 27/5/24</b>	<b>mar 28/5/24</b>															
1118		<b>Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA)</b>	<b>2 días</b>	<b>lun 27/5/24</b>	<b>mar 28/5/24</b>															
1119		Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	lun 27/5/24	mar 28/5/24															
1120		<b>Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)</b>	<b>2 días</b>	<b>lun 27/5/24</b>	<b>mar 28/5/24</b>															
1121		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	lun 27/5/24	mar 28/5/24															
1122		<b>Plazo para audiencia inicial</b>	<b>5 días</b>	<b>mié 29/5/24</b>	<b>mar 4/6/24</b>															
1123		Resolución de Recurso de revocatoria	3 días	mié 29/5/24	vie 31/5/24															
1124		Adjudicación en firme	2 días	lun 3/6/24	mar 4/6/24															
1125		<b>Trámite de contrato</b>	<b>11 días?</b>	<b>mié 5/6/24</b>	<b>mié 19/6/24</b>															
1126		Elaboración del Contrato	4 días	mié 5/6/24	lun 10/6/24															
1127		Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	mar 11/6/24	mar 11/6/24															
1128		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, patente, etc)	5 días	mié 12/6/24	mar 18/6/24															
1129		Firma de contrato Proveedor USP	1 día?	mié 19/6/24	mié 19/6/24															
1130		Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa	0 días	mié 19/6/24	mié 19/6/24															
1131		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>6 días</b>	<b>jue 20/6/24</b>	<b>jue 27/6/24</b>															
1132		Elaboración de orden de pedido temporal	2 días	jue 20/6/24	vie 21/6/24															
1133		Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	vie 21/6/24	vie 21/6/24															
1134		Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	lun 24/6/24	mié 26/6/24															
1135		Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	jue 27/6/24	jue 27/6/24															
1136		Firma de pedido por Proveedor USP	0 días	jue 27/6/24	jue 27/6/24															
1137		Notificación de la orden de pedido	0 días	jue 27/6/24	jue 27/6/24															
1138		<b>Recepción de los bienes y/o servicios</b>	<b>40 días</b>	<b>vie 28/6/24</b>	<b>mar 27/8/24</b>															
1139		Entrega de los bienes/servicios	10 días	vie 28/6/24	jue 11/7/24															
1140		Recibido a satisfacción	30 días	vie 12/7/24	mar 27/8/24															
1141		<b>Trámite de pago</b>	<b>39 días?</b>	<b>mié 28/8/24</b>	<b>lun 21/10/24</b>															
1142		Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mié 28/8/24	mié 28/8/24															
1143		Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	jue 29/8/24	jue 29/8/24															
1144		Generación y firma de trámite de pago	1 día?	vie 30/8/24	vie 30/8/24															

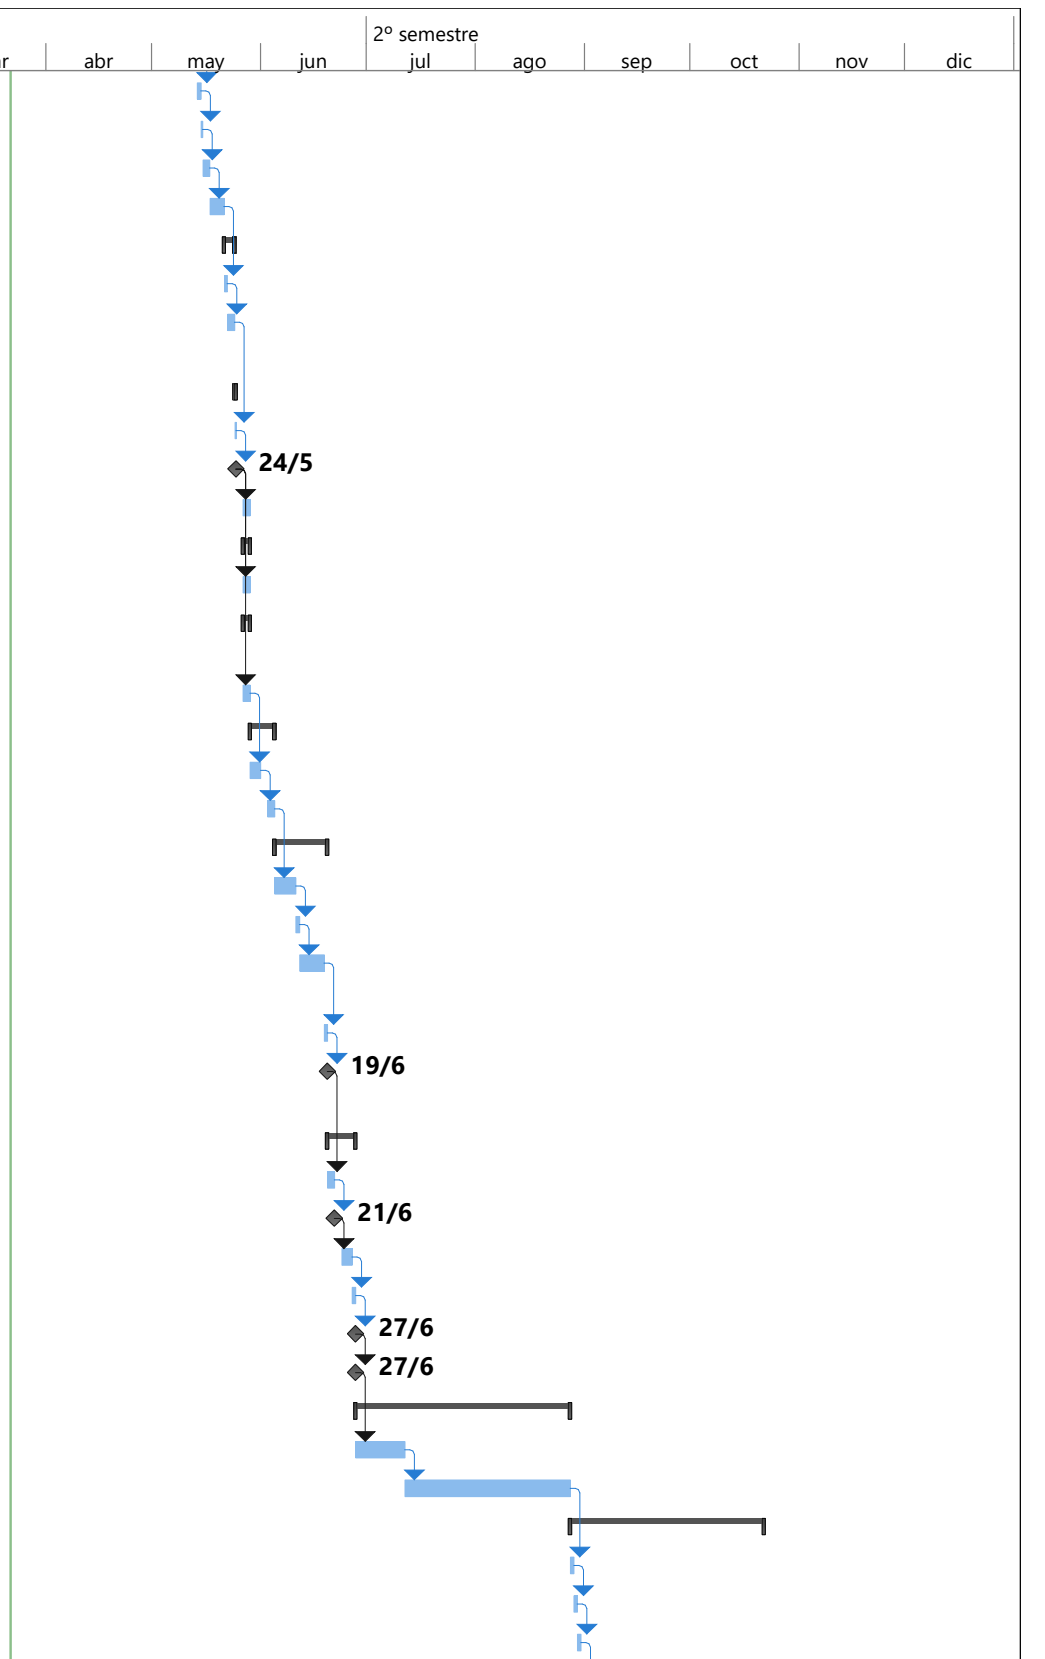

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: vie 22/3/24

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre						2º semestre								
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic			
1145		Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	lun 2/9/24	lun 2/9/24															
1146		Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	mar 3/9/24	lun 9/9/24															
1147		Pago de Tesorería Nacional	30 días	mar 10/9/24	lun 21/10/24															
1148		Fin	0 días	lun 21/10/24	lun 21/10/24															
1149		<b>2024LD-0000XX-000540/USG/Recuperación y aprovechamiento de aguas pluviales (Contratado al 31/05/2024); \$5.000.000/2024 ; / Código SICOP:311628</b>	<b>141 días?</b>	<b>mar 20/2/24</b>	<b>mar 17/9/24</b>															
1150		<b>Elaboración de pliego de condiciones</b>	<b>0 días</b>	<b>mar 20/2/24</b>	<b>mar 20/2/24</b>															
1151		Envío de especificaciones técnicas y estudios previos	0 días	mar 20/2/24	mar 20/2/24															
1152		<b>Confección documento complementario al pliego de condiciones</b>	<b>8 días</b>	<b>mar 20/2/24</b>	<b>jue 29/2/24</b>															
1153		Elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	2 días	mar 20/2/24	mié 21/2/24															
1154		Revisión de documento colaborador USP	2 días	jue 22/2/24	vie 23/2/24															
1155		Revisión Técnica de documento complementario al pliego de condiciones	3 días	lun 26/2/24	mié 28/2/24															
1156		Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	1 día	jue 29/2/24	jue 29/2/24															
1157		<b>Preparación previa a publicación en SICOP</b>	<b>15 días</b>	<b>vie 1/3/24</b>	<b>jue 21/3/24</b>															
1158		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	vie 1/3/24	jue 7/3/24															
1159		Elaboración de solicitud y confección de pliego de condiciones en SICOP	5 días	vie 8/3/24	jue 14/3/24															
1160		<b>Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh)</b>	<b>5 días</b>	<b>vie 15/3/24</b>	<b>jue 21/3/24</b>															
1161		<b>Plazo para recepción de ofertas (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 RLGCP)</b>	<b>5 días</b>	<b>vie 22/3/24</b>	<b>jue 4/4/24</b>															
1162		Plazo para recibir ofertas	5 días	vie 22/3/24	jue 4/4/24															
1163		<b>Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284)</b>	<b>5 días</b>	<b>vie 22/3/24</b>	<b>jue 4/4/24</b>															
1164		Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones	2 días	vie 22/3/24	lun 1/4/24															
1165		Resolución y comunicación de recurso	3 días	mar 2/4/24	jue 4/4/24															
1166		<b>Estudio de ofertas</b>	<b>6,5 días</b>	<b>vie 5/4/24</b>	<b>mar 16/4/24</b>															
1167		Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y técnico	1 día	vie 5/4/24	vie 5/4/24															
1168		Valoración de ofertas	1 día	lun 8/4/24	lun 8/4/24															
1169		Previsiones a los oferentes	0,5 días	mar 9/4/24	mar 9/4/24															
1170		Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes)	2 días	mar 9/4/24	jue 11/4/24															
1171		Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT	2 días	jue 11/4/24	mar 16/4/24															
1172		<b>Recomendación de adjudicación (UT)</b>	<b>3 días</b>	<b>mar 16/4/24</b>	<b>vie 19/4/24</b>															
1173		Recomendación de adjudicación (UT)	1 día	mar 16/4/24	mié 17/4/24															
1174		Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT y Fiscalizador USP)	2 días	mié 17/4/24	vie 19/4/24															
1175		<b>Adjudicación y notificación</b>	<b>0,5 días</b>	<b>vie 19/4/24</b>	<b>vie 19/4/24</b>															

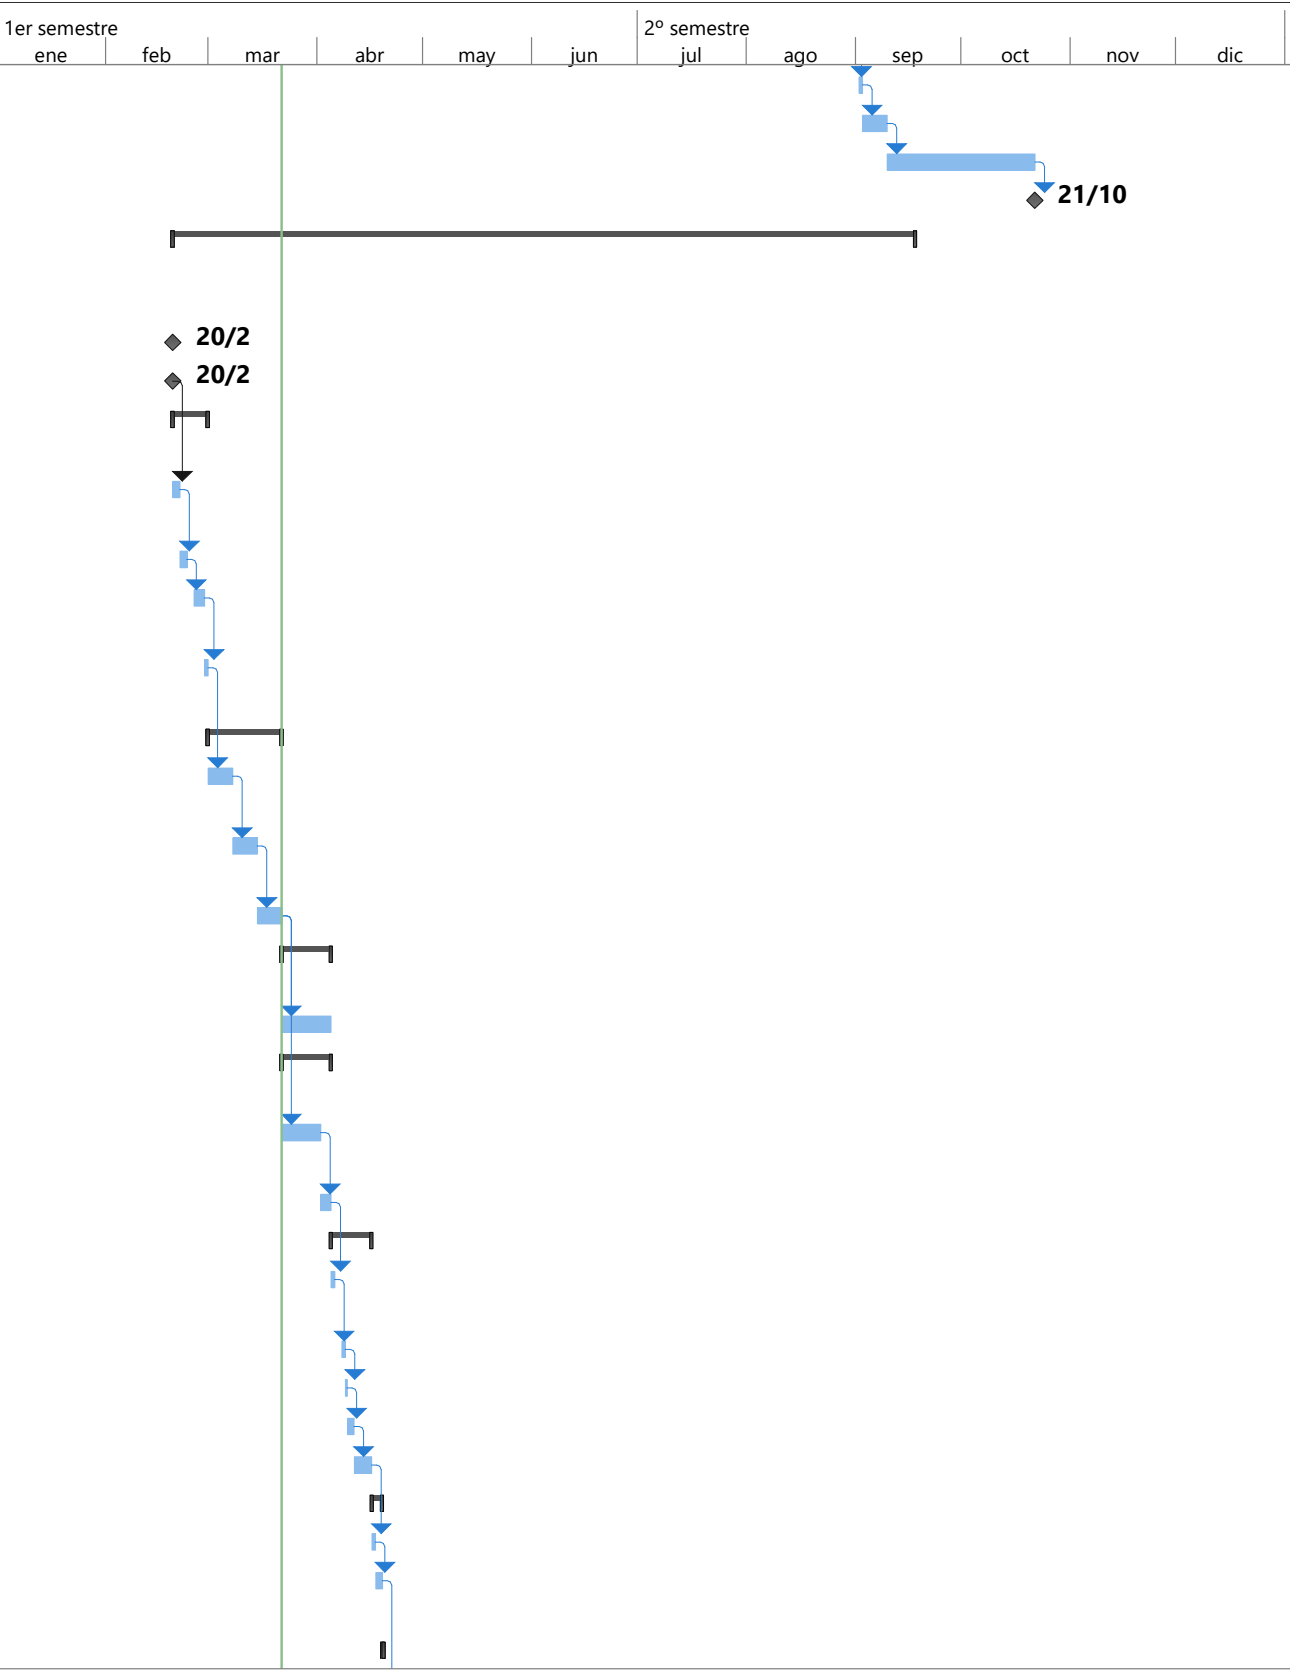

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: vie 22/3/24

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre						2º semestre								
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic			
1176		Elaboración de acuerdo de adjudicación	0,5 días	vie 19/4/24	vie 19/4/24															
1177		Notificación del acto de adjudicación (SICOP)	0 días	vie 19/4/24	vie 19/4/24															
1178		<b>Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP)</b>	<b>2 días</b>	<b>lun 22/4/24</b>	<b>mar 23/4/24</b>															
1179		<b>Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA)</b>	<b>2 días</b>	<b>lun 22/4/24</b>	<b>mar 23/4/24</b>															
1180		Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	lun 22/4/24	mar 23/4/24															
1181		<b>Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)</b>	<b>2 días</b>	<b>lun 22/4/24</b>	<b>mar 23/4/24</b>															
1182		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	lun 22/4/24	mar 23/4/24															
1183		<b>Plazo para audiencia inicial</b>	<b>5 días</b>	<b>mié 24/4/24</b>	<b>mar 30/4/24</b>															
1184		Resolución de Recurso de revocatoria	3 días	mié 24/4/24	vie 26/4/24															
1185		Adjudicación en firme	2 días	lun 29/4/24	mar 30/4/24															
1186		<b>Trámite de contrato</b>	<b>11 días?</b>	<b>jue 2/5/24</b>	<b>jue 16/5/24</b>															
1187		Elaboración del Contrato	4 días	jue 2/5/24	mar 7/5/24															
1188		Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	mié 8/5/24	mié 8/5/24															
1189		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, patente, etc)	5 días	jue 9/5/24	mié 15/5/24															
1190		Firma de contrato Proveedor USP	1 día?	jue 16/5/24	jue 16/5/24															
1191		Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa	0 días	jue 16/5/24	jue 16/5/24															
1192		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>6 días</b>	<b>vie 17/5/24</b>	<b>vie 24/5/24</b>															
1193		Elaboración de orden de pedido temporal	2 días	vie 17/5/24	lun 20/5/24															
1194		Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	lun 20/5/24	lun 20/5/24															
1195		Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	mar 21/5/24	jue 23/5/24															
1196		Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	vie 24/5/24	vie 24/5/24															
1197		Firma de pedido por Proveedor USP	0 días	vie 24/5/24	vie 24/5/24															
1198		Notificación de la orden de pedido	0 días	vie 24/5/24	vie 24/5/24															
1199		<b>Recepción de los bienes y/o servicios</b>	<b>40 días</b>	<b>lun 27/5/24</b>	<b>vie 19/7/24</b>															
1200		Entrega de los bienes/servicios	10 días	lun 27/5/24	vie 7/6/24															
1201		Recibido a satisfacción	30 días	lun 10/6/24	vie 19/7/24															
1202		<b>Trámite de pago</b>	<b>39 días?</b>	<b>lun 22/7/24</b>	<b>mar 17/9/24</b>															
1203		Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	lun 22/7/24	lun 22/7/24															
1204		Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mar 23/7/24	mar 23/7/24															
1205		Generación y firma de trámite de pago	1 día?	mié 24/7/24	mié 24/7/24															
1206		Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	jue 25/7/24	jue 25/7/24															
1207		Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	vie 26/7/24	lun 5/8/24															
1208		Pago de Tesorería Nacional	30 días	mar 6/8/24	mar 17/9/24															
1209		Fin	0 días	mar 17/9/24	mar 17/9/24															
1210		<b>2024LD-00000XX-000540/USG/Servicio de fibra óptica del parqueo sur nuevo(iniciar 2023, vence 1/1/2024); \$613,000/2024; / Código SICOP:83112304</b>	<b>141 días?</b>	<b>mié 22/11/23</b>	<b>lun 1/7/24</b>															
1211		<b>Elaboración de pliego de condiciones</b>	<b>0 días</b>	<b>mié 22/11/23</b>	<b>mié 22/11/23</b>															
1212		Envío de especificaciones técnicas y estudios previos	0 días	mié 22/11/23	mié 22/11/23															

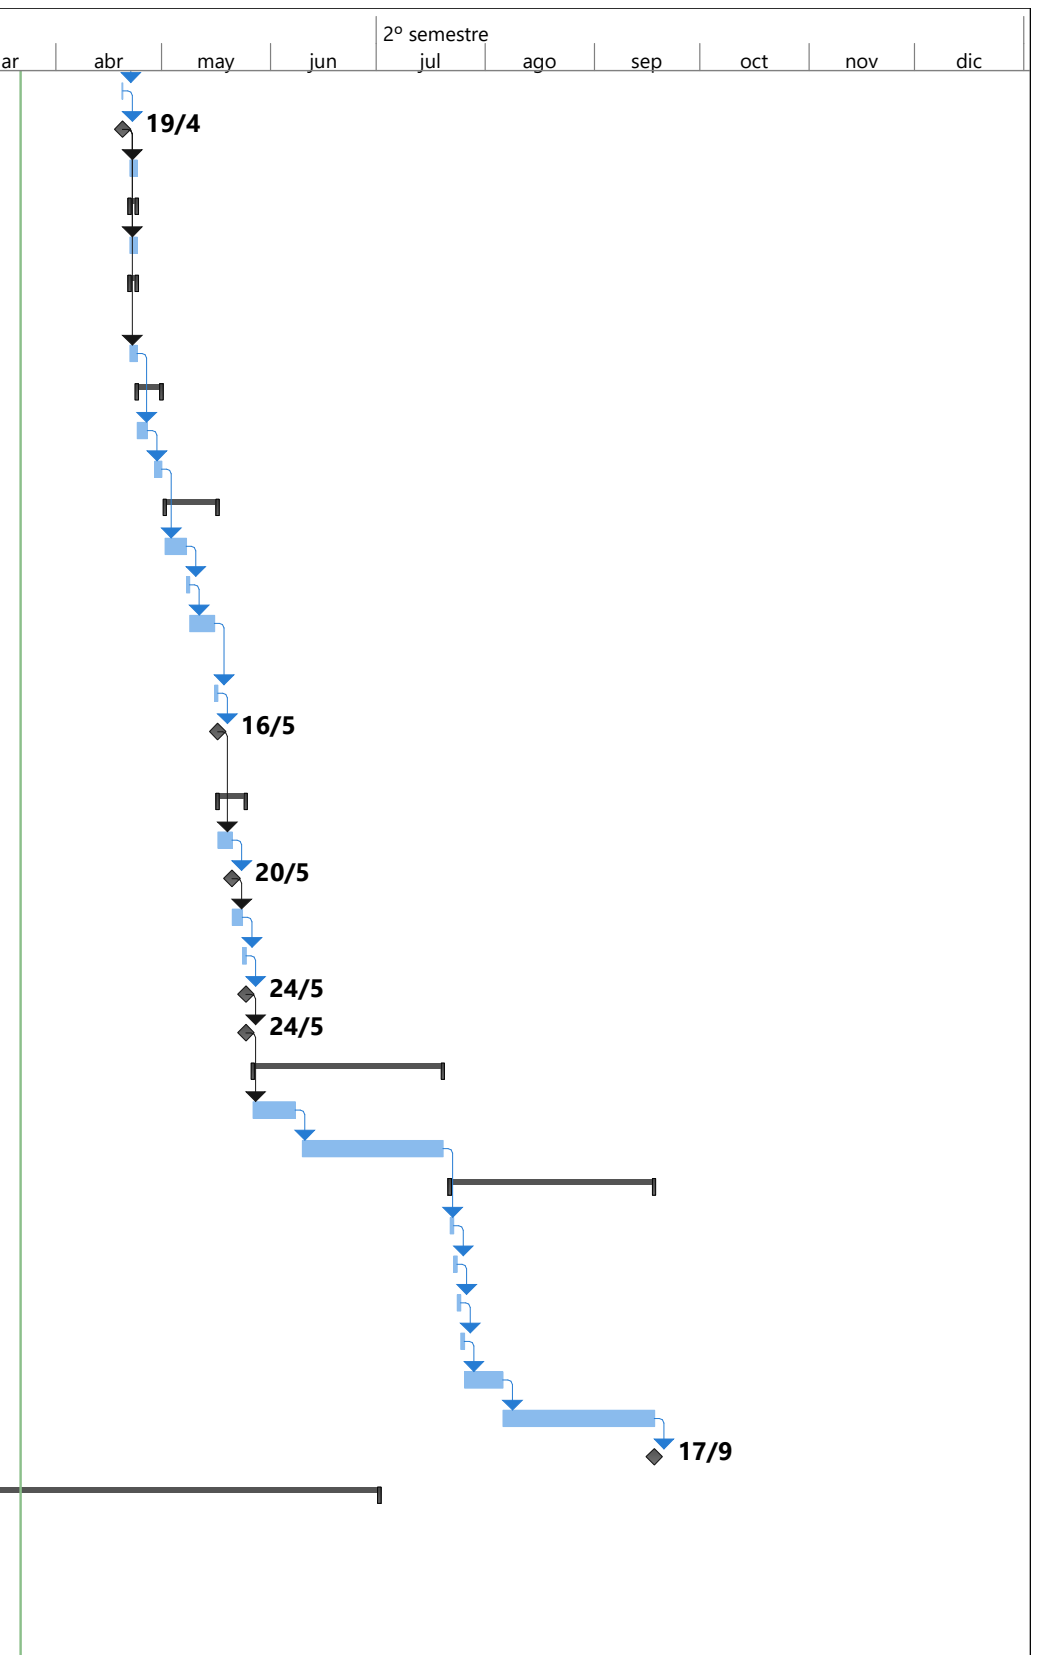


Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: vie 22/3/24

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre						2º semestre								
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic			
1245		Resolución de Recurso de revocatoria	3 días	jue 1/2/24	lun 5/2/24															
1246		Adjudicación en firme	2 días	mar 6/2/24	mié 7/2/24															
1247		<b>Trámite de contrato</b>	<b>11 días?</b>	<b>jue 8/2/24</b>	<b>jue 22/2/24</b>															
1248		Elaboración del Contrato	4 días	jue 8/2/24	mar 13/2/24															
1249		Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	mié 14/2/24	mié 14/2/24															
1250		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, patente, etc)	5 días	jue 15/2/24	mié 21/2/24															
1251		Firma de contrato Proveedor USP	1 día?	jue 22/2/24	jue 22/2/24															
1252		Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa	0 días	jue 22/2/24	jue 22/2/24															
1253		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>6 días</b>	<b>vie 23/2/24</b>	<b>vie 1/3/24</b>															
1254		Elaboración de orden de pedido temporal	2 días	vie 23/2/24	lun 26/2/24															
1255		Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	lun 26/2/24	lun 26/2/24															
1256		Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	mar 27/2/24	jue 29/2/24															
1257		Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	vie 1/3/24	vie 1/3/24															
1258		Firma de pedido por Proveedor USP	0 días	vie 1/3/24	vie 1/3/24															
1259		Notificación de la orden de pedido	0 días	vie 1/3/24	vie 1/3/24															
1260		<b>Recepción de los bienes y/o servicios</b>	<b>40 días</b>	<b>lun 4/3/24</b>	<b>mar 7/5/24</b>															
1261		Entrega de los bienes/servicios	10 días	lun 4/3/24	vie 15/3/24															
1262		Recibido a satisfacción	30 días	lun 18/3/24	mar 7/5/24															
1263		<b>Trámite de pago</b>	<b>39 días?</b>	<b>mié 8/5/24</b>	<b>lun 1/7/24</b>															
1264		Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mié 8/5/24	mié 8/5/24															
1265		Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	jue 9/5/24	jue 9/5/24															
1266		Generación y firma de trámite de pago	1 día?	vie 10/5/24	vie 10/5/24															
1267		Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	lun 13/5/24	lun 13/5/24															
1268		Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	mar 14/5/24	lun 20/5/24															
1269		Pago de Tesorería Nacional	30 días	mar 21/5/24	lun 1/7/24															
1270		Fin	0 días	lun 1/7/24	lun 1/7/24															
1271		<b>2024LD-00000XX-000540/USG/Servicio de fumigación de los edificios de la Contraloría General de la República (Contrato vence 22/04/2024); \$810,000/2024; / Código SICOP:72102103</b>	<b>141 días?</b>	<b>jue 29/2/24</b>	<b>jue 26/9/24</b>															
1272		Elaboración de pliego de condiciones	0 días	jue 29/2/24	jue 29/2/24															
1273		Envío de especificaciones técnicas y estudios previos	0 días	jue 29/2/24	jue 29/2/24															
1274		<b>Confección documento complementario al pliego de condiciones</b>	<b>8 días</b>	<b>jue 29/2/24</b>	<b>lun 11/3/24</b>															
1275		Elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	2 días	jue 29/2/24	vie 1/3/24															
1276		Revisión de documento colaborador USP	2 días	lun 4/3/24	mar 5/3/24															
1277		Revisión Técnica de documento complementario al pliego de condiciones	3 días	mié 6/3/24	vie 8/3/24															
1278		Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	1 día	lun 11/3/24	lun 11/3/24															
1279		<b>Preparación previa a publicación en SICOP</b>	<b>15 días</b>	<b>mar 12/3/24</b>	<b>lun 8/4/24</b>															

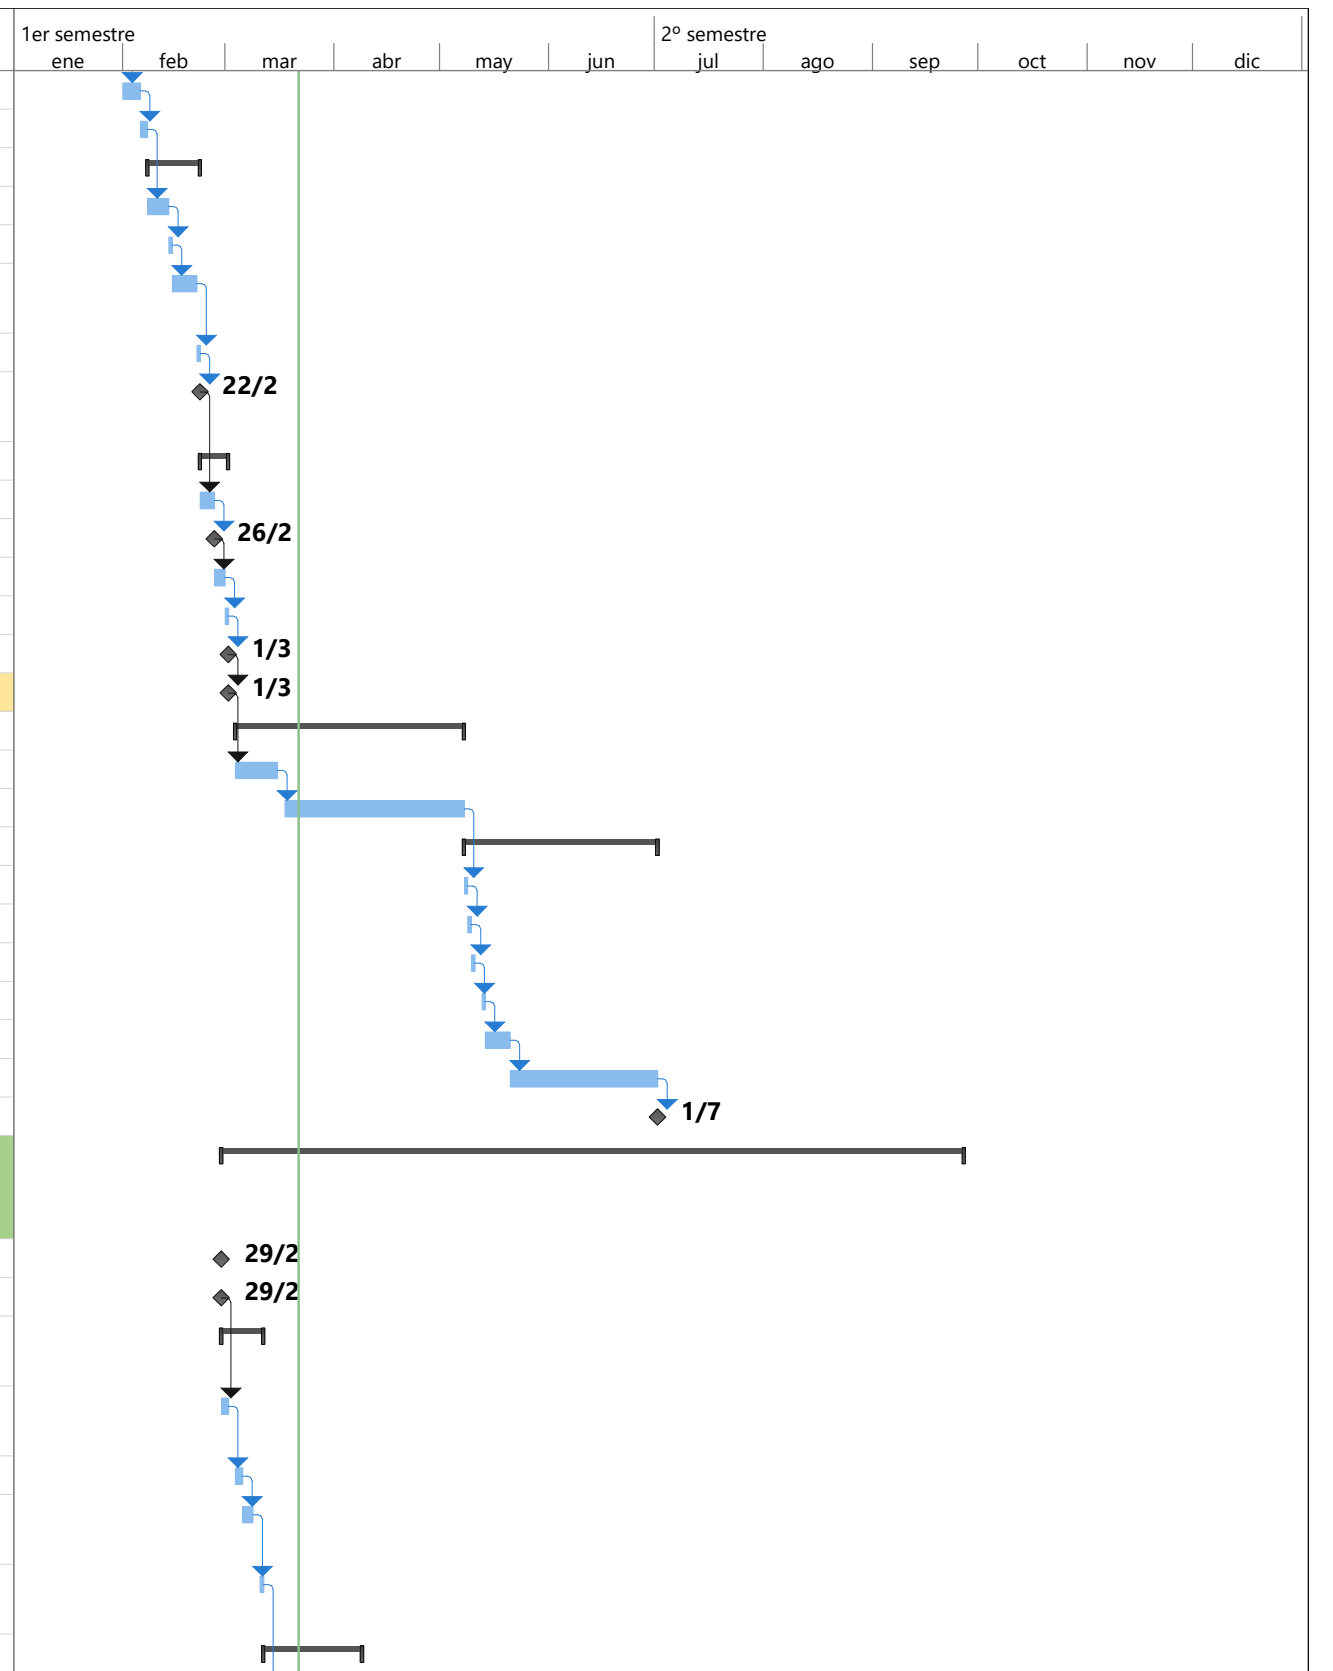


Proyecto: Cronograma de comp Fecha: vie 22/3/24	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre						2º semestre								
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic			
1280		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	mar 12/3/24	lun 18/3/24															
1281		Elaboracion de solicitud y confección de pliego de condiciones en SICOP	5 días	mar 19/3/24	lun 1/4/24															
1282		<b>Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh)</b>	<b>5 días</b>	<b>mar 2/4/24</b>	<b>lun 8/4/24</b>															
1283		<b>Plazo para recepción de ofertas (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 RLGCP)</b>	<b>5 días</b>	<b>mar 9/4/24</b>	<b>mar 16/4/24</b>															
1284		Plazo para recibir ofertas	5 días	mar 9/4/24	mar 16/4/24															
1285		<b>Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284)</b>	<b>5 días</b>	<b>mar 9/4/24</b>	<b>mar 16/4/24</b>															
1286		Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones	2 días	mar 9/4/24	mié 10/4/24															
1287		Resolución y comunicación de recurso	3 días	jue 11/4/24	mar 16/4/24															
1288		<b>Estudio de ofertas</b>	<b>6,5 días</b>	<b>mié 17/4/24</b>	<b>jue 25/4/24</b>															
1289		Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y técnico	1 día	mié 17/4/24	mié 17/4/24															
1290		Valoración de ofertas	1 día	jue 18/4/24	jue 18/4/24															
1291		Previsiones a los oferentes	0,5 días	vie 19/4/24	vie 19/4/24															
1292		Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes)	2 días	vie 19/4/24	mar 23/4/24															
1293		Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT	2 días	mar 23/4/24	jue 25/4/24															
1294		<b>Recomendación de adjudicación (UT)</b>	<b>3 días</b>	<b>jue 25/4/24</b>	<b>mar 30/4/24</b>															
1295		Recomendación de adjudicación (UT)	1 día	jue 25/4/24	vie 26/4/24															
1296		Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT y Fiscalizador USP)	2 días	vie 26/4/24	mar 30/4/24															
1297		<b>Adjudicación y notificación</b>	<b>0,5 días</b>	<b>mar 30/4/24</b>	<b>mar 30/4/24</b>															
1298		Elaboración de acuerdo de adjudicación	0,5 días	mar 30/4/24	mar 30/4/24															
1299		Notificación del acto de adjudicación (SICOP)	0 días	mar 30/4/24	mar 30/4/24															
1300		<b>Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP)</b>	<b>2 días</b>	<b>jue 2/5/24</b>	<b>vie 3/5/24</b>															
1301		<b>Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA)</b>	<b>2 días</b>	<b>jue 2/5/24</b>	<b>vie 3/5/24</b>															
1302		Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	jue 2/5/24	vie 3/5/24															
1303		<b>Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)</b>	<b>2 días</b>	<b>jue 2/5/24</b>	<b>vie 3/5/24</b>															
1304		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	jue 2/5/24	vie 3/5/24															
1305		<b>Plazo para audiencia inicial</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 6/5/24</b>	<b>vie 10/5/24</b>															
1306		Resolución de Recurso de revocatoria	3 días	lun 6/5/24	mié 8/5/24															
1307		Adjudicación en firme	2 días	jue 9/5/24	vie 10/5/24															
1308		<b>Trámite de contrato</b>	<b>11 días?</b>	<b>lun 13/5/24</b>	<b>lun 27/5/24</b>															
1309		Elaboración del Contrato	4 días	lun 13/5/24	jue 16/5/24															
1310		Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	vie 17/5/24	vie 17/5/24															
1311		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, patente, etc)	5 días	lun 20/5/24	vie 24/5/24															
1312		Firma de contrato Proveedor USP	1 día?	lun 27/5/24	lun 27/5/24															

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: vie 22/3/24

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre					2º semestre					
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov
1313		Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa	0 días	lun 27/5/24	lun 27/5/24											
1314		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>6 días</b>	<b>mar 28/5/24</b>	<b>mar 4/6/24</b>											
1315		Elaboración de orden de pedido temporal	2 días	mar 28/5/24	mié 29/5/24											
1316		Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	mié 29/5/24	mié 29/5/24											
1317		Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	jue 30/5/24	lun 3/6/24											
1318		Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	mar 4/6/24	mar 4/6/24											
1319		Firma de pedido por Proveedor USP	0 días	mar 4/6/24	mar 4/6/24											
1320		Notificación de la orden de pedido	0 días	mar 4/6/24	mar 4/6/24											
1321		<b>Recepción de los bienes y/o servicios</b>	<b>40 días</b>	<b>mié 5/6/24</b>	<b>mié 31/7/24</b>											
1322		Entrega de los bienes/servicios	10 días	mié 5/6/24	mar 18/6/24											
1323		Recibido a satisfacción	30 días	mié 19/6/24	mié 31/7/24											
1324		<b>Trámite de pago</b>	<b>39 días?</b>	<b>jue 1/8/24</b>	<b>jue 26/9/24</b>											
1325		Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	jue 1/8/24	jue 1/8/24											
1326		Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	lun 5/8/24	lun 5/8/24											
1327		Generación y firma de trámite de pago	1 día?	mar 6/8/24	mar 6/8/24											
1328		Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	mié 7/8/24	mié 7/8/24											
1329		Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	jue 8/8/24	mié 14/8/24											
1330		Pago de Tesorería Nacional	30 días	jue 15/8/24	jue 26/9/24											
1331		Fin	0 días	jue 26/9/24	jue 26/9/24											
1332		<b>2024LD-00000XX-000540/USG/Servicio de limpieza de ventanales, estructuras externas y canoas del edificio principal de la CGR, (Contratado al 30/04/2024); \$7,800,000/2024; / Código</b>	<b>141 días?</b>	<b>vie 1/3/24</b>	<b>vie 27/9/24</b>											
1333		Elaboración de pliego de condiciones	0 días	vie 1/3/24	vie 1/3/24											
1334		Envío de especificaciones técnicas y estudios previos	0 días	vie 1/3/24	vie 1/3/24											
1335		Confección documento complementario al pliego de condiciones	8 días	vie 1/3/24	mar 12/3/24											
1336		Elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	2 días	vie 1/3/24	lun 4/3/24											
1337		Revisión de documento colaborador USP	2 días	mar 5/3/24	mié 6/3/24											
1338		Revisión Técnica de documento complementario al pliego de condiciones	3 días	jue 7/3/24	lun 11/3/24											
1339		Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	1 día	mar 12/3/24	mar 12/3/24											
1340		<b>Preparación previa a publicación en SICOP</b>	<b>15 días</b>	<b>mié 13/3/24</b>	<b>mar 9/4/24</b>											
1341		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	mié 13/3/24	mar 19/3/24											
1342		Elaboración de solicitud y confección de pliego de condiciones en SICOP	5 días	mié 20/3/24	mar 2/4/24											
1343		<b>Invitación a participar en SICOP (Art.177 entre 3dh y 5dh)</b>	<b>5 días</b>	<b>mié 3/4/24</b>	<b>mar 9/4/24</b>											
1344		<b>Plazo para recepción de ofertas (plazo entre 3dh y 5dh Art.177 RLGCP)</b>	<b>5 días</b>	<b>mié 10/4/24</b>	<b>mié 17/4/24</b>											
1345		Plazo para recibir ofertas	5 días	mié 10/4/24	mié 17/4/24											

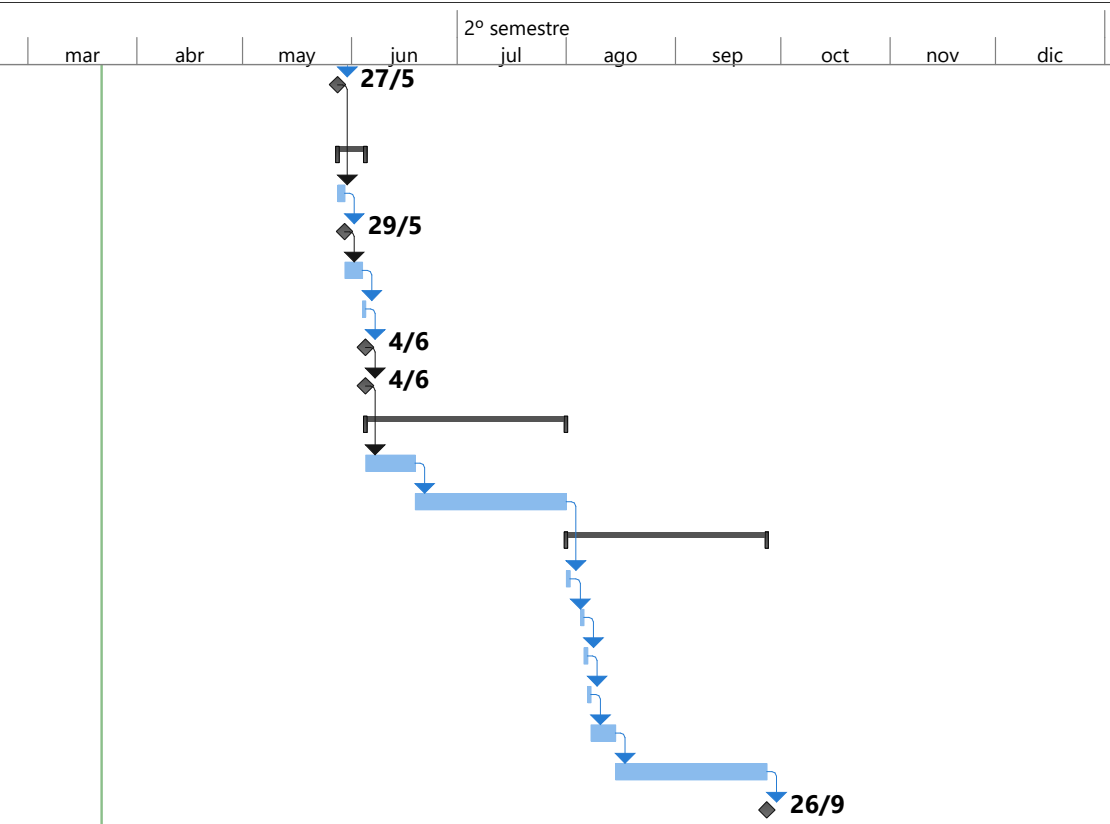

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: vie 22/3/24

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre						2º semestre								
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic			
1346		<b>Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones (2dh p/objetar; 3dh p/resolver (Administración) Art 284)</b>	<b>5 días</b>	<b>mié 10/4/24</b>	<b>mié 17/4/24</b>															
1347		Presentación de recurso de objeción al pliego de condiciones	2 días	mié 10/4/24	jue 11/4/24															
1348		Resolución y comunicación de recurso	3 días	vie 12/4/24	mié 17/4/24															
1349		<b>Estudio de ofertas</b>	<b>6,5 días</b>	<b>jue 18/4/24</b>	<b>vie 26/4/24</b>															
1350		Apertura y remisión de ofertas en SICOP para estudio legal y técnico	1 día	jue 18/4/24	jue 18/4/24															
1351		Valoración de ofertas	1 día	vie 19/4/24	vie 19/4/24															
1352		Previsiones a los oferentes	0,5 días	lun 22/4/24	lun 22/4/24															
1353		Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes)	2 días	lun 22/4/24	mié 24/4/24															
1354		Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT	2 días	mié 24/4/24	vie 26/4/24															
1355		<b>Recomendación de adjudicación (UT)</b>	<b>3 días</b>	<b>vie 26/4/24</b>	<b>jue 2/5/24</b>															
1356		Recomendación de adjudicación (UT)	1 día	vie 26/4/24	lun 29/4/24															
1357		Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT y Fiscalizador USP)	2 días	lun 29/4/24	jue 2/5/24															
1358		<b>Adjudicación y notificación</b>	<b>0,5 días</b>	<b>jue 2/5/24</b>	<b>jue 2/5/24</b>															
1359		Elaboración de acuerdo de adjudicación	0,5 días	jue 2/5/24	jue 2/5/24															
1360		Notificación del acto de adjudicación (SICOP)	0 días	jue 2/5/24	jue 2/5/24															
1361		<b>Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP)</b>	<b>2 días</b>	<b>vie 3/5/24</b>	<b>lun 6/5/24</b>															
1362		<b>Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA)</b>	<b>2 días</b>	<b>vie 3/5/24</b>	<b>lun 6/5/24</b>															
1363		Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	vie 3/5/24	lun 6/5/24															
1364		<b>Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)</b>	<b>2 días</b>	<b>vie 3/5/24</b>	<b>lun 6/5/24</b>															
1365		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	vie 3/5/24	lun 6/5/24															
1366		<b>Plazo para audiencia inicial</b>	<b>5 días</b>	<b>mar 7/5/24</b>	<b>lun 13/5/24</b>															
1367		Resolución de Recurso de revocatoria	3 días	mar 7/5/24	jue 9/5/24															
1368		Adjudicación en firme	2 días	vie 10/5/24	lun 13/5/24															
1369		<b>Trámite de contrato</b>	<b>11 días?</b>	<b>mar 14/5/24</b>	<b>mar 28/5/24</b>															
1370		Elaboración del Contrato	4 días	mar 14/5/24	vie 17/5/24															
1371		Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	lun 20/5/24	lun 20/5/24															
1372		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, patente, etc)	5 días	mar 21/5/24	lun 27/5/24															
1373		Firma de contrato Proveedor USP	1 día?	mar 28/5/24	mar 28/5/24															
1374		Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa	0 días	mar 28/5/24	mar 28/5/24															
1375		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>6 días</b>	<b>mié 29/5/24</b>	<b>mié 5/6/24</b>															
1376		Elaboración de orden de pedido temporal	2 días	mié 29/5/24	jue 30/5/24															
1377		Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	jue 30/5/24	jue 30/5/24															
1378		Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	vie 31/5/24	mar 4/6/24															
1379		Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	mié 5/6/24	mié 5/6/24															
1380		Firma de pedido por Proveedor USP	0 días	mié 5/6/24	mié 5/6/24															
1381		Notificación de la orden de pedido	0 días	mié 5/6/24	mié 5/6/24															

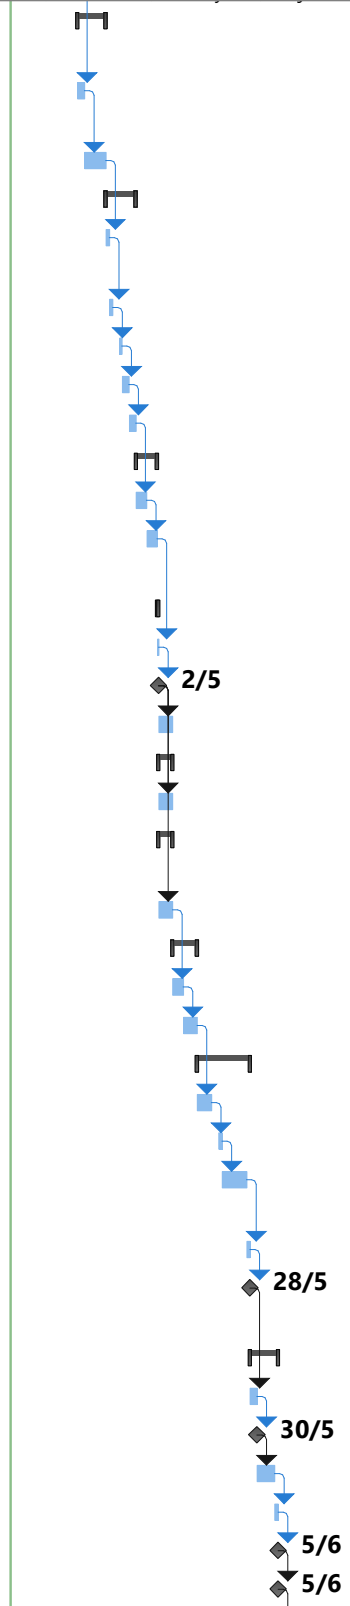

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: vie 22/3/24

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre						2º semestre					
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
1414		Recepción de subsanaciones en SICOP (oferentes)	2 días	lun 15/7/24	mié 17/7/24												
1415		Análisis de respuestas / subsanaciones por parte de la UT	2 días	mié 17/7/24	vie 19/7/24												
1416		<b>Recomendación de adjudicación (UT)</b>	<b>3 días</b>	<b>vie 19/7/24</b>	<b>mié 24/7/24</b>												
1417		Recomendación de adjudicación (UT)	1 día	vie 19/7/24	lun 22/7/24												
1418		Aprobación recomendación de adjudicación en SICOP (Jefatura UT y Fiscalizador USP)	2 días	lun 22/7/24	mié 24/7/24												
1419		<b>Adjudicación y notificación</b>	<b>0,5 días</b>	<b>mié 24/7/24</b>	<b>mié 24/7/24</b>												
1420		Elaboración de acuerdo de adjudicación	0,5 días	mié 24/7/24	mié 24/7/24												
1421		Notificación del acto de adjudicación (SICOP)	0 días	mié 24/7/24	mié 24/7/24												
1422		<b>Firmeza del acto de adjudicación (2 dh Art 63 RLCP)</b>	<b>2 días</b>	<b>jue 25/7/24</b>	<b>vie 26/7/24</b>												
1423		<b>Plazo recepción de recurso revocatoria (Art N°185 RLCA)</b>	<b>2 días</b>	<b>jue 25/7/24</b>	<b>vie 26/7/24</b>												
1424		Plazo recepción recurso de revocatoria (Art N°185 RLCA)	2 días	jue 25/7/24	vie 26/7/24												
1425		<b>Recurso de revocatoria Presentacion de recurso 2dh; 3dh p/resolver Art. 284 y Art. 285 (Resuelve la Administración)</b>	<b>2 días</b>	<b>jue 25/7/24</b>	<b>vie 26/7/24</b>												
1426		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	jue 25/7/24	vie 26/7/24												
1427		<b>Plazo para audiencia inicial</b>	<b>5 días</b>	<b>mar 30/7/24</b>	<b>mar 6/8/24</b>												
1428		Resolución de Recurso de revocatoria	3 días	mar 30/7/24	jue 1/8/24												
1429		Adjudicación en firme	2 días	lun 5/8/24	mar 6/8/24												
1430		<b>Trámite de contrato</b>	<b>11 días?</b>	<b>mié 7/8/24</b>	<b>jue 22/8/24</b>												
1431		Elaboración del Contrato	4 días	mié 7/8/24	lun 12/8/24												
1432		Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	mar 13/8/24	mar 13/8/24												
1433		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, patente, etc)	5 días	mié 14/8/24	mié 21/8/24												
1434		Firma de contrato Proveedor USP	1 día?	jue 22/8/24	jue 22/8/24												
1435		Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa	0 días	jue 22/8/24	jue 22/8/24												
1436		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>6 días</b>	<b>vie 23/8/24</b>	<b>vie 30/8/24</b>												
1437		Elaboración de orden de pedido temporal	2 días	vie 23/8/24	lun 26/8/24												
1438		Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	lun 26/8/24	lun 26/8/24												
1439		Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	mar 27/8/24	jue 29/8/24												
1440		Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	vie 30/8/24	vie 30/8/24												
1441		Firma de pedido por Proveedor USP	0 días	vie 30/8/24	vie 30/8/24												
1442		Notificación de la orden de pedido	0 días	vie 30/8/24	vie 30/8/24												
1443		<b>Recepción de los bienes y/o servicios</b>	<b>40 días</b>	<b>lun 2/9/24</b>	<b>vie 25/10/24</b>												
1444		Entrega de los bienes/servicios	10 días	lun 2/9/24	vie 13/9/24												
1445		Recibido a satisfacción	30 días	lun 16/9/24	vie 25/10/24												
1446		<b>Trámite de pago</b>	<b>39 días?</b>	<b>lun 28/10/24</b>	<b>jue 19/12/24</b>												
1447		Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	lun 28/10/24	lun 28/10/24												
1448		Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mar 29/10/24	mar 29/10/24												
1449		Generación y firma de trámite de pago	1 día?	mié 30/10/24	mié 30/10/24												
1450		Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	jue 31/10/24	jue 31/10/24												
1451		Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	vie 1/11/24	jue 7/11/24												

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: vie 22/3/24


Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			







Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre						2º semestre					
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
1553		Elaboración del Contrato	4 días	lun 8/7/24	jue 11/7/24												
1554		Solicitud de documentos a Adjudicatario	1 día	vie 12/7/24	vie 12/7/24												
1555		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, patente, etc)	5 días	lun 15/7/24	vie 19/7/24												
1556		Firma de contrato Proveedor USP	1 día?	lun 22/7/24	lun 22/7/24												
1557		Notificación de contrato, pedido y orden de inicio a la empresa	0 días	lun 22/7/24	lun 22/7/24												
1558		<b>Trámite del Pedido</b>	<b>6 días</b>	<b>mar 23/7/24</b>	<b>mié 31/7/24</b>												
1559		Elaboración de orden de pedido temporal	2 días	mar 23/7/24	mié 24/7/24												
1560		Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	mié 24/7/24	mié 24/7/24												
1561		Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	jue 25/7/24	mar 30/7/24												
1562		Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	mié 31/7/24	mié 31/7/24												
1563		Firma de pedido por Proveedor USP	0 días	mié 31/7/24	mié 31/7/24												
1564		Notificación de la orden de pedido	0 días	mié 31/7/24	mié 31/7/24												
1565		<b>Recepción de los bienes y/o servicios</b>	<b>40 días</b>	<b>jue 1/8/24</b>	<b>vie 27/9/24</b>												
1566		Entrega de los bienes/servicios	10 días	jue 1/8/24	jue 15/8/24												
1567		Recibido a satisfacción	30 días	vie 16/8/24	vie 27/9/24												
1568		<b>Trámite de pago</b>	<b>39 días?</b>	<b>lun 30/9/24</b>	<b>jue 21/11/24</b>												
1569		Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	lun 30/9/24	lun 30/9/24												
1570		Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	mar 1/10/24	mar 1/10/24												
1571		Generación y firma de trámite de pago	1 día?	mié 2/10/24	mié 2/10/24												
1572		Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	jue 3/10/24	jue 3/10/24												
1573		Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	vie 4/10/24	jue 10/10/24												
1574		Pago de Tesorería Nacional	30 días	vie 11/10/24	jue 21/11/24												
1575		Fin	0 días	jue 21/11/24	jue 21/11/24												
1576		<b>2024LD-00000XX-000540/USG/Sillas y descansapiés € 2,500,000/2024 (Envían especificaciones el 02/05/2024); Eneyda Flores / Silvia Castro Código SICOP:56112102/46182205</b>	<b>141 días?</b>	<b>jue 2/5/24</b>	<b>mar 19/11/24</b>												
1577		<b>Elaboración de pliego de condiciones</b>	<b>0 días</b>	<b>jue 2/5/24</b>	<b>jue 2/5/24</b>												
1578		Envío de especificaciones técnicas y estudios previos	0 días	jue 2/5/24	jue 2/5/24												
1579		<b>Confección documento complementario al pliego de condiciones</b>	<b>8 días</b>	<b>jue 2/5/24</b>	<b>lun 13/5/24</b>												
1580		Elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	2 días	jue 2/5/24	vie 3/5/24												
1581		Revisión de documento colaborador USP	2 días	lun 6/5/24	mar 7/5/24												
1582		Revisión Técnica de documento complementario al pliego de condiciones	3 días	mié 8/5/24	vie 10/5/24												
1583		Incorporación de ajustes y elaboración de documento complementario al pliego de condiciones	1 día	lun 13/5/24	lun 13/5/24												
1584		<b>Preparación previa a publicacion en SICOP</b>	<b>15 días</b>	<b>mar 14/5/24</b>	<b>lun 3/6/24</b>												
1585		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de SICOP	5 días	mar 14/5/24	lun 20/5/24												

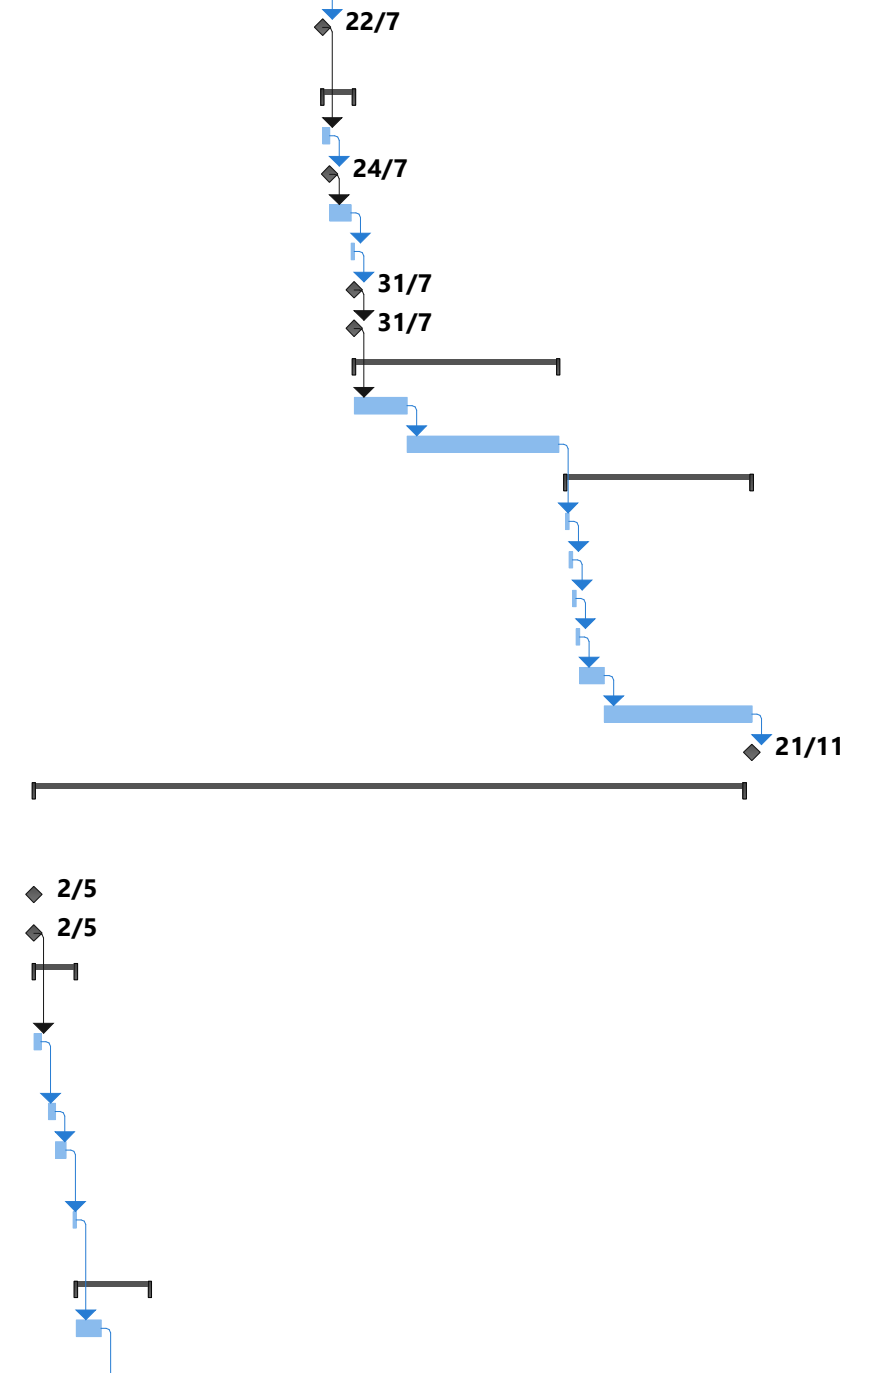

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: vie 22/3/24

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er semestre						2º semestre					
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
1620	→	Elaboración de orden de pedido temporal	2 días	vie 19/7/24	lun 22/7/24												
1621	→	Envío de pedido temporal a la UAF para aprobación	0 días	lun 22/7/24	lun 22/7/24												
1622	→	Visado de pedido por parte de la UAF	3 días	mar 23/7/24	jue 25/7/24												
1623	→	Recepción de la orden de pedido firmada por la UAF	1 día	vie 26/7/24	vie 26/7/24												
1624	→	Firma de pedido por Proveedor USP	0 días	vie 26/7/24	vie 26/7/24												
1625	→	Notificación de la orden de pedido	0 días	vie 26/7/24	vie 26/7/24												
1626	→	<b>Recepción de los bienes y/o servicios</b>	<b>40 días</b>	<b>mar 30/7/24</b>	<b>mié 25/9/24</b>												
1627	→	Entrega de los bienes/servicios	10 días	mar 30/7/24	mar 13/8/24												
1628	→	Recibido a satisfacción	30 días	mié 14/8/24	mié 25/9/24												
1629	→	<b>Trámite de pago</b>	<b>39 días?</b>	<b>jue 26/9/24</b>	<b>mar 19/11/24</b>												
1630	→	Recepción de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	jue 26/9/24	jue 26/9/24												
1631	→	Aplicación y escogencia de facturas en el Sistema de Compras	1 día?	vie 27/9/24	vie 27/9/24												
1632	→	Generación y firma de trámite de pago	1 día?	lun 30/9/24	lun 30/9/24												
1633	→	Remisión de trámite de pago a la UAF	1 día	mar 1/10/24	mar 1/10/24												
1634	→	Emisión de pago por parte de la UAF	5 días	mié 2/10/24	mar 8/10/24												
1635	→	Pago de Tesorería Nacional	30 días	mié 9/10/24	mar 19/11/24												
1636	→	Fin	0 días	mar 19/11/24	mar 19/11/24												
1637	→	<b>UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (UTI)</b>	<b>239 días?</b>	<b>lun 8/1/24</b>	<b>jue 19/12/24</b>												
1943	→	<b>UNIDAD DE GESTIÓN DE POTENCIAL HUMANO (UGPH)</b>	<b>161 días?</b>	<b>lun 8/1/24</b>	<b>lun 2/9/24</b>												
2066	→	<b>UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES (UPC)</b>	<b>141 días?</b>	<b>lun 3/6/24</b>	<b>jue 19/12/24</b>												
2128	→	<b>SERVICIOS DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL (SPI)</b>	<b>141 días?</b>	<b>lun 8/1/24</b>	<b>jue 1/8/24</b>												
2190	→	<b>UNIDAD DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN (USI)</b>	<b>141 días?</b>	<b>lun 5/2/24</b>	<b>lun 2/9/24</b>												
2252	→	<b>UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION (UTI) UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA (UAF)</b>	<b>141 días?</b>	<b>lun 4/3/24</b>	<b>lun 30/9/24</b>												
2314	→	<b>Capacitación abierta (Art 3 LGCP y Art. 9 RLGCP)</b>	<b>173 días?</b>	<b>lun 8/1/24</b>	<b>mié 18/9/24</b>												
2315	→	<b>UNIDAD DE GESTIÓN DE POTENCIAL HUMANO (UGPH)</b>	<b>95 días?</b>	<b>lun 8/1/24</b>	<b>mar 28/5/24</b>												
2363	→	<b>AUDITORIA INTERNA (AI)</b>	<b>173 días?</b>	<b>lun 8/1/24</b>	<b>mié 18/9/24</b>												
2552	→	<b>Contrato entre entes de derecho público (Art 3 LGCP y Art 5 RLGCP)</b>	<b>63 días</b>	<b>lun 4/12/23</b>	<b>mié 13/3/24</b>												
2553	→	<b>UNIDAD DE SERVICIOS DE PROVEEDURÍA (USP)</b>	<b>63 días</b>	<b>lun 4/12/23</b>	<b>mié 13/3/24</b>												
2577	→	<b>Oferente único (Art 6 RLGCP y Art 3 inciso c. RLGCP)</b>	<b>44 días</b>	<b>lun 8/1/24</b>	<b>jue 7/3/24</b>												
2578	→	<b>DIVISIÓN DE GESTIÓN DE APOYO (GDGA)</b>	<b>44 días</b>	<b>lun 8/1/24</b>	<b>jue 7/3/24</b>												

Proyecto: Cronograma de comp  
Fecha: vie 22/3/24

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			
