Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**CRONOGRAMAS COMPRAS CGR - 2016**	**302,34 días**	**mié 04/11/15**	**mié 08/02/16**	
2		**LICITACIONES PÚBLICAS**	**302,34 días**	**mié 04/11/15**	**mié 08/02/16**	
3		**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**236,48 días**	**mié 04/11/15**	**mar 25/10/16**	
4		**2016LN-000001-503"USG_Sistema de Supresión de incendios (Invitado en enero 2016) ₡89,000.000,00**	**236,48 días**	**mié 04/11/15**	**mar 25/10/16**	
5		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	mié 04/11/15	mié 04/11/15	
6		**Confección Documento complementario al cartel**	**22,95 días**	**mié 04/11/15**	**vie 04/12/15**	
7		Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	mié 04/11/15	mié 11/11/15	5
8		Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	mié 11/11/15	mié 18/11/15	7
9		Revisión Técnica de cartel	7 días	jue 19/11/15	vie 27/11/15	8
10		Incorporación de ajustes y confección de Documento complementario al ca	5 días	lun 30/11/15	vie 04/12/15	9
11		**Invitación a participar**	**33,98 días**	**lun 07/12/15**	**vie 05/02/16**	
12		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo	5 días	lun 07/12/15	lun 14/12/15	10
13		Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	lun 14/12/15	vie 18/12/15	12
14		Invitación a participar en Mer Link	0 días	mié 06/01/16	mié 06/01/16	
15		Plazo para recibir ofertas	22 días	mié 06/01/16	vie 05/02/16	14
16		**Recurso de Objeción al Cartel**	**31,85 días**	**mié 06/01/16**	**vie 19/02/16**	
17		Presentacion de Objeción al cartel	10 días	mié 06/01/16	mar 19/01/16	14CC
18		Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	mié 20/01/16	jue 21/01/16	17
19		La DCA solicita expediente administrativo a la USP y solicita criterio técnico	1 día	jue 21/01/16	vie 22/01/16	18
20		Respuesta con el criterio de la UT a la USP para ser enviado a la DCA	3 días	vie 22/01/16	mié 27/01/16	19
21		Remisión del criterio técnico a la DCA	1 día	mié 27/01/16	jue 28/01/16	20
22		Confeccion de Resolucion a la Objecion	4 días	jue 28/01/16	mié 03/02/16	21
23		Comunicación de Resolucion final por medio de Mer Link	1 día	mié 03/02/16	jue 04/02/16	22
24		Nuevo plazo para recibir ofertas	22 días	mié 20/01/16	vie 19/02/16	17
25		**Recepción y estudio de ofertas**	**22,83 días**	**vie 19/02/16**	**mar 22/03/16**	
26		Apertura de ofertas	1 día	vie 19/02/16	vie 19/02/16	24
27		Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (lega	1 día	lun 22/02/16	lun 22/02/16	26
28		Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respu	5 días	mar 23/02/16	lun 29/02/16	27
29		Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenci	0 días	lun 29/02/16	lun 29/02/16	28
30		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En l	5 días	mar 01/03/16	lun 07/03/16	29
31		Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	lun 07/03/16	lun 07/03/16	30

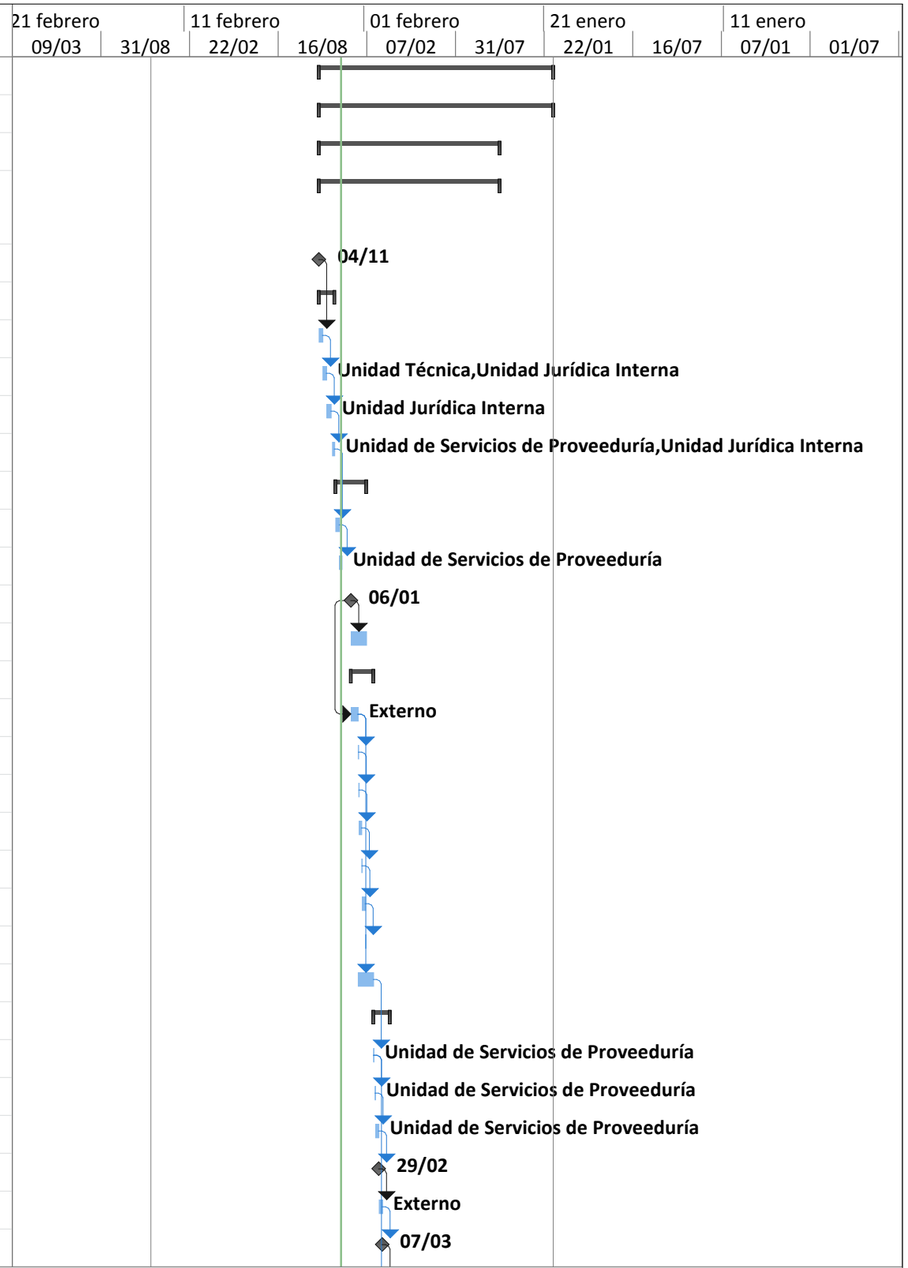

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
32		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mar 08/03/16	jue 10/03/16	31
33		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	vie 11/03/16	mié 16/03/16	32
34		Elaboración de Informe de recomendación (UT)	5 días	mié 16/03/16	mar 22/03/16	33
35		**Proceso de adjudicación**	**44 días**	**lun 22/02/16**	**mié 27/04/16**	
36		Fecha máxima para adjudicar	44 días	lun 22/02/16	mié 27/04/16	26
37		**Recomendación, adjudicación y comunicación**	**15,99 días**	**mié 23/03/16**	**mar 19/04/16**	
38		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mié 23/03/16	mié 30/03/16	34
39		Sesión de la Comision de Adjuducaciones	0,5 días	mié 30/03/16	mié 30/03/16	38
40		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 30/03/16	mié 30/03/16	39
41		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mié 30/03/16	jue 31/03/16	40
42		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicación (Mer Link)	1 día	vie 01/04/16	lun 04/04/16	41
43		Firmeza del acto de adjudicación	10 días	lun 04/04/16	mar 19/04/16	42
44		**Recurso de revocatoria o apelación (DCA)**	**90,58 días**	**lun 04/04/16**	**jue 11/08/16**	
45		Plazo para recibir recurso (Art 174 RLCA)	10 días	lun 04/04/16	lun 18/04/16	42
46		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisib	10 días	mar 19/04/16	mar 03/05/16	45
47		Notificacion al Adjudicatario y a la administración del recurso	1 día	mar 03/05/16	mié 04/05/16	46
48		Plazo para recibir respuesta del adjudicatario y de la administración (Art182	10 días	mié 04/05/16	mié 18/05/16	47
49		Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria	40 días	mié 18/05/16	mié 13/07/16	48
50		Notificacion de la resolución (Mer Link)	1 día	mié 13/07/16	jue 14/07/16	49
51		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	5 días	jue 14/07/16	jue 21/07/16	50
52		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	3 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	51
53		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudic	0,5 días	mié 27/07/16	mié 27/07/16	52
54		Adjudicación en firme	10 días	mié 27/07/16	jue 11/08/16	45,53
55		**Trámite de contrato**	**37 días**	**jue 11/08/16**	**mié 05/10/16**	
56		Elaboración del Contrato	5 días	jue 11/08/16	vie 19/08/16	54
57		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	jue 11/08/16	jue 11/08/16	56CC
58		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía	5 días	jue 11/08/16	vie 19/08/16	57
59		Firma de contrato oferente	1 día	vie 19/08/16	lun 22/08/16	54,58
60		Envío de contrato para firma al Despacho contralor	1 día	lun 22/08/16	mar 23/08/16	59
61		Firma de contrato despacho contralor	5 días	mar 23/08/16	mar 30/08/16	60
62		Envío de contrato a refrendo contralor	0 días	mar 30/08/16	mar 30/08/16	59,61
63		Refrendo del Contrato	25 días	mar 30/08/16	mié 05/10/16	62

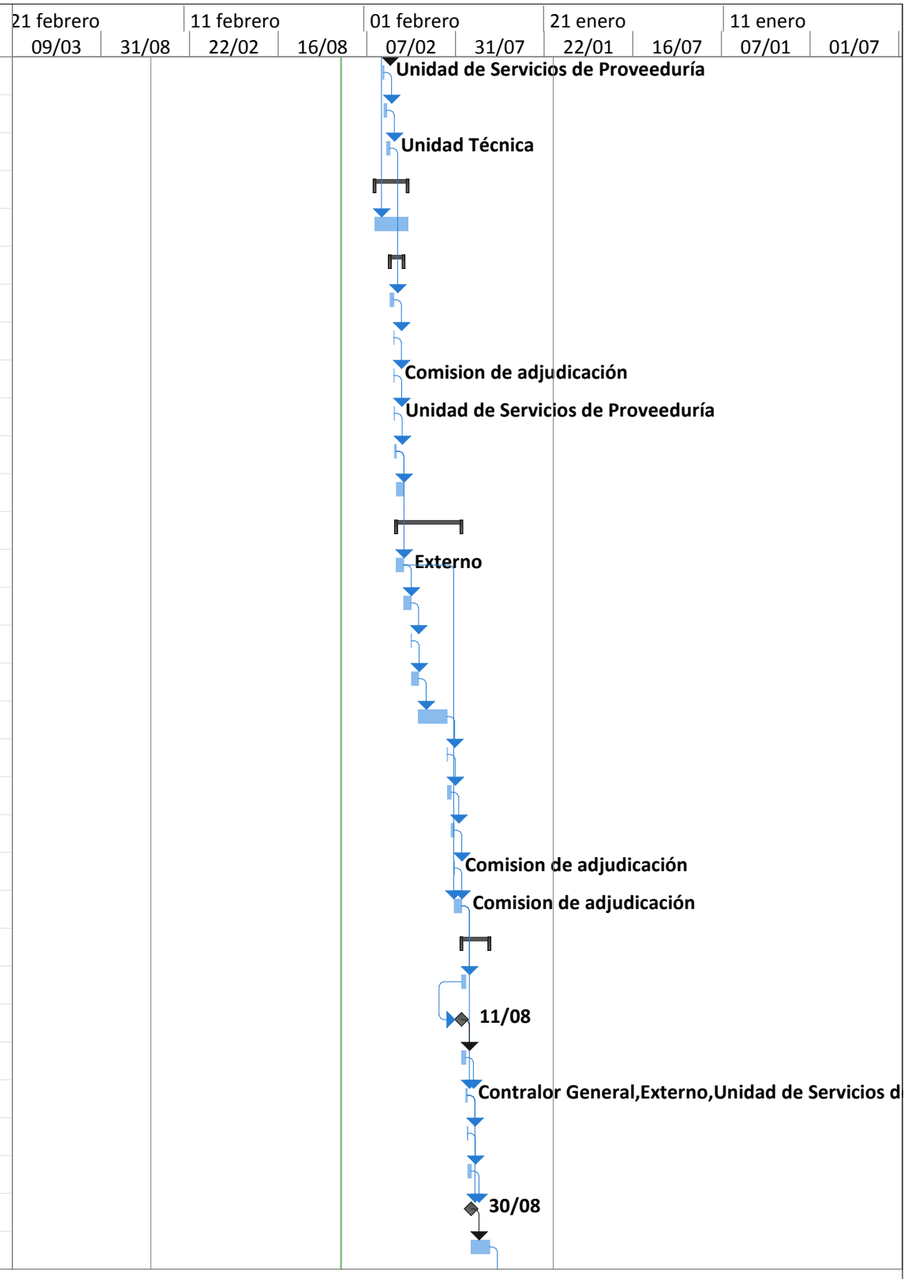

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
64		Comunicación a la (las) empresa del refendo del contrato y orden de inicio	0 días	mié 05/10/16	mié 05/10/16	63
65		**Trámite del Pedido**	**3 días**	**mié 05/10/16**	**lun 10/10/16**	
66		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	mié 05/10/16	vie 07/10/16	64
67		Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	vie 07/10/16	vie 07/10/16	66
68		Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	vie 07/10/16	lun 10/10/16	67
69		Notificación de Pedido de Compra	0 días	lun 10/10/16	lun 10/10/16	68
70		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	lun 10/10/16	lun 10/10/16	69
71		**Recepción de los items**	**3,99 días**	**lun 10/10/16**	**lun 17/10/16**	
72		Entrega items en Almacén	1 día	lun 10/10/16	mar 11/10/16	70
73		Recibido a satisfacción	3 días	mar 11/10/16	lun 17/10/16	72
74		Fin recepción de items	0 días	lun 17/10/16	lun 17/10/16	73
75		**Trámite de pago**	**5,99 días**	**lun 17/10/16**	**mar 25/10/1**	
76		Envio documentos a Financiero	1 día	lun 17/10/16	mar 18/10/16	74
77		Emisión de pago en Financiero	5 días	mar 18/10/16	mar 25/10/16	76
78		Conclusión trámite licitación	0 días	mar 25/10/16	mar 25/10/16	77
79		**UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN**	**234,48 días**	**lun 11/01/16**	**mié 14/12/16**	
80		**2016LN-0000002-503"UTI_Compra de computadoras" ₡153,236.400,00**	**234,48 días**	**lun 11/01/16**	**mié 14/12/16**	
81		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	lun 11/01/16	lun 11/01/16	
82		**Confección Documento complementario al cartel**	**22,95 días**	**lun 11/01/16**	**mié 10/02/16**	
83		Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 11/01/16	lun 18/01/16	81
84		Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	lun 18/01/16	lun 25/01/16	83
85		Revisión Técnica de cartel	7 días	mar 26/01/16	mié 03/02/16	84
86		Incorporación de ajustes y confección de Documento complementario al ca	5 días	jue 04/02/16	mié 10/02/16	85
87		**Invitación a participar**	**32,98 días**	**jue 11/02/16**	**jue 31/03/16**	
88		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo	5 días	jue 11/02/16	jue 18/02/16	86
89		Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	jue 18/02/16	mié 24/02/16	88
90		Invitación a participar en Mer Link	1 día	jue 25/02/16	vie 26/02/16	89
91		Plazo para recibir ofertas	22 días	vie 26/02/16	jue 31/03/16	90
92		**Recurso de Objeción al Cartel**	**31,85 días**	**jue 25/02/16**	**jue 14/04/16**	
93		Presentacion de Objeción al cartel	10 días	jue 25/02/16	mié 09/03/16	90CC
94		Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	jue 10/03/16	vie 11/03/16	93
95		La DCA solicita expediente administrativo a la USP y solicita criterio técnico	1 día	vie 11/03/16	lun 14/03/16	94

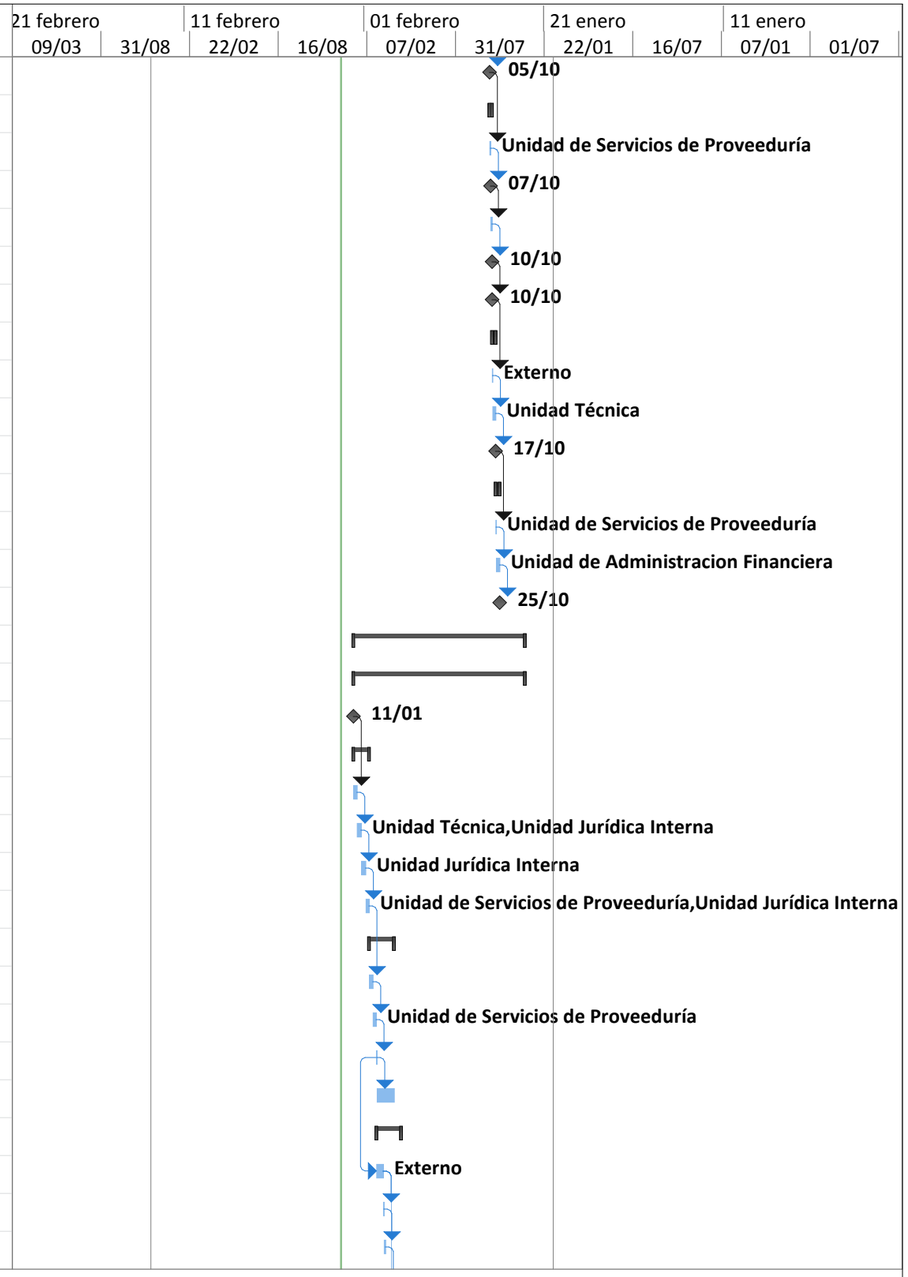

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
96		Respuesta con el criterio de la UT a la USP para ser enviado a la DCA	3 días	lun 14/03/16	jue 17/03/16	95
97		Remisión del criterio técnico a la DCA	1 día	jue 17/03/16	vie 18/03/16	96
98		Confeccion de Resolucion a la Objecion	4 días	vie 18/03/16	lun 28/03/16	97
99		Comunicación de Resolucion final por medio de Mer Link	1 día	lun 28/03/16	mar 29/03/1(	98
100		Nuevo plazo para recibir ofertas	22 días	jue 10/03/16	jue 14/04/16	93
101		**Recepción y estudio de ofertas**	**22,83 días**	**jue 14/04/16**	**lun 16/05/16**	
102		Apertura de ofertas	1 día	jue 14/04/16	jue 14/04/16	100
103		Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (lega	1 día	vie 15/04/16	vie 15/04/16	102
104		Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respu	5 días	lun 18/04/16	vie 22/04/16	103
105		Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenci	0 días	vie 22/04/16	vie 22/04/16	104
106		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En l	5 días	lun 25/04/16	vie 29/04/16	105
107		Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	vie 29/04/16	vie 29/04/16	106
108		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	lun 02/05/16	mié 04/05/1(	107
109		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	jue 05/05/16	mar 10/05/1(	108
110		Elaboración de Informe de recomendación (UT)	5 días	mar 10/05/1(	lun 16/05/16	109
111		**Proceso de adjudicación**	**44 días**	**vie 15/04/16**	**jue 16/06/16**	
112		Fecha máxima para adjudicar	44 días	vie 15/04/16	jue 16/06/16	102
113		**Recomendación, adjudicación y comunicación**	**15,99 días**	**mar 17/05/1**	**mié 08/06/1(**	
114		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mar 17/05/1(	vie 20/05/16	110
115		Sesión de la Comision de Adjuducaciones	0,5 días	vie 20/05/16	vie 20/05/16	114
116		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	vie 20/05/16	vie 20/05/16	115
117		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	vie 20/05/16	lun 23/05/16	116
118		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicación (Mer Link)	1 día	mar 24/05/1(	mié 25/05/1(	117
119		Firmeza del acto de adjudicación	10 días	mié 25/05/1(	mié 08/06/1(	118
120		**Recurso de revocatoria o apelación (DCA)**	**90,58 días**	**mié 25/05/1(**	**mar 04/10/1**	
121		Plazo para recibir recurso (Art 174 RLCA)	10 días	mié 25/05/1(	mar 07/06/1(	118
122		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisib	10 días	mié 08/06/1(	mié 22/06/1(	121
123		Notificacion al Adjudicatario y a la administración del recurso	1 día	mié 22/06/1(	jue 23/06/16	122
124		Plazo para recibir respuesta del adjudicatario y de la administración (Art182	10 días	jue 23/06/16	jue 07/07/16	123
125		Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria	40 días	jue 07/07/16	mar 06/09/1(	124
126		Notificacion de la resolución (Mer Link)	1 día	mar 06/09/1(	mié 07/09/1(	125
127		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	5 días	mié 07/09/1(	mié 14/09/1(	126

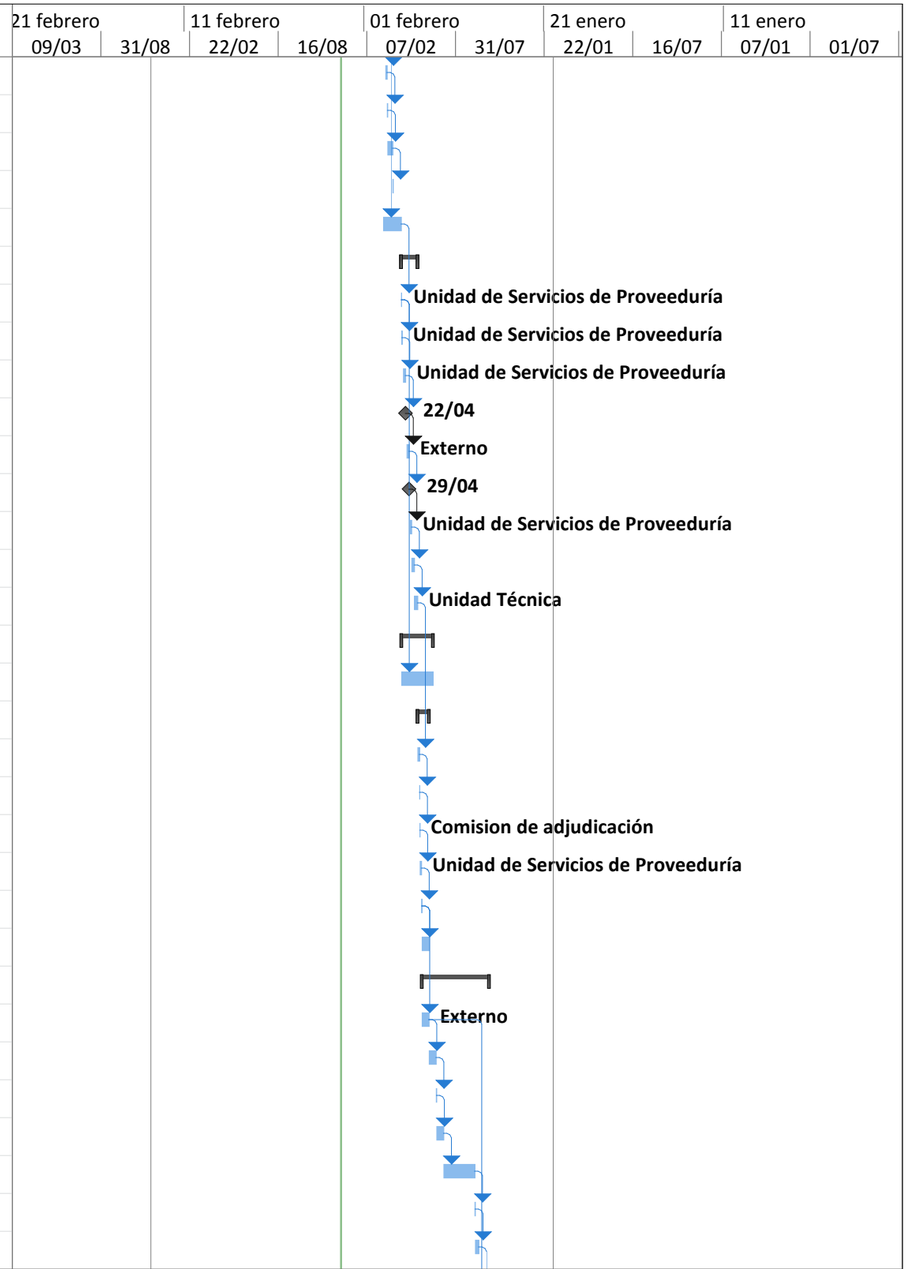

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
128		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	3 días	mié 14/09/16	mar 20/09/16	127
129		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudic	0,5 días	mar 20/09/16	mar 20/09/16	128
130		Adjudicación en firme	10 días	mar 20/09/16	mar 04/10/16	121,129
131		**Trámite de contrato**	**37 días**	**mar 04/10/16**	**vie 25/11/16**	
132		Elaboración del Contrato	5 días	mar 04/10/16	mar 11/10/16	130
133		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	mar 04/10/16	mar 04/10/16	132CC
134		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía	5 días	mar 04/10/16	mar 11/10/16	133
135		Firma de contrato oferente	1 día	mar 11/10/16	jue 13/10/16	130,134
136		Envío de contrato para firma al Despacho contralor	1 día	jue 13/10/16	vie 14/10/16	135
137		Firma de contrato despacho contralor	5 días	vie 14/10/16	vie 21/10/16	136
138		Envío de contrato a refrendo contralor	0 días	vie 21/10/16	vie 21/10/16	135,137
139		Refrendo del Contrato	25 días	vie 21/10/16	vie 25/11/16	138
140		Comunicación a la (las) empresa del refendo del contrato y orden de inicio	0 días	vie 25/11/16	vie 25/11/16	139
141		**Trámite del Pedido**	**3 días**	**vie 25/11/16**	**mié 30/11/16**	
142		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	vie 25/11/16	mar 29/11/16	140
143		Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	mar 29/11/16	mar 29/11/16	142
144		Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	mar 29/11/16	mié 30/11/16	143
145		Notificación de Pedido de Compra	0 días	mié 30/11/16	mié 30/11/16	144
146		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mié 30/11/16	mié 30/11/16	145
147		**Recepción de los items**	**3,99 días**	**mié 30/11/16**	**mar 06/12/16**	
148		Entrega items en Almacén	1 día	mié 30/11/16	jue 01/12/16	146
149		Recibido a satisfacción	3 días	jue 01/12/16	mar 06/12/16	148
150		Fin recepción de items	0 días	mar 06/12/16	mar 06/12/16	149
151		**Trámite de pago**	**5,99 días**	**mar 06/12/16**	**mié 14/12/16**	
152		Envio documentos a Financiero	1 día	mar 06/12/16	mié 07/12/16	150
153		Emisión de pago en Financiero	5 días	mié 07/12/16	mié 14/12/16	152
154		Conclusión trámite licitación	0 días	mié 14/12/16	mié 14/12/16	153
155		**SERVICIOS DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL**	**234,48 días**	**lun 22/02/16**	**mié 08/02/17**	
156		**2016LN-0000003-503"SPI_Compra de Suministros ₡Cuantía inestimable**	**234,48 días**	**lun 22/02/16**	**mié 08/02/17**	
157		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	lun 22/02/16	lun 22/02/16	
158		**Confección Documento complementario al cartel**	**22,95 días**	**lun 22/02/16**	**mié 23/03/16**	
159		Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 22/02/16	lun 29/02/16	157

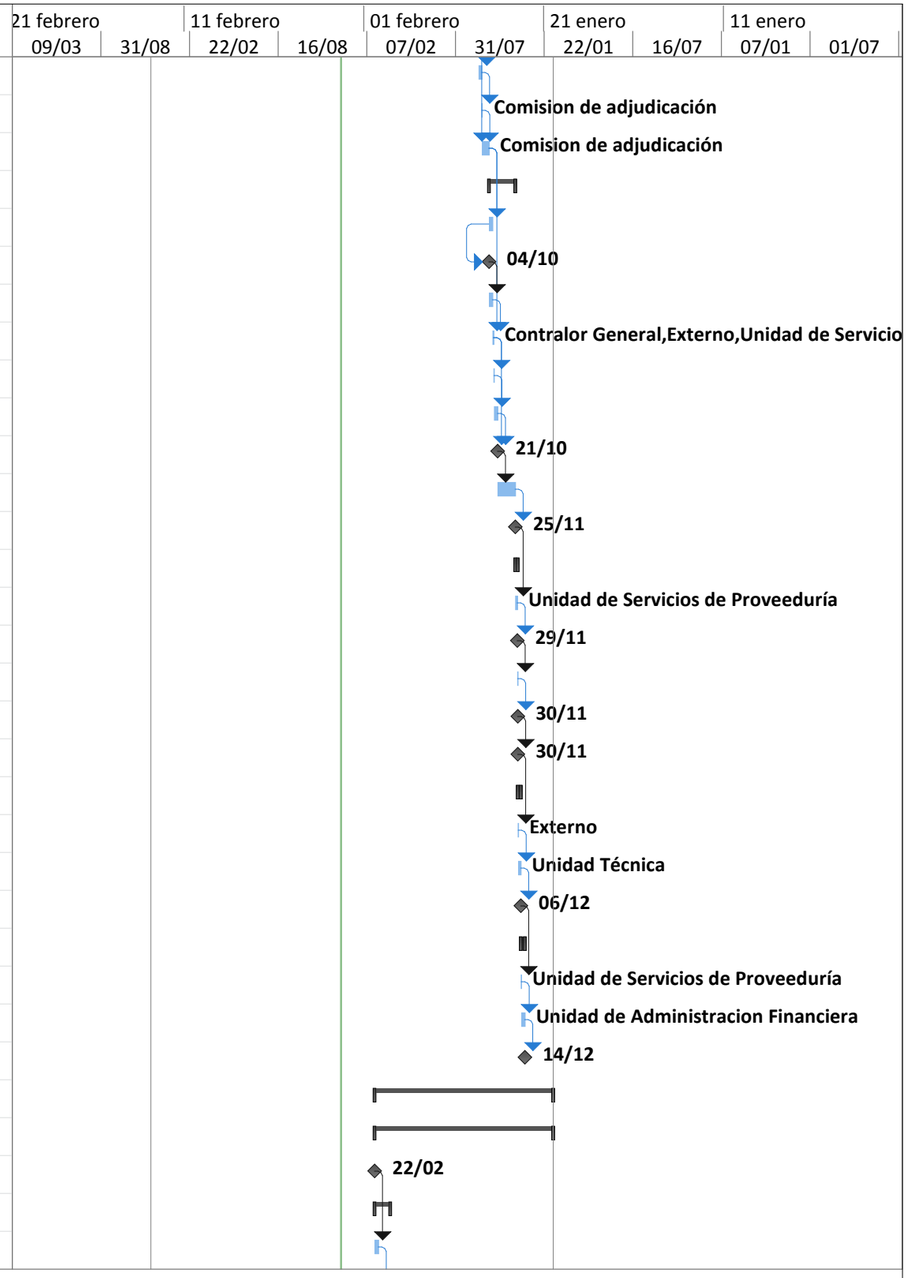

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
160		Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	lun 29/02/16	lun 07/03/16	159
161		Revisión Técnica de cartel	7 días	mar 08/03/1	mié 16/03/16	160
162		Incorporación de ajustes y confección de Documento complementario al ca	5 días	jue 17/03/16	mié 23/03/16	161
163		**Invitación a participar**	**42,98 días**	**lun 28/03/16**	**vie 27/05/16**	
164		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo	5 días	lun 28/03/16	lun 04/04/16	162
165		Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	lun 04/04/16	vie 08/04/16	164
166		Invitación a participar en Mer Link	1 día	mar 12/04/1	mié 13/04/16	165
167		Plazo para recibir ofertas	32 días	mié 13/04/16	vie 27/05/16	166
168		**Recurso de Objeción al Cartel**	**31,85 días**	**mar 12/04/1**	**jue 26/05/16**	
169		Presentacion de Objeción al cartel	10 días	mar 12/04/1	lun 25/04/16	166CC
170		Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	mar 26/04/1	mié 27/04/16	169
171		La DCA solicita expediente administrativo a la USP y solicita criterio técnico	1 día	mié 27/04/16	jue 28/04/16	170
172		Respuesta con el criterio de la UT a la USP para ser enviado a la DCA	3 días	jue 28/04/16	mar 03/05/1	171
173		Remisión del criterio técnico a la DCA	1 día	mar 03/05/1	mié 04/05/16	172
174		Confeccion de Resolucion a la Objecion	4 días	mié 04/05/16	mar 10/05/1	173
175		Comunicación de Resolucion final por medio de Mer Link	1 día	mar 10/05/1	mié 11/05/16	174
176		Nuevo plazo para recibir ofertas	22 días	mar 26/04/1	jue 26/05/16	169
177		**Recepción y estudio de ofertas**	**22,83 días**	**jue 26/05/16**	**lun 27/06/16**	
178		Apertura de ofertas	1 día	jue 26/05/16	jue 26/05/16	176
179		Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (lega	1 día	vie 27/05/16	vie 27/05/16	178
180		Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respu	5 días	lun 30/05/16	vie 03/06/16	179
181		Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenci	0 días	vie 03/06/16	vie 03/06/16	180
182		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En l	5 días	lun 06/06/16	vie 10/06/16	181
183		Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	vie 10/06/16	vie 10/06/16	182
184		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	lun 13/06/16	mié 15/06/16	183
185		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	jue 16/06/16	mar 21/06/1	184
186		Elaboración de Informe de recomendación (UT)	5 días	mar 21/06/1	lun 27/06/16	185
187		**Proceso de adjudicación**	**64 días**	**vie 27/05/16**	**mar 30/08/1**	
188		Fecha máxima para adjudicar	64 días	vie 27/05/16	mar 30/08/1	178
189		**Recomendación, adjudicación y comunicación**	**15,99 días**	**mar 28/06/1**	**mié 20/07/1**	
190		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mar 28/06/1	vie 01/07/16	186
191		Sesión de la Comision de Adjuducaciones	0,5 días	vie 01/07/16	vie 01/07/16	190

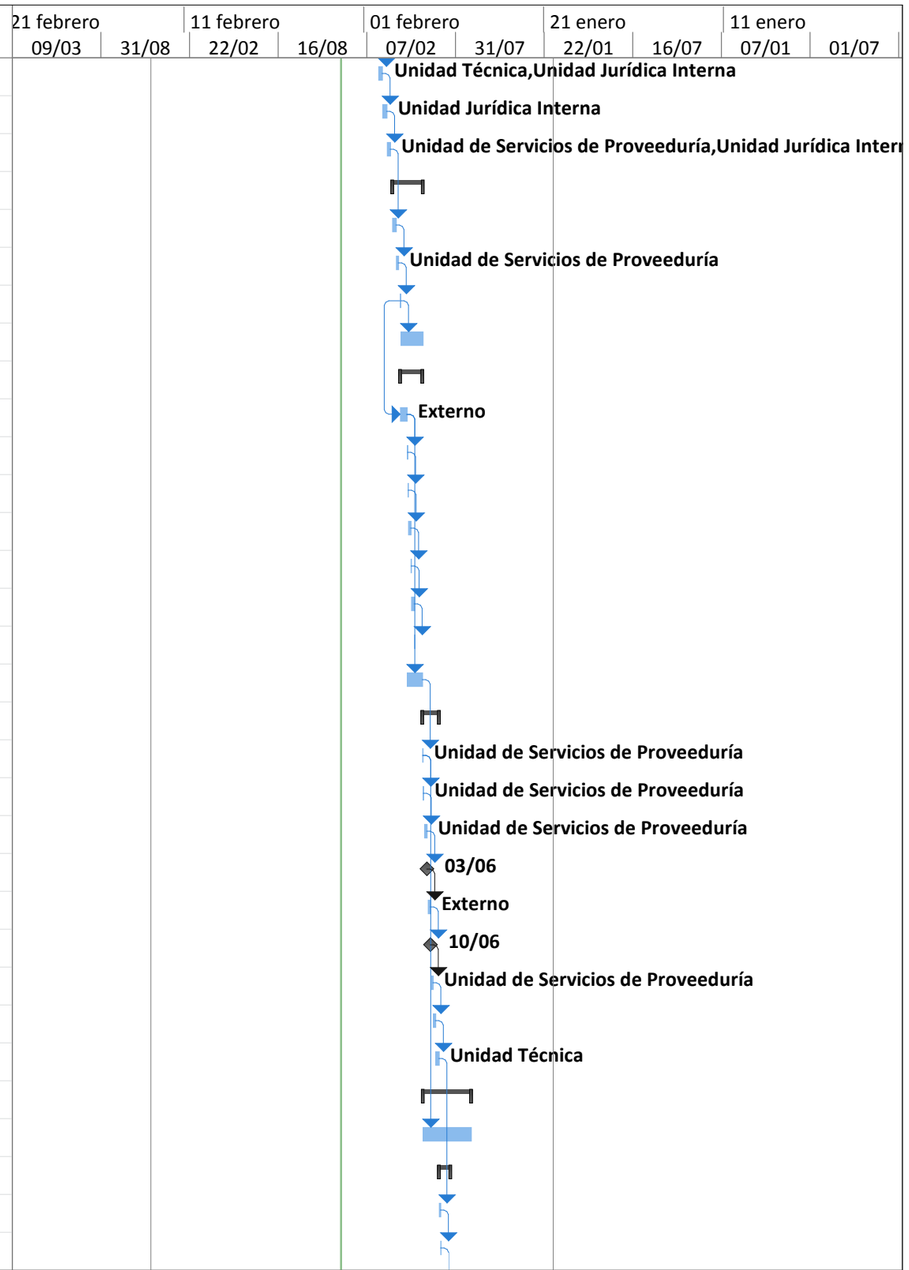

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
192		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	vie 01/07/16	vie 01/07/16	191
193		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	vie 01/07/16	lun 04/07/16	192
194		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicación (Mer Link)	1 día	mar 05/07/1	mié 06/07/1	193
195		Firmeza del acto de adjudicación	10 días	mié 06/07/1	mié 20/07/1	194
196		**Recurso de revocatoria o apelación (DCA)**	**90,58 días**	**mié 06/07/1**	**mié 16/11/1**	
197		Plazo para recibir recurso (Art 174 RLCA)	10 días	mié 06/07/1	mar 19/07/1	194
198		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisib	10 días	mié 20/07/1	vie 05/08/16	197
199		Notificacion al Adjudicatario y a la administración del recurso	1 día	vie 05/08/16	lun 08/08/16	198
200		Plazo para recibir respuesta del adjudicatario y de la administración (Art182	10 días	lun 08/08/16	mar 23/08/1	199
201		Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria	40 días	mar 23/08/1	jue 20/10/16	200
202		Notificacion de la resolución (Mer Link)	1 día	jue 20/10/16	vie 21/10/16	201
203		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	5 días	vie 21/10/16	vie 28/10/16	202
204		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	3 días	vie 28/10/16	mié 02/11/1	203
205		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudic	0,5 días	mié 02/11/1	mié 02/11/1	204
206		Adjudicación en firme	10 días	mié 02/11/1	mié 16/11/1	197,205
207		**Trámite de contrato**	**37 días**	**mié 16/11/1**	**vie 20/01/17**	
208		Elaboración del Contrato	5 días	mié 16/11/1	mié 23/11/1	206
209		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	mié 16/11/1	mié 16/11/1	208CC
210		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía	5 días	mié 16/11/1	mié 23/11/1	209
211		Firma de contrato oferente	1 día	mié 23/11/1	jue 24/11/16	206,210
212		Envío de contrato para firma al Despacho contralor	1 día	jue 24/11/16	vie 25/11/16	211
213		Firma de contrato despacho contralor	5 días	vie 25/11/16	vie 02/12/16	212
214		Envío de contrato a refrendo contralor	0 días	vie 02/12/16	vie 02/12/16	211,213
215		Refrendo del Contrato	25 días	vie 02/12/16	vie 20/01/17	214
216		Comunicación a la (las) empresa del refendo del contrato y orden de inicio	0 días	vie 20/01/17	vie 20/01/17	215
217		**Trámite del Pedido**	**3 días**	**vie 20/01/17**	**mié 25/01/1**	
218		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	vie 20/01/17	mar 24/01/1	216
219		Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	mar 24/01/1	mar 24/01/1	218
220		Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	mar 24/01/1	mié 25/01/1	219
221		Notificación de Pedido de Compra	0 días	mié 25/01/1	mié 25/01/1	220
222		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mié 25/01/1	mié 25/01/1	221
223		**Recepción de los items**	**3,99 días**	**mié 25/01/1**	**mar 31/01/1**	

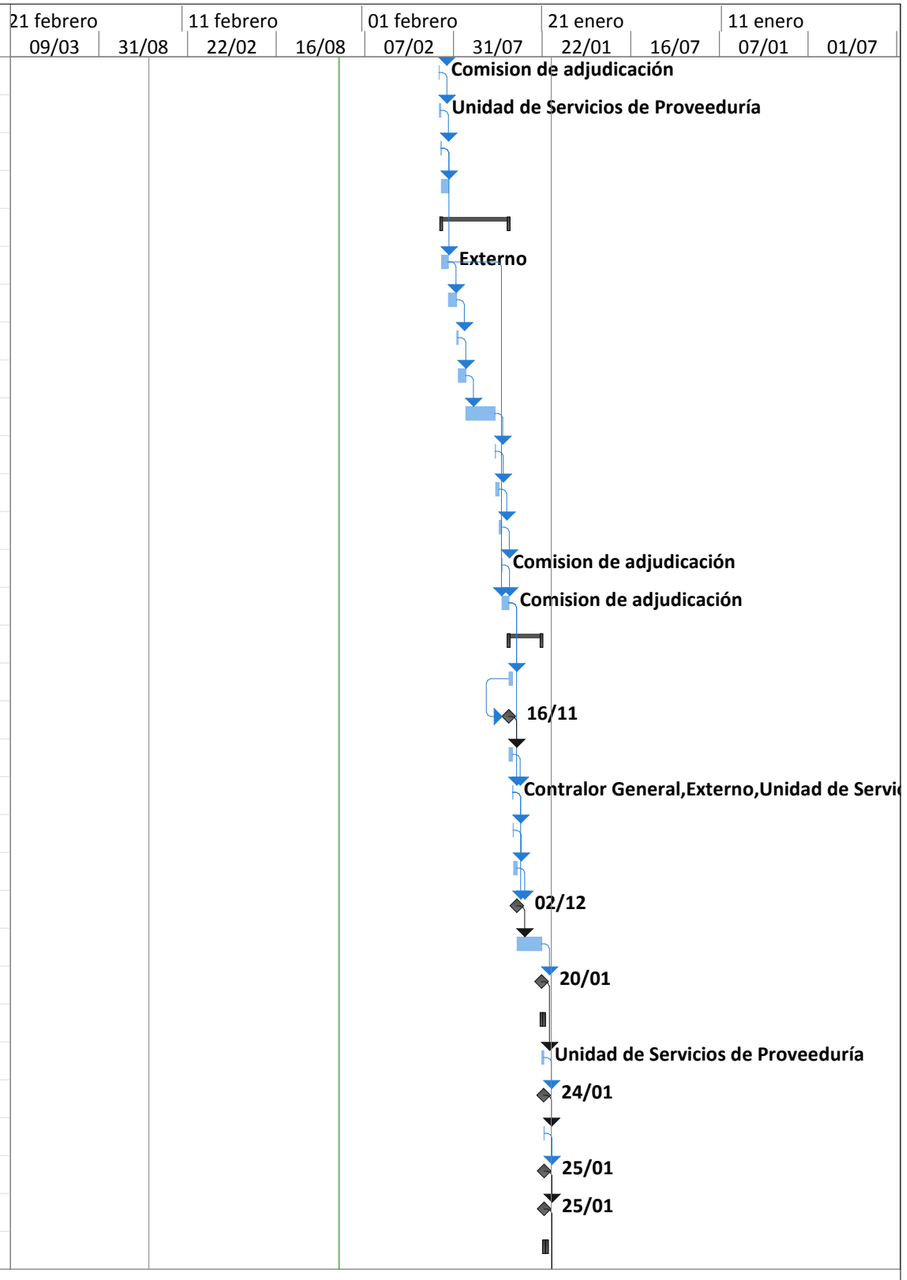

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
224		Entrega items en Almacén	1 día	mié 25/01/17	jue 26/01/17	222
225		Recibido a satisfacción	3 días	jue 26/01/17	mar 31/01/17	224
226		Fin recepción de items	0 días	mar 31/01/17	mar 31/01/17	225
227		**Trámite de pago**	**5,99 días**	**mar 31/01/1**	**mié 08/02/17**	
228		Envio documentos a Financiero	1 día	mar 31/01/17	mié 01/02/17	226
229		Emisión de pago en Financiero	5 días	mié 01/02/17	mié 08/02/17	228
230		Conclusión trámite licitación	0 días	mié 08/02/17	mié 08/02/17	229
231		**LICITACIONES ABREVIADAS**	**256,05 días**	**jue 12/11/15**	**mié 30/11/16**	
232		**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**216,13 días**	**jue 12/11/15**	**mar 04/10/1**	
233		**2016LA-000001-503 USG_ Limpieza de Ventanales ₡12,000.000,00**	**148,28 días**	**mié 25/11/15**	**jue 07/07/16**	
234		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	mié 25/11/15	mié 25/11/15	
235		**Confección Documento complementario al cartel**	**22,95 días**	**mié 25/11/15**	**vie 08/01/16**	
236		Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	mié 25/11/15	mié 02/12/15	234
237		Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	mié 02/12/15	mié 09/12/15	236
238		Revisión Técnica de cartel	7 días	jue 10/12/15	vie 18/12/15	237
239		Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al ca	5 días	lun 04/01/16	vie 08/01/16	238
240		**Invitación a participar**	**27,98 días**	**lun 11/01/16**	**jue 18/02/16**	
241		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo c	5 días	lun 11/01/16	lun 18/01/16	239
242		Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	lun 18/01/16	lun 25/01/16	241
243		Invitación a participar en Mer Link	1 día	lun 25/01/16	lun 25/01/16	242
244		Plazo para recibir ofertas	17 días	mar 26/01/16	jue 18/02/16	243
245		**Recurso de Objeción al Cartel**	**16,86 días**	**mar 26/01/1**	**jue 18/02/16**	
246		Presentacion de Objeción al cartel	5 días	mar 26/01/16	lun 01/02/16	243
247		Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	mar 02/02/16	mié 03/02/16	246
248		Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	mié 03/02/16	jue 04/02/16	247
249		Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	jue 04/02/16	jue 11/02/16	248
250		Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	jue 11/02/16	mié 17/02/16	249
251		Comunicación de Resolución final	1 día	mié 17/02/16	jue 18/02/16	250
252		Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	mar 02/02/16	jue 18/02/16	246
253		**Recepción y estudio de ofertas**	**32,82 días**	**jue 18/02/16**	**jue 07/04/16**	
254		Apertura de ofertas	1 día	jue 18/02/16	jue 18/02/16	252
255		Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (lega	1 día	vie 19/02/16	vie 19/02/16	254

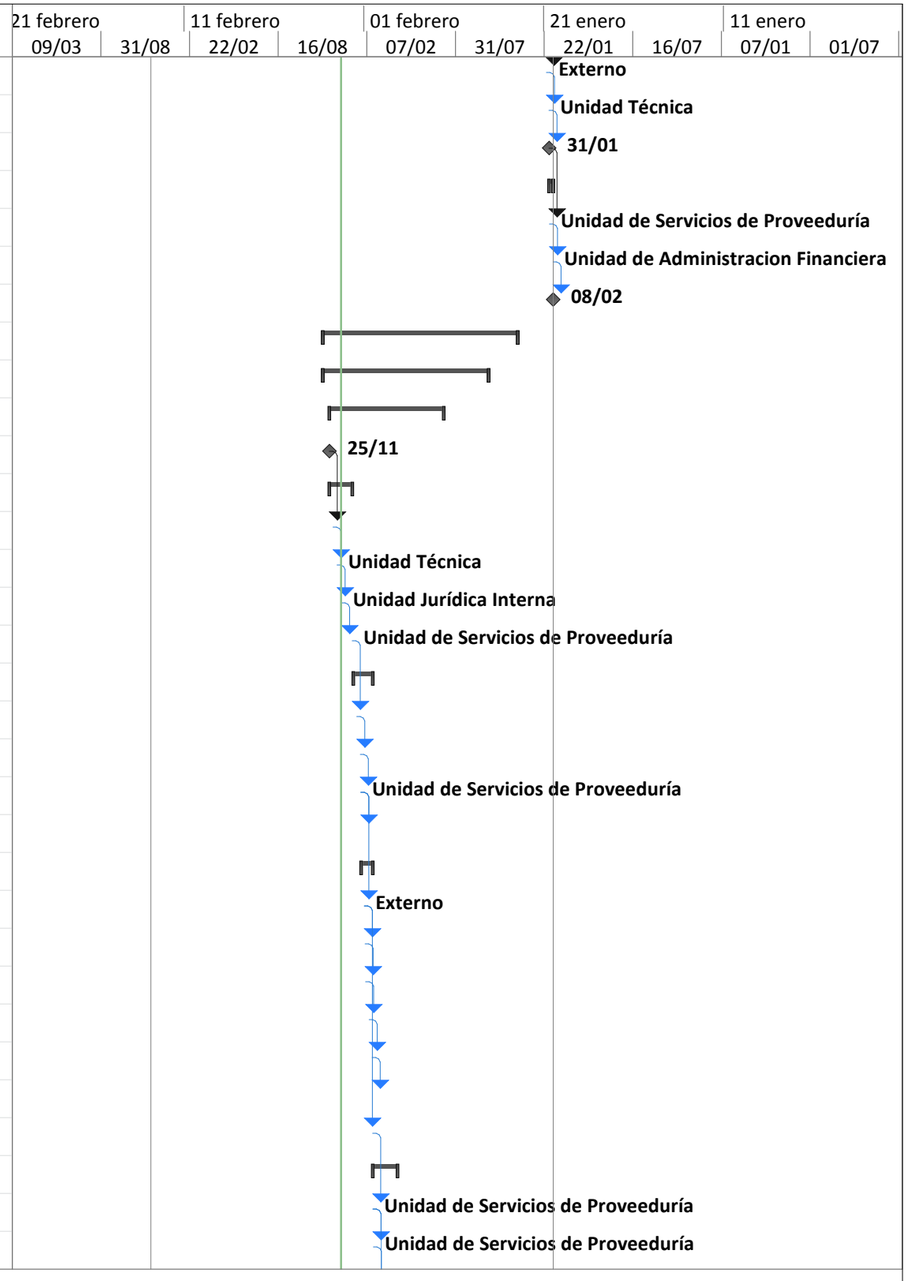

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
256		Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respu	13 días	lun 22/02/16	mié 09/03/16	255
257		Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado e	1 día	jue 10/03/16	jue 10/03/16	256
258		Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenci	1 día	vie 11/03/16	lun 14/03/16	257
259		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En l	5 días	lun 14/03/16	vie 18/03/16	258
260		Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	vie 18/03/16	vie 18/03/16	259
261		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	lun 21/03/16	mié 23/03/16	260
262		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	lun 28/03/16	jue 31/03/16	261
263		Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	jue 31/03/16	jue 31/03/16	262
264		Elaboración de Informe de recomendación	5 días	jue 31/03/16	jue 07/04/16	263
265		**Proceso de adjudicación**	**34 días**	**vie 19/02/16**	**mar 12/04/1**	
266		Fecha máxima para adjudicar	34 días	vie 19/02/16	mar 12/04/16	254
267		**Recomendación, adjudicación y comunicación**	**10,92 días**	**mar 12/04/1**	**mié 27/04/1**	
268		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mar 12/04/1	vie 15/04/16	266
269		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	vie 15/04/16	vie 15/04/16	268
270		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	vie 15/04/16	vie 15/04/16	269
271		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	vie 15/04/16	lun 18/04/16	270
272		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	mar 19/04/1	mié 20/04/16	271
273		Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	mié 20/04/16	mié 27/04/16	272
274		**Recurso de revocatoria**	**35,8 días**	**mié 20/04/1**	**mié 08/06/1**	
275		Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	mié 20/04/16	mar 26/04/1	272
276		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisib	2 días	mié 27/04/16	vie 29/04/16	275
277		Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	vie 29/04/16	vie 29/04/16	276
278		Plazo para recibir respuesta del adjuducatario (Art N°186 RLCA)	3 días	vie 29/04/16	mié 04/05/16	277
279		Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Art N°187 RLCA)	15 días	mié 04/05/16	mié 25/05/16	278
280		Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	mié 25/05/16	mié 25/05/16	279
281		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	5 días	mié 25/05/16	mié 01/06/16	280
282		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mié 01/06/16	mié 01/06/16	281
283		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudic	0,5 días	mié 01/06/16	mié 01/06/16	282
284		Adjudicación en firme	5 días	mié 01/06/16	mié 08/06/16	275,283
285		**Trámite de contrato**	**16 días**	**mié 01/06/1**	**jue 23/06/16**	
286		Elaboración del Contrato	5 días	mié 01/06/16	mié 08/06/16	282
287		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	mié 01/06/16	mié 01/06/16	286CC

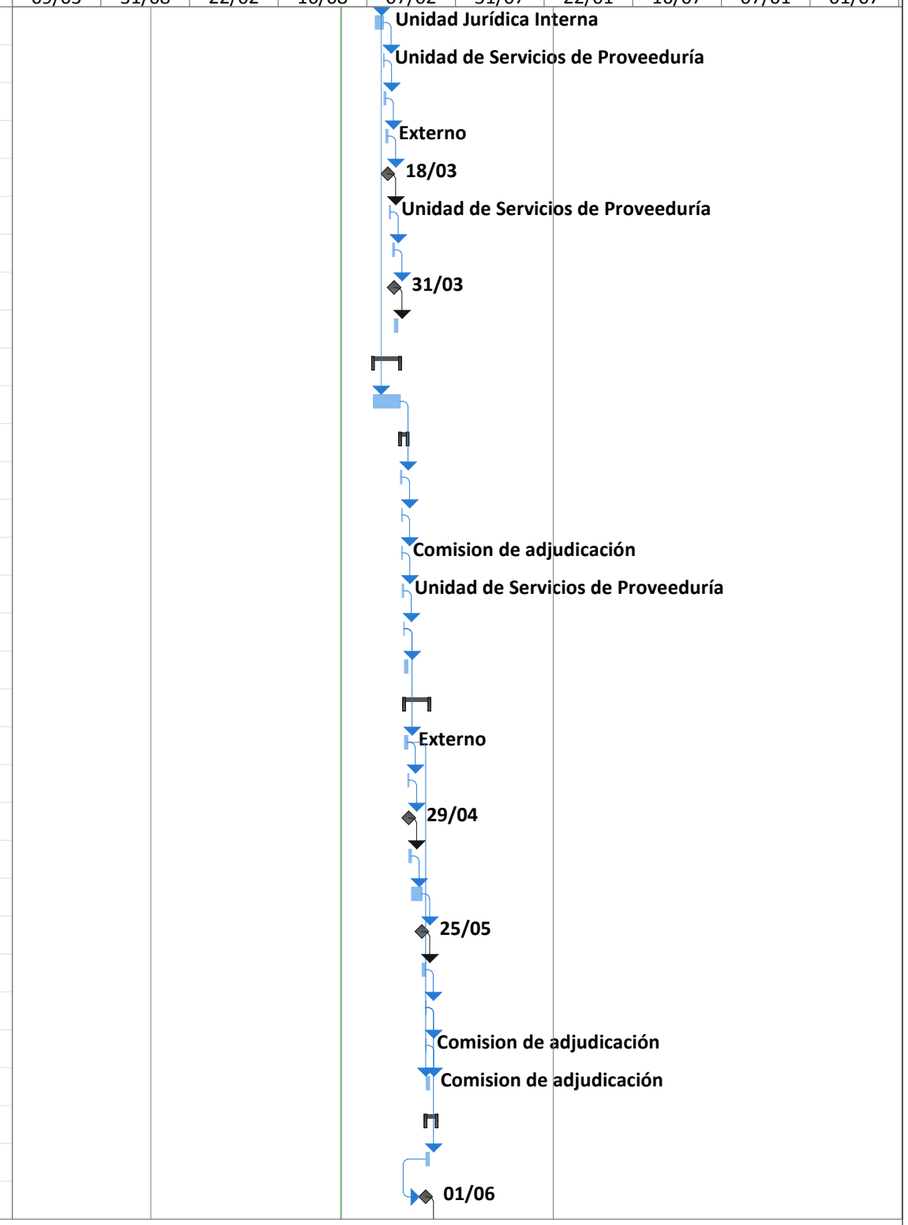

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
288		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía	5 días	mié 01/06/16	mié 08/06/16	287
289		Firma de contrato oferente	1 día	mié 08/06/16	jue 09/06/16	288
290		Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	0 días	jue 09/06/16	jue 09/06/16	289
291		Firma de contrato Despacho Contralor	5 días	jue 09/06/16	jue 16/06/16	290
292		Envío de contrato a aprobación interna	0 días	jue 16/06/16	jue 16/06/16	289,291
293		Aprobacion Interna de Contrato	5 días	jue 16/06/16	jue 23/06/16	292
294		Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	jue 23/06/16	jue 23/06/16	293
295		**Trámite del Pedido**	**3 días**	**jue 23/06/16**	**mar 28/06/1**	
296		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	jue 23/06/16	lun 27/06/16	293
297		Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	lun 27/06/16	lun 27/06/16	296
298		Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	lun 27/06/16	mar 28/06/1	297
299		Notificación de Pedido de Compra	0 días	mar 28/06/1	mar 28/06/1	297,298
300		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mar 28/06/1	mar 28/06/1	299
301		**Recepción de los items**	**3,99 días**	**jue 23/06/16**	**mié 29/06/1**	
302		Entrega items en Almacén	1 día	jue 23/06/16	vie 24/06/16	293
303		Recibido a satisfacción	3 días	vie 24/06/16	mié 29/06/16	302
304		Fin recepción de items	0 días	mié 29/06/16	mié 29/06/16	303
305		**Trámite de pago**	**5,99 días**	**mié 29/06/1**	**jue 07/07/16**	
306		Envio documentos a Financiero	1 día	mié 29/06/16	jue 30/06/16	304
307		Emisión de pago en Financiero	5 días	jue 30/06/16	jue 07/07/16	306
308		Conclusión trámite licitación	0 días	jue 07/07/16	jue 07/07/16	307
309		**2016LA-0000002-503 USG_ Mantenimiento del sistema contra incendios (Invitado el 12 de enero 2016)" ₡20,000.000,00**	**148,28 días**	**jue 12/11/15**	**vie 24/06/16**	
310		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	jue 12/11/15	jue 12/11/15	
311		**Confección Documento complementario al cartel**	**22,95 días**	**jue 12/11/15**	**lun 14/12/15**	
312		Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	jue 12/11/15	jue 19/11/15	310
313		Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	jue 19/11/15	jue 26/11/15	312
314		Revisión Técnica de cartel	7 días	vie 27/11/15	lun 07/12/15	313
315		Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al ca	5 días	mar 08/12/15	lun 14/12/15	314
316		**Invitación a participar**	**27,98 días**	**mar 15/12/1**	**vie 05/02/16**	
317		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo de Mer Link	5 días	mar 15/12/15	mar 05/01/16	315

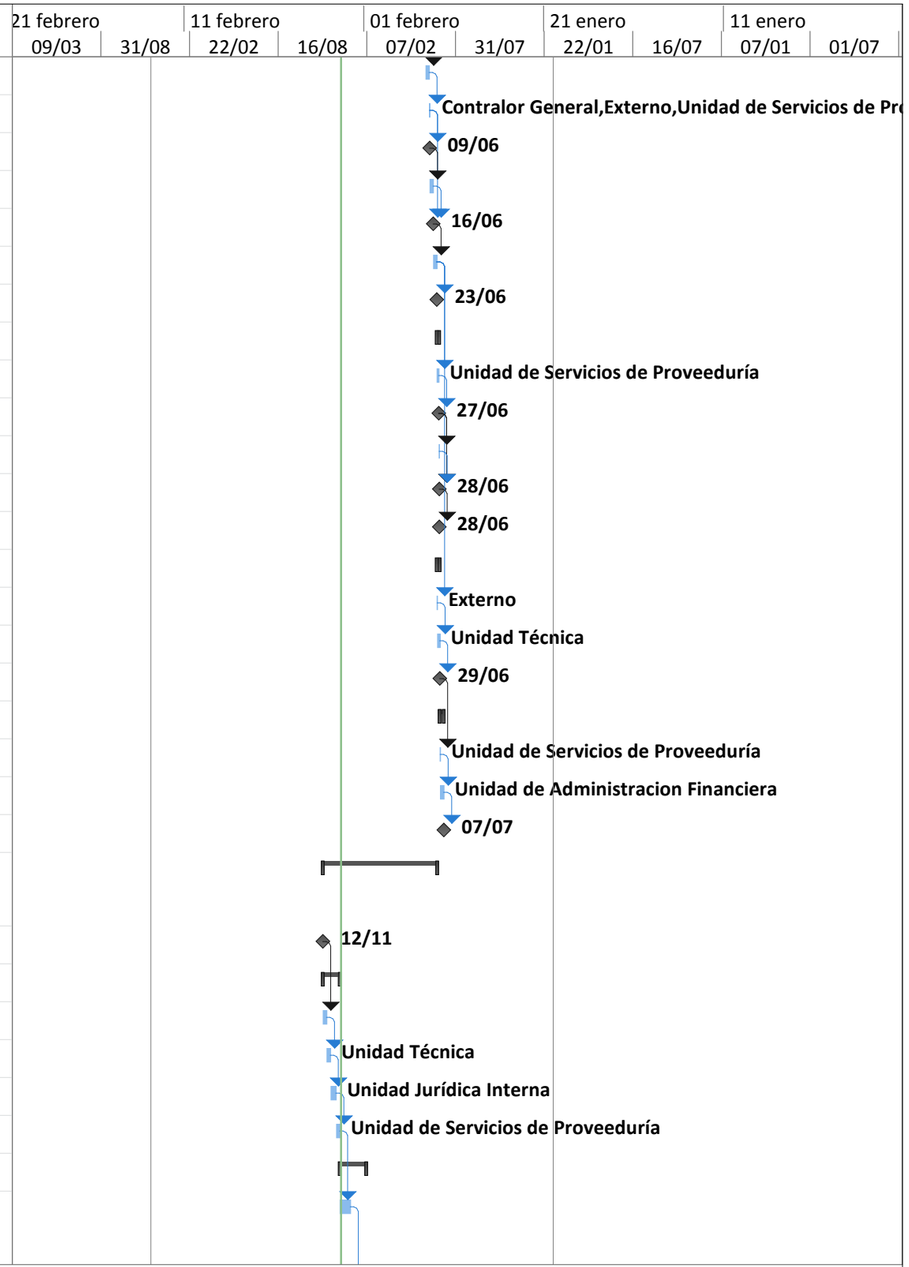

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
318		Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	mar 05/01/16	mar 12/01/16	317
319		Invitación a participar en Mer Link	1 día	mar 12/01/16	mar 12/01/16	318
320		Plazo para recibir ofertas	17 días	mié 13/01/16	vie 05/02/16	319
321		**Recurso de Objeción al Cartel**	**16,86 días**	**mié 13/01/16**	**vie 05/02/16**	
322		Presentacion de Objeción al cartel	5 días	mié 13/01/16	mar 19/01/16	319
323		Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	mié 20/01/16	jue 21/01/16	322
324		Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	jue 21/01/16	vie 22/01/16	323
325		Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	vie 22/01/16	vie 29/01/16	324
326		Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	vie 29/01/16	jue 04/02/16	325
327		Comunicación de Resolución final	1 día	jue 04/02/16	vie 05/02/16	326
328		Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	mié 20/01/16	vie 05/02/16	322
329		**Recepción y estudio de ofertas**	**32,82 días**	**vie 05/02/16**	**mié 23/03/16**	
330		Apertura de ofertas	1 día	vie 05/02/16	vie 05/02/16	328
331		Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (lega	1 día	lun 08/02/16	lun 08/02/16	330
332		Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respu	13 días	mar 09/02/16	jue 25/02/16	331
333		Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado e	1 día	vie 26/02/16	vie 26/02/16	332
334		Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenci	1 día	lun 29/02/16	mar 01/03/16	333
335		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En l	5 días	mar 01/03/16	lun 07/03/16	334
336		Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	lun 07/03/16	lun 07/03/16	335
337		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mar 08/03/16	jue 10/03/16	336
338		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	vie 11/03/16	mié 16/03/16	337
339		Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	mié 16/03/16	mié 16/03/16	338
340		Elaboración de Informe de recomendación	5 días	mié 16/03/16	mié 23/03/16	339
341		**Proceso de adjudicación**	**34 días**	**lun 08/02/16**	**mar 29/03/1**	
342		Fecha máxima para adjudicar	34 días	lun 08/02/16	mar 29/03/16	330
343		**Recomendación, adjudicación y comunicación**	**10,92 días**	**mar 29/03/1**	**jue 14/04/16**	
344		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mar 29/03/16	vie 01/04/16	342
345		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	vie 01/04/16	vie 01/04/16	344
346		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	vie 01/04/16	vie 01/04/16	345
347		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	vie 01/04/16	lun 04/04/16	346
348		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	mar 05/04/16	mié 06/04/16	347
349		Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	mié 06/04/16	jue 14/04/16	348

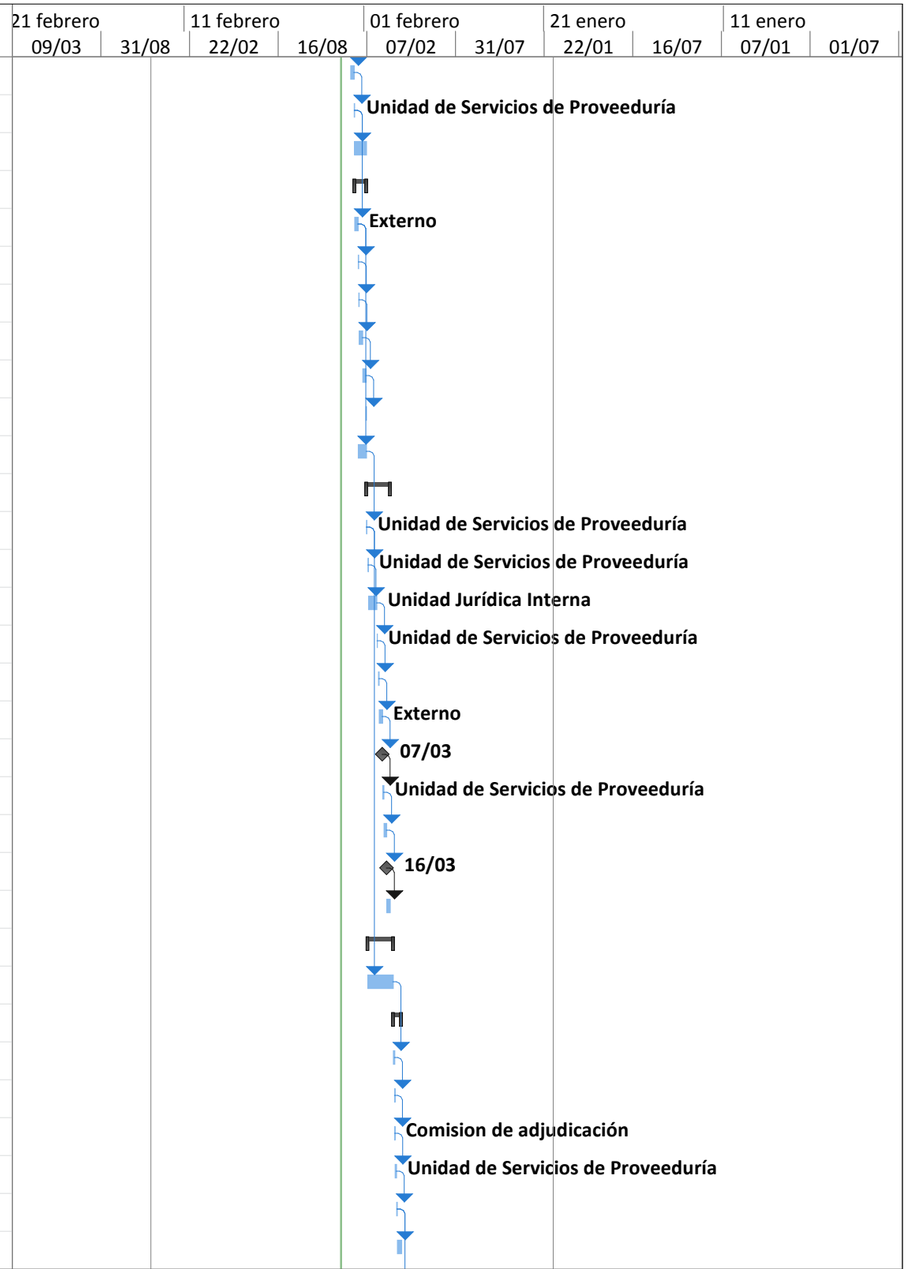

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
350		**Recurso de revocatoria**	**35,8 días**	**mié 06/04/1**	**jue 26/05/16**	
351		Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	mié 06/04/1	mié 13/04/1	348
352		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisib	2 días	jue 14/04/16	lun 18/04/16	351
353		Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	lun 18/04/16	lun 18/04/16	352
354		Plazo para recibir respuesta del adjuducatario (Art N°186 RLCA)	3 días	lun 18/04/16	jue 21/04/16	353
355		Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Art N°187 RLCA)	15 días	jue 21/04/16	jue 12/05/16	354
356		Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	jue 12/05/16	jue 12/05/16	355
357		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	5 días	jue 12/05/16	jue 19/05/16	356
358		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 19/05/16	jue 19/05/16	357
359		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudic	0,5 días	jue 19/05/16	jue 19/05/16	358
360		Adjudicación en firme	5 días	jue 19/05/16	jue 26/05/16	351,359
361		**Trámite de contrato**	**16 días**	**jue 19/05/16**	**vie 10/06/16**	
362		Elaboración del Contrato	5 días	jue 19/05/16	jue 26/05/16	358
363		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	jue 19/05/16	jue 19/05/16	362CC
364		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía	5 días	jue 19/05/16	jue 26/05/16	363
365		Firma de contrato oferente	1 día	jue 26/05/16	vie 27/05/16	364
366		Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	0 días	vie 27/05/16	vie 27/05/16	365
367		Firma de contrato Despacho Contralor	5 días	vie 27/05/16	vie 03/06/16	366
368		Envío de contrato a aprobación interna	0 días	vie 03/06/16	vie 03/06/16	365,367
369		Aprobacion Interna de Contrato	5 días	vie 03/06/16	vie 10/06/16	368
370		Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	vie 10/06/16	vie 10/06/16	369
371		**Trámite del Pedido**	**3 días**	**vie 10/06/16**	**mié 15/06/1**	
372		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	vie 10/06/16	mar 14/06/1	369
373		Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	mar 14/06/1	mar 14/06/1	372
374		Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	mar 14/06/1	mié 15/06/1	373
375		Notificación de Pedido de Compra	0 días	mié 15/06/1	mié 15/06/1	373,374
376		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mié 15/06/1	mié 15/06/1	375
377		**Recepción de los items**	**3,99 días**	**vie 10/06/16**	**jue 16/06/16**	
378		Entrega items en Almacén	1 día	vie 10/06/16	lun 13/06/16	369
379		Recibido a satisfacción	3 días	lun 13/06/16	jue 16/06/16	378
380		Fin recepción de items	0 días	jue 16/06/16	jue 16/06/16	379
381		**Trámite de pago**	**5,99 días**	**jue 16/06/16**	**vie 24/06/16**	

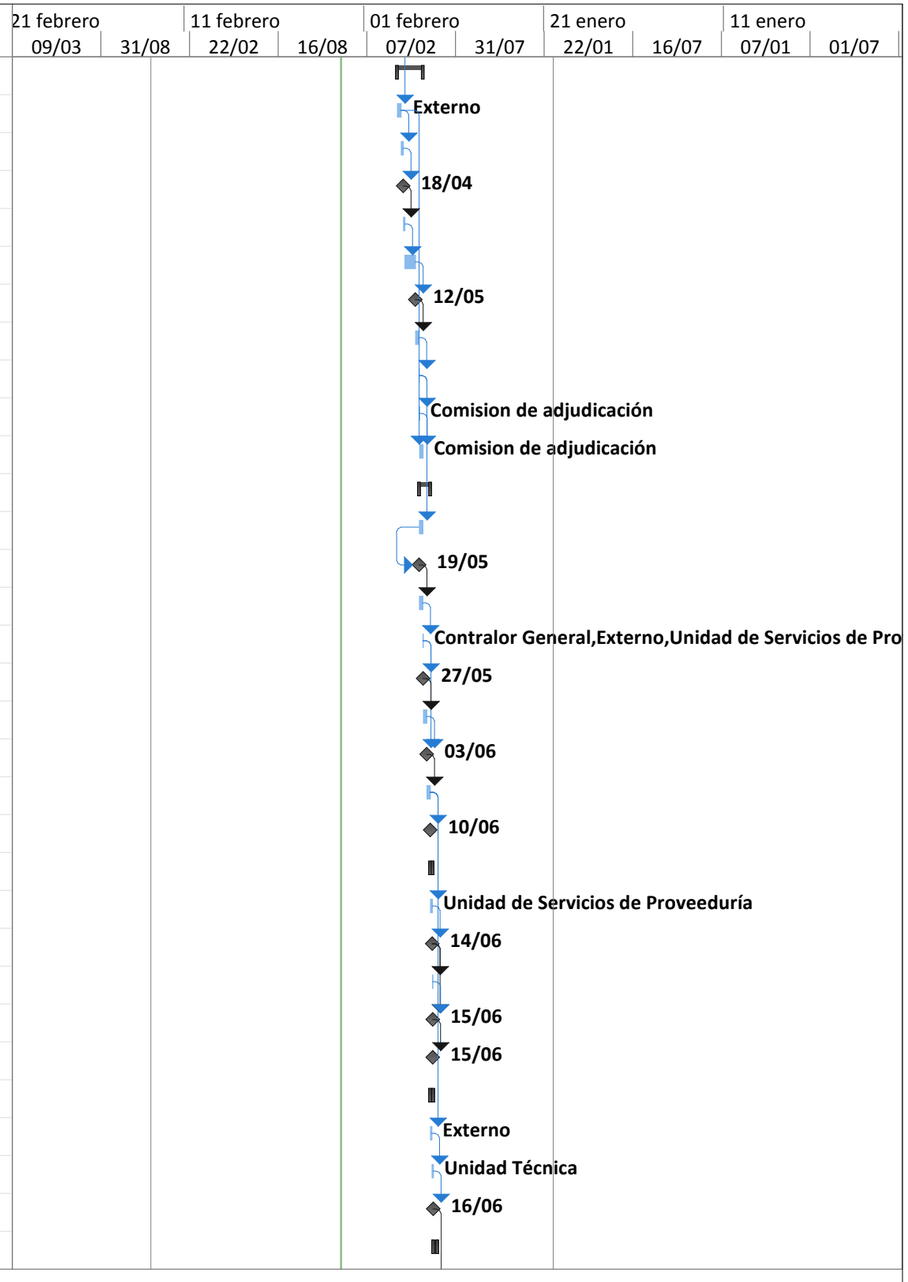

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
382		Envio documentos a Financiero	1 día	jue 16/06/16	vie 17/06/16	380
383		Emisión de pago en Financiero	5 días	vie 17/06/16	vie 24/06/16	382
384		Conclusión trámite licitación	0 días	vie 24/06/16	vie 24/06/16	383
385		**2016LA-00000003-503 USG_Caseta se seguridad y Centro de Acopio (Inicio el 30/01/16)" ₡61,900,000,00**	**148,28 días**	**vie 29/01/16**	**jue 01/09/16**	
386		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	vie 29/01/16	vie 29/01/16	
387		**Confección Documento complementario al cartel**	**22,95 días**	**vie 29/01/16**	**mar 01/03/1**	
388		Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	vie 29/01/16	vie 05/02/16	386
389		Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	vie 05/02/16	vie 12/02/16	388
390		Revisión Técnica de cartel	7 días	lun 15/02/16	mar 23/02/1(	389
391		Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al ca	5 días	mié 24/02/1(	mar 01/03/1(	390
392		**Invitación a participar**	**27,98 días**	**mié 02/03/1(**	**jue 14/04/16**	
393		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo c	5 días	mié 02/03/1(	mié 09/03/1(	391
394		Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	mié 09/03/1(	mié 16/03/1(	393
395		Invitación a participar en Mer Link	1 día	mié 16/03/1(	mié 16/03/1(	394
396		Plazo para recibir ofertas	17 días	jue 17/03/16	jue 14/04/16	395
397		**Recurso de Objeción al Cartel**	**16,86 días**	**jue 17/03/16**	**jue 14/04/16**	
398		Presentacion de Objeción al cartel	5 días	jue 17/03/16	mié 23/03/1(	395
399		Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	lun 28/03/16	mar 29/03/1(	398
400		Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	mar 29/03/1(	mié 30/03/1(	399
401		Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	mié 30/03/1(	mié 06/04/1(	400
402		Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	mié 06/04/1(	mié 13/04/1(	401
403		Comunicación de Resolución final	1 día	mié 13/04/1(	jue 14/04/16	402
404		Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	lun 28/03/16	jue 14/04/16	398
405		**Recepción y estudio de ofertas**	**32,82 días**	**jue 14/04/16**	**mar 31/05/1**	
406		Apertura de ofertas	1 día	jue 14/04/16	jue 14/04/16	404
407		Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (lega	1 día	vie 15/04/16	vie 15/04/16	406
408		Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respu	13 días	lun 18/04/16	mié 04/05/1(	407
409		Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado e	1 día	jue 05/05/16	jue 05/05/16	408
410		Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenci	1 día	vie 06/05/16	lun 09/05/16	409
411		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En l	5 días	lun 09/05/16	vie 13/05/16	410
412		Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	vie 13/05/16	vie 13/05/16	411

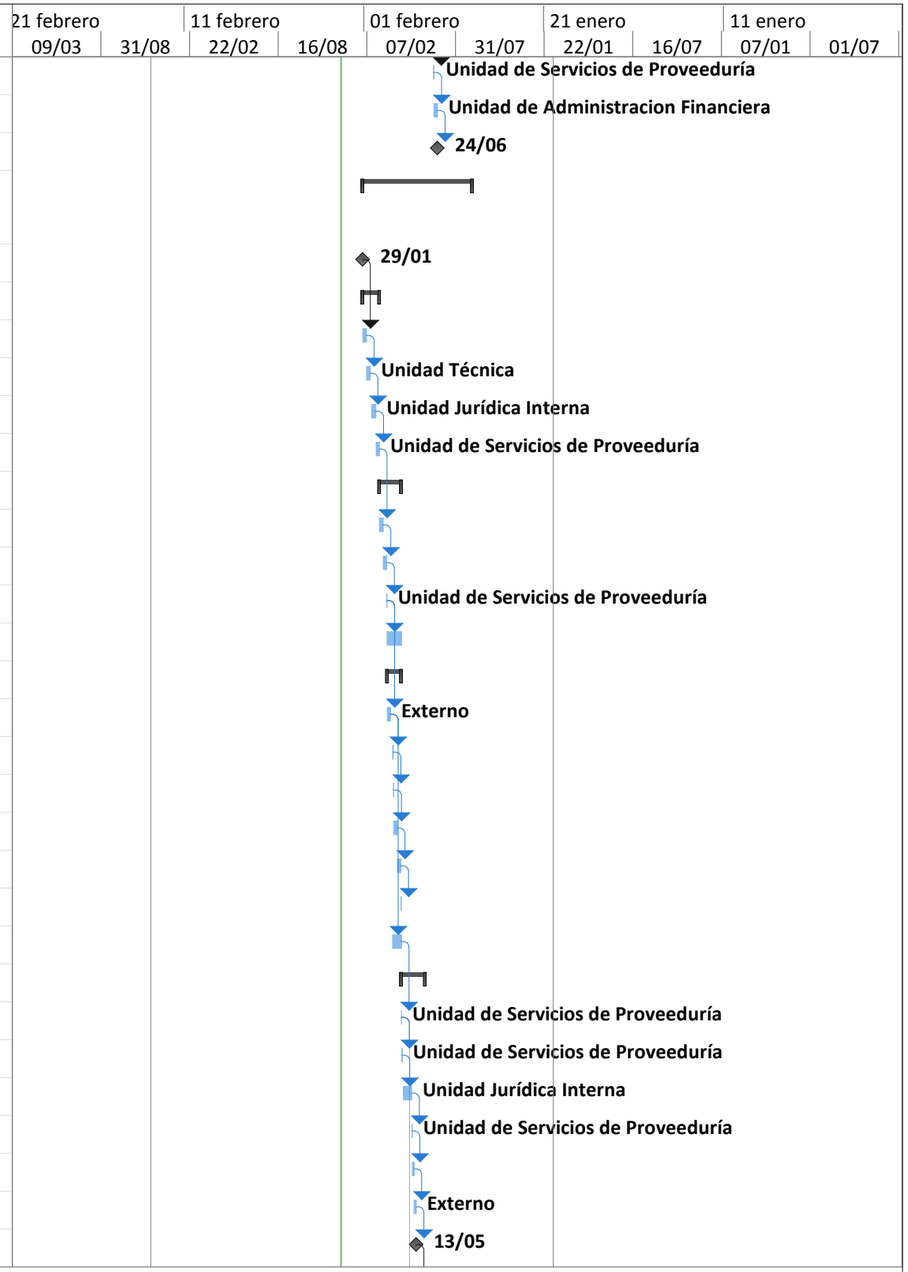

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
413		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	lun 16/05/16	mié 18/05/16	412
414		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	jue 19/05/16	mar 24/05/16	413
415		Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	mar 24/05/16	mar 24/05/16	414
416		Elaboración de Informe de recomendación	5 días	mar 24/05/16	mar 31/05/16	415
417		**Proceso de adjudicación**	**34 días**	**vie 15/04/16**	**jue 02/06/16**	
418		Fecha máxima para adjudicar	34 días	vie 15/04/16	jue 02/06/16	406
419		**Recomendación, adjudicación y comunicación**	**5,92 días**	**jue 02/06/16**	**vie 10/06/16**	
420		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	jue 02/06/16	mar 07/06/16	418
421		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mar 07/06/16	mar 07/06/16	420
422		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mar 07/06/16	mar 07/06/16	421
423		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mar 07/06/16	mié 08/06/16	422
424		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	jue 09/06/16	vie 10/06/16	423
425		**Adjudicación**	**5 días**	**vie 10/06/16**	**vie 17/06/16**	
426		Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	vie 10/06/16	vie 17/06/16	424
427		**Recurso de revocatoria**	**35,8 días**	**vie 10/06/16**	**lun 01/08/16**	
428		Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	vie 10/06/16	jue 16/06/16	424
429		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisib	2 días	vie 17/06/16	mar 21/06/16	428
430		Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	mar 21/06/16	mar 21/06/16	429
431		Plazo para recibir respuesta del adjuducatario (Art N°186 RLCA)	3 días	mar 21/06/16	vie 24/06/16	430
432		Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Art N°187 RLCA)	15 días	vie 24/06/16	vie 15/07/16	431
433		Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	vie 15/07/16	vie 15/07/16	432
434		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	5 días	vie 15/07/16	vie 22/07/16	433
435		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	vie 22/07/16	vie 22/07/16	434
436		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudic	0,5 días	vie 22/07/16	vie 22/07/16	435
437		Adjudicación en firme	5 días	vie 22/07/16	lun 01/08/16	428,436
438		**Trámite de contrato**	**16 días**	**vie 22/07/16**	**jue 18/08/16**	
439		Elaboración del Contrato	5 días	vie 22/07/16	lun 01/08/16	435
440		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	vie 22/07/16	vie 22/07/16	439CC
441		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía	5 días	vie 22/07/16	lun 01/08/16	440
442		Firma de contrato oferente	1 día	lun 01/08/16	mié 03/08/16	441
443		Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	0 días	mié 03/08/16	mié 03/08/16	442
444		Firma de contrato Despacho Contralor	5 días	mié 03/08/16	mié 10/08/16	443

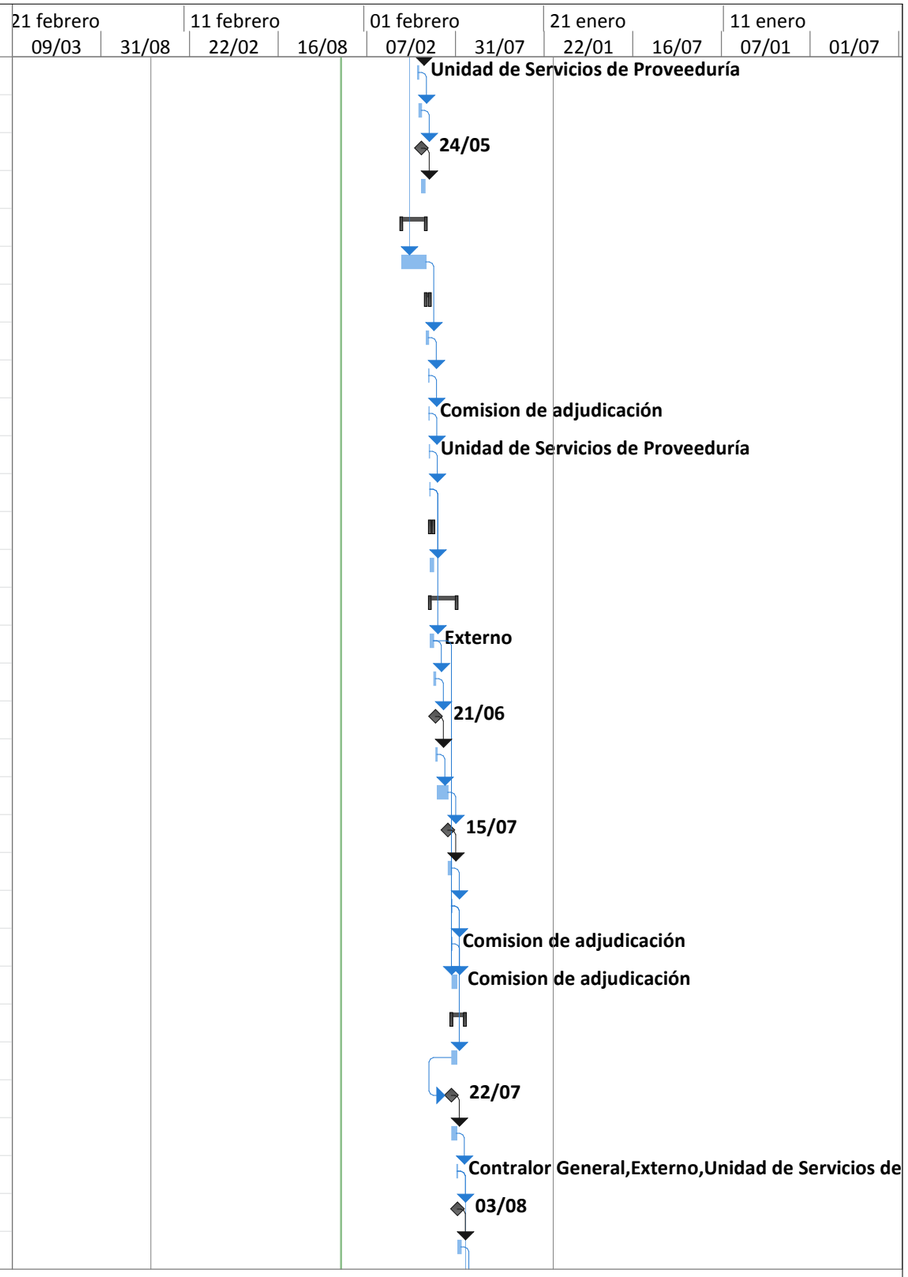

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
445		Envío de contrato a aprobación interna	0 días	mié 10/08/16	mié 10/08/16	442,444
446		Aprobacion Interna de Contrato	5 días	mié 10/08/16	jue 18/08/16	445
447		Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	jue 18/08/16	jue 18/08/16	446
448		**Trámite del Pedido**	**3 días**	**jue 18/08/16**	**mar 23/08/1**	
449		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	jue 18/08/16	lun 22/08/16	446
450		Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	lun 22/08/16	lun 22/08/16	449
451		Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	lun 22/08/16	mar 23/08/16	450
452		Notificación de Pedido de Compra	0 días	mar 23/08/16	mar 23/08/16	450,451
453		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mar 23/08/16	mar 23/08/16	452
454		**Recepción de los items**	**3,99 días**	**jue 18/08/16**	**mié 24/08/16**	
455		Entrega items en Almacén	1 día	jue 18/08/16	vie 19/08/16	446
456		Recibido a satisfacción	3 días	vie 19/08/16	mié 24/08/16	455
457		Fin recepción de items	0 días	mié 24/08/16	mié 24/08/16	456
458		**Trámite de pago**	**5,99 días**	**mié 24/08/16**	**jue 01/09/16**	
459		Envio documentos a Financiero	1 día	mié 24/08/16	jue 25/08/16	457
460		Emisión de pago en Financiero	5 días	jue 25/08/16	jue 01/09/16	459
461		Conclusión trámite licitación	0 días	jue 01/09/16	jue 01/09/16	460
462		**2016LA-00000004-503 USG_Cerramiento de oficinas (Inicio el 01/03/16)" ₡13,900,000,00**	**148,28 días**	**mar 01/03/16**	**mar 04/10/16**	
463		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	mar 01/03/16	mar 01/03/16	
464		**Confección Documento complementario al cartel**	**22,95 días**	**mar 01/03/1**	**lun 04/04/16**	
465		Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	mar 01/03/16	mar 08/03/16	463
466		Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	mar 08/03/16	mar 15/03/16	465
467		Revisión Técnica de cartel	7 días	mié 16/03/16	lun 28/03/16	466
468		Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al ca	5 días	mar 29/03/16	lun 04/04/16	467
469		**Invitación a participar**	**27,98 días**	**mar 05/04/1**	**lun 16/05/16**	
470		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo c	5 días	mar 05/04/16	mié 13/04/16	468
471		Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	mié 13/04/16	mié 20/04/16	470
472		Invitación a participar en Mer Link	1 día	mié 20/04/16	mié 20/04/16	471
473		Plazo para recibir ofertas	17 días	jue 21/04/16	lun 16/05/16	472
474		**Recurso de Objeción al Cartel**	**16,86 días**	**jue 21/04/16**	**lun 16/05/16**	
475		Presentacion de Objeción al cartel	5 días	jue 21/04/16	mié 27/04/16	472

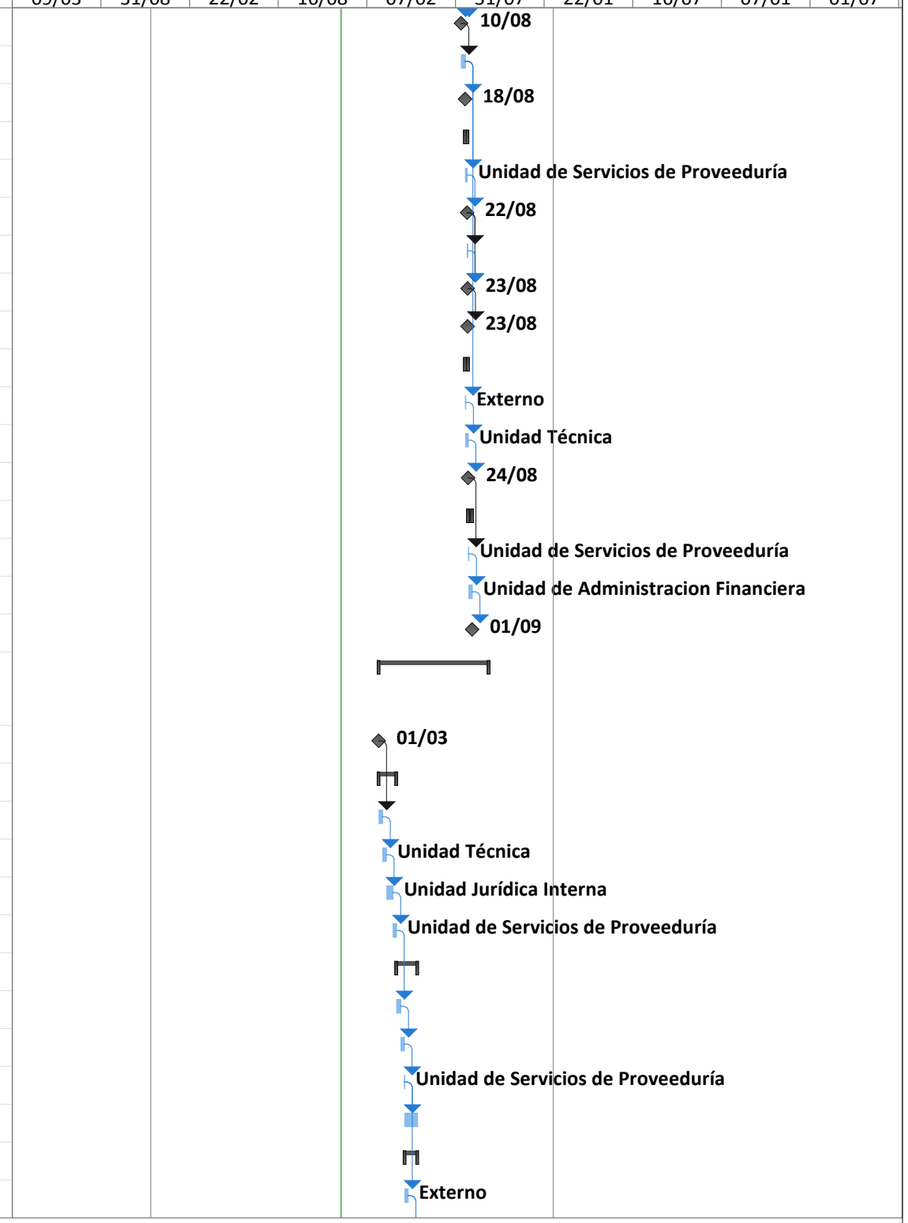

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
476		Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	jue 28/04/16	vie 29/04/16	475
477		Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	vie 29/04/16	lun 02/05/16	476
478		Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	lun 02/05/16	lun 09/05/16	477
479		Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	lun 09/05/16	vie 13/05/16	478
480		Comunicación de Resolución final	1 día	vie 13/05/16	lun 16/05/16	479
481		Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	jue 28/04/16	lun 16/05/16	475
482		**Recepción y estudio de ofertas**	**32,82 días**	**lun 16/05/16**	**jue 30/06/16**	
483		Apertura de ofertas	1 día	lun 16/05/16	lun 16/05/16	481
484		Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (lega	1 día	mar 17/05/1(	mar 17/05/1(	483
485		Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respu	13 días	mié 18/05/1(	vie 03/06/16	484
486		Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado e	1 día	lun 06/06/16	lun 06/06/16	485
487		Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenci	1 día	mar 07/06/1(	mié 08/06/1(	486
488		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En l	5 días	mié 08/06/1(	mar 14/06/1(	487
489		Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	mar 14/06/1(	mar 14/06/1(	488
490		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mié 15/06/1(	vie 17/06/16	489
491		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	lun 20/06/16	jue 23/06/16	490
492		Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	jue 23/06/16	jue 23/06/16	491
493		Elaboración de Informe de recomendación	5 días	jue 23/06/16	jue 30/06/16	492
494		**Proceso de adjudicación**	**34 días**	**mar 17/05/1**	**lun 04/07/16**	
495		Fecha máxima para adjudicar	34 días	mar 17/05/1(	lun 04/07/16	483
496		**Recomendación, adjudicación y comunicación**	**5,92 días**	**lun 04/07/16**	**mar 12/07/1**	
497		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	lun 04/07/16	jue 07/07/16	495
498		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	jue 07/07/16	jue 07/07/16	497
499		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	jue 07/07/16	jue 07/07/16	498
500		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	jue 07/07/16	vie 08/07/16	499
501		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	lun 11/07/16	mar 12/07/1(	500
502		**Adjudicación**	**5 días**	**mar 12/07/1**	**mar 19/07/1**	
503		Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	mar 12/07/1(	mar 19/07/1(	501
504		**Recurso de revocatoria**	**35,8 días**	**mar 12/07/1**	**vie 02/09/16**	
505		Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	mar 12/07/1(	lun 18/07/16	501
506		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisib	2 días	mar 19/07/1(	jue 21/07/16	505
507		Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	jue 21/07/16	jue 21/07/16	506

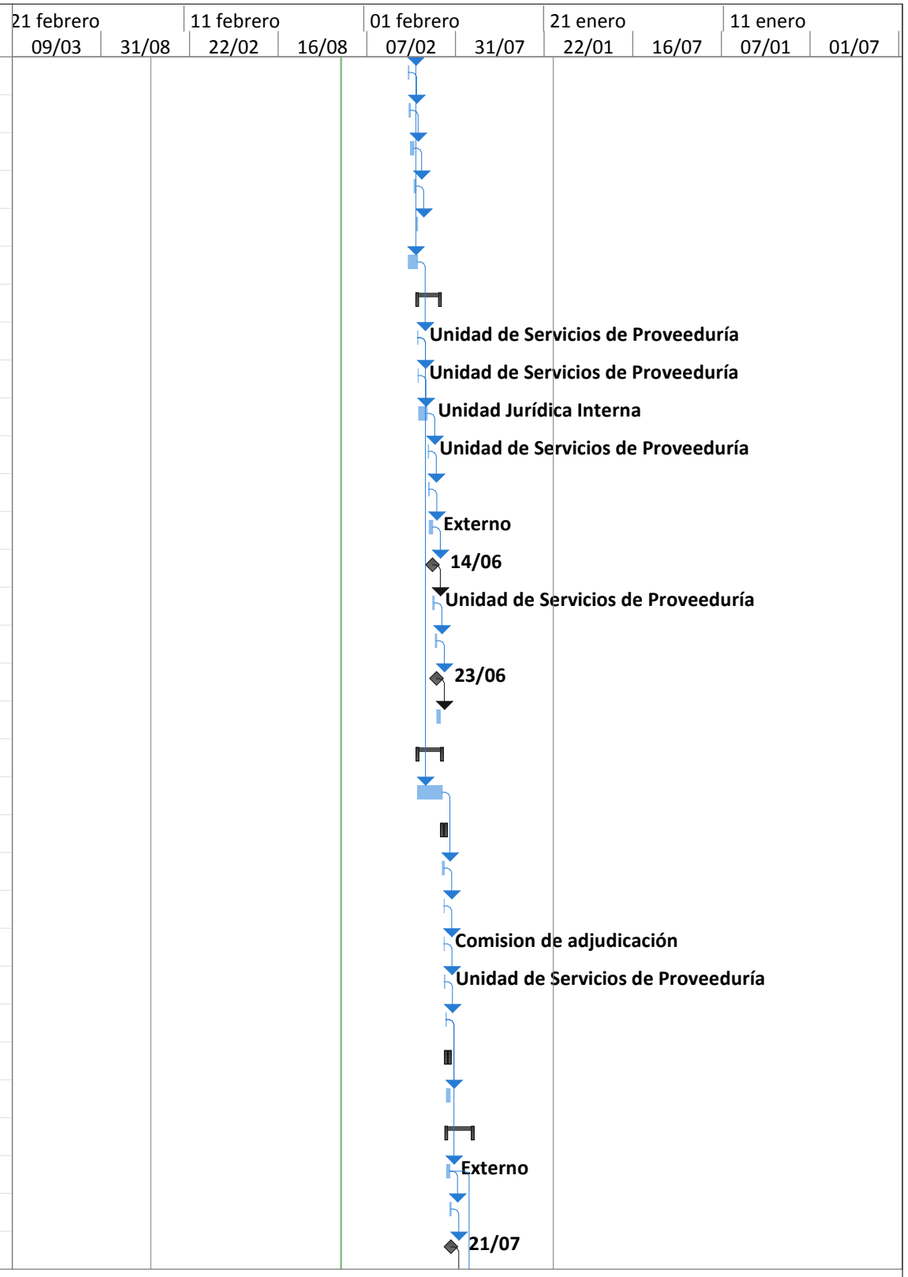

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
508		Plazo para recibir respuesta del adjuducatario (Art N°186 RLCA)	3 días	jue 21/07/16	mié 27/07/16	507
509		Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Art N°187 RLCA)	15 días	mié 27/07/16	vie 19/08/16	508
510		Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	vie 19/08/16	vie 19/08/16	509
511		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	5 días	vie 19/08/16	vie 26/08/16	510
512		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	vie 26/08/16	vie 26/08/16	511
513		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudic	0,5 días	vie 26/08/16	vie 26/08/16	512
514		Adjudicación en firme	5 días	vie 26/08/16	vie 02/09/16	505,513
515		**Trámite de contrato**	**16 días**	**vie 26/08/16**	**mar 20/09/1**	
516		Elaboración del Contrato	5 días	vie 26/08/16	vie 02/09/16	512
517		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	vie 26/08/16	vie 26/08/16	516CC
518		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía	5 días	vie 26/08/16	vie 02/09/16	517
519		Firma de contrato oferente	1 día	vie 02/09/16	lun 05/09/16	518
520		Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	0 días	lun 05/09/16	lun 05/09/16	519
521		Firma de contrato Despacho Contralor	5 días	lun 05/09/16	lun 12/09/16	520
522		Envío de contrato a aprobación interna	0 días	lun 12/09/16	lun 12/09/16	519,521
523		Aprobacion Interna de Contrato	5 días	lun 12/09/16	mar 20/09/1	522
524		Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	mar 20/09/1	mar 20/09/1	523
525		**Trámite del Pedido**	**3 días**	**mar 20/09/1**	**vie 23/09/16**	
526		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	mar 20/09/1	jue 22/09/16	523
527		Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	jue 22/09/16	jue 22/09/16	526
528		Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	jue 22/09/16	vie 23/09/16	527
529		Notificación de Pedido de Compra	0 días	vie 23/09/16	vie 23/09/16	527,528
530		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	vie 23/09/16	vie 23/09/16	529
531		**Recepción de los items**	**3,99 días**	**mar 20/09/1**	**lun 26/09/16**	
532		Entrega items en Almacén	1 día	mar 20/09/1	mié 21/09/16	523
533		Recibido a satisfacción	3 días	mié 21/09/16	lun 26/09/16	532
534		Fin recepción de items	0 días	lun 26/09/16	lun 26/09/16	533
535		**Trámite de pago**	**5,99 días**	**lun 26/09/16**	**mar 04/10/1**	
536		Envio documentos a Financiero	1 día	lun 26/09/16	mar 27/09/1	534
537		Emisión de pago en Financiero	5 días	mar 27/09/1	mar 04/10/1	536
538		Conclusión trámite licitación	0 días	mar 04/10/1	mar 04/10/1	537
539		**UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN**	**217,13 días**	**mié 20/01/1**	**mié 30/11/1**	

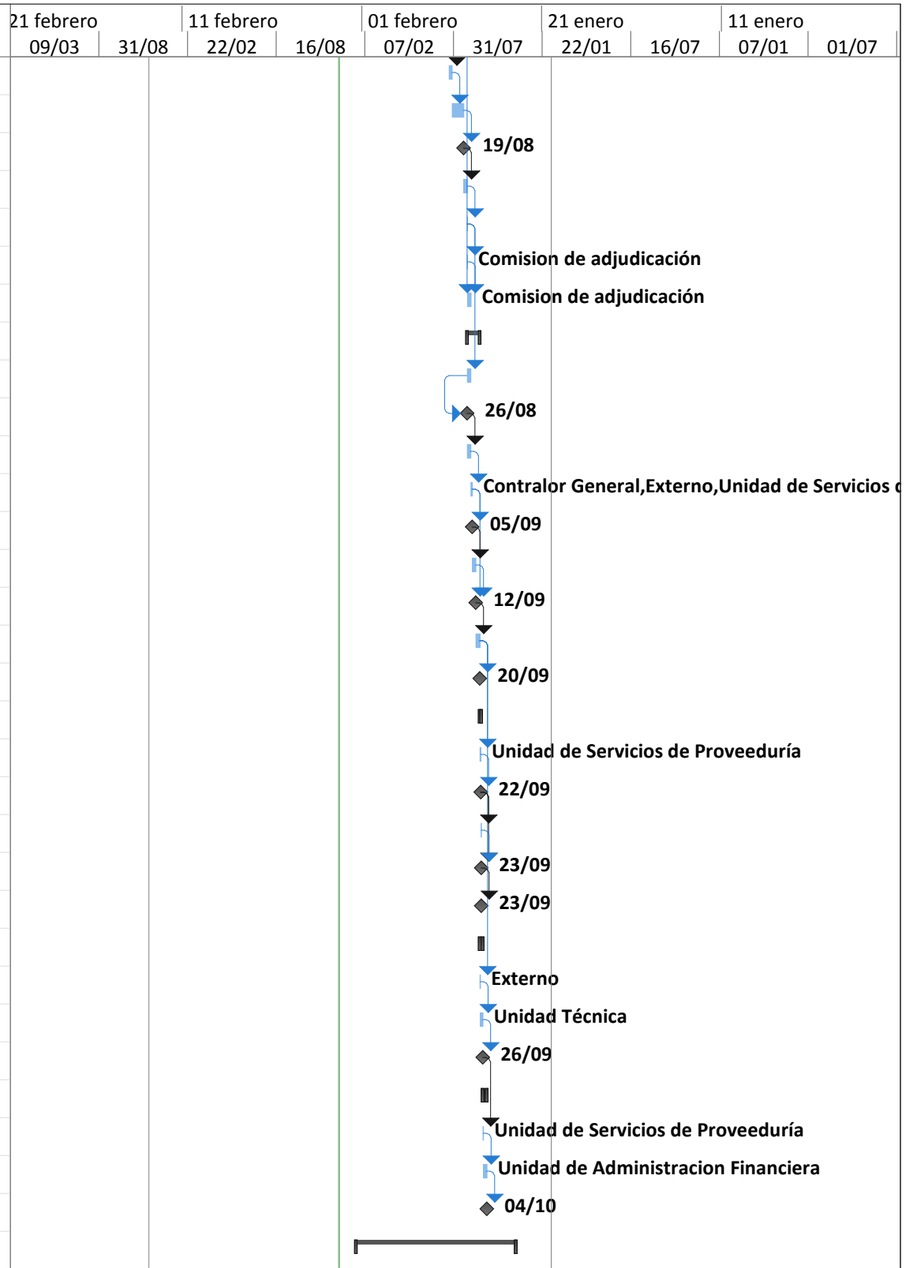

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
540		**2016LA-0000005-503 UTI_Adquisición y Mantenimiento del CCTV ₡16,133.000**	**148,28 días**	**mié 23/03/1**	**jue 27/10/16**	
541		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	mié 23/03/16	mié 23/03/16	
542		**Confección Documento complementario al cartel**	**22,95 días**	**mié 23/03/1**	**mié 27/04/1**	
543		Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	mié 23/03/16	vie 01/04/16	541
544		Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	vie 01/04/16	vie 08/04/16	543
545		Revisión Técnica de cartel	7 días	mar 12/04/1	mié 20/04/16	544
546		Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al ca	5 días	jue 21/04/16	mié 27/04/16	545
547		**Invitación a participar**	**27,98 días**	**jue 28/04/16**	**mar 07/06/1**	
548		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo c	5 días	jue 28/04/16	jue 05/05/16	546
549		Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	jue 05/05/16	jue 12/05/16	548
550		Invitación a participar en Mer Link	1 día	jue 12/05/16	jue 12/05/16	549
551		Plazo para recibir ofertas	17 días	vie 13/05/16	mar 07/06/1	550
552		**Recurso de Objeción al Cartel**	**16,86 días**	**vie 13/05/16**	**mar 07/06/1**	
553		Presentacion de Objeción al cartel	5 días	vie 13/05/16	jue 19/05/16	550
554		Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	vie 20/05/16	lun 23/05/16	553
555		Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	lun 23/05/16	mar 24/05/1	554
556		Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	mar 24/05/1	mar 31/05/1	555
557		Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	mar 31/05/1	lun 06/06/16	556
558		Comunicación de Resolución final	1 día	lun 06/06/16	mar 07/06/1	557
559		Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	vie 20/05/16	mar 07/06/1	553
560		**Recepción y estudio de ofertas**	**32,82 días**	**mar 07/06/1**	**vie 22/07/16**	
561		Apertura de ofertas	1 día	mar 07/06/1	mar 07/06/1	559
562		Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (lega	1 día	mié 08/06/1	mié 08/06/1	561
563		Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respu	13 días	jue 09/06/16	lun 27/06/16	562
564		Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado e	1 día	mar 28/06/1	mar 28/06/1	563
565		Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenci	1 día	mié 29/06/1	jue 30/06/16	564
566		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En l	5 días	jue 30/06/16	mié 06/07/1	565
567		Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	mié 06/07/1	mié 06/07/1	566
568		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	jue 07/07/16	lun 11/07/16	567
569		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	mar 12/07/1	vie 15/07/16	568
570		Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	vie 15/07/16	vie 15/07/16	569
571		Elaboración de Informe de recomendación	5 días	vie 15/07/16	vie 22/07/16	570

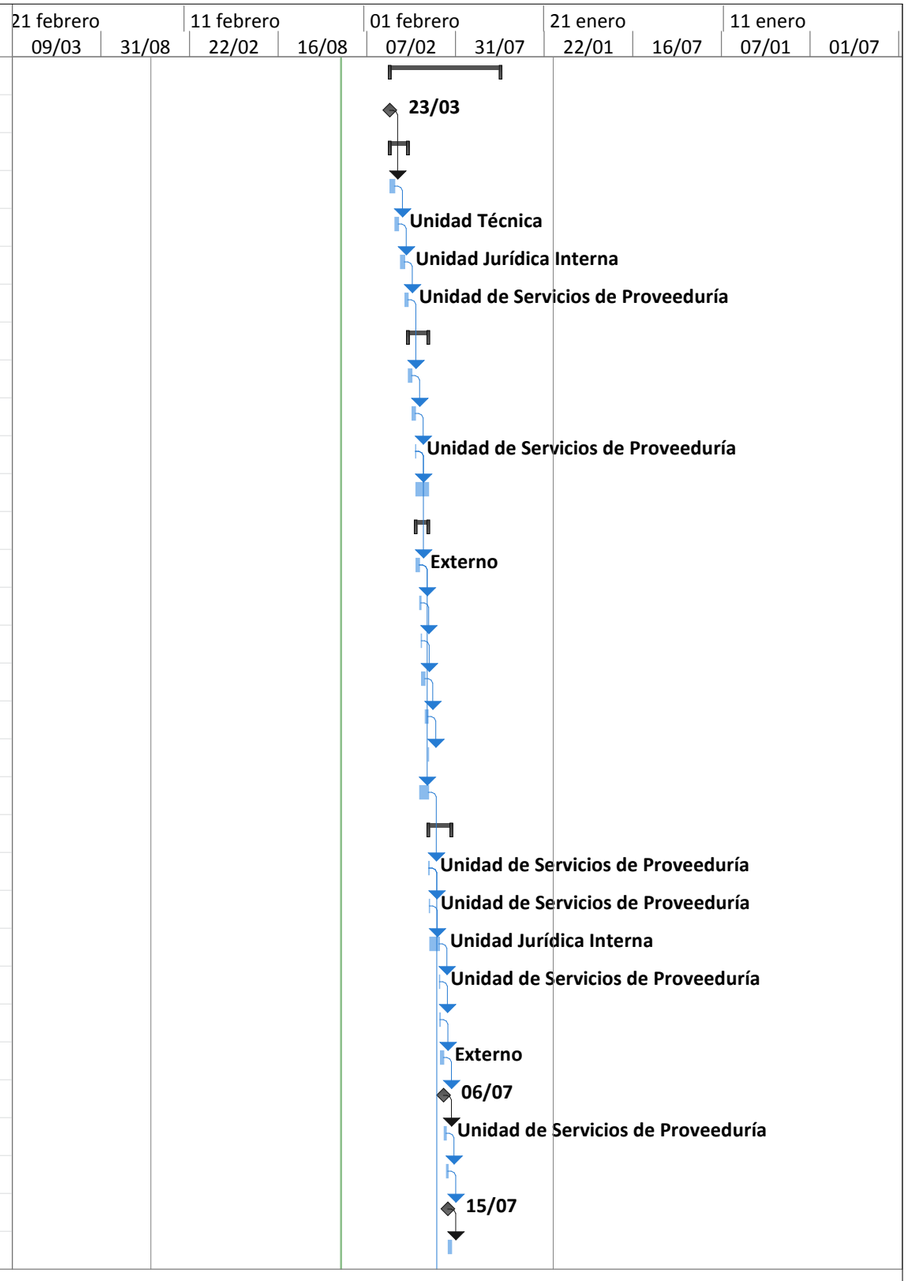

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
572		**Proceso de adjudicación**	**34 días**	**mié 08/06/1**	**mié 27/07/1**	
573		Fecha máxima para adjudicar	34 días	mié 08/06/1	mié 27/07/1	561
574		**Recomendación, adjudicación y comunicación**	**10,92 días**	**mié 27/07/1**	**vie 12/08/16**	
575		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mié 27/07/1	lun 01/08/16	573
576		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	lun 01/08/16	lun 01/08/16	575
577		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	lun 01/08/16	lun 01/08/16	576
578		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	lun 01/08/16	mié 03/08/1	577
579		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	jue 04/08/16	vie 05/08/16	578
580		Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	vie 05/08/16	vie 12/08/16	579
581		**Recurso de revocatoria**	**35,8 días**	**vie 05/08/16**	**mar 27/09/1**	
582		Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	vie 05/08/16	jue 11/08/16	579
583		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisib	2 días	vie 12/08/16	mié 17/08/1	582
584		Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	mié 17/08/1	mié 17/08/1	583
585		Plazo para recibir respuesta del adjuducatario (Art N°186 RLCA)	3 días	mié 17/08/1	lun 22/08/16	584
586		Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Art N°187 RLCA)	15 días	lun 22/08/16	lun 12/09/16	585
587		Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	lun 12/09/16	lun 12/09/16	586
588		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	5 días	lun 12/09/16	mar 20/09/1	587
589		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mar 20/09/1	mar 20/09/1	588
590		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudic	0,5 días	mar 20/09/1	mar 20/09/1	589
591		Adjudicación en firme	5 días	mar 20/09/1	mar 27/09/1	582,590
592		**Trámite de contrato**	**16 días**	**mar 20/09/1**	**jue 13/10/16**	
593		Elaboración del Contrato	5 días	mar 20/09/1	mar 27/09/1	589
594		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	mar 20/09/1	mar 20/09/1	593CC
595		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía	5 días	mar 20/09/1	mar 27/09/1	594
596		Firma de contrato oferente	1 día	mar 27/09/1	mié 28/09/1	595
597		Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	0 días	mié 28/09/1	mié 28/09/1	596
598		Firma de contrato Despacho Contralor	5 días	mié 28/09/1	mié 05/10/1	597
599		Envío de contrato a aprobación interna	0 días	mié 05/10/1	mié 05/10/1	596,598
600		Aprobacion Interna de Contrato	5 días	mié 05/10/1	jue 13/10/16	599
601		Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	jue 13/10/16	jue 13/10/16	600
602		**Trámite del Pedido**	**3 días**	**jue 13/10/16**	**mar 18/10/1**	
603		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	jue 13/10/16	lun 17/10/16	600

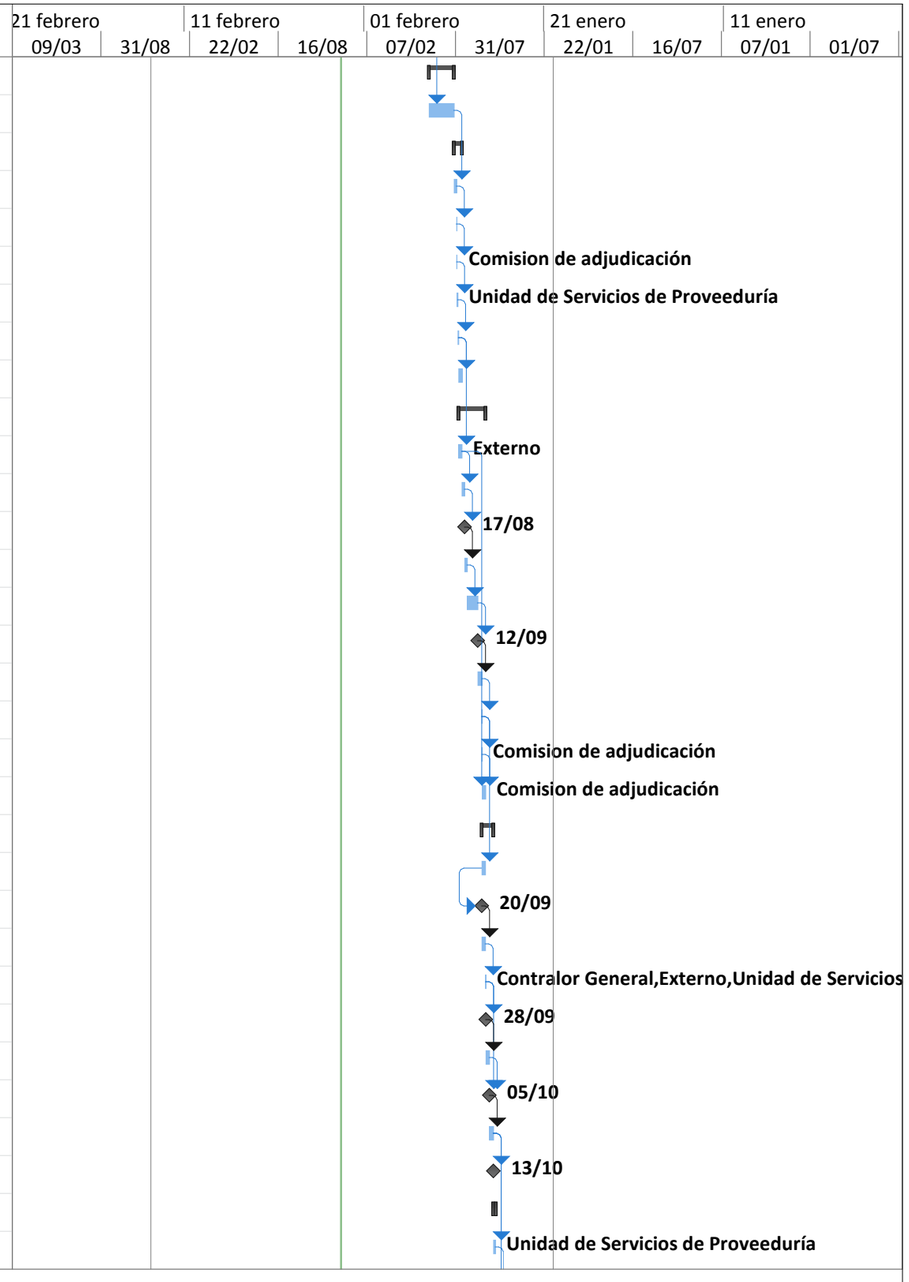

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
604		Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	lun 17/10/16	lun 17/10/16	603
605		Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	lun 17/10/16	mar 18/10/16	604
606		Notificación de Pedido de Compra	0 días	mar 18/10/16	mar 18/10/16	604,605
607		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mar 18/10/16	mar 18/10/16	606
608		**Recepción de los items**	**3,99 días**	**jue 13/10/16**	**mié 19/10/16**	
609		Entrega items en Almacén	1 día	jue 13/10/16	vie 14/10/16	600
610		Recibido a satisfacción	3 días	vie 14/10/16	mié 19/10/16	609
611		Fin recepción de items	0 días	mié 19/10/16	mié 19/10/16	610
612		**Trámite de pago**	**5,99 días**	**mié 19/10/16**	**jue 27/10/16**	
613		Envio documentos a Financiero	1 día	mié 19/10/16	jue 20/10/16	611
614		Emisión de pago en Financiero	5 días	jue 20/10/16	jue 27/10/16	613
615		Conclusión trámite licitación	0 días	jue 27/10/16	jue 27/10/16	614
616		**2016LA-000006-503_UTI_ Accesorios ₡29,030.000,00**	**148,28 días**	**mié 20/01/16**	**mar 23/08/16**	
617		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	mié 20/01/16	mié 20/01/16	
618		**Confección Documento complementario al cartel**	**22,95 días**	**mié 20/01/16**	**vie 19/02/16**	
619		Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	mié 20/01/16	mié 27/01/16	617
620		Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	mié 27/01/16	mié 03/02/16	619
621		Revisión Técnica de cartel	7 días	jue 04/02/16	vie 12/02/16	620
622		Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al ca	5 días	lun 15/02/16	vie 19/02/16	621
623		**Invitación a participar**	**27,98 días**	**lun 22/02/16**	**lun 04/04/16**	
624		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo c	5 días	lun 22/02/16	lun 29/02/16	622
625		Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	lun 29/02/16	lun 07/03/16	624
626		Invitación a participar en Mer Link	1 día	lun 07/03/16	lun 07/03/16	625
627		Plazo para recibir ofertas	17 días	mar 08/03/16	lun 04/04/16	626
628		**Recurso de Objeción al Cartel**	**16,86 días**	**mar 08/03/16**	**lun 04/04/16**	
629		Presentacion de Objeción al cartel	5 días	mar 08/03/16	lun 14/03/16	626
630		Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	mar 15/03/16	mié 16/03/16	629
631		Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	mié 16/03/16	jue 17/03/16	630
632		Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	jue 17/03/16	lun 28/03/16	631
633		Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	lun 28/03/16	vie 01/04/16	632
634		Comunicación de Resolución final	1 día	vie 01/04/16	lun 04/04/16	633
635		Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	mar 15/03/16	lun 04/04/16	629

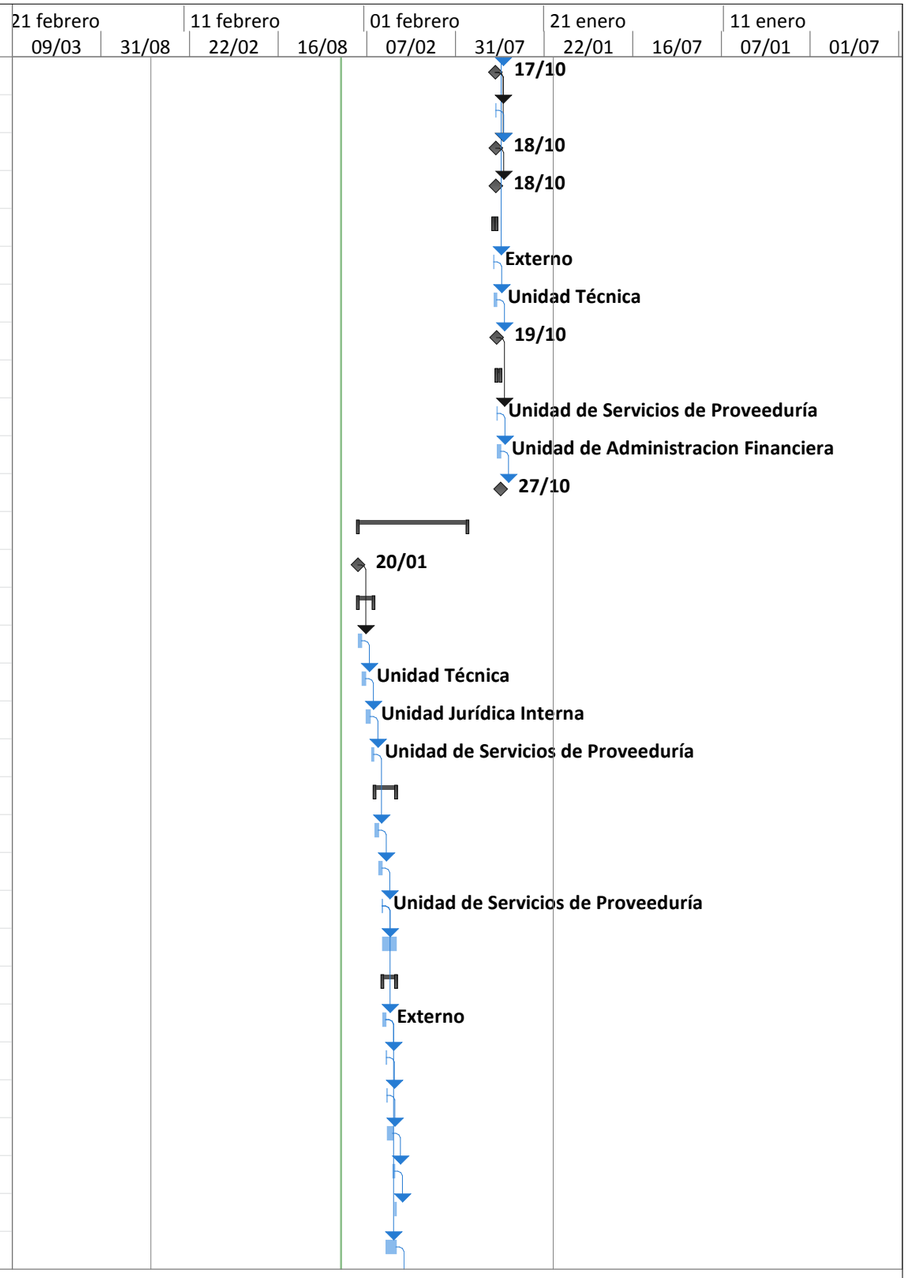

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
636		**Recepción y estudio de ofertas**	**32,82 días**	**lun 04/04/16**	**vie 20/05/16**	
637		Apertura de ofertas	1 día	lun 04/04/16	lun 04/04/16	635
638		Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (lega	1 día	mar 05/04/1(	mar 05/04/1(	637
639		Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respu	13 días	mié 06/04/16	lun 25/04/16	638
640		Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado e	1 día	mar 26/04/1(	mar 26/04/1(	639
641		Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenci	1 día	mié 27/04/16	jue 28/04/16	640
642		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En l	5 días	jue 28/04/16	mié 04/05/16	641
643		Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	mié 04/05/16	mié 04/05/16	642
644		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	jue 05/05/16	lun 09/05/16	643
645		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	mar 10/05/1(	vie 13/05/16	644
646		Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	vie 13/05/16	vie 13/05/16	645
647		Elaboración de Informe de recomendación	5 días	vie 13/05/16	vie 20/05/16	646
648		**Proceso de adjudicación**	**34 días**	**mar 05/04/1**	**mar 24/05/1**	
649		Fecha máxima para adjudicar	34 días	mar 05/04/1(	mar 24/05/1(	637
650		**Recomendación, adjudicación y comunicación**	**10,92 días**	**mar 24/05/1**	**mié 08/06/1(**	
651		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	mar 24/05/1(	vie 27/05/16	649
652		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	vie 27/05/16	vie 27/05/16	651
653		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	vie 27/05/16	vie 27/05/16	652
654		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	vie 27/05/16	lun 30/05/16	653
655		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	mar 31/05/1(	mié 01/06/1(	654
656		Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	mié 01/06/1(	mié 08/06/1(	655
657		**Recurso de revocatoria**	**35,8 días**	**mié 01/06/1(**	**mié 20/07/1(**	
658		Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	mié 01/06/1(	mar 07/06/1(	655
659		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisib	2 días	mié 08/06/1(	vie 10/06/16	658
660		Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	vie 10/06/16	vie 10/06/16	659
661		Plazo para recibir respuesta del adjuducatario (Art N°186 RLCA)	3 días	vie 10/06/16	mié 15/06/1(	660
662		Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Art N°187 RLCA)	15 días	mié 15/06/1(	mié 06/07/1(	661
663		Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	mié 06/07/1(	mié 06/07/1(	662
664		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	5 días	mié 06/07/1(	mié 13/07/1(	663
665		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mié 13/07/1(	mié 13/07/1(	664
666		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudic	0,5 días	mié 13/07/1(	mié 13/07/1(	665
667		Adjudicación en firme	5 días	mié 13/07/1(	mié 20/07/1(	658,666

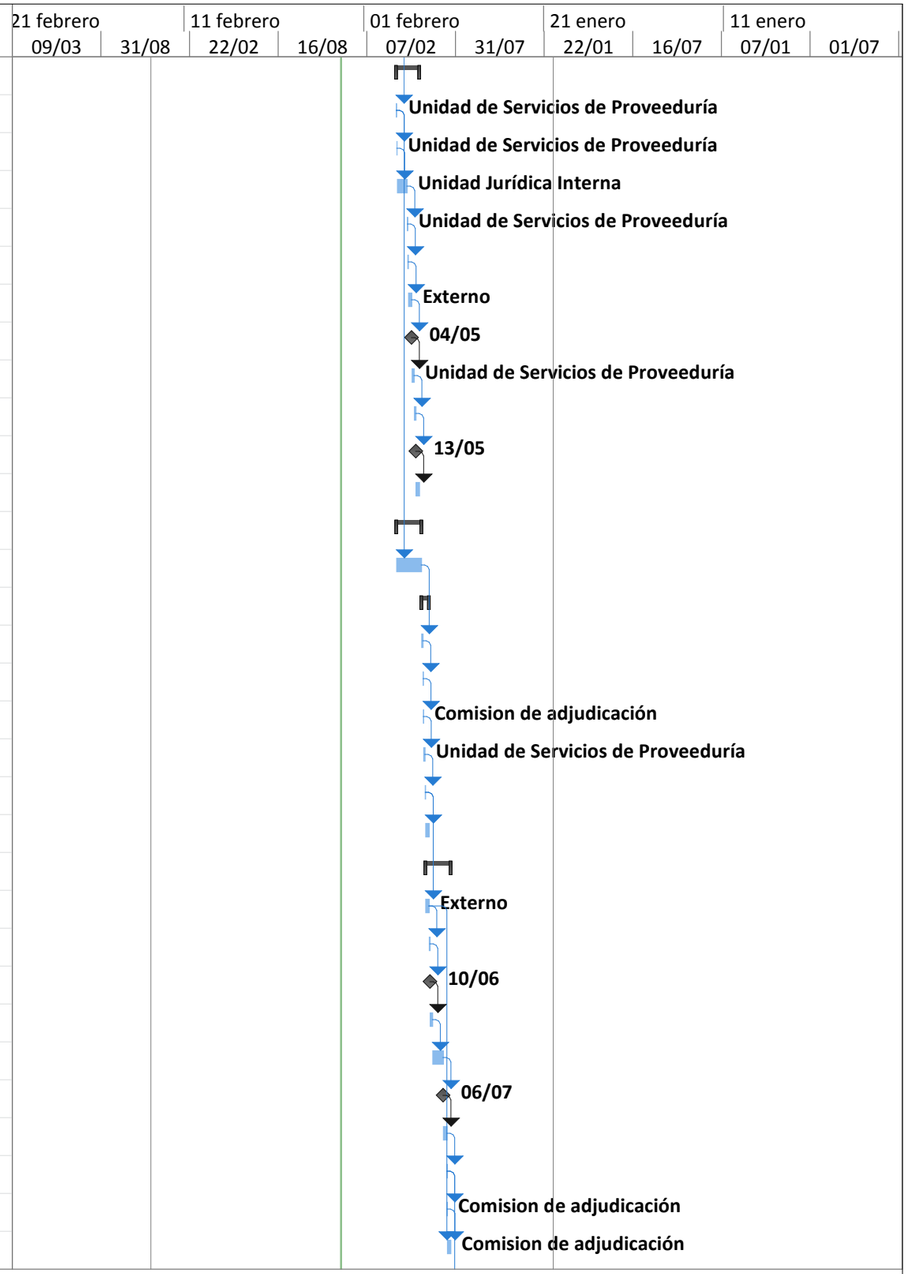

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
668		**Trámite de contrato**	**16 días**	**mié 13/07/16**	**lun 08/08/16**	
669		Elaboración del Contrato	5 días	mié 13/07/16	mié 20/07/16	665
670		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	mié 13/07/16	mié 13/07/16	669CC
671		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía	5 días	mié 13/07/16	mié 20/07/16	670
672		Firma de contrato oferente	1 día	mié 20/07/16	jue 21/07/16	671
673		Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	0 días	jue 21/07/16	jue 21/07/16	672
674		Firma de contrato Despacho Contralor	5 días	jue 21/07/16	vie 29/07/16	673
675		Envío de contrato a aprobación interna	0 días	vie 29/07/16	vie 29/07/16	672,674
676		Aprobacion Interna de Contrato	5 días	vie 29/07/16	lun 08/08/16	675
677		Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	lun 08/08/16	lun 08/08/16	676
678		**Trámite del Pedido**	**3 días**	**lun 08/08/16**	**jue 11/08/16**	
679		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	lun 08/08/16	mié 10/08/16	676
680		Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	mié 10/08/16	mié 10/08/16	679
681		Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	mié 10/08/16	jue 11/08/16	680
682		Notificación de Pedido de Compra	0 días	jue 11/08/16	jue 11/08/16	680,681
683		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	jue 11/08/16	jue 11/08/16	682
684		**Recepción de los items**	**3,99 días**	**lun 08/08/16**	**vie 12/08/16**	
685		Entrega items en Almacén	1 día	lun 08/08/16	mar 09/08/16	676
686		Recibido a satisfacción	3 días	mar 09/08/16	vie 12/08/16	685
687		Fin recepción de items	0 días	vie 12/08/16	vie 12/08/16	686
688		**Trámite de pago**	**5,99 días**	**vie 12/08/16**	**mar 23/08/1**	
689		Envio documentos a Financiero	1 día	vie 12/08/16	mar 16/08/16	687
690		Emisión de pago en Financiero	5 días	mar 16/08/16	mar 23/08/16	689
691		Conclusión trámite licitación	0 días	mar 23/08/16	mar 23/08/16	690
692		**2016LA-000007-503"UTI_ Access Point (Inicia el 29/04/16)" ₡22,160.000,00**	**148,28 días**	**vie 29/04/16**	**mié 30/11/16**	
693		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	vie 29/04/16	vie 29/04/16	
694		**Confección Documento complementario al cartel**	**22,95 días**	**vie 29/04/16**	**mar 31/05/1**	
695		Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	vie 29/04/16	vie 06/05/16	693
696		Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	vie 06/05/16	vie 13/05/16	695
697		Revisión Técnica de cartel	7 días	lun 16/05/16	mar 24/05/16	696
698		Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al ca	5 días	mié 25/05/16	mar 31/05/16	697
699		**Invitación a participar**	**27,98 días**	**mié 01/06/16**	**lun 11/07/16**	

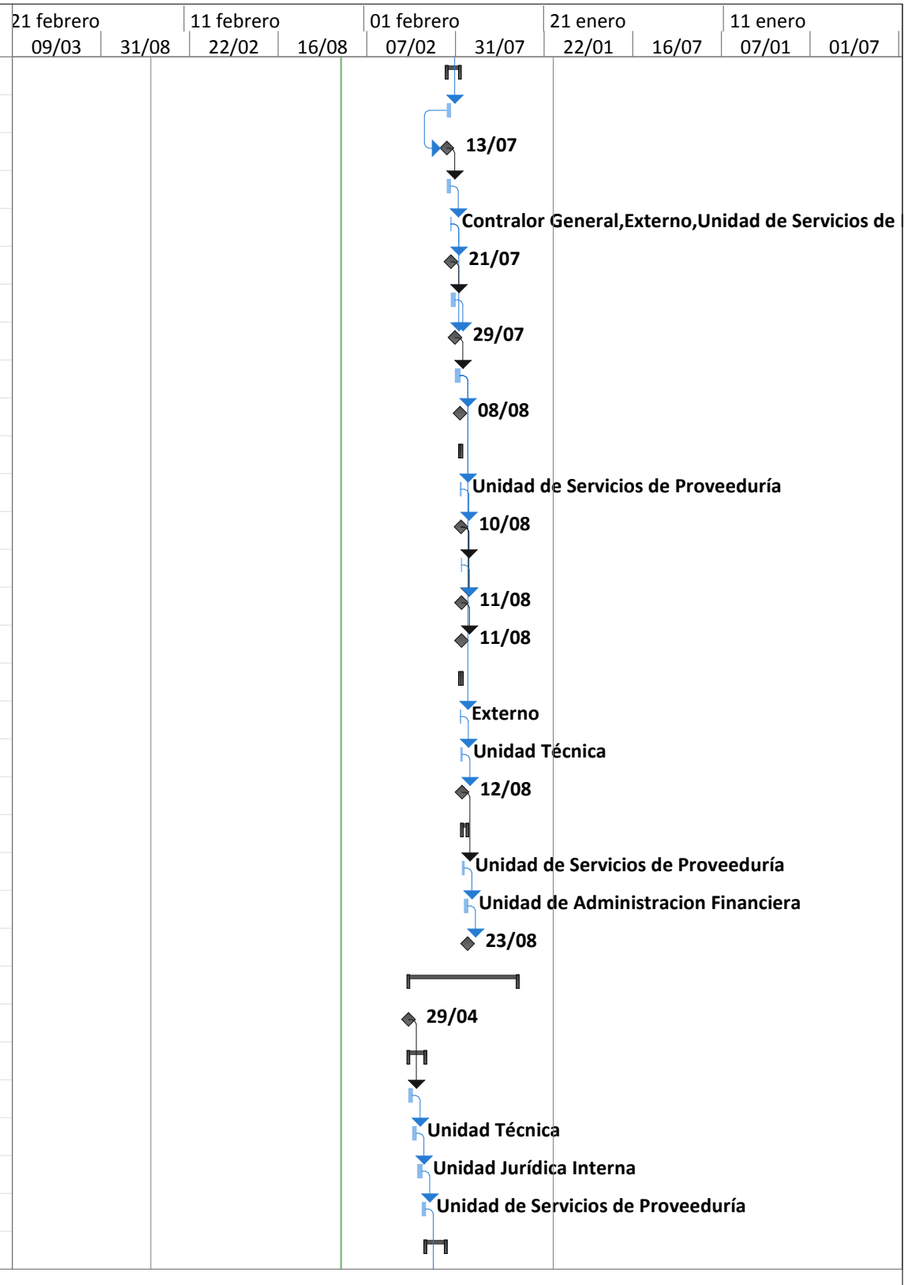

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
700		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo c	5 días	mié 01/06/16	mié 08/06/16	698
701		Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	mié 08/06/16	mié 15/06/16	700
702		Invitación a participar en Mer Link	1 día	mié 15/06/16	mié 15/06/16	701
703		Plazo para recibir ofertas	17 días	jue 16/06/16	lun 11/07/16	702
704		**Recurso de Objeción al Cartel**	**16,86 días**	**jue 16/06/16**	**lun 11/07/16**	
705		Presentacion de Objeción al cartel	5 días	jue 16/06/16	mié 22/06/16	702
706		Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	jue 23/06/16	vie 24/06/16	705
707		Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	vie 24/06/16	lun 27/06/16	706
708		Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	lun 27/06/16	lun 04/07/16	707
709		Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	lun 04/07/16	vie 08/07/16	708
710		Comunicación de Resolución final	1 día	vie 08/07/16	lun 11/07/16	709
711		Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	jue 23/06/16	lun 11/07/16	705
712		**Recepción y estudio de ofertas**	**32,82 días**	**lun 11/07/16**	**mar 30/08/1**	
713		Apertura de ofertas	1 día	lun 11/07/16	lun 11/07/16	711
714		Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (lega	1 día	mar 12/07/16	mar 12/07/16	713
715		Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respu	13 días	mié 13/07/16	lun 01/08/16	714
716		Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado e	1 día	mié 03/08/16	mié 03/08/16	715
717		Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenci	1 día	jue 04/08/16	vie 05/08/16	716
718		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En l	5 días	vie 05/08/16	jue 11/08/16	717
719		Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	jue 11/08/16	jue 11/08/16	718
720		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	vie 12/08/16	mié 17/08/16	719
721		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	jue 18/08/16	mar 23/08/16	720
722		Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	mar 23/08/16	mar 23/08/16	721
723		Elaboración de Informe de recomendación	5 días	mar 23/08/16	mar 30/08/16	722
724		**Proceso de adjudicación**	**34 días**	**mar 12/07/1**	**jue 01/09/16**	
725		Fecha máxima para adjudicar	34 días	mar 12/07/16	jue 01/09/16	713
726		**Recomendación, adjudicación y comunicación**	**10,92 días**	**jue 01/09/16**	**lun 19/09/16**	
727		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	jue 01/09/16	mar 06/09/16	725
728		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mar 06/09/16	mar 06/09/16	727
729		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mar 06/09/16	mar 06/09/16	728
730		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mar 06/09/16	mié 07/09/16	729
731		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	jue 08/09/16	vie 09/09/16	730

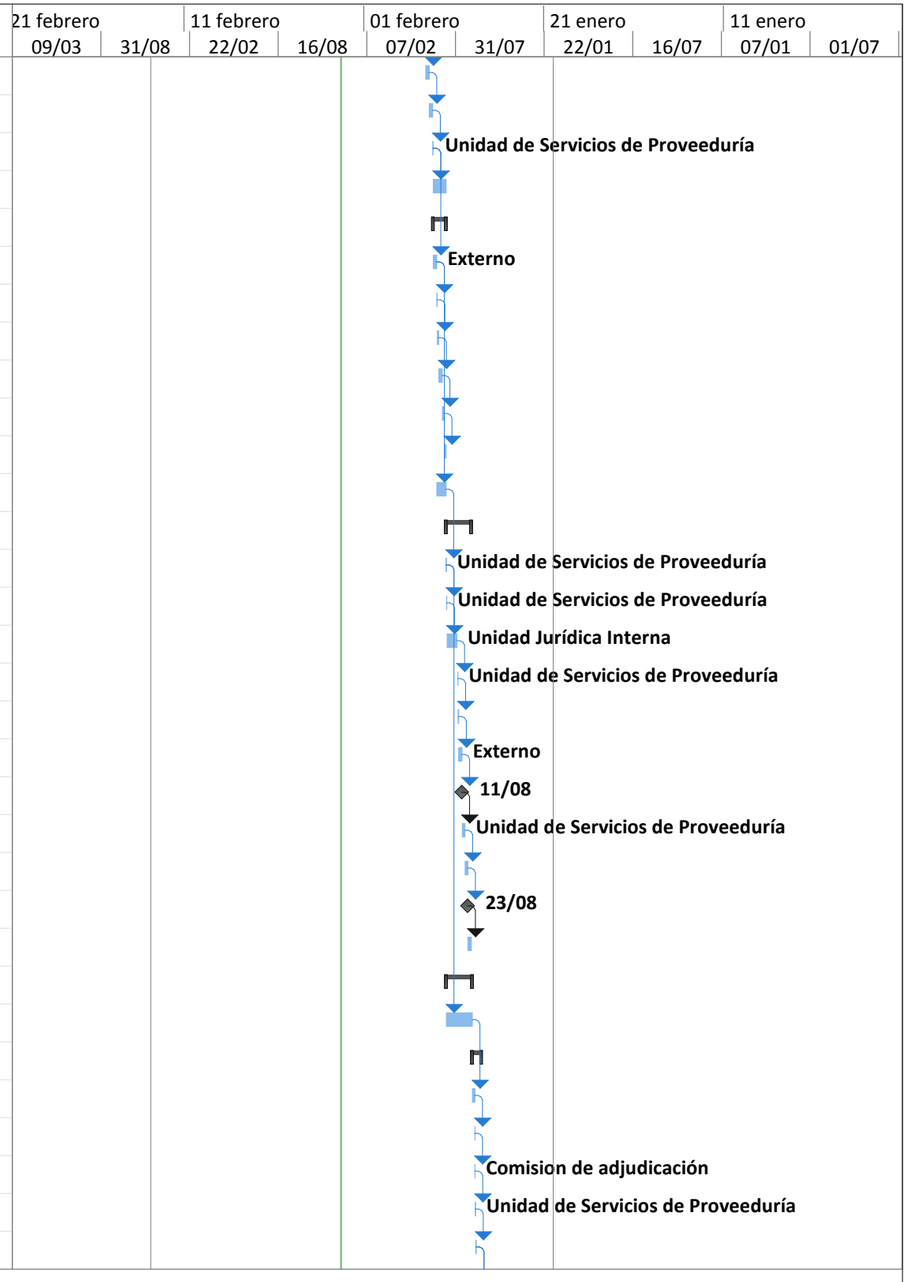

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
732		Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	vie 09/09/16	lun 19/09/16	731
733		**Recurso de revocatoria**	**35,8 días**	**vie 09/09/16**	**mar 01/11/1**	
734		Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	vie 09/09/16	vie 16/09/16	731
735		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisib	2 días	lun 19/09/16	mié 21/09/1(	734
736		Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	mié 21/09/1(	mié 21/09/1(	735
737		Plazo para recibir respuesta del adjuducatario (Art N°186 RLCA)	3 días	mié 21/09/1(	lun 26/09/16	736
738		Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Art N°187 RLCA)	15 días	lun 26/09/16	mar 18/10/1(	737
739		Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	mar 18/10/1(	mar 18/10/1(	738
740		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	5 días	mar 18/10/1(	mar 25/10/1(	739
741		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mar 25/10/1(	mar 25/10/1(	740
742		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudic	0,5 días	mar 25/10/1(	mar 25/10/1(	741
743		Adjudicación en firme	5 días	mar 25/10/1(	mar 01/11/1(	734,742
744		**Trámite de contrato**	**16 días**	**mar 25/10/1**	**mié 16/11/1(**	
745		Elaboración del Contrato	5 días	mar 25/10/1(	mar 01/11/1(	741
746		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	mar 25/10/1(	mar 25/10/1(	745CC
747		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía	5 días	mar 25/10/1(	mar 01/11/1(	746
748		Firma de contrato oferente	1 día	mar 01/11/1(	mié 02/11/1(	747
749		Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	0 días	mié 02/11/1(	mié 02/11/1(	748
750		Firma de contrato Despacho Contralor	5 días	mié 02/11/1(	mié 09/11/1(	749
751		Envío de contrato a aprobación interna	0 días	mié 09/11/1(	mié 09/11/1(	748,750
752		Aprobacion Interna de Contrato	5 días	mié 09/11/1(	mié 16/11/1(	751
753		Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	mié 16/11/1(	mié 16/11/1(	752
754		**Trámite del Pedido**	**3 días**	**mié 16/11/1(**	**lun 21/11/16**	
755		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	mié 16/11/1(	vie 18/11/16	752
756		Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	vie 18/11/16	vie 18/11/16	755
757		Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	vie 18/11/16	lun 21/11/16	756
758		Notificación de Pedido de Compra	0 días	lun 21/11/16	lun 21/11/16	756,757
759		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	lun 21/11/16	lun 21/11/16	758
760		**Recepción de los items**	**3,99 días**	**mié 16/11/1(**	**mar 22/11/1**	
761		Entrega items en Almacén	1 día	mié 16/11/1(	jue 17/11/16	752
762		Recibido a satisfacción	3 días	jue 17/11/16	mar 22/11/1(	761
763		Fin recepción de items	0 días	mar 22/11/1(	mar 22/11/1(	762

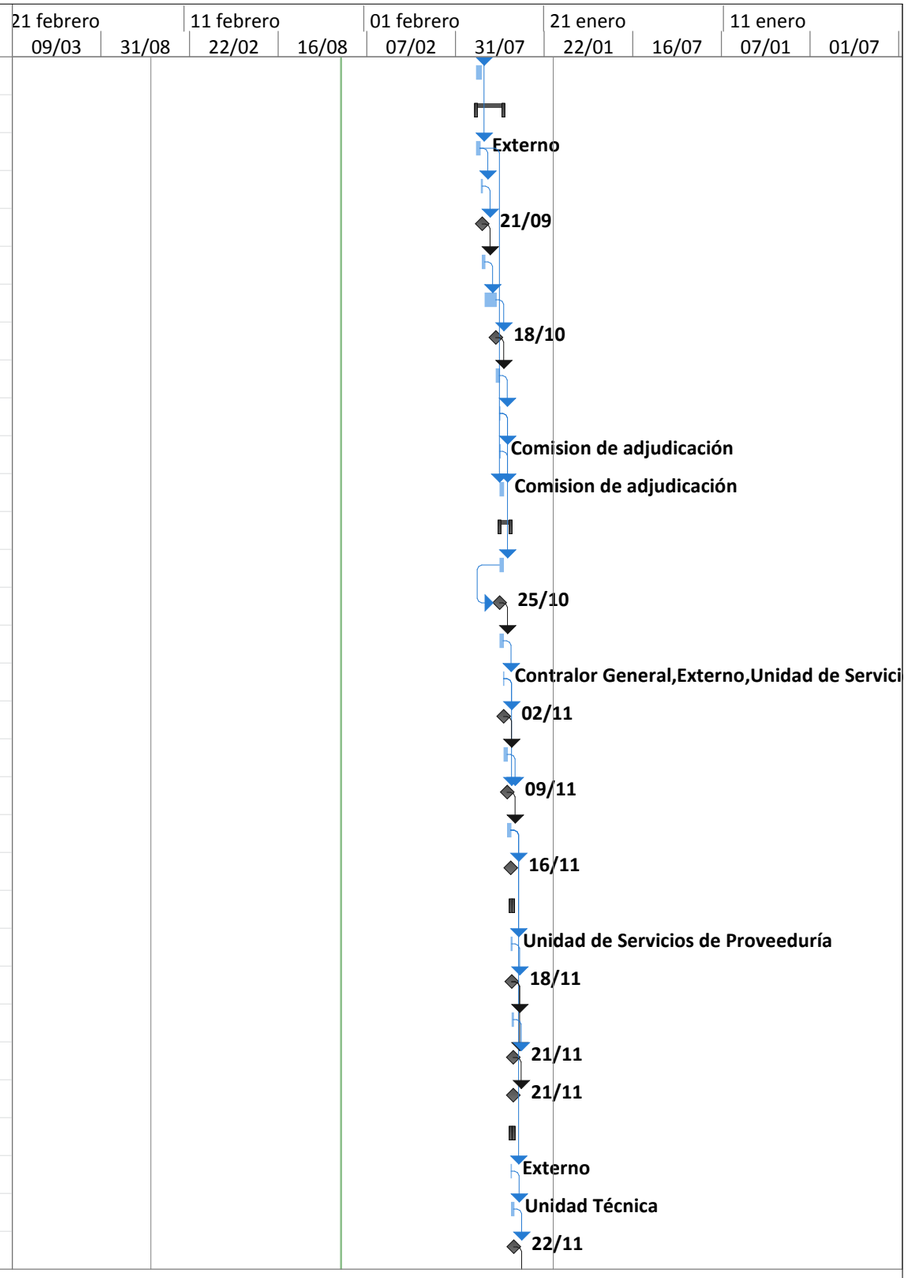

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
764		**Trámite de pago**	**5,99 días**	**mar 22/11/1**	**mié 30/11/1**	
765		Envio documentos a Financiero	1 día	mar 22/11/1	mié 23/11/1	763
766		Emisión de pago en Financiero	5 días	mié 23/11/1	mié 30/11/1	765
767		Conclusión trámite licitación	0 días	mié 30/11/1	mié 30/11/1	766
768		**2016LA-0000008-503 UTI_Reforzamiento de la Plataforma ₡87,370.400,00**	**148,28 días**	**lun 08/02/16**	**vie 09/09/16**	
769		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	lun 08/02/16	lun 08/02/16	
770		**Confección Documento complementario al cartel**	**22,95 días**	**lun 08/02/16**	**mié 09/03/1**	
771		Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 08/02/16	lun 15/02/16	769
772		Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	lun 15/02/16	lun 22/02/16	771
773		Revisión Técnica de cartel	7 días	mar 23/02/1	mié 02/03/1	772
774		Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al ca	5 días	jue 03/03/16	mié 09/03/1	773
775		**Invitación a participar**	**27,98 días**	**jue 10/03/16**	**vie 22/04/16**	
776		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo c	5 días	jue 10/03/16	jue 17/03/16	774
777		Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	jue 17/03/16	lun 28/03/16	776
778		Invitación a participar en Mer Link	1 día	lun 28/03/16	lun 28/03/16	777
779		Plazo para recibir ofertas	17 días	mar 29/03/1	vie 22/04/16	778
780		**Recurso de Objeción al Cartel**	**16,86 días**	**mar 29/03/1**	**vie 22/04/16**	
781		Presentacion de Objeción al cartel	5 días	mar 29/03/1	lun 04/04/16	778
782		Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	mar 05/04/1	mié 06/04/1	781
783		Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	mié 06/04/1	jue 07/04/16	782
784		Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	jue 07/04/16	vie 15/04/16	783
785		Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	vie 15/04/16	jue 21/04/16	784
786		Comunicación de Resolución final	1 día	jue 21/04/16	vie 22/04/16	785
787		Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	mar 05/04/1	vie 22/04/16	781
788		**Recepción y estudio de ofertas**	**32,82 días**	**vie 22/04/16**	**mié 08/06/1**	
789		Apertura de ofertas	1 día	vie 22/04/16	vie 22/04/16	787
790		Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (lega	1 día	lun 25/04/16	lun 25/04/16	789
791		Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respu	13 días	mar 26/04/1	jue 12/05/16	790
792		Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado e	1 día	vie 13/05/16	vie 13/05/16	791
793		Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenci	1 día	lun 16/05/16	mar 17/05/1	792
794		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En l	5 días	mar 17/05/1	lun 23/05/16	793
795		Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	lun 23/05/16	lun 23/05/16	794

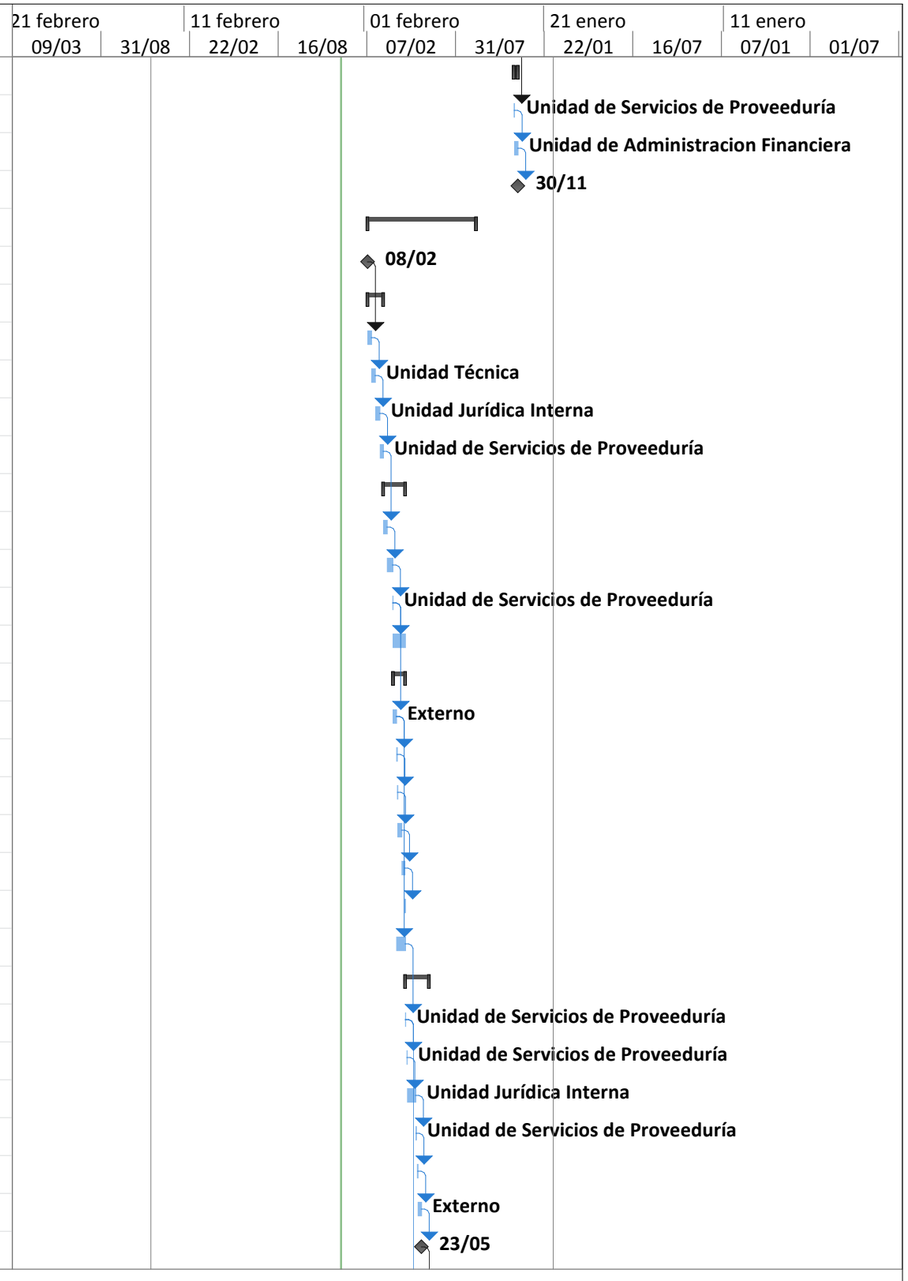

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
796		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mar 24/05/16	jue 26/05/16	795
797		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	vie 27/05/16	mié 01/06/16	796
798		Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	mié 01/06/16	mié 01/06/16	797
799		Elaboración de Informe de recomendación	5 días	mié 01/06/16	mié 08/06/16	798
800		**proceso de adjudicación**	**34 días**	**lun 25/04/16**	**vie 10/06/16**	
801		Fecha máxima para adjudicar	34 días	lun 25/04/16	vie 10/06/16	789
802		**Recomendación, adjudicación y comunicación**	**5,92 días**	**vie 10/06/16**	**lun 20/06/16**	
803		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	vie 10/06/16	mié 15/06/16	801
804		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 15/06/16	mié 15/06/16	803
805		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 15/06/16	mié 15/06/16	804
806		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mié 15/06/16	jue 16/06/16	805
807		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	vie 17/06/16	lun 20/06/16	806
808		**Proceso de adjudicación**	**5 días**	**lun 20/06/16**	**lun 27/06/16**	
809		Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	lun 20/06/16	lun 27/06/16	807
810		**Recurso de revocatoria**	**35,8 días**	**lun 20/06/16**	**mié 10/08/16**	
811		Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	lun 20/06/16	vie 24/06/16	807
812		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisib	2 días	lun 27/06/16	mié 29/06/16	811
813		Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	mié 29/06/16	mié 29/06/16	812
814		Plazo para recibir respuesta del adjuducatario (Art N°186 RLCA)	3 días	mié 29/06/16	lun 04/07/16	813
815		Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Art N°187 RLCA)	15 días	lun 04/07/16	mar 26/07/16	814
816		Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	mar 26/07/16	mar 26/07/16	815
817		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	5 días	mar 26/07/16	mié 03/08/16	816
818		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mié 03/08/16	mié 03/08/16	817
819		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudic	0,5 días	mié 03/08/16	mié 03/08/16	818
820		Adjudicación en firme	5 días	mié 03/08/16	mié 10/08/16	811,819
821		**Trámite de contrato**	**16 días**	**mié 03/08/16**	**vie 26/08/16**	
822		Elaboración del Contrato	5 días	mié 03/08/16	mié 10/08/16	818
823		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	mié 03/08/16	mié 03/08/16	822CC
824		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía	5 días	mié 03/08/16	mié 10/08/16	823
825		Firma de contrato oferente	1 día	mié 10/08/16	jue 11/08/16	824
826		Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	0 días	jue 11/08/16	jue 11/08/16	825
827		Firma de contrato Despacho Contralor	5 días	jue 11/08/16	vie 19/08/16	826

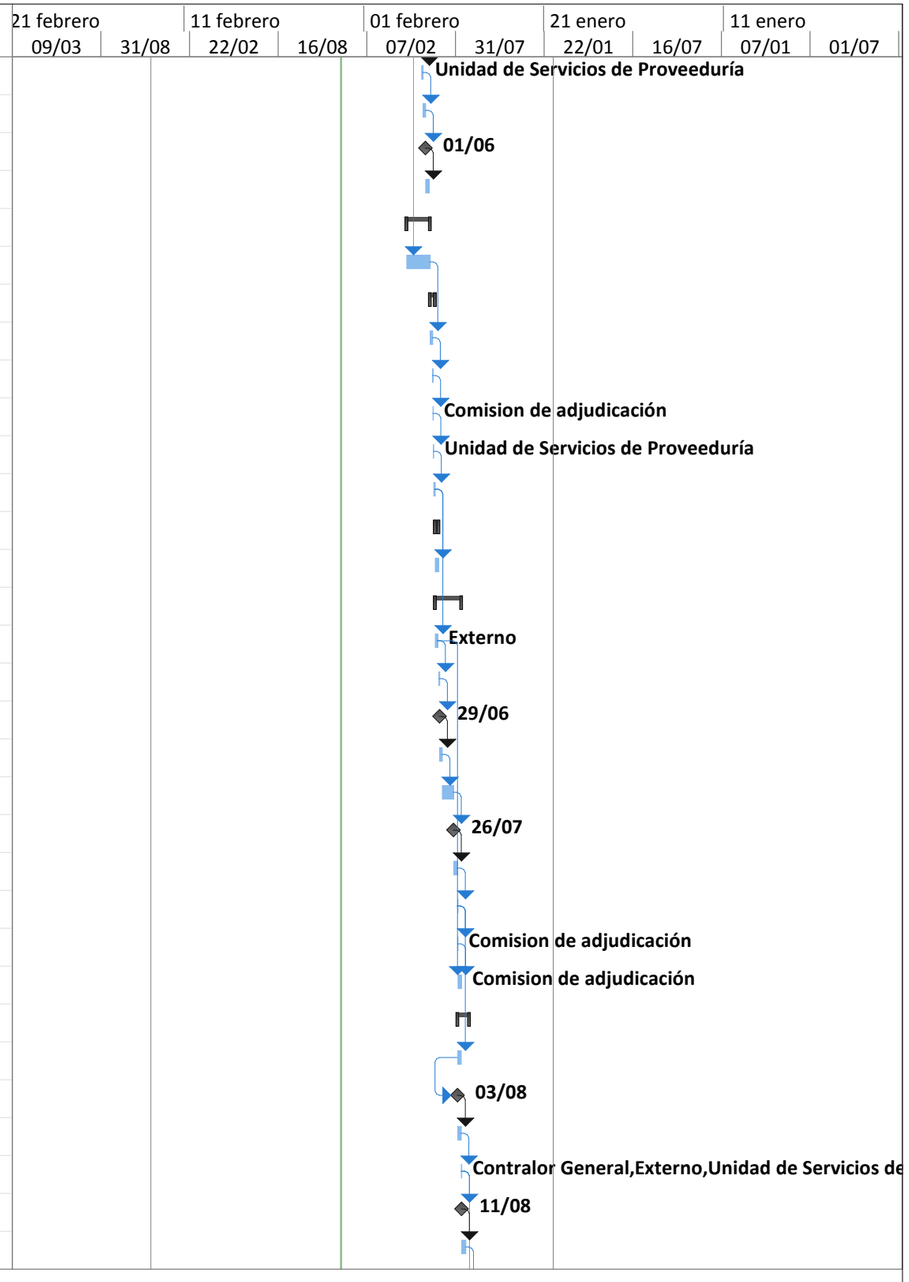

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
828		Envío de contrato a aprobación interna	0 días	vie 19/08/16	vie 19/08/16	825,827
829		Aprobacion Interna de Contrato	5 días	vie 19/08/16	vie 26/08/16	828
830		Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	vie 26/08/16	vie 26/08/16	829
831		**Trámite del Pedido**	**3 días**	**vie 26/08/16**	**mié 31/08/1(**	
832		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	vie 26/08/16	mar 30/08/1(	829
833		Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	mar 30/08/1(	mar 30/08/1(	832
834		Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	mar 30/08/1(	mié 31/08/16	833
835		Notificación de Pedido de Compra	0 días	mié 31/08/16	mié 31/08/16	833,834
836		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mié 31/08/16	mié 31/08/16	835
837		**Recepción de los items**	**3,99 días**	**vie 26/08/16**	**jue 01/09/16**	
838		Entrega items en Almacén	1 día	vie 26/08/16	lun 29/08/16	829
839		Recibido a satisfacción	3 días	lun 29/08/16	jue 01/09/16	838
840		Fin recepción de items	0 días	jue 01/09/16	jue 01/09/16	839
841		**Trámite de pago**	**5,99 días**	**jue 01/09/16**	**vie 09/09/16**	
842		Envio documentos a Financiero	1 día	jue 01/09/16	vie 02/09/16	840
843		Emisión de pago en Financiero	5 días	vie 02/09/16	vie 09/09/16	842
844		Conclusión trámite licitación	0 días	vie 09/09/16	vie 09/09/16	843
845		**2016LA-0000009-503 UTI Mantenimiento de 409 computadoras (Contrato vence el 31/08/16)" ₡12,005,000,00**	**148,28 días**	**lun 15/02/16**	**lun 19/09/16**	
846		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	lun 15/02/16	lun 15/02/16	
847		**Confección Documento complementario al cartel**	**22,95 días**	**lun 15/02/16**	**mié 16/03/1(**	
848		Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 15/02/16	lun 22/02/16	846
849		Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	lun 22/02/16	lun 29/02/16	848
850		Revisión Técnica de cartel	7 días	mar 01/03/1(	mié 09/03/16	849
851		Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al ca	5 días	jue 10/03/16	mié 16/03/16	850
852		**Invitación a participar**	**27,98 días**	**jue 17/03/16**	**vie 29/04/16**	
853		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo c	5 días	jue 17/03/16	lun 28/03/16	851
854		Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	lun 28/03/16	lun 04/04/16	853
855		Invitación a participar en Mer Link	1 día	lun 04/04/16	lun 04/04/16	854
856		Plazo para recibir ofertas	17 días	mar 05/04/1(	vie 29/04/16	855
857		**Recurso de Objeción al Cartel**	**16,86 días**	**mar 05/04/1**	**vie 29/04/16**	
858		Presentacion de Objeción al cartel	5 días	mar 05/04/1(	mar 12/04/1(	855

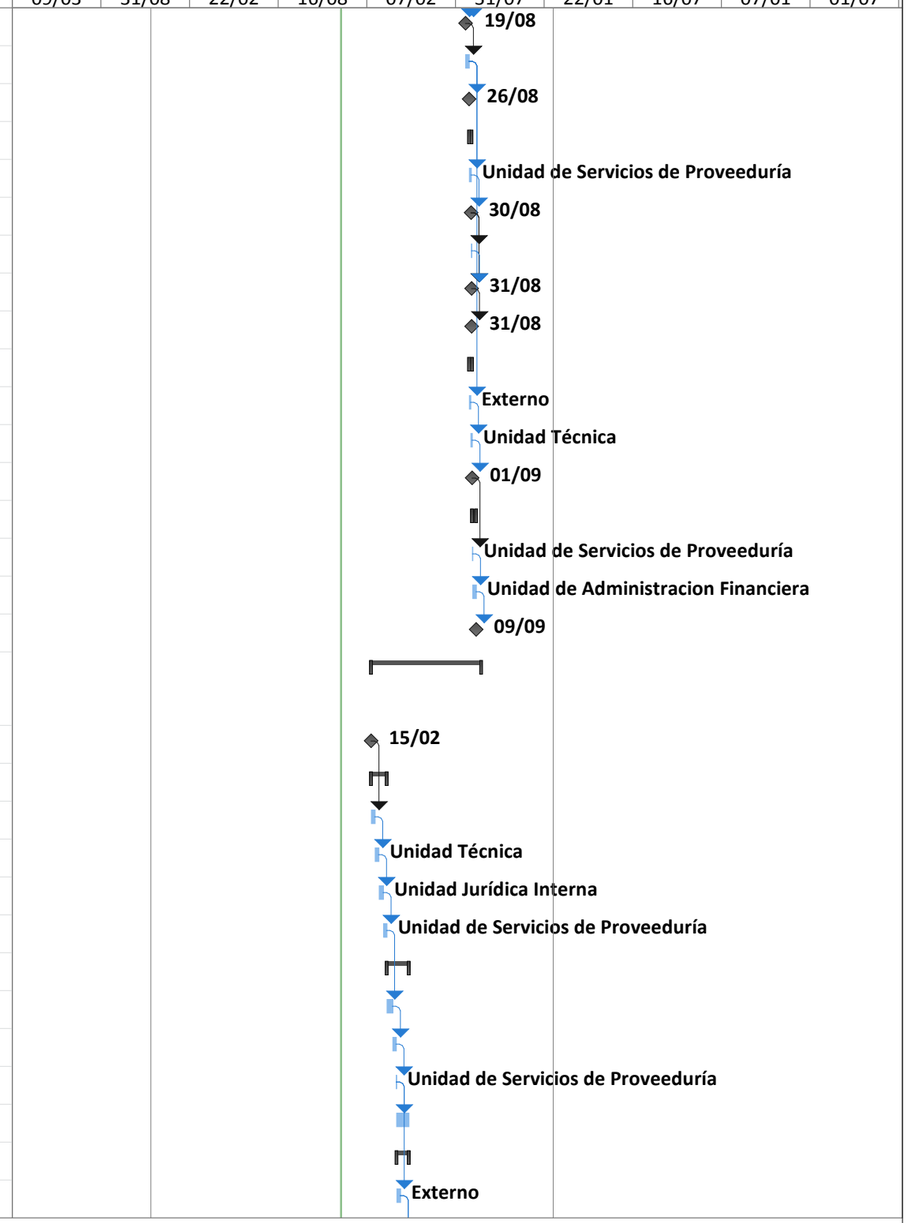

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
859		Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	mié 13/04/16	jue 14/04/16	858
860		Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	jue 14/04/16	vie 15/04/16	859
861		Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	vie 15/04/16	vie 22/04/16	860
862		Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	vie 22/04/16	jue 28/04/16	861
863		Comunicación de Resolución final	1 día	jue 28/04/16	vie 29/04/16	862
864		Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	mié 13/04/16	vie 29/04/16	858
865		**Recepción y estudio de ofertas**	**32,82 días**	**vie 29/04/16**	**mié 15/06/16**	
866		Apertura de ofertas	1 día	vie 29/04/16	vie 29/04/16	864
867		Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (lega	1 día	lun 02/05/16	lun 02/05/16	866
868		Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respu	13 días	mar 03/05/16	jue 19/05/16	867
869		Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado e	1 día	vie 20/05/16	vie 20/05/16	868
870		Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenci	1 día	lun 23/05/16	mar 24/05/16	869
871		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En l	5 días	mar 24/05/16	lun 30/05/16	870
872		Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	lun 30/05/16	lun 30/05/16	871
873		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mar 31/05/16	jue 02/06/16	872
874		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	vie 03/06/16	mié 08/06/16	873
875		Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	mié 08/06/16	mié 08/06/16	874
876		Elaboración de Informe de recomendación	5 días	mié 08/06/16	mié 15/06/16	875
877		**Proceso de adjudicación**	**34 días**	**lun 02/05/16**	**vie 17/06/16**	
878		Fecha máxima para adjudicar	34 días	lun 02/05/16	vie 17/06/16	866
879		**Recomendación, adjudicación y comunicación**	**10,92 días**	**vie 17/06/16**	**lun 04/07/16**	
880		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	vie 17/06/16	mié 22/06/16	878
881		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 22/06/16	mié 22/06/16	880
882		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 22/06/16	mié 22/06/16	881
883		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mié 22/06/16	jue 23/06/16	882
884		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	vie 24/06/16	lun 27/06/16	883
885		Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	lun 27/06/16	lun 04/07/16	884
886		**Recurso de revocatoria**	**35,8 días**	**lun 27/06/16**	**jue 18/08/16**	
887		Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	lun 27/06/16	vie 01/07/16	884
888		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisib	2 días	lun 04/07/16	mié 06/07/16	887
889		Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	mié 06/07/16	mié 06/07/16	888
890		Plazo para recibir respuesta del adjuducatario (Art N°186 RLCA)	3 días	mié 06/07/16	lun 11/07/16	889

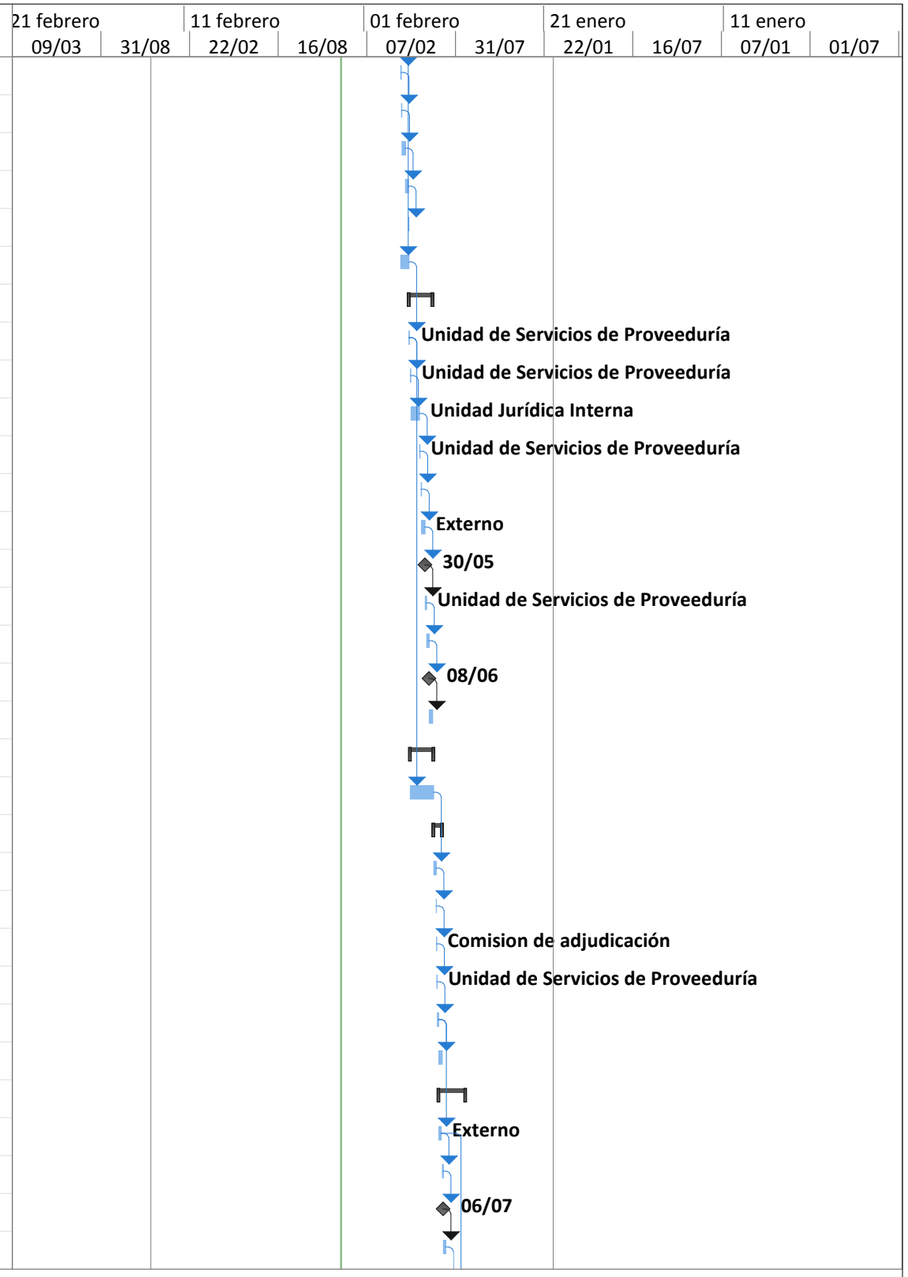

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
891		Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Art N°187 RLCA)	15 días	lun 11/07/16	mié 03/08/16	890
892		Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	mié 03/08/16	mié 03/08/16	891
893		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	5 días	mié 03/08/16	mié 10/08/16	892
894		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mié 10/08/16	mié 10/08/16	893
895		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudic	0,5 días	mié 10/08/16	mié 10/08/16	894
896		Adjudicación en firme	5 días	mié 10/08/16	jue 18/08/16	887,895
897		**Trámite de contrato**	**16 días**	**mié 10/08/16**	**vie 02/09/16**	
898		Elaboración del Contrato	5 días	mié 10/08/16	jue 18/08/16	894
899		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	mié 10/08/16	mié 10/08/16	898CC
900		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía	5 días	mié 10/08/16	jue 18/08/16	899
901		Firma de contrato oferente	1 día	jue 18/08/16	vie 19/08/16	900
902		Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	0 días	vie 19/08/16	vie 19/08/16	901
903		Firma de contrato Despacho Contralor	5 días	vie 19/08/16	vie 26/08/16	902
904		Envío de contrato a aprobación interna	0 días	vie 26/08/16	vie 26/08/16	901,903
905		Aprobacion Interna de Contrato	5 días	vie 26/08/16	vie 02/09/16	904
906		Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	vie 02/09/16	vie 02/09/16	905
907		**Trámite del Pedido**	**3 días**	**vie 02/09/16**	**mié 07/09/16**	
908		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	vie 02/09/16	mar 06/09/16	905
909		Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	mar 06/09/16	mar 06/09/16	908
910		Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	mar 06/09/16	mié 07/09/16	909
911		Notificación de Pedido de Compra	0 días	mié 07/09/16	mié 07/09/16	909,910
912		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mié 07/09/16	mié 07/09/16	911
913		**Recepción de los items**	**3,99 días**	**vie 02/09/16**	**jue 08/09/16**	
914		Entrega items en Almacén	1 día	vie 02/09/16	lun 05/09/16	905
915		Recibido a satisfacción	3 días	lun 05/09/16	jue 08/09/16	914
916		Fin recepción de items	0 días	jue 08/09/16	jue 08/09/16	915
917		**Trámite de pago**	**5,99 días**	**jue 08/09/16**	**lun 19/09/16**	
918		Envio documentos a Financiero	1 día	jue 08/09/16	vie 09/09/16	916
919		Emisión de pago en Financiero	5 días	vie 09/09/16	lun 19/09/16	918
920		Conclusión trámite licitación	0 días	lun 19/09/16	lun 19/09/16	919
921		**2016LA-0000010-503 UTI_Ofimática y Servicios en la nube (Contratación al 01/11/16) ₡35,021,100,00**	**148,28 días**	**lun 14/03/16**	**mar 18/10/16**	

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
922		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	lun 14/03/16	lun 14/03/16	
923		**Confección Documento complementario al cartel**	**22,95 días**	**lun 14/03/16**	**lun 18/04/16**	
924		Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 14/03/16	lun 21/03/16	922
925		Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	lun 21/03/16	mié 30/03/16	924
926		Revisión Técnica de cartel	7 días	jue 31/03/16	vie 08/04/16	925
927		Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al ca	5 días	mar 12/04/16	lun 18/04/16	926
928		**Invitación a participar**	**27,98 días**	**mar 19/04/1**	**vie 27/05/16**	
929		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo c	5 días	mar 19/04/16	mar 26/04/16	927
930		Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	mar 26/04/16	mar 03/05/16	929
931		Invitación a participar en Mer Link	1 día	mar 03/05/16	mar 03/05/16	930
932		Plazo para recibir ofertas	17 días	mié 04/05/16	vie 27/05/16	931
933		**Recurso de Objeción al Cartel**	**16,86 días**	**mié 04/05/1**	**vie 27/05/16**	
934		Presentacion de Objeción al cartel	5 días	mié 04/05/16	mar 10/05/16	931
935		Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	mié 11/05/16	jue 12/05/16	934
936		Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	jue 12/05/16	vie 13/05/16	935
937		Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	vie 13/05/16	vie 20/05/16	936
938		Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	vie 20/05/16	jue 26/05/16	937
939		Comunicación de Resolución final	1 día	jue 26/05/16	vie 27/05/16	938
940		Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	mié 11/05/16	vie 27/05/16	934
941		**Recepción y estudio de ofertas**	**32,82 días**	**vie 27/05/16**	**mié 13/07/1**	
942		Apertura de ofertas	1 día	vie 27/05/16	vie 27/05/16	940
943		Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (lega	1 día	lun 30/05/16	lun 30/05/16	942
944		Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respu	13 días	mar 31/05/16	jue 16/06/16	943
945		Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado e	1 día	vie 17/06/16	vie 17/06/16	944
946		Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenci	1 día	lun 20/06/16	mar 21/06/16	945
947		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En l	5 días	mar 21/06/16	lun 27/06/16	946
948		Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	lun 27/06/16	lun 27/06/16	947
949		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mar 28/06/16	jue 30/06/16	948
950		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	vie 01/07/16	mié 06/07/16	949
951		Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	mié 06/07/16	mié 06/07/16	950
952		Elaboración de Informe de recomendación	5 días	mié 06/07/16	mié 13/07/16	951
953		**Proceso de adjudicación**	**34 días**	**lun 30/05/16**	**vie 15/07/16**	

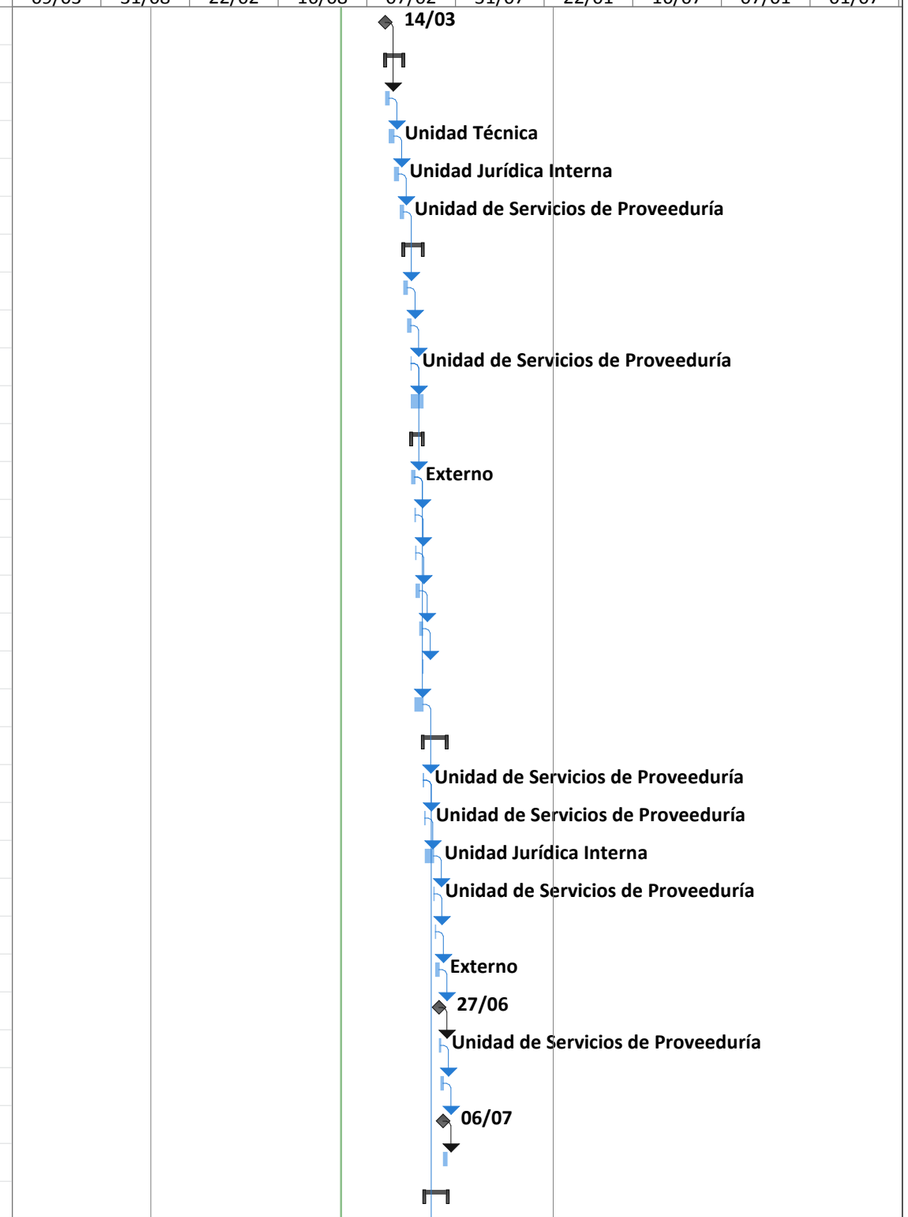

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
954		Fecha máxima para adjudicar	34 días	lun 30/05/16	vie 15/07/16	942
955		**Recomendación, adjudicación y comunicación**	**10,92 días**	**vie 15/07/16**	**mié 03/08/1(**	
956		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	vie 15/07/16	mié 20/07/1(	954
957		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 20/07/1(	mié 20/07/1(	956
958		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 20/07/1(	mié 20/07/1(	957
959		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mié 20/07/1(	jue 21/07/16	958
960		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	vie 22/07/16	mar 26/07/1(	959
961		Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	mar 26/07/1(	mié 03/08/1(	960
962		**Recurso de revocatoria**	**35,8 días**	**mar 26/07/1**	**vie 16/09/16**	
963		Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	mar 26/07/1(	lun 01/08/16	960
964		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisib	2 días	mié 03/08/1(	vie 05/08/16	963
965		Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	vie 05/08/16	vie 05/08/16	964
966		Plazo para recibir respuesta del adjuducatario (Art N°186 RLCA)	3 días	vie 05/08/16	mié 10/08/1(	965
967		Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Art N°187 RLCA)	15 días	mié 10/08/1(	jue 01/09/16	966
968		Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	jue 01/09/16	jue 01/09/16	967
969		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	5 días	jue 01/09/16	jue 08/09/16	968
970		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	jue 08/09/16	jue 08/09/16	969
971		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudic	0,5 días	jue 08/09/16	jue 08/09/16	970
972		Adjudicación en firme	5 días	jue 08/09/16	vie 16/09/16	963,971
973		**Trámite de contrato**	**16 días**	**jue 08/09/16**	**lun 03/10/16**	
974		Elaboración del Contrato	5 días	jue 08/09/16	vie 16/09/16	970
975		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	jue 08/09/16	jue 08/09/16	974CC
976		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía	5 días	jue 08/09/16	vie 16/09/16	975
977		Firma de contrato oferente	1 día	vie 16/09/16	lun 19/09/16	976
978		Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	0 días	lun 19/09/16	lun 19/09/16	977
979		Firma de contrato Despacho Contralor	5 días	lun 19/09/16	lun 26/09/16	978
980		Envío de contrato a aprobación interna	0 días	lun 26/09/16	lun 26/09/16	977,979
981		Aprobacion Interna de Contrato	5 días	lun 26/09/16	lun 03/10/16	980
982		Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	lun 03/10/16	lun 03/10/16	981
983		**Trámite del Pedido**	**3 días**	**lun 03/10/16**	**jue 06/10/16**	
984		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	lun 03/10/16	mié 05/10/1(	981
985		Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	mié 05/10/1(	mié 05/10/1(	984

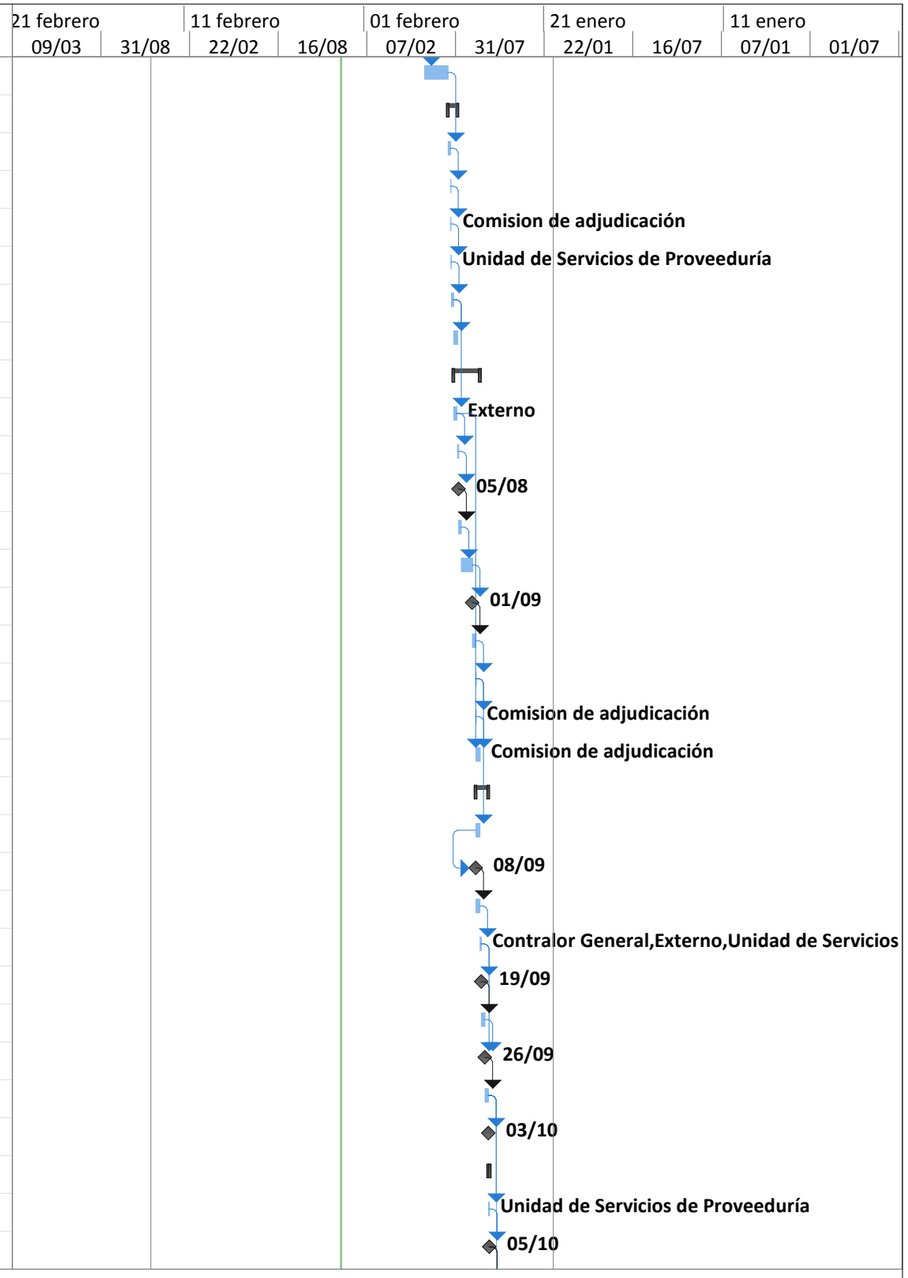

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
986		Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	mié 05/10/16	jue 06/10/16	985
987		Notificación de Pedido de Compra	0 días	jue 06/10/16	jue 06/10/16	985,986
988		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	jue 06/10/16	jue 06/10/16	987
989		**Recepción de los items**	**3,99 días**	**lun 03/10/16**	**vie 07/10/16**	
990		Entrega items en Almacén	1 día	lun 03/10/16	mar 04/10/16	981
991		Recibido a satisfacción	3 días	mar 04/10/16	vie 07/10/16	990
992		Fin recepción de items	0 días	vie 07/10/16	vie 07/10/16	991
993		**Trámite de pago**	**5,99 días**	**vie 07/10/16**	**mar 18/10/1**	
994		Envio documentos a Financiero	1 día	vie 07/10/16	lun 10/10/16	992
995		Emisión de pago en Financiero	5 días	lun 10/10/16	mar 18/10/16	994
996		Conclusión trámite licitación	0 días	mar 18/10/16	mar 18/10/16	995
997		**2016LA-0000011-503 UTI_Reparaciones de equipos según demanda ₡7,100,00**	**148,28 días**	**lun 25/04/16**	**jue 24/11/16**	
998		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	lun 25/04/16	lun 25/04/16	
999		**Confección Documento complementario al cartel**	**22,95 días**	**lun 25/04/16**	**mié 25/05/16**	
1000		Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 25/04/16	lun 02/05/16	998
1001		Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	lun 02/05/16	lun 09/05/16	1000
1002		Revisión Técnica de cartel	7 días	mar 10/05/16	mié 18/05/16	1001
1003		Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al ca	5 días	jue 19/05/16	mié 25/05/16	1002
1004		**Invitación a participar**	**27,98 días**	**jue 26/05/16**	**mar 05/07/1**	
1005		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo c	5 días	jue 26/05/16	jue 02/06/16	1003
1006		Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	jue 02/06/16	jue 09/06/16	1005
1007		Invitación a participar en Mer Link	1 día	jue 09/06/16	jue 09/06/16	1006
1008		Plazo para recibir ofertas	17 días	vie 10/06/16	mar 05/07/16	1007
1009		**Recurso de Objeción al Cartel**	**16,86 días**	**vie 10/06/16**	**mar 05/07/1**	
1010		Presentacion de Objeción al cartel	5 días	vie 10/06/16	jue 16/06/16	1007
1011		Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	vie 17/06/16	lun 20/06/16	1010
1012		Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	lun 20/06/16	mar 21/06/16	1011
1013		Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	mar 21/06/16	mar 28/06/16	1012
1014		Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	mar 28/06/16	lun 04/07/16	1013
1015		Comunicación de Resolución final	1 día	lun 04/07/16	mar 05/07/16	1014
1016		Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	vie 17/06/16	mar 05/07/16	1010
1017		**Recepción y estudio de ofertas**	**32,82 días**	**mar 05/07/1**	**mié 24/08/16**	

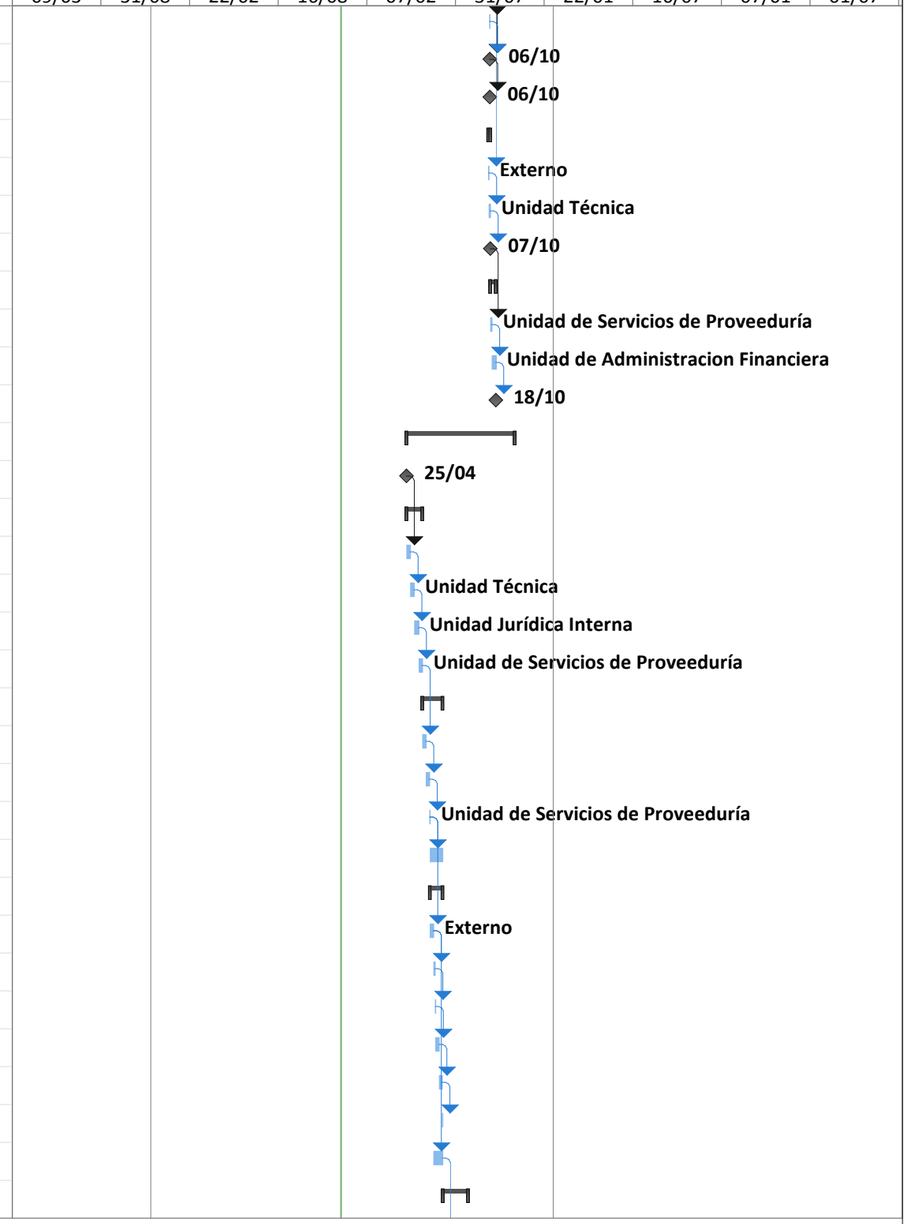

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1018		Apertura de ofertas	1 día	mar 05/07/1	mar 05/07/1	1016
1019		Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (lega	1 día	mié 06/07/1	mié 06/07/1	1018
1020		Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respu	13 días	jue 07/07/16	mar 26/07/1	1019
1021		Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado e	1 día	mié 27/07/1	mié 27/07/1	1020
1022		Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenci	1 día	jue 28/07/16	vie 29/07/16	1021
1023		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En l	5 días	vie 29/07/16	vie 05/08/16	1022
1024		Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	vie 05/08/16	vie 05/08/16	1023
1025		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	lun 08/08/16	mié 10/08/1	1024
1026		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	jue 11/08/16	mié 17/08/1	1025
1027		Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	mié 17/08/1	mié 17/08/1	1026
1028		Elaboración de Informe de recomendación	5 días	mié 17/08/1	mié 24/08/1	1027
1029		**Proceso de adjudicación**	**34 días**	**mié 06/07/1**	**vie 26/08/16**	
1030		Fecha máxima para adjudicar	34 días	mié 06/07/1	vie 26/08/16	1018
1031		**Recomendación, adjudicación y comunicación**	**10,92 días**	**vie 26/08/16**	**lun 12/09/16**	
1032		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	vie 26/08/16	mié 31/08/1	1030
1033		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 31/08/1	mié 31/08/1	1032
1034		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 31/08/1	mié 31/08/1	1033
1035		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mié 31/08/1	jue 01/09/16	1034
1036		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	vie 02/09/16	lun 05/09/16	1035
1037		Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	lun 05/09/16	lun 12/09/16	1036
1038		**Recurso de revocatoria**	**35,8 días**	**lun 05/09/16**	**mié 26/10/1**	
1039		Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	lun 05/09/16	vie 09/09/16	1036
1040		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisib	2 días	lun 12/09/16	mié 14/09/1	1039
1041		Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	mié 14/09/1	mié 14/09/1	1040
1042		Plazo para recibir respuesta del adjuducatario (Art N°186 RLCA)	3 días	mié 14/09/1	mar 20/09/1	1041
1043		Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Art N°187 RLCA)	15 días	mar 20/09/1	mar 11/10/1	1042
1044		Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	mar 11/10/1	mar 11/10/1	1043
1045		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	5 días	mar 11/10/1	mié 19/10/1	1044
1046		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	mié 19/10/1	mié 19/10/1	1045
1047		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudic	0,5 días	mié 19/10/1	mié 19/10/1	1046
1048		Adjudicación en firme	5 días	mié 19/10/1	mié 26/10/1	1039,1047
1049		**Trámite de contrato**	**16 días**	**mié 19/10/1**	**jue 10/11/16**	

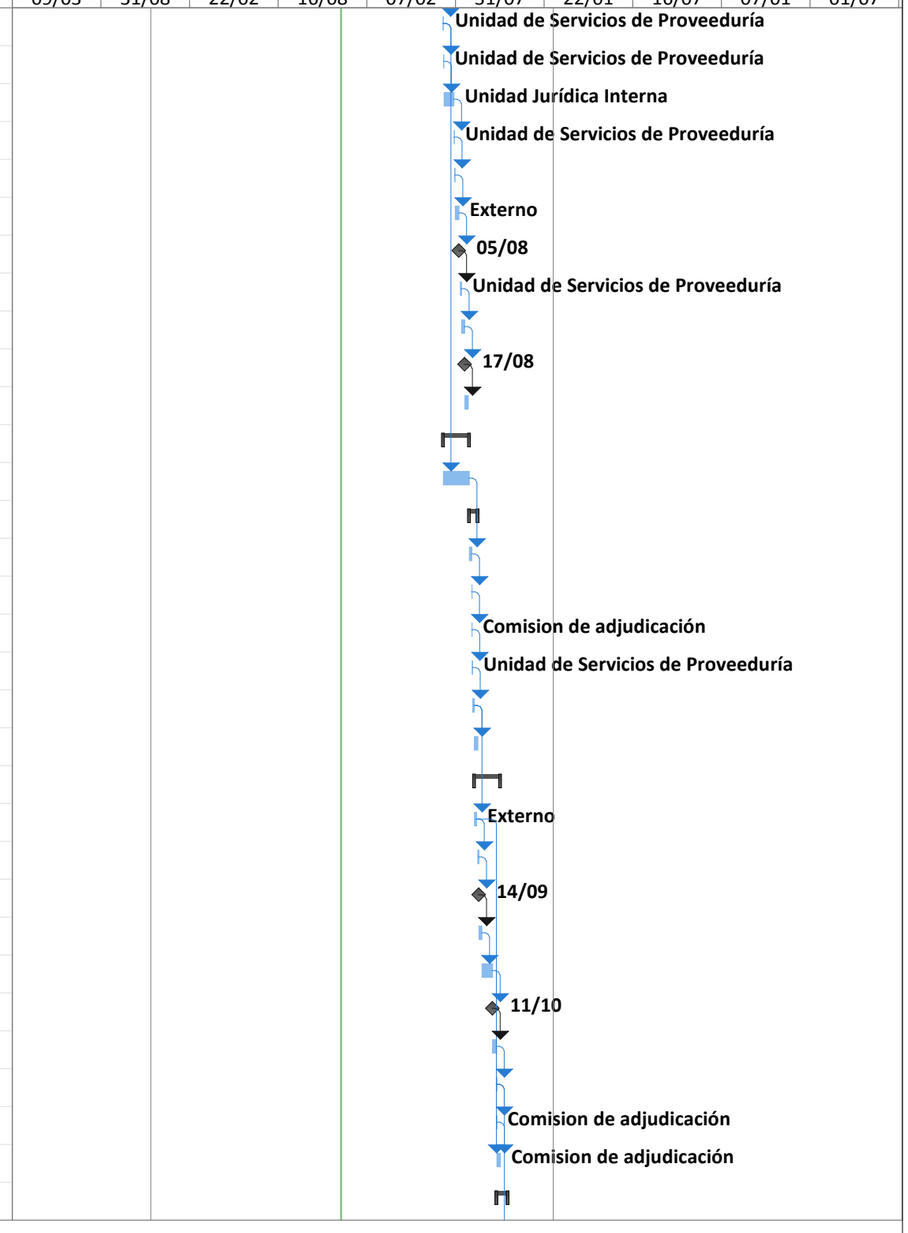

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1050		Elaboración del Contrato	5 días	mié 19/10/16	mié 26/10/16	1046
1051		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	mié 19/10/16	mié 19/10/16	1050CC
1052		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía	5 días	mié 19/10/16	mié 26/10/16	1051
1053		Firma de contrato oferente	1 día	mié 26/10/16	jue 27/10/16	1052
1054		Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	0 días	jue 27/10/16	jue 27/10/16	1053
1055		Firma de contrato Despacho Contralor	5 días	jue 27/10/16	jue 03/11/16	1054
1056		Envío de contrato a aprobación interna	0 días	jue 03/11/16	jue 03/11/16	1053,1055
1057		Aprobacion Interna de Contrato	5 días	jue 03/11/16	jue 10/11/16	1056
1058		Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	jue 10/11/16	jue 10/11/16	1057
1059		**Trámite del Pedido**	**3 días**	**jue 10/11/16**	**mar 15/11/1**	
1060		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	jue 10/11/16	lun 14/11/16	1057
1061		Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	lun 14/11/16	lun 14/11/16	1060
1062		Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	lun 14/11/16	mar 15/11/1	1061
1063		Notificación de Pedido de Compra	0 días	mar 15/11/1	mar 15/11/1	1061,1062
1064		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mar 15/11/1	mar 15/11/1	1063
1065		**Recepción de los items**	**3,99 días**	**jue 10/11/16**	**mié 16/11/1**	
1066		Entrega items en Almacén	1 día	jue 10/11/16	vie 11/11/16	1057
1067		Recibido a satisfacción	3 días	vie 11/11/16	mié 16/11/16	1066
1068		Fin recepción de items	0 días	mié 16/11/16	mié 16/11/16	1067
1069		**Trámite de pago**	**5,99 días**	**mié 16/11/1**	**jue 24/11/16**	
1070		Envio documentos a Financiero	1 día	mié 16/11/16	jue 17/11/16	1068
1071		Emisión de pago en Financiero	5 días	jue 17/11/16	jue 24/11/16	1070
1072		Conclusión trámite licitación	0 días	jue 24/11/16	jue 24/11/16	1071
1073		**CENTRO DE CAPACITACIÓN**	**148,28 días**	**lun 25/01/16**	**vie 26/08/16**	
1074		**2016LA-00000012-503 CC_VII Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública ₡17,500.000,00**	**148,28 días**	**lun 25/01/16**	**vie 26/08/16**	
1075		Envío de especificaciones técnicas y Estudios de mercado	0 días	lun 25/01/16	lun 25/01/16	
1076		**Confección Documento complementario al cartel**	**22,95 días**	**lun 25/01/16**	**mié 24/02/1**	
1077		Elaboración de documento complementario al Cartel	5 días	lun 25/01/16	lun 01/02/16	1075
1078		Revisión Jurídica de cartel UJI	6 días	lun 01/02/16	lun 08/02/16	1077
1079		Revisión Técnica de cartel	7 días	mar 09/02/1	mié 17/02/16	1078
1080		Incorporación de ajustes y confección de documento complementario al ca	5 días	jue 18/02/16	mié 24/02/16	1079

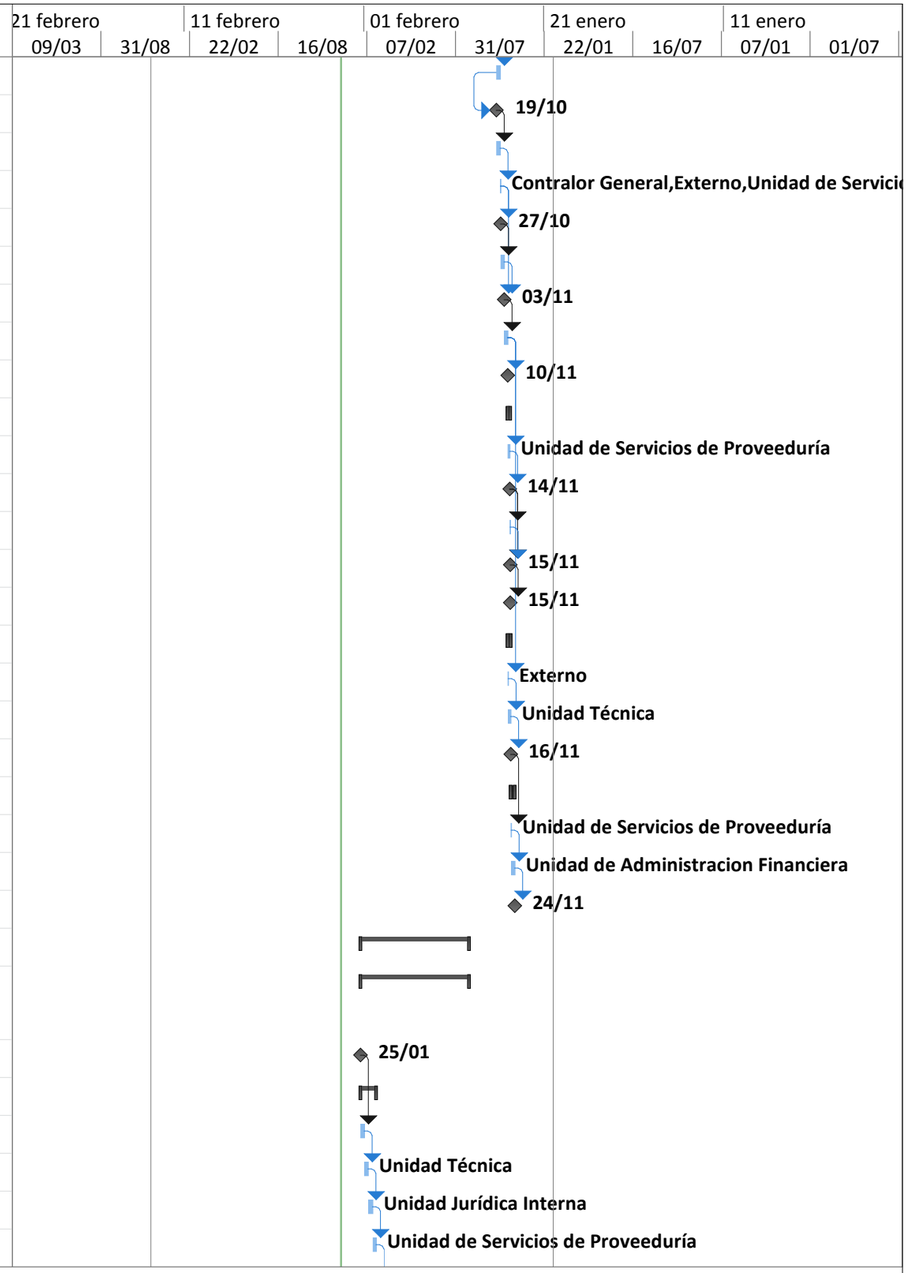

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1081		**Invitación a participar**	**27,98 días**	**jue 25/02/16**	**jue 07/04/16**	
1082		Buscar código de producto / solicitar la creación de códigos en el catálogo c	5 días	jue 25/02/16	jue 03/03/16	1080
1083		Elaboracion de solicitud y confección de Cartel en Mer Link	5 días	jue 03/03/16	jue 10/03/16	1082
1084		Invitación a participar en Mer Link	1 día	jue 10/03/16	jue 10/03/16	1083
1085		Plazo para recibir ofertas	17 días	vie 11/03/16	jue 07/04/16	1084
1086		**Recurso de Objeción al Cartel**	**16,86 días**	**vie 11/03/16**	**jue 07/04/16**	
1087		Presentacion de Objeción al cartel	5 días	vie 11/03/16	jue 17/03/16	1084
1088		Suspensión del plazo para recibir ofertas y publicación en Mer Link	1 día	vie 18/03/16	lun 21/03/16	1087
1089		Envío de recurso de objecion a Unidad Jurídica y a Unidad Técnica	1 día	lun 21/03/16	mar 22/03/1(	1088
1090		Respuesta de UT o UJI a la USP	5 días	mar 22/03/1(	jue 31/03/16	1089
1091		Confeccion de Resolución a la Objeción	4 días	jue 31/03/16	mié 06/04/1(	1090
1092		Comunicación de Resolución final	1 día	mié 06/04/1(	jue 07/04/16	1091
1093		Nuevo plazo para recibir ofertas	12 días	vie 18/03/16	jue 07/04/16	1087
1094		**Recepción y estudio de ofertas**	**32,82 días**	**jue 07/04/16**	**mié 25/05/1(**	
1095		Apertura de ofertas	1 día	jue 07/04/16	jue 07/04/16	1093
1096		Remisión en Mer Link de ofertas para realizar estudio de admisibilidad (lega	1 día	vie 08/04/16	vie 08/04/16	1095
1097		Estudio y valoración de las ofertas: 5 dh para prevenciones; 3 dh para respu	13 días	mar 12/04/1(	jue 28/04/16	1096
1098		Remisión de solicitud de prevenciones por parte de la UJI y de la UT dado e	1 día	vie 29/04/16	vie 29/04/16	1097
1099		Solicitud de información en Mer.Link a los oferentes para atender prevenci	1 día	lun 02/05/16	mar 03/05/1(	1098
1100		Recepción de respuestas por parte de los oferentes a las prevenciones (En l	5 días	mar 03/05/1(	lun 09/05/16	1099
1101		Envío de las respuestas a prevenciones a la UJI y a la UT (Mer Link)	0 días	lun 09/05/16	lun 09/05/16	1100
1102		Análisis de respuesta a prevenciones por parte de la UJI y de la UT	3 días	mar 10/05/1(	jue 12/05/16	1101
1103		Informe de admisibilidad (UJI y UT)	3 días	vie 13/05/16	mié 18/05/1(	1102
1104		Elaboracion y envío de Informe de admisibilidad	0 días	mié 18/05/1(	mié 18/05/1(	1103
1105		Elaboración de Informe de recomendación	5 días	mié 18/05/1(	mié 25/05/1(	1104
1106		**Proceso de adjudicación**	**34 días**	**vie 08/04/16**	**vie 27/05/16**	
1107		Fecha máxima para adjudicar	34 días	vie 08/04/16	vie 27/05/16	1095
1108		**Recomendación, adjudicación y comunicación**	**5,92 días**	**vie 27/05/16**	**lun 06/06/16**	
1109		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	3 días	vie 27/05/16	mié 01/06/1(	1107
1110		Sesión de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 01/06/1(	mié 01/06/1(	1109
1111		Recomendación de la Comisión de Adjudicaciones	0,5 días	mié 01/06/1(	mié 01/06/1(	1110
1112		Elaboracion de acuerdo de adjudicacion	1 día	mié 01/06/1(	jue 02/06/16	1111

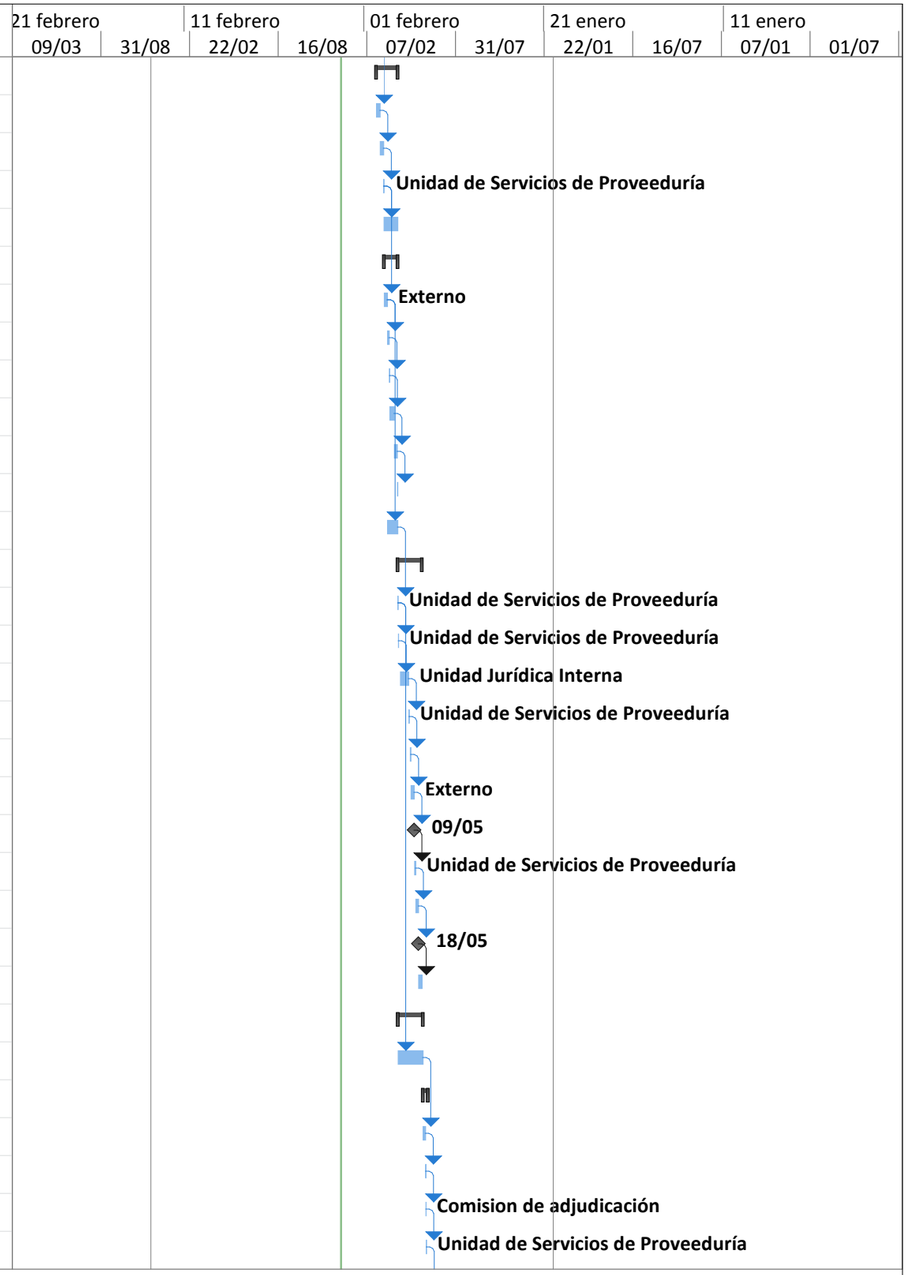

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1113		Comunicación a empresas de Acuerdo de adjudicacion (Mer - Link)	1 día	vie 03/06/16	lun 06/06/16	1112
1114		**Adjudicación**	**5 días**	**lun 06/06/16**	**lun 13/06/16**	
1115		Firmeza del acto de adjudicacion	5 días	lun 06/06/16	lun 13/06/16	1113
1116		**Recurso de revocatoria**	**35,8 días**	**lun 06/06/16**	**mar 26/07/1**	
1117		Plazo para recibir recurso (Art N°185 RLCA)	5 días	lun 06/06/16	vie 10/06/16	1113
1118		Análisis de admisibilidad del recurso y comunicación si se declara inadmisib	2 días	lun 13/06/16	mié 15/06/1(	1117
1119		Notificacion al Adjudicatario del recurso en caso de ser adminisble	0 días	mié 15/06/1(	mié 15/06/1(	1118
1120		Plazo para recibir respuesta del adjuducatario (Art N°186 RLCA)	3 días	mié 15/06/1(	lun 20/06/16	1119
1121		Elaboracion de la resolucion final de la revocatoria (Art N°187 RLCA)	15 días	lun 20/06/16	lun 11/07/16	1120
1122		Notificacion de la resolución (Mer-Link)	0 días	lun 11/07/16	lun 11/07/16	1121
1123		Convocatoria a Comisión de Adjudicaciones	5 días	lun 11/07/16	lun 18/07/16	1122
1124		Sesión de la Comision de Adjudicaciones	0,5 días	lun 18/07/16	lun 18/07/16	1123
1125		Nueva recomendación de adjudicación por parte de la Comision de Adjudic	0,5 días	lun 18/07/16	lun 18/07/16	1124
1126		Adjudicación en firme	5 días	lun 18/07/16	mar 26/07/1(	1117,1125
1127		**Trámite de contrato**	**16 días**	**lun 18/07/16**	**jue 11/08/16**	
1128		Elaboración del Contrato	5 días	lun 18/07/16	mar 26/07/1(	1124
1129		Solicitud de documentos a Adjudicatario	0 días	lun 18/07/16	lun 18/07/16	1128CC
1130		Presentación de documentos por parte de adjudicatario (Timbres, grarantía	5 días	lun 18/07/16	mar 26/07/1(	1129
1131		Firma de contrato oferente	1 día	mar 26/07/1(	mié 27/07/1(	1130
1132		Envío de contrato para firma al Despacho Contralor	0 días	mié 27/07/1(	mié 27/07/1(	1131
1133		Firma de contrato Despacho Contralor	5 días	mié 27/07/1(	jue 04/08/16	1132
1134		Envío de contrato a aprobación interna	0 días	jue 04/08/16	jue 04/08/16	1131,1133
1135		Aprobacion Interna de Contrato	5 días	jue 04/08/16	jue 11/08/16	1134
1136		Comunicación a empresa de aprobación del contrato y orden de inicio	0 días	jue 11/08/16	jue 11/08/16	1135
1137		**Trámite del Pedido**	**3 días**	**jue 11/08/16**	**mié 17/08/1(**	
1138		Elaboración del borrador del pedido de Compra	2 días	jue 11/08/16	mar 16/08/1(	1135
1139		Envio de borrador de pedido a Financiero para aprobación	0 días	mar 16/08/1(	mar 16/08/1(	1138
1140		Devolución de pedido a Proveeduría	1 día	mar 16/08/1(	mié 17/08/1(	1139
1141		Notificación de Pedido de Compra	0 días	mié 17/08/1(	mié 17/08/1(	1139,1140
1142		Fin trámite de Pedido de compra	0 días	mié 17/08/1(	mié 17/08/1(	1141
1143		**Recepción de los items**	**3,99 días**	**jue 11/08/16**	**jue 18/08/16**	
1144		Entrega items en Almacén	1 día	jue 11/08/16	vie 12/08/16	1135

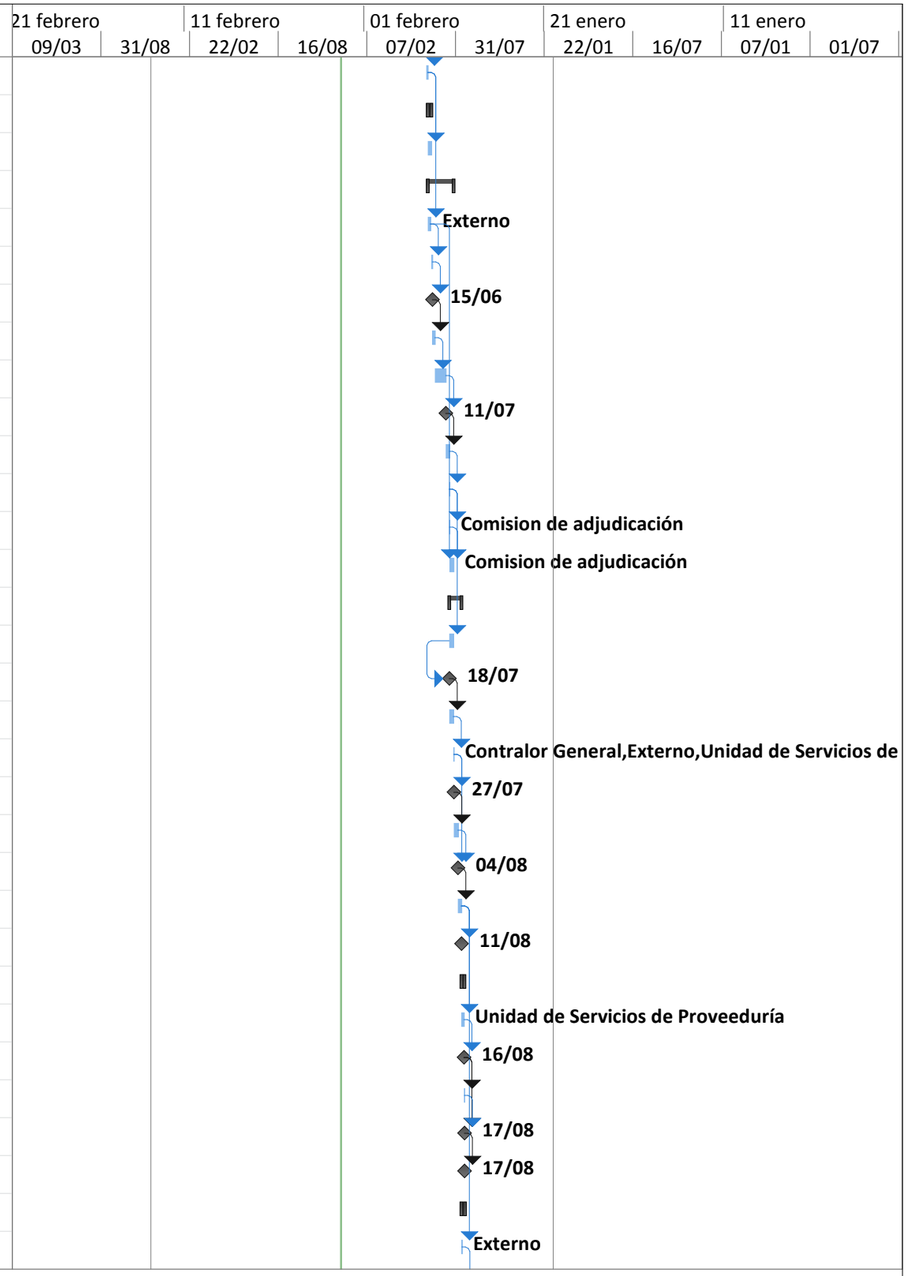

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1145		Recibido a satisfacción	3 días	vie 12/08/16	jue 18/08/16	1144
1146		Fin recepción de items	0 días	jue 18/08/16	jue 18/08/16	1145
1147		**Trámite de pago**	**5,99 días**	**jue 18/08/16**	**vie 26/08/16**	
1148		Envio documentos a Financiero	1 día	jue 18/08/16	vie 19/08/16	1146
1149		Emisión de pago en Financiero	5 días	vie 19/08/16	vie 26/08/16	1148
1150		Conclusión trámite licitación	0 días	vie 26/08/16	vie 26/08/16	1149
1151		Conclusión trámite licitación	0 días	vie 26/08/16	vie 26/08/16	1150
1152		**COMPRAS DIRECTAS**	**223,24 días**	**lun 04/01/16**	**mar 22/11/1**	
1153		**UNIDAD DE GESTIÓN DE POTENCIAL HUMANO**	**40 días**	**lun 04/01/16**	**lun 29/02/16**	
1154		**2016CD-000001-503 UGPH_Capacitación (De enero a diciembre 2016, Con Objeción y con Revocatoria) ₡94,174.500,00**	**40 días**	**lun 04/01/16**	**lun 29/02/16**	
1155		**Contratación**	**0,8 días**	**lun 04/01/16**	**lun 04/01/16**	
1156		Contacto al Proveedor	0,5 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	
1157		Verificación de datos	0,1 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	1156
1158		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	0,1 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	1157
1159		Adjudicación en firme	0,1 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	1158
1160		**Trámite del Pedido**	**3,2 días**	**lun 04/01/16**	**vie 08/01/16**	
1161		Elaboración del Pedido de Compra	0,2 días	lun 04/01/16	mar 05/01/1(	1159
1162		Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	2 días	mar 05/01/1(	jue 07/01/16	1161
1163		Notificación de Pedido de Compra	1 día	jue 07/01/16	vie 08/01/16	1162
1164		**Ejecución**	**4 días**	**vie 08/01/16**	**jue 14/01/16**	
1165		Realización del Evento	1 día	vie 08/01/16	lun 11/01/16	1163
1166		Recibido a satisfacción	3 días	lun 11/01/16	jue 14/01/16	1165
1167		**Trámite de pago**	**32 días**	**jue 14/01/16**	**lun 29/02/16**	
1168		Envio documentos a Financiero	2 días	jue 14/01/16	lun 18/01/16	1166
1169		Emisión de pago en Financiero	30 días	lun 18/01/16	lun 29/02/16	1168
1170		Conclusión trámite de Contratación	0 días	lun 29/02/16	lun 29/02/16	1169
1171		**DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA**	**128,91 días**	**lun 11/01/16**	**mié 13/07/1(**	
1172		**CONSULTORIAS DFOE ₡14,000.000,00**	**128,91 días**	**lun 11/01/16**	**mié 13/07/1(**	
1173		**2016CD-000002-503 DFOE_Consultor Economía con conocimiento en Desarrollo sostenible (Contratado al 15/06/16; Con Objeción y con Revocatoria) ₡4,000.000,00**	**84 días**	**lun 14/03/16**	**mié 13/07/16**	
1174		**Elaboración de Cartel**	**5 días**	**lun 14/03/16**	**lun 21/03/16**	

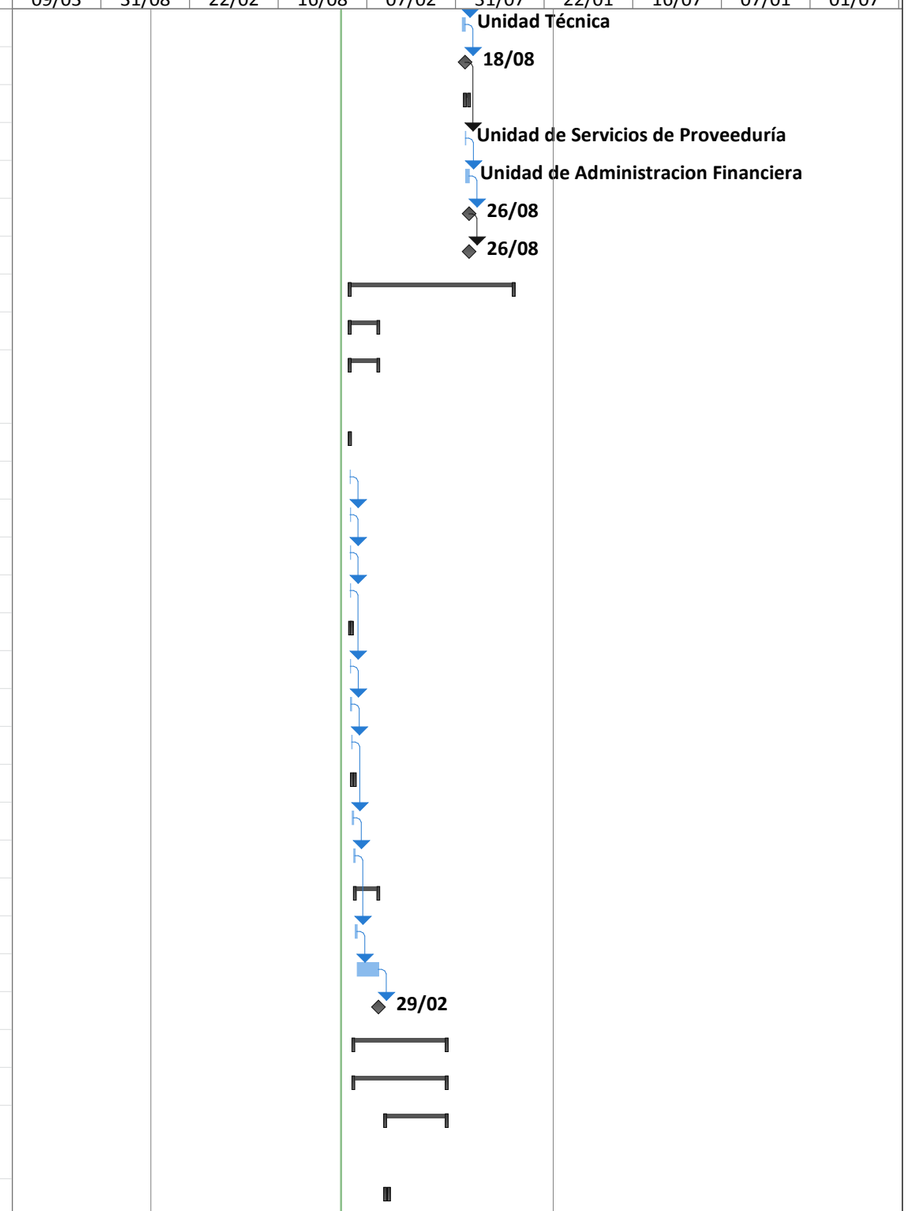

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1175		Recepción Especificaciones técnicas y elaboracion del cartel (UGA)	2 días	lun 14/03/16	mié 16/03/16	
1176		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 16/03/16	jue 17/03/16	1175
1177		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 17/03/16	vie 18/03/16	1176
1178		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 18/03/16	lun 21/03/16	1177
1179		Invitación a participar en Mer- Link	0 días	lun 21/03/16	lun 21/03/16	1178
1180		**Recepción y estudio de ofertas**	**24 días**	**lun 21/03/16**	**mié 27/04/16**	
1181		**Invitación a participar**	**15 días**	**lun 21/03/16**	**jue 14/04/16**	
1182		Envío de invitación	0 días	lun 21/03/16	lun 21/03/16	1179
1183		Objeción al cartel	10 días	lun 21/03/16	mié 06/04/16	1182
1184		Nuevo plazo para recibir ofertas	5 días	mié 06/04/16	jue 14/04/16	1183
1185		**Recepción y estudio de ofertas**	**9 días**	**jue 14/04/16**	**mié 27/04/16**	
1186		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	jue 14/04/16	jue 14/04/16	1184
1187		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	jue 14/04/16	jue 14/04/16	1186
1188		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	jue 14/04/16	mié 20/04/16	1187
1189		Envio de prevenciones	0 días	mié 20/04/16	mié 20/04/16	1188
1190		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	mié 20/04/16	vie 22/04/16	1189
1191		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	vie 22/04/16	mar 26/04/16	1190
1192		Elaboración de Informe Técnico	1 día	mar 26/04/16	mié 27/04/16	1191
1193		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	mié 27/04/16	jue 28/04/16	1192
1194		**Recurso de revocatoria**	**15 días**	**jue 28/04/16**	**jue 19/05/16**	
1195		Plazo para recibir recurso	2 días	jue 28/04/16	lun 02/05/16	1193
1196		Resolución de Recurso de revocatoria	10 días	lun 02/05/16	lun 16/05/16	1195
1197		Adjudicación en firme	3 días	lun 16/05/16	jue 19/05/16	1196
1198		Solicitud de garantía de cumplimiento y especies fiscales	0 días	jue 19/05/16	jue 19/05/16	1197
1199		Presentación de timbres fiscales y garantía de cuimplimiento	0 días	jue 19/05/16	jue 19/05/16	1198
1200		**Trámite del Pedido**	**3 días**	**jue 19/05/16**	**mar 24/05/1**	
1201		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	jue 19/05/16	vie 20/05/16	1197
1202		Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	1 día	vie 20/05/16	lun 23/05/16	1201
1203		Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 23/05/16	mar 24/05/16	1202
1204		**Recepción de los items**	**4 días**	**mar 24/05/1**	**lun 30/05/16**	
1205		Entrega items en Almacén	1 día	mar 24/05/16	mié 25/05/16	1203
1206		Recibido a satisfacción	3 días	mié 25/05/16	lun 30/05/16	1205

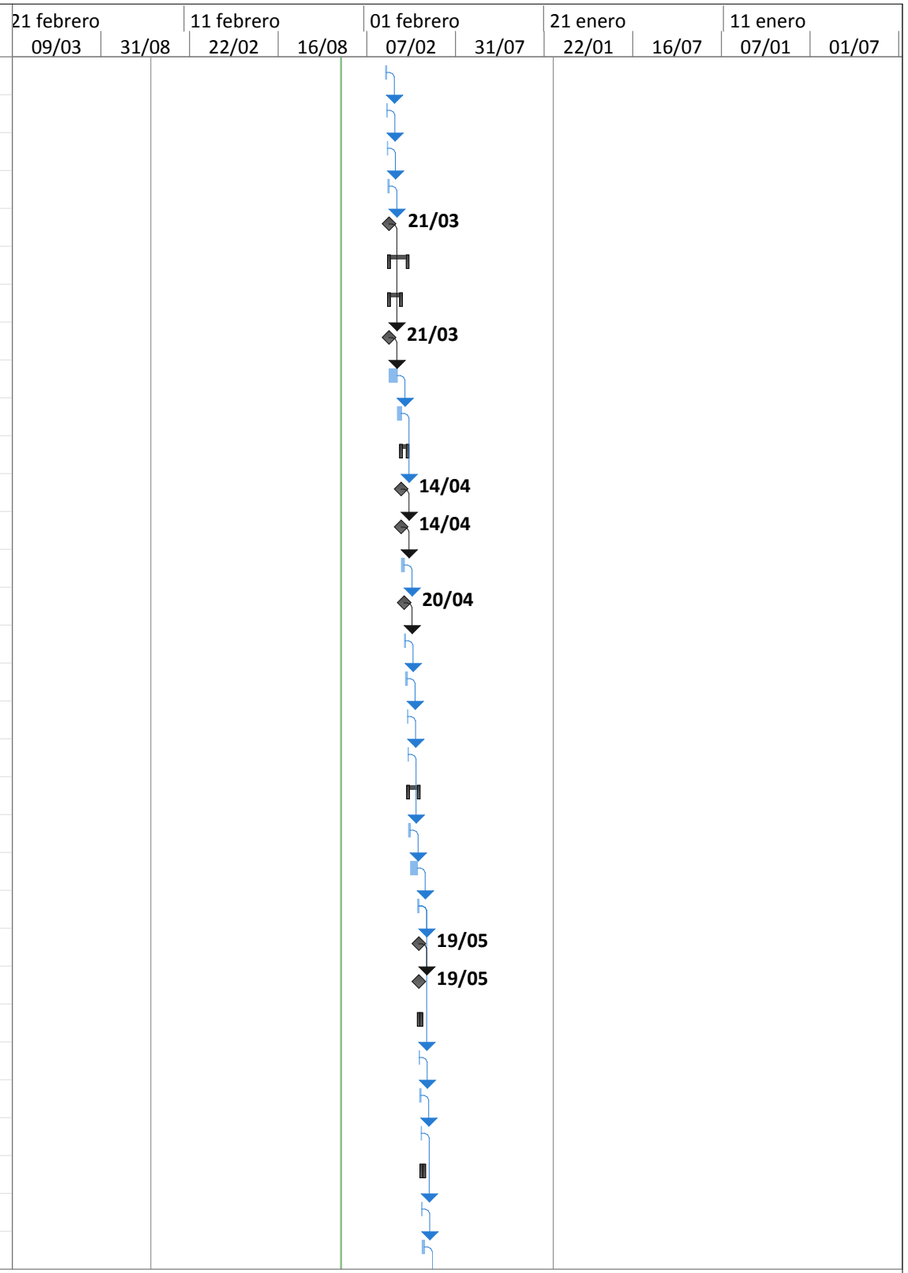

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1207		**Trámite de pago**	**32 días**	**lun 30/05/16**	**mié 13/07/1(**	
1208		Envio documentos a Financiero	2 días	lun 30/05/16	mié 01/06/1(	1206
1209		Emisión de pago en Financiero	30 días	mié 01/06/1(	mié 13/07/1(	1208
1210		Conclusión trámite de Contratación	0 días	mié 13/07/1(	mié 13/07/1(	1209
1211		**16CD-000003-503 DFOE Ingeniero Sanitario y/o químico (Contratado al 01/04/16; Con Objeción y con Revocatoria) ₡7,000.000,00**	**84 días**	**lun 18/01/16**	**mié 18/05/16**	
1212		**Elaboración de Cartel**	**5 días**	**lun 18/01/16**	**lun 25/01/16**	
1213		Recepción Especificaciones técnicas y elaboracion del cartel (UGA)	2 días	lun 18/01/16	mié 20/01/1(	
1214		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 20/01/1(	jue 21/01/16	1213
1215		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 21/01/16	vie 22/01/16	1214
1216		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 22/01/16	lun 25/01/16	1215
1217		Invitación a participar en Mer- Link	0 días	lun 25/01/16	lun 25/01/16	1216
1218		**Recepción y estudio de ofertas**	**24 días**	**lun 25/01/16**	**vie 26/02/16**	
1219		**Invitación a participar**	**15 días**	**lun 25/01/16**	**lun 15/02/16**	
1220		Envío de invitación	0 días	lun 25/01/16	lun 25/01/16	1217
1221		Objeción al cartel	10 días	lun 25/01/16	lun 08/02/16	1220
1222		Nuevo plazo para recibir ofertas	5 días	lun 08/02/16	lun 15/02/16	1221
1223		**Recepción y estudio de ofertas**	**9 días**	**lun 15/02/16**	**vie 26/02/16**	
1224		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 15/02/16	lun 15/02/16	1222
1225		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 15/02/16	lun 15/02/16	1224
1226		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 15/02/16	vie 19/02/16	1225
1227		Envio de prevenciones	0 días	vie 19/02/16	vie 19/02/16	1226
1228		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 19/02/16	mar 23/02/1(	1227
1229		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 23/02/1(	jue 25/02/16	1228
1230		Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 25/02/16	vie 26/02/16	1229
1231		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 26/02/16	lun 29/02/16	1230
1232		**Recurso de revocatoria**	**15 días**	**lun 29/02/16**	**lun 21/03/16**	
1233		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 29/02/16	mié 02/03/1(	1231
1234		Resolución de Recurso de revocatoria	10 días	mié 02/03/1(	mié 16/03/1(	1233
1235		Adjudicación en firme	3 días	mié 16/03/1(	lun 21/03/16	1234
1236		Solicitud de garantía de cumplimiento y especies fiscales	0 días	lun 21/03/16	lun 21/03/16	1235
1237		Presentación de timbres fiscales y garantía de cuimplimiento	0 días	lun 21/03/16	lun 21/03/16	1236

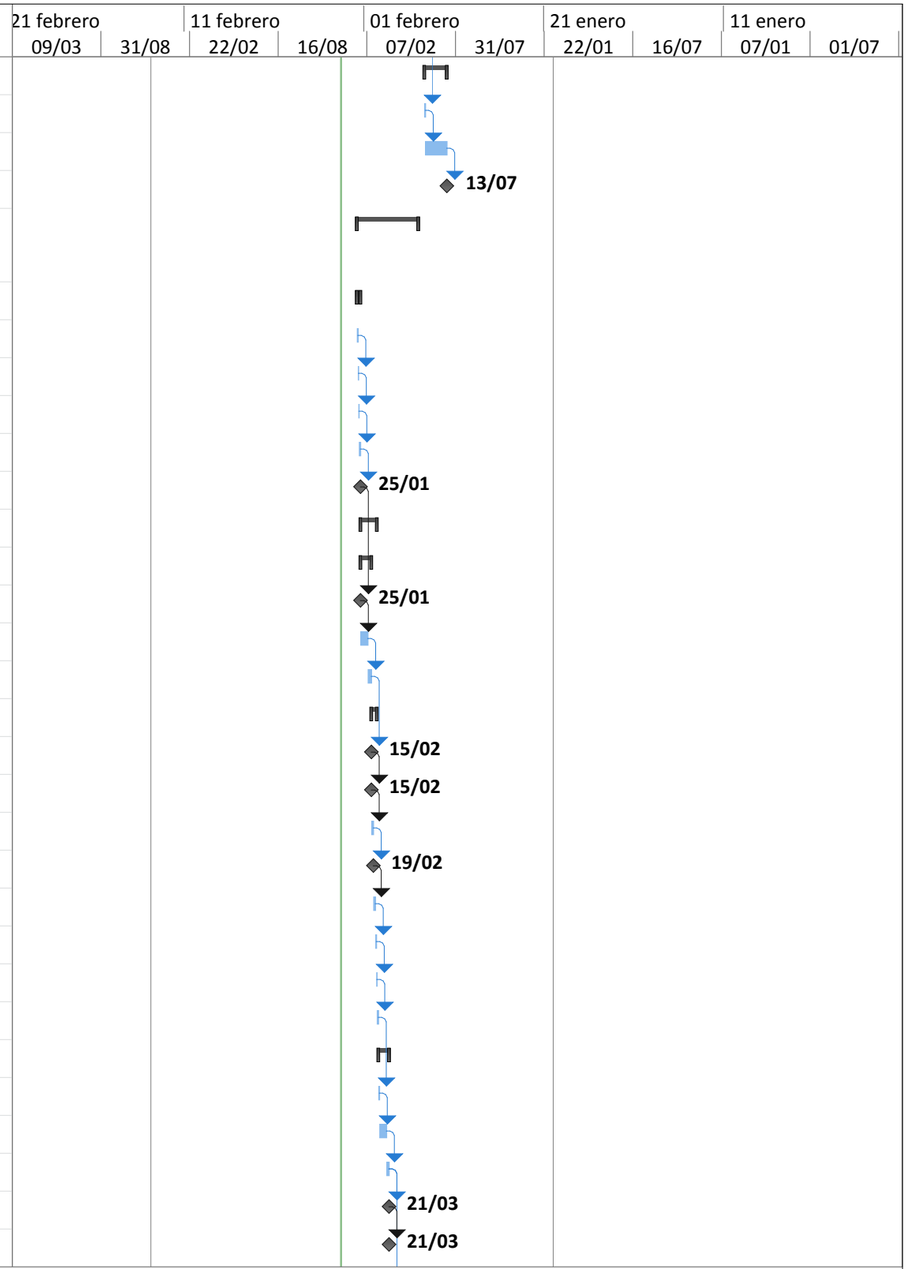

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1238		**Trámite del Pedido**	**3 días**	**lun 21/03/16**	**lun 28/03/16**	
1239		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	lun 21/03/16	mar 22/03/1(	1235
1240		Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	1 día	mar 22/03/1(	mié 23/03/1(	1239
1241		Notificación de Pedido de Compra	1 día	mié 23/03/1(	lun 28/03/16	1240
1242		**Recepción de los items**	**4 días**	**lun 28/03/16**	**vie 01/04/16**	
1243		Entrega items en Almacén	1 día	lun 28/03/16	mar 29/03/1(	1241
1244		Recibido a satisfacción	3 días	mar 29/03/1(	vie 01/04/16	1243
1245		**Trámite de pago**	**32 días**	**vie 01/04/16**	**mié 18/05/1(**	
1246		Envio documentos a Financiero	2 días	vie 01/04/16	mar 05/04/1(	1244
1247		Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 05/04/1(	mié 18/05/1(	1246
1248		Conclusión trámite de Contratación	0 días	mié 18/05/1(	mié 18/05/1(	1247
1249		**2016CD-000004-503 DFOEIngeniero Topógrafo(antes Ingeniero Civil)Especialista en Sistemas de Información Geoespacial (Contratado al 01/03/16; Con Objeción y con Revocatoria) ₡6,000.000,00**	**84 días**	**lun 11/01/16**	**mié 11/05/16**	
1250		**Elaboración de Cartel**	**5 días**	**lun 11/01/16**	**lun 18/01/16**	
1251		Recepción Especificaciones técnicas y elaboracion del cartel (UGA)	2 días	lun 11/01/16	mié 13/01/1(	
1252		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 13/01/1(	jue 14/01/16	1251
1253		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 14/01/16	vie 15/01/16	1252
1254		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 15/01/16	lun 18/01/16	1253
1255		Invitación a participar en Mer- Link	0 días	lun 18/01/16	lun 18/01/16	1254
1256		**Recepción y estudio de ofertas**	**24 días**	**lun 18/01/16**	**vie 19/02/16**	
1257		**Invitación a participar**	**15 días**	**lun 18/01/16**	**lun 08/02/16**	
1258		Envío de invitación	0 días	lun 18/01/16	lun 18/01/16	1255
1259		Objeción al cartel	10 días	lun 18/01/16	lun 01/02/16	1258
1260		Nuevo plazo para recibir ofertas	5 días	lun 01/02/16	lun 08/02/16	1259
1261		**Recepción y estudio de ofertas**	**9 días**	**lun 08/02/16**	**vie 19/02/16**	
1262		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 08/02/16	lun 08/02/16	1260
1263		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 08/02/16	lun 08/02/16	1262
1264		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 08/02/16	vie 12/02/16	1263
1265		Envio de prevenciones	0 días	vie 12/02/16	vie 12/02/16	1264
1266		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 12/02/16	mar 16/02/1(	1265
1267		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 16/02/1(	jue 18/02/16	1266

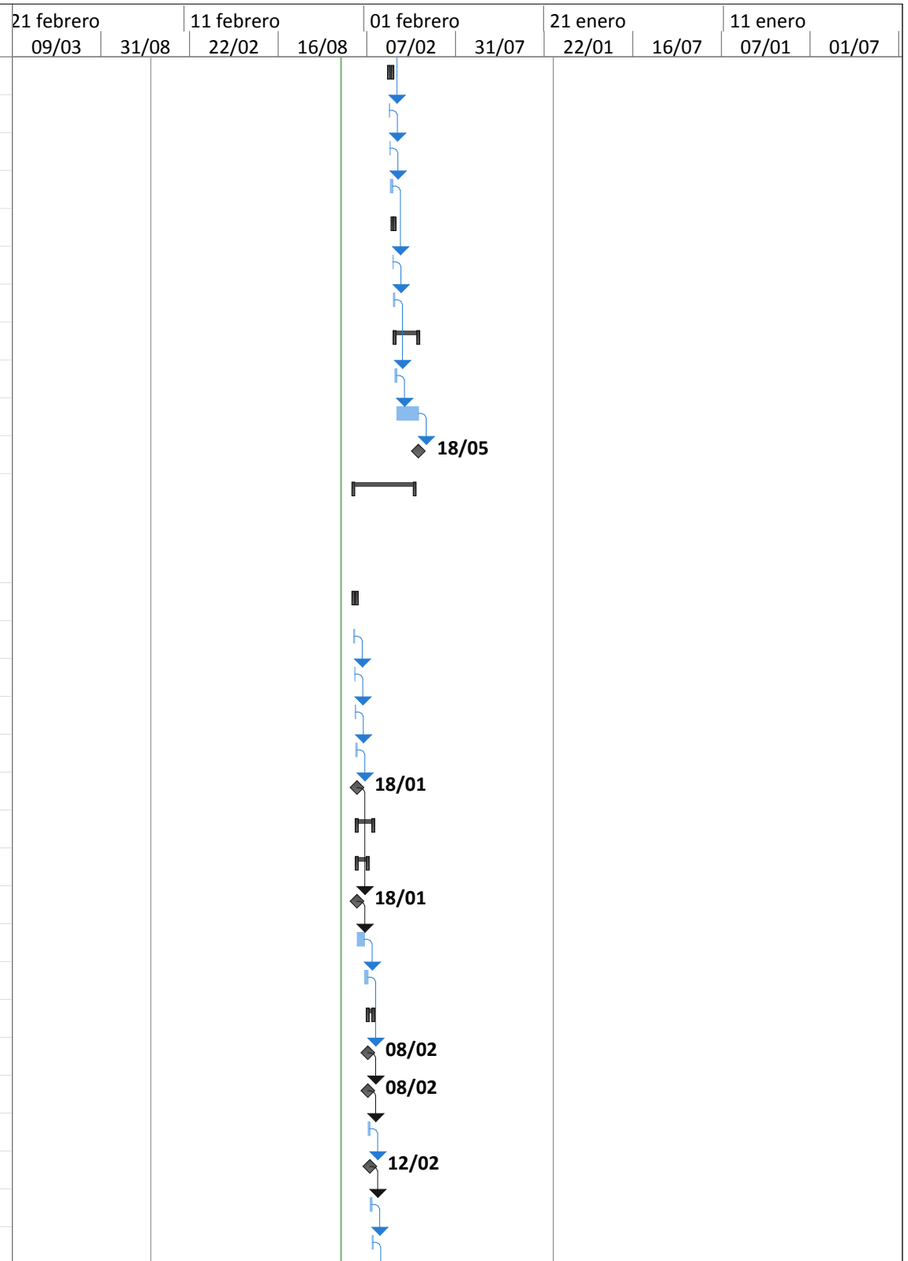

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1268		Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 18/02/16	vie 19/02/16	1267
1269		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 19/02/16	lun 22/02/16	1268
1270		**Recurso de revocatoria**	**15 días**	**lun 22/02/16**	**lun 14/03/16**	
1271		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 22/02/16	mié 24/02/16	1269
1272		Resolución de Recurso de revocatoria	10 días	mié 24/02/16	mié 09/03/16	1271
1273		Adjudicación en firme	3 días	mié 09/03/16	lun 14/03/16	1272
1274		Solicitud de garantía de cumplimiento y especies fiscales	0 días	lun 14/03/16	lun 14/03/16	1273
1275		Presentación de timbres fiscales y garantía de cuimplimiento	0 días	lun 14/03/16	lun 14/03/16	1274
1276		**Trámite del Pedido**	**3 días**	**lun 14/03/16**	**jue 17/03/16**	
1277		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	lun 14/03/16	mar 15/03/16	1273
1278		Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	1 día	mar 15/03/16	mié 16/03/16	1277
1279		Notificación de Pedido de Compra	1 día	mié 16/03/16	jue 17/03/16	1278
1280		**Recepción de los items**	**4 días**	**jue 17/03/16**	**mié 23/03/16**	
1281		Entrega items en Almacén	1 día	jue 17/03/16	vie 18/03/16	1279
1282		Recibido a satisfacción	3 días	vie 18/03/16	mié 23/03/16	1281
1283		**Trámite de pago**	**32 días**	**mié 23/03/16**	**mié 11/05/16**	
1284		Envio documentos a Financiero	2 días	mié 23/03/16	mar 29/03/16	1282
1285		Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 29/03/16	mié 11/05/16	1284
1286		Conclusión trámite de Contratación	0 días	mié 11/05/16	mié 11/05/16	1285
1287		**2016CD-000002-503 DFOE_Consultor Economía con conocimiento en Desarrollo sostenible (Contratado al 15/06/16; Con Objeción y con Revocatoria) #4.000.000.00**	**84 días**	**lun 11/01/16**	**mié 11/05/16**	
1288		**Elaboración de Cartel**	**5 días**	**lun 11/01/16**	**lun 18/01/16**	
1289		Recepción Especificaciones técnicas y elaboracion del cartel (UGA)	2 días	lun 11/01/16	mié 13/01/16	
1290		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 13/01/16	jue 14/01/16	1289
1291		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 14/01/16	vie 15/01/16	1290
1292		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 15/01/16	lun 18/01/16	1291
1293		Invitación a participar en Mer- Link	0 días	lun 18/01/16	lun 18/01/16	1292
1294		**Recepción y estudio de ofertas**	**24 días**	**lun 18/01/16**	**vie 19/02/16**	
1295		**Invitación a participar**	**15 días**	**lun 18/01/16**	**lun 08/02/16**	
1296		Envío de invitación	0 días	lun 18/01/16	lun 18/01/16	1293
1297		Objeción al cartel	10 días	lun 18/01/16	lun 01/02/16	1296
1298		Nuevo plazo para recibir ofertas	5 días	lun 01/02/16	lun 08/02/16	1297

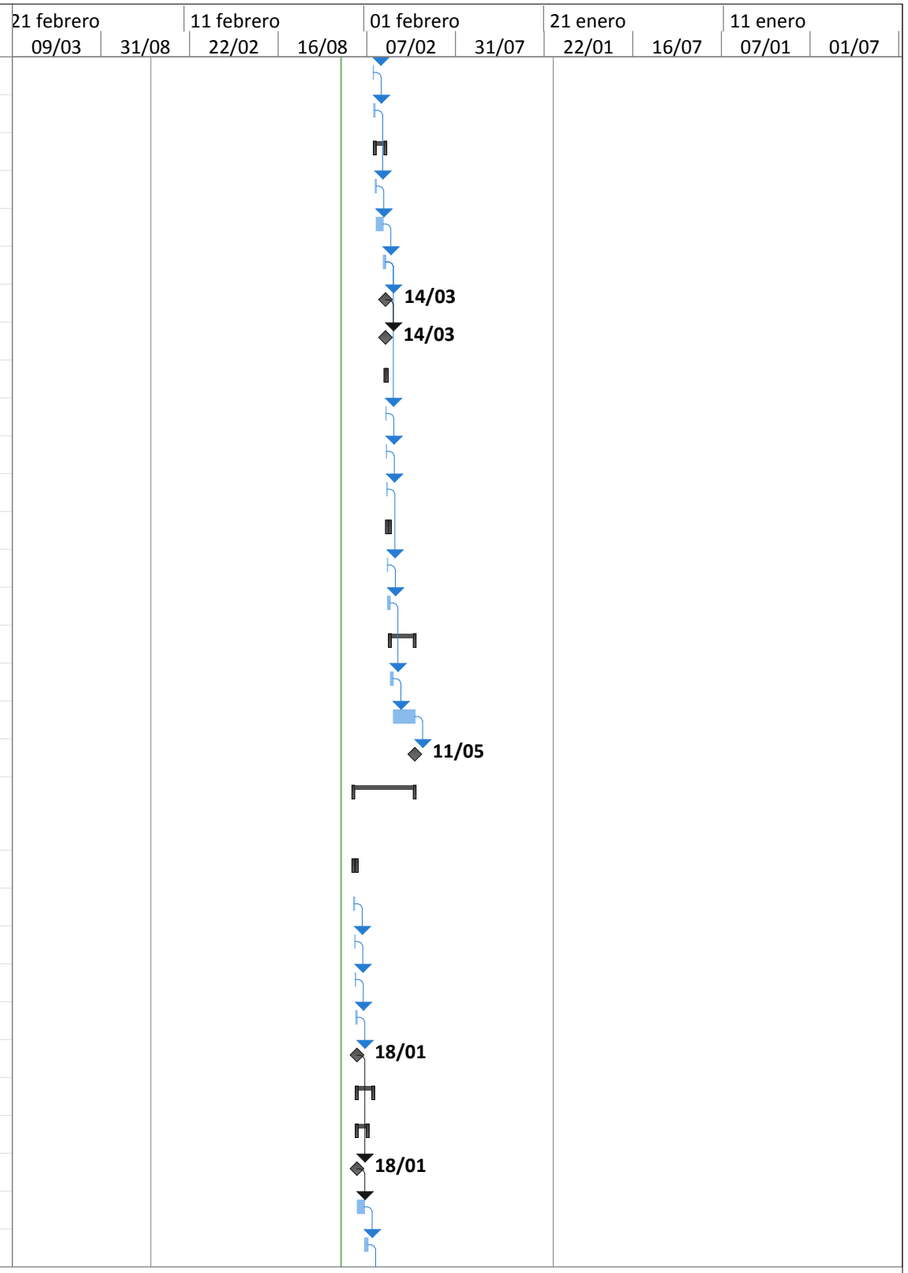

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1299		**Recepción y estudio de ofertas**	**9 días**	**lun 08/02/16**	**vie 19/02/16**	
1300		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 08/02/16	lun 08/02/16	1298
1301		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 08/02/16	lun 08/02/16	1300
1302		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 08/02/16	vie 12/02/16	1301
1303		Envio de prevenciones	0 días	vie 12/02/16	vie 12/02/16	1302
1304		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 12/02/16	mar 16/02/1(	1303
1305		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 16/02/1(	jue 18/02/16	1304
1306		Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 18/02/16	vie 19/02/16	1305
1307		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 19/02/16	lun 22/02/16	1306
1308		**Recurso de revocatoria**	**15 días**	**lun 22/02/16**	**lun 14/03/16**	
1309		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 22/02/16	mié 24/02/1(	1307
1310		Resolución de Recurso de revocatoria	10 días	mié 24/02/1(	mié 09/03/1(	1309
1311		Adjudicación en firme	3 días	mié 09/03/1(	lun 14/03/16	1310
1312		Solicitud de garantía de cumplimiento y especies fiscales	0 días	lun 14/03/16	lun 14/03/16	1311
1313		Presentación de timbres fiscales y garantía de cuimplimiento	0 días	lun 14/03/16	lun 14/03/16	1312
1314		**Trámite del Pedido**	**3 días**	**lun 14/03/16**	**jue 17/03/16**	
1315		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	lun 14/03/16	mar 15/03/1(	1311
1316		Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	1 día	mar 15/03/1(	mié 16/03/1(	1315
1317		Notificación de Pedido de Compra	1 día	mié 16/03/1(	jue 17/03/16	1316
1318		**Recepción de los items**	**4 días**	**jue 17/03/16**	**mié 23/03/1(**	
1319		Entrega items en Almacén	1 día	jue 17/03/16	vie 18/03/16	1317
1320		Recibido a satisfacción	3 días	vie 18/03/16	mié 23/03/1(	1319
1321		**Trámite de pago**	**32 días**	**mié 23/03/1(**	**mié 11/05/1(**	
1322		Envio documentos a Financiero	2 días	mié 23/03/1(	mar 29/03/1(	1320
1323		Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 29/03/1(	mié 11/05/1(	1322
1324		Conclusión trámite de Contratación	0 días	mié 11/05/1(	mié 11/05/1(	1323
1325		**2016CD-000004-503 DFOE Auditor Financiero con especialidad deteccion de riesgo de fraude (Contratado al 18/03/16; Con Objeción y con Revocatoria) ₡2.000.000,00**	**84 días**	**lun 11/01/16**	**mié 11/05/16**	
1326		**Elaboración de Cartel**	**5 días**	**lun 11/01/16**	**lun 18/01/16**	
1327		Recepción Especificaciones técnicas y elaboracion del cartel (UGA)	2 días	lun 11/01/16	mié 13/01/1(	
1328		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 13/01/1(	jue 14/01/16	1327
1329		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 14/01/16	vie 15/01/16	1328

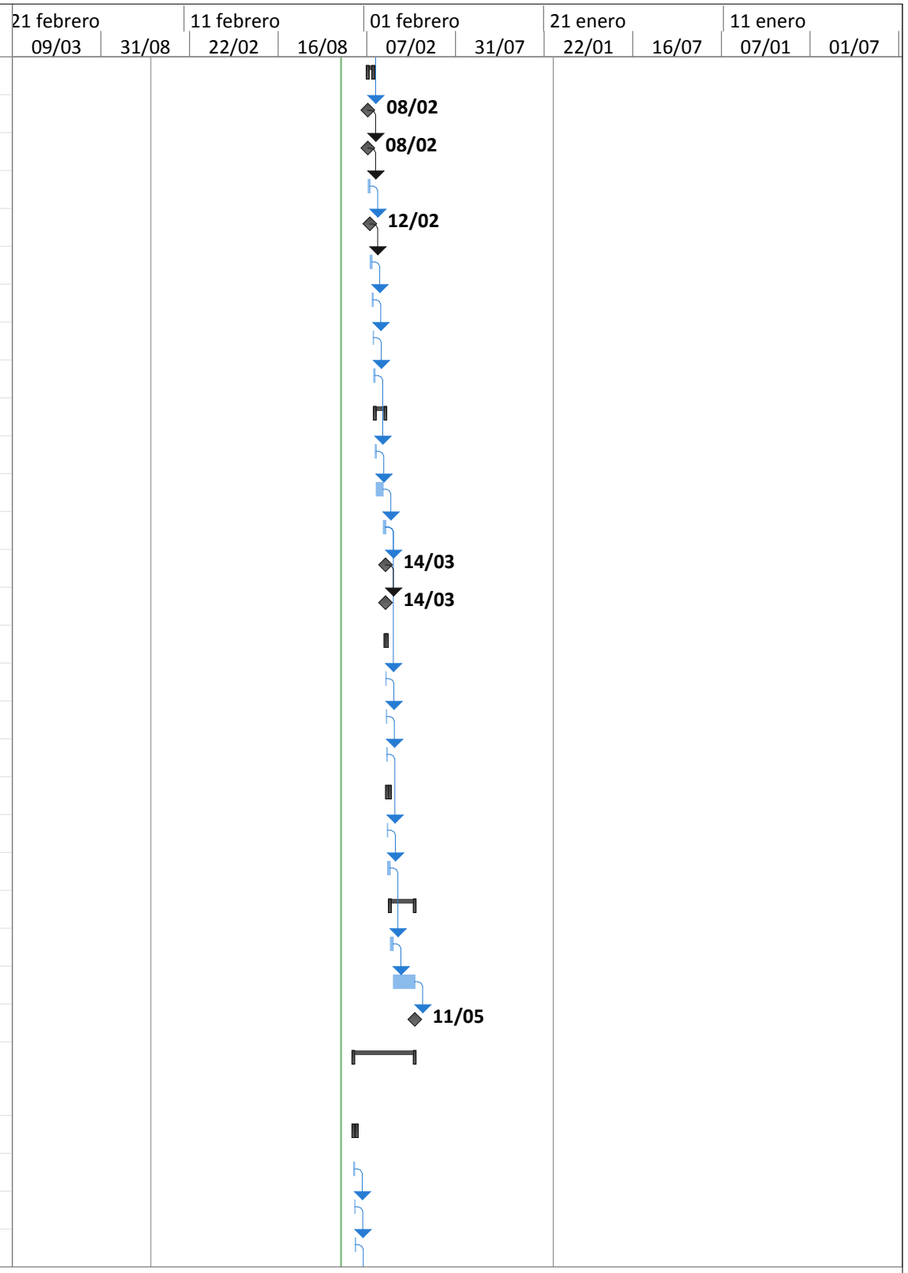

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1330		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 15/01/16	lun 18/01/16	1329
1331		Invitación a participar en Mer- Link	0 días	lun 18/01/16	lun 18/01/16	1330
1332		**Recepción y estudio de ofertas**	**24 días**	**lun 18/01/16**	**vie 19/02/16**	
1333		**Invitación a participar**	**15 días**	**lun 18/01/16**	**lun 08/02/16**	
1334		Envío de invitación	0 días	lun 18/01/16	lun 18/01/16	1331
1335		Objeción al cartel	10 días	lun 18/01/16	lun 01/02/16	1334
1336		Nuevo plazo para recibir ofertas	5 días	lun 01/02/16	lun 08/02/16	1335
1337		**Recepción y estudio de ofertas**	**9 días**	**lun 08/02/16**	**vie 19/02/16**	
1338		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 08/02/16	lun 08/02/16	1336
1339		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 08/02/16	lun 08/02/16	1338
1340		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 08/02/16	vie 12/02/16	1339
1341		Envio de prevenciones	0 días	vie 12/02/16	vie 12/02/16	1340
1342		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 12/02/16	mar 16/02/1(	1341
1343		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 16/02/1(	jue 18/02/16	1342
1344		Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 18/02/16	vie 19/02/16	1343
1345		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 19/02/16	lun 22/02/16	1344
1346		**Recurso de revocatoria**	**15 días**	**lun 22/02/16**	**lun 14/03/16**	
1347		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 22/02/16	mié 24/02/1(	1345
1348		Resolución de Recurso de revocatoria	10 días	mié 24/02/1(	mié 09/03/1(	1347
1349		Adjudicación en firme	3 días	mié 09/03/1(	lun 14/03/16	1348
1350		Solicitud de garantía de cumplimiento y especies fiscales	0 días	lun 14/03/16	lun 14/03/16	1349
1351		Presentación de timbres fiscales y garantía de cuimplimiento	0 días	lun 14/03/16	lun 14/03/16	1350
1352		**Trámite del Pedido**	**3 días**	**lun 14/03/16**	**jue 17/03/16**	
1353		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	lun 14/03/16	mar 15/03/1(	1349
1354		Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	1 día	mar 15/03/1(	mié 16/03/1(	1353
1355		Notificación de Pedido de Compra	1 día	mié 16/03/1(	jue 17/03/16	1354
1356		**Recepción de los items**	**4 días**	**jue 17/03/16**	**mié 23/03/1(**	
1357		Entrega items en Almacén	1 día	jue 17/03/16	vie 18/03/16	1355
1358		Recibido a satisfacción	3 días	vie 18/03/16	mié 23/03/1(	1357
1359		**Trámite de pago**	**32 días**	**mié 23/03/1(**	**mié 11/05/1(**	
1360		Envio documentos a Financiero	2 días	mié 23/03/1(	mar 29/03/1(	1358
1361		Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 29/03/1(	mié 11/05/1(	1360

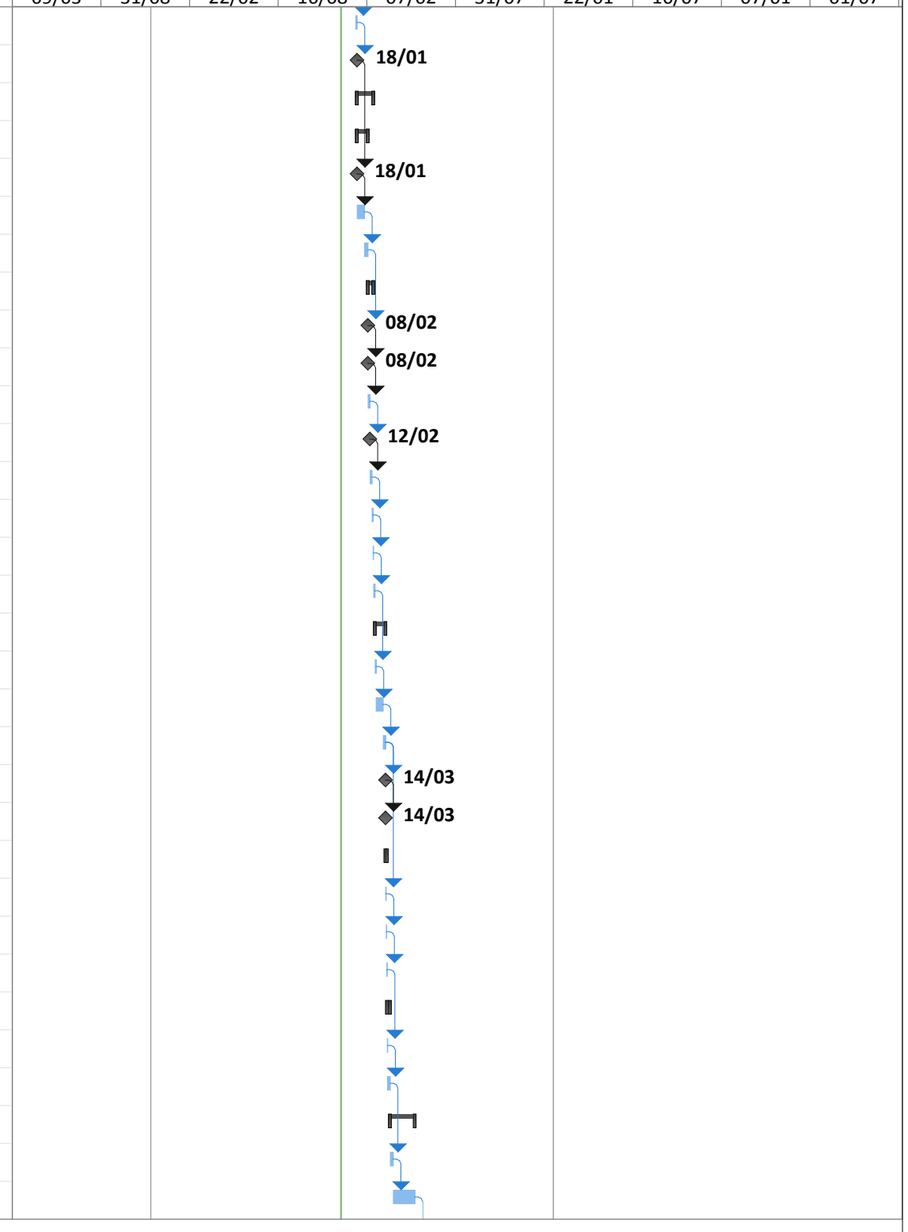

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1362		Conclusión trámite de Contratación	0 días	mié 11/05/16	mié 11/05/16	1361
1363		**2016CD-000004-503 DFOE abogado especialista en derecho tributario,(Contratado al 18/03/16; Con Objeción y con Revocatoria) ₡3.000.000,00**	**84 días**	**lun 11/01/16**	**mié 11/05/16**	
1364		**Elaboración de Cartel**	**5 días**	**lun 11/01/16**	**lun 18/01/16**	
1365		Recepción Especificaciones técnicas y elaboracion del cartel (UGA)	2 días	lun 11/01/16	mié 13/01/16	
1366		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 13/01/16	jue 14/01/16	1365
1367		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 14/01/16	vie 15/01/16	1366
1368		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 15/01/16	lun 18/01/16	1367
1369		Invitación a participar en Mer- Link	0 días	lun 18/01/16	lun 18/01/16	1368
1370		**Recepción y estudio de ofertas**	**24 días**	**lun 18/01/16**	**vie 19/02/16**	
1371		**Invitación a participar**	**15 días**	**lun 18/01/16**	**lun 08/02/16**	
1372		Envío de invitación	0 días	lun 18/01/16	lun 18/01/16	1369
1373		Objeción al cartel	10 días	lun 18/01/16	lun 01/02/16	1372
1374		Nuevo plazo para recibir ofertas	5 días	lun 01/02/16	lun 08/02/16	1373
1375		**Recepción y estudio de ofertas**	**9 días**	**lun 08/02/16**	**vie 19/02/16**	
1376		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 08/02/16	lun 08/02/16	1374
1377		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 08/02/16	lun 08/02/16	1376
1378		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 08/02/16	vie 12/02/16	1377
1379		Envio de prevenciones	0 días	vie 12/02/16	vie 12/02/16	1378
1380		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 12/02/16	mar 16/02/16	1379
1381		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 16/02/16	jue 18/02/16	1380
1382		Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 18/02/16	vie 19/02/16	1381
1383		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 19/02/16	lun 22/02/16	1382
1384		**Recurso de revocatoria**	**15 días**	**lun 22/02/16**	**lun 14/03/16**	
1385		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 22/02/16	mié 24/02/16	1383
1386		Resolución de Recurso de revocatoria	10 días	mié 24/02/16	mié 09/03/16	1385
1387		Adjudicación en firme	3 días	mié 09/03/16	lun 14/03/16	1386
1388		Solicitud de garantía de cumplimiento y especies fiscales	0 días	lun 14/03/16	lun 14/03/16	1387
1389		Presentación de timbres fiscales y garantía de cuimplimiento	0 días	lun 14/03/16	lun 14/03/16	1388
1390		**Trámite del Pedido**	**3 días**	**lun 14/03/16**	**jue 17/03/16**	
1391		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	lun 14/03/16	mar 15/03/16	1387
1392		Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	1 día	mar 15/03/16	mié 16/03/16	1391

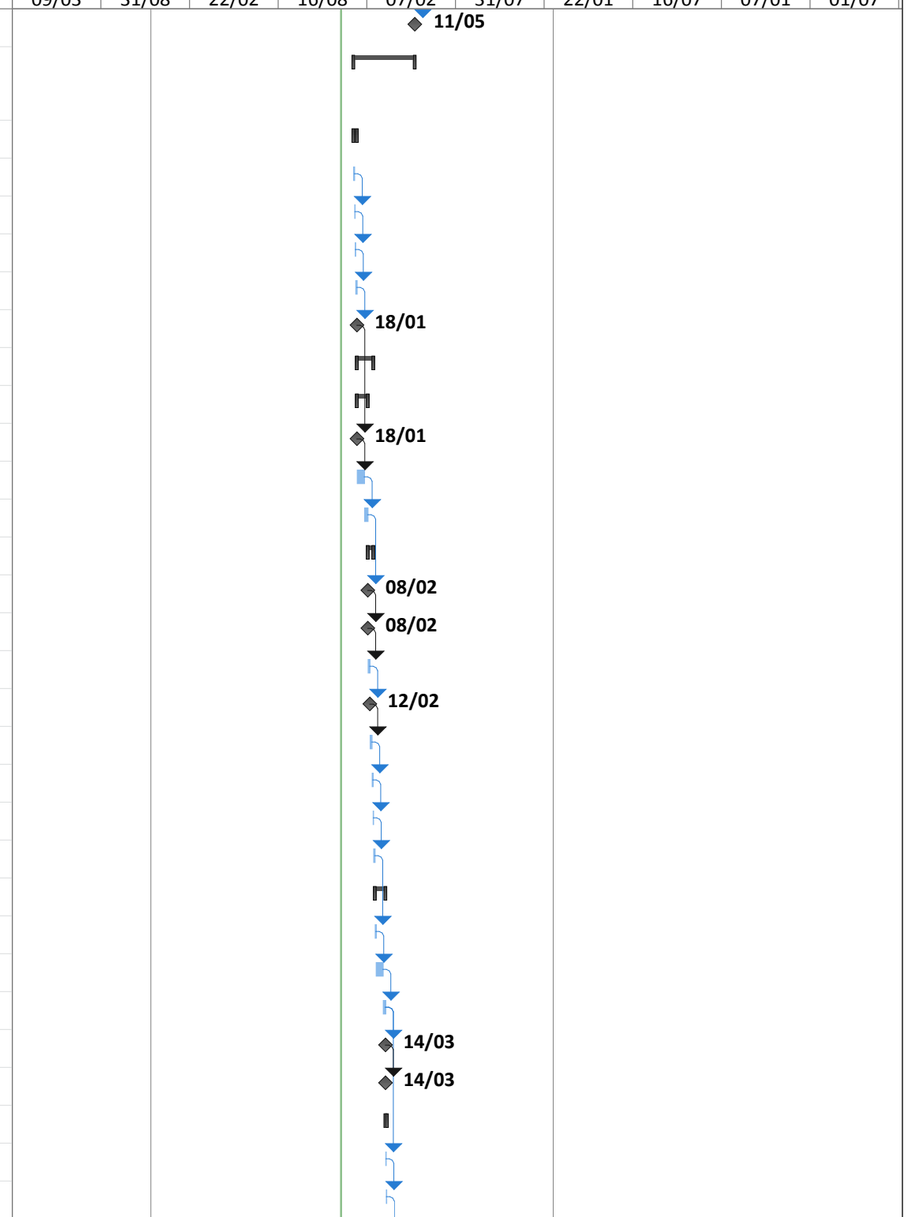

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1393		Notificación de Pedido de Compra	1 día	mié 16/03/16	jue 17/03/16	1392
1394		**Recepción de los items**	**4 días**	**jue 17/03/16**	**mié 23/03/1**	
1395		Entrega items en Almacén	1 día	jue 17/03/16	vie 18/03/16	1393
1396		Recibido a satisfacción	3 días	vie 18/03/16	mié 23/03/1	1395
1397		**Trámite de pago**	**32 días**	**mié 23/03/1**	**mié 11/05/1**	
1398		Envio documentos a Financiero	2 días	mié 23/03/1	mar 29/03/1	1396
1399		Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 29/03/1	mié 11/05/1	1398
1400		Conclusión trámite de Contratación	0 días	mié 11/05/1	mié 11/05/1	1399
1401		**2016CD-000004-503 DFOE Especialista en contratación administrativa(Contratado al 18/03/16; Con Objeción y con Revocatoria) ₡3.000.000,00**	**84 días**	**lun 11/01/16**	**mié 11/05/16**	
1402		**Elaboración de Cartel**	**5 días**	**lun 11/01/16**	**lun 18/01/16**	
1403		Recepción Especificaciones técnicas y elaboracion del cartel (UGA)	2 días	lun 11/01/16	mié 13/01/1	
1404		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 13/01/1	jue 14/01/16	1403
1405		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 14/01/16	vie 15/01/16	1404
1406		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 15/01/16	lun 18/01/16	1405
1407		Invitación a participar en Mer- Link	0 días	lun 18/01/16	lun 18/01/16	1406
1408		**Recepción y estudio de ofertas**	**24 días**	**lun 18/01/16**	**vie 19/02/16**	
1409		**Invitación a participar**	**15 días**	**lun 18/01/16**	**lun 08/02/16**	
1410		Envío de invitación	0 días	lun 18/01/16	lun 18/01/16	1407
1411		Objeción al cartel	10 días	lun 18/01/16	lun 01/02/16	1410
1412		Nuevo plazo para recibir ofertas	5 días	lun 01/02/16	lun 08/02/16	1411
1413		**Recepción y estudio de ofertas**	**9 días**	**lun 08/02/16**	**vie 19/02/16**	
1414		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 08/02/16	lun 08/02/16	1412
1415		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 08/02/16	lun 08/02/16	1414
1416		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 08/02/16	vie 12/02/16	1415
1417		Envio de prevenciones	0 días	vie 12/02/16	vie 12/02/16	1416
1418		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 12/02/16	mar 16/02/1	1417
1419		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 16/02/1	jue 18/02/16	1418
1420		Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 18/02/16	vie 19/02/16	1419
1421		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 19/02/16	lun 22/02/16	1420
1422		**Recurso de revocatoria**	**15 días**	**lun 22/02/16**	**lun 14/03/16**	
1423		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 22/02/16	mié 24/02/1	1421

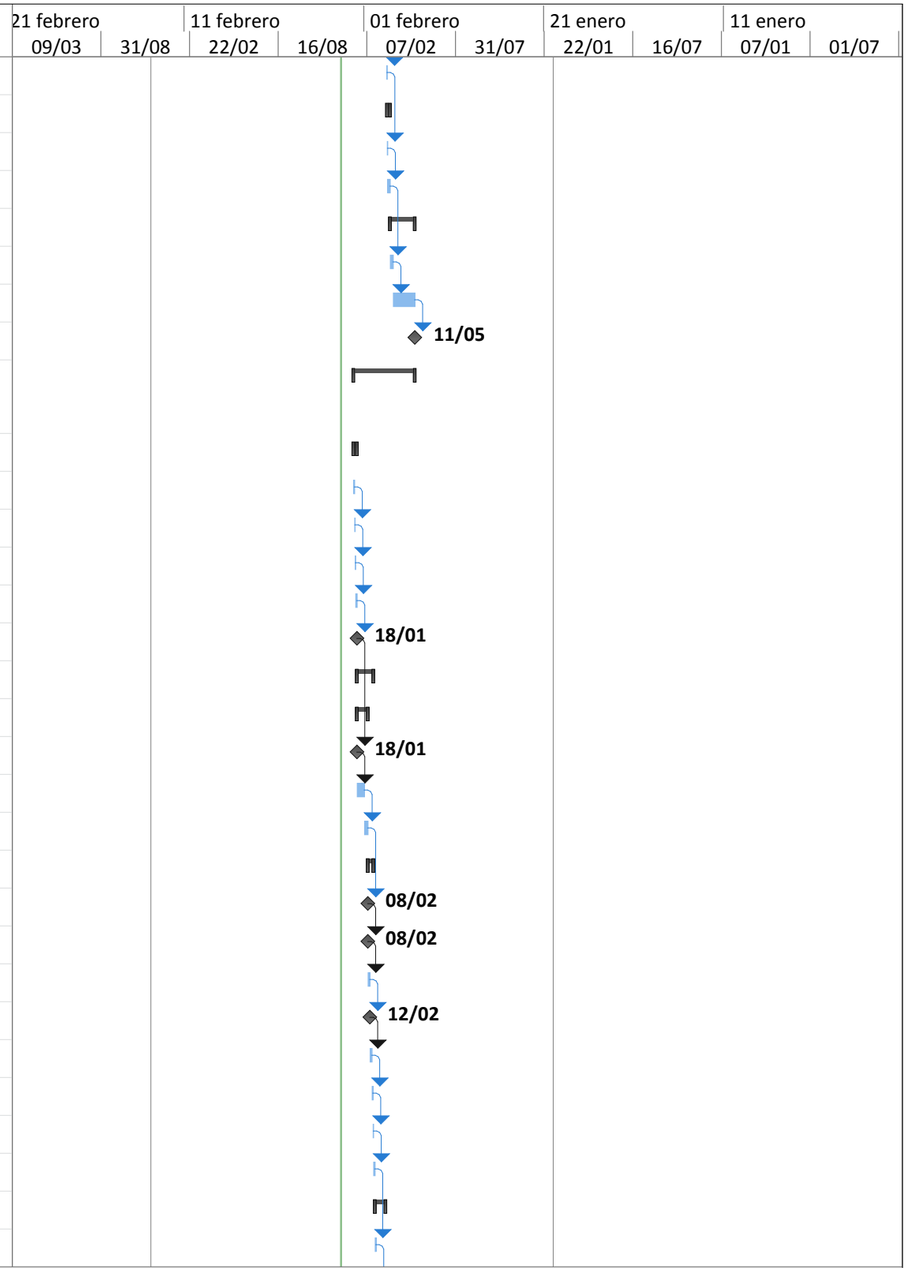

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1424		Resolución de Recurso de revocatoria	10 días	mié 24/02/16	mié 09/03/16	1423
1425		Adjudicación en firme	3 días	mié 09/03/16	lun 14/03/16	1424
1426		Solicitud de garantía de cumplimiento y especies fiscales	0 días	lun 14/03/16	lun 14/03/16	1425
1427		Presentación de timbres fiscales y garantía de cuimplimiento	0 días	lun 14/03/16	lun 14/03/16	1426
1428		**Trámite del Pedido**	**3 días**	**lun 14/03/16**	**jue 17/03/16**	
1429		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	lun 14/03/16	mar 15/03/16	1425
1430		Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	1 día	mar 15/03/16	mié 16/03/16	1429
1431		Notificación de Pedido de Compra	1 día	mié 16/03/16	jue 17/03/16	1430
1432		**Recepción de los items**	**4 días**	**jue 17/03/16**	**mié 23/03/16**	
1433		Entrega items en Almacén	1 día	jue 17/03/16	vie 18/03/16	1431
1434		Recibido a satisfacción	3 días	vie 18/03/16	mié 23/03/16	1433
1435		**Trámite de pago**	**32 días**	**mié 23/03/16**	**mié 11/05/16**	
1436		Envio documentos a Financiero	2 días	mié 23/03/16	mar 29/03/16	1434
1437		Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 29/03/16	mié 11/05/16	1436
1438		Conclusión trámite de Contratación	0 días	mié 11/05/16	mié 11/05/16	1437
1439		**UNIDAD DE PRENSA**	**96,5 días**	**vie 01/07/16**	**lun 21/11/16**	
1440		**2016CD-000005-503 UP_Monitoreo de Noticias (Vence 01/11/2016; Con Objeción y con Revocatoria) ₡2,400.000.00)**	**96,5 días**	**vie 01/07/16**	**lun 21/11/16**	
1441		**Elaboración de Cartel**	**5,5 días**	**vie 01/07/16**	**vie 08/07/16**	
1442		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	vie 01/07/16	vie 01/07/16	
1443		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	vie 01/07/16	mar 05/07/16	1442
1444		Revisión Técnica de cartel	1 día	mar 05/07/16	mié 06/07/16	1443
1445		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	mié 06/07/16	jue 07/07/16	1444
1446		Confección de cartel definitivo	1 día	jue 07/07/16	vie 08/07/16	1445
1447		Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	vie 08/07/16	vie 08/07/16	1446
1448		**Recepción y estudio de ofertas**	**24 días**	**vie 08/07/16**	**mar 16/08/1**	
1449		**Invitación a participar**	**15 días**	**vie 08/07/16**	**lun 01/08/16**	
1450		Invitación	5 días	vie 08/07/16	vie 15/07/16	1447
1451		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	vie 08/07/16	lun 11/07/16	1450CC
1452		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	lun 11/07/16	mar 26/07/16	1451
1453		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 26/07/16	lun 01/08/16	1452
1454		**Recepción y estudio de ofertas**	**9 días**	**lun 01/08/16**	**mar 16/08/1**	

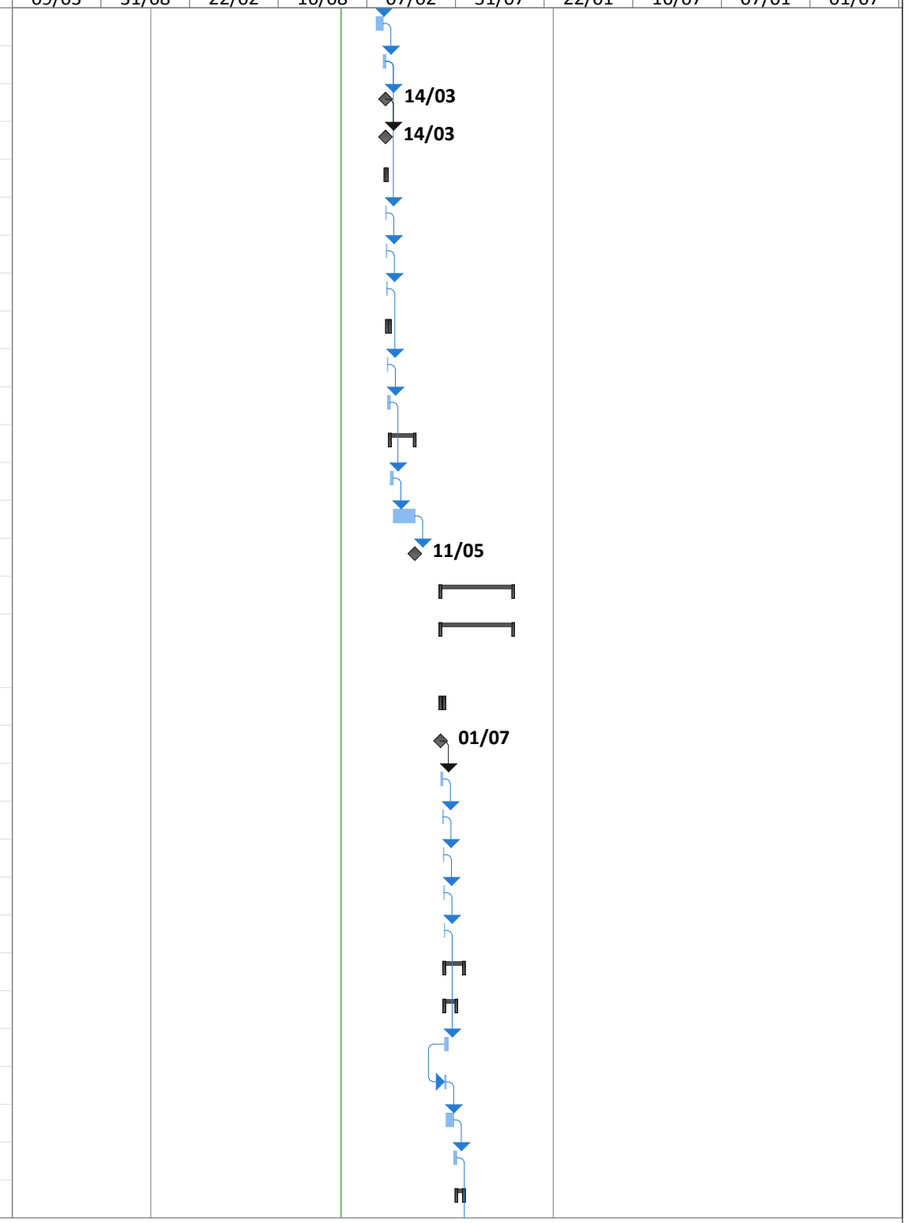

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1455		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 01/08/16	lun 01/08/16	1453
1456		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 01/08/16	lun 01/08/16	1455
1457		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 01/08/16	lun 08/08/16	1456
1458		Envio de prevenciones	0 días	lun 08/08/16	lun 08/08/16	1457
1459		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	lun 08/08/16	mié 10/08/16	1458
1460		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mié 10/08/16	vie 12/08/16	1459
1461		Elaboración de Informe Técnico	1 día	vie 12/08/16	mar 16/08/16	1460
1462		**Recomendación, adjudicación y comunicación**	**12 días**	**mar 16/08/1**	**jue 01/09/16**	
1463		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	mar 16/08/16	mié 17/08/16	1461
1464		**Recurso de revocatoria**	**9 días**	**mié 17/08/1**	**mar 30/08/1**	
1465		Plazo para recibir recurso	2 días	mié 17/08/16	vie 19/08/16	1463
1466		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	vie 19/08/16	mar 23/08/16	1465
1467		Plazo para audiencia inicial	2 días	mar 23/08/16	jue 25/08/16	1466
1468		Resolución de Recurso de revocatoria Art 136 RLCA	3 días	jue 25/08/16	mar 30/08/16	1467
1469		Adjudicación en firme	2 días	mar 30/08/16	jue 01/09/16	1468
1470		**Trámite del Pedido**	**5 días**	**jue 01/09/16**	**jue 08/09/16**	
1471		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	jue 01/09/16	vie 02/09/16	1469
1472		Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	vie 02/09/16	mié 07/09/16	1471
1473		Notificación de Pedido de Compra	1 día	mié 07/09/16	jue 08/09/16	1472
1474		**Recepción de los items**	**18 días**	**jue 08/09/16**	**mié 05/10/16**	
1475		Entrega items en Almacén	15 días	jue 08/09/16	vie 30/09/16	1473
1476		Recibido a satisfacción	3 días	vie 30/09/16	mié 05/10/16	1475
1477		**Trámite de pago**	**32 días**	**mié 05/10/16**	**lun 21/11/16**	
1478		Envio documentos a Financiero	2 días	mié 05/10/16	vie 07/10/16	1476
1479		Emisión de pago en Financiero	30 días	vie 07/10/16	lun 21/11/16	1478
1480		Conclusión trámite de Contratación	0 días	lun 21/11/16	lun 21/11/16	1479
1481		**CENTRO DE CAPACITACIÓN**	**96,5 días**	**lun 14/03/16**	**lun 01/08/16**	
1482		**2016CD-0000006-503 CC_Cursos Virtuales (Con Objeción y con Revocatoria; Contratado al 31 de Julio) ₡10.000.000.00**	**96,5 días**	**lun 14/03/16**	**lun 01/08/16**	
1483		**Elaboración de Cartel**	**5,5 días**	**lun 14/03/16**	**lun 21/03/16**	
1484		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 14/03/16	lun 14/03/16	
1485		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 14/03/16	mié 16/03/16	1484

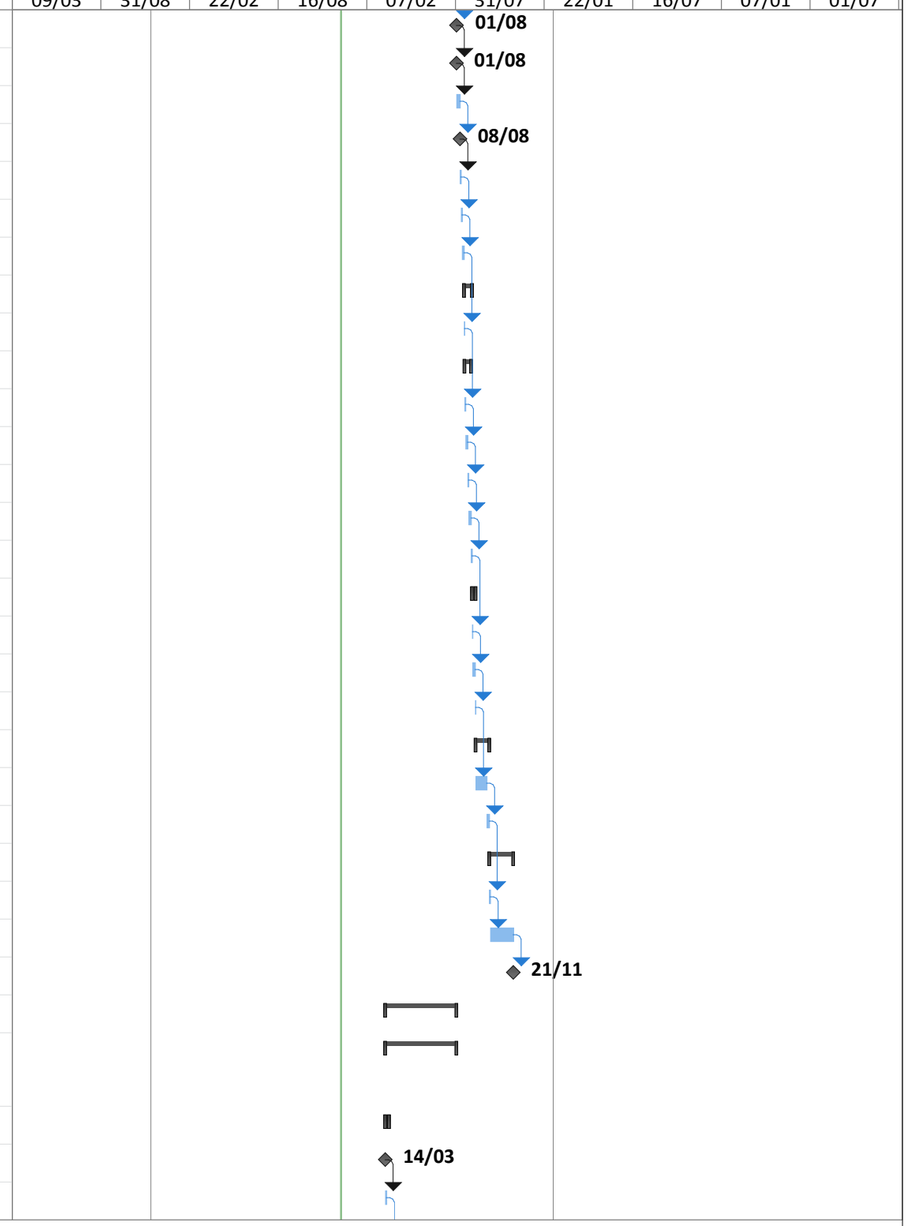

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1486		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 16/03/16	jue 17/03/16	1485
1487		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 17/03/16	vie 18/03/16	1486
1488		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 18/03/16	lun 21/03/16	1487
1489		Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 21/03/16	lun 21/03/16	1488
1490		**Recepción y estudio de ofertas**	**24 días**	**lun 21/03/16**	**mié 27/04/16**	
1491		**Invitación a participar**	**15 días**	**lun 21/03/16**	**jue 14/04/16**	
1492		Invitación	5 días	lun 21/03/16	mié 30/03/16	1489
1493		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 21/03/16	mar 22/03/16	1492CC
1494		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 22/03/16	jue 07/04/16	1493
1495		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	jue 07/04/16	jue 14/04/16	1494
1496		**Recepción y estudio de ofertas**	**9 días**	**jue 14/04/16**	**mié 27/04/16**	
1497		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	jue 14/04/16	jue 14/04/16	1495
1498		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	jue 14/04/16	jue 14/04/16	1497
1499		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	jue 14/04/16	mié 20/04/16	1498
1500		Envio de prevenciones	0 días	mié 20/04/16	mié 20/04/16	1499
1501		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	mié 20/04/16	vie 22/04/16	1500
1502		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	vie 22/04/16	mar 26/04/16	1501
1503		Elaboración de Informe Técnico	1 día	mar 26/04/16	mié 27/04/16	1502
1504		**Recomendación, adjudicación y comunicación**	**12 días**	**mié 27/04/16**	**vie 13/05/16**	
1505		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	mié 27/04/16	jue 28/04/16	1503
1506		**Recurso de revocatoria**	**9 días**	**jue 28/04/16**	**mié 11/05/16**	
1507		Plazo para recibir recurso	2 días	jue 28/04/16	lun 02/05/16	1505
1508		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	lun 02/05/16	mié 04/05/16	1507
1509		Plazo para audiencia inicial	2 días	mié 04/05/16	vie 06/05/16	1508
1510		Resolución de Recurso de revocatoria Art 136 RLCA	3 días	vie 06/05/16	mié 11/05/16	1509
1511		Adjudicación en firme	2 días	mié 11/05/16	vie 13/05/16	1510
1512		**Trámite del Pedido**	**5 días**	**vie 13/05/16**	**vie 20/05/16**	
1513		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	vie 13/05/16	lun 16/05/16	1511
1514		Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	lun 16/05/16	jue 19/05/16	1513
1515		Notificación de Pedido de Compra	1 día	jue 19/05/16	vie 20/05/16	1514
1516		**Recepción de los items**	**18 días**	**vie 20/05/16**	**mié 15/06/16**	
1517		Entrega items en Almacén	15 días	vie 20/05/16	vie 10/06/16	1515

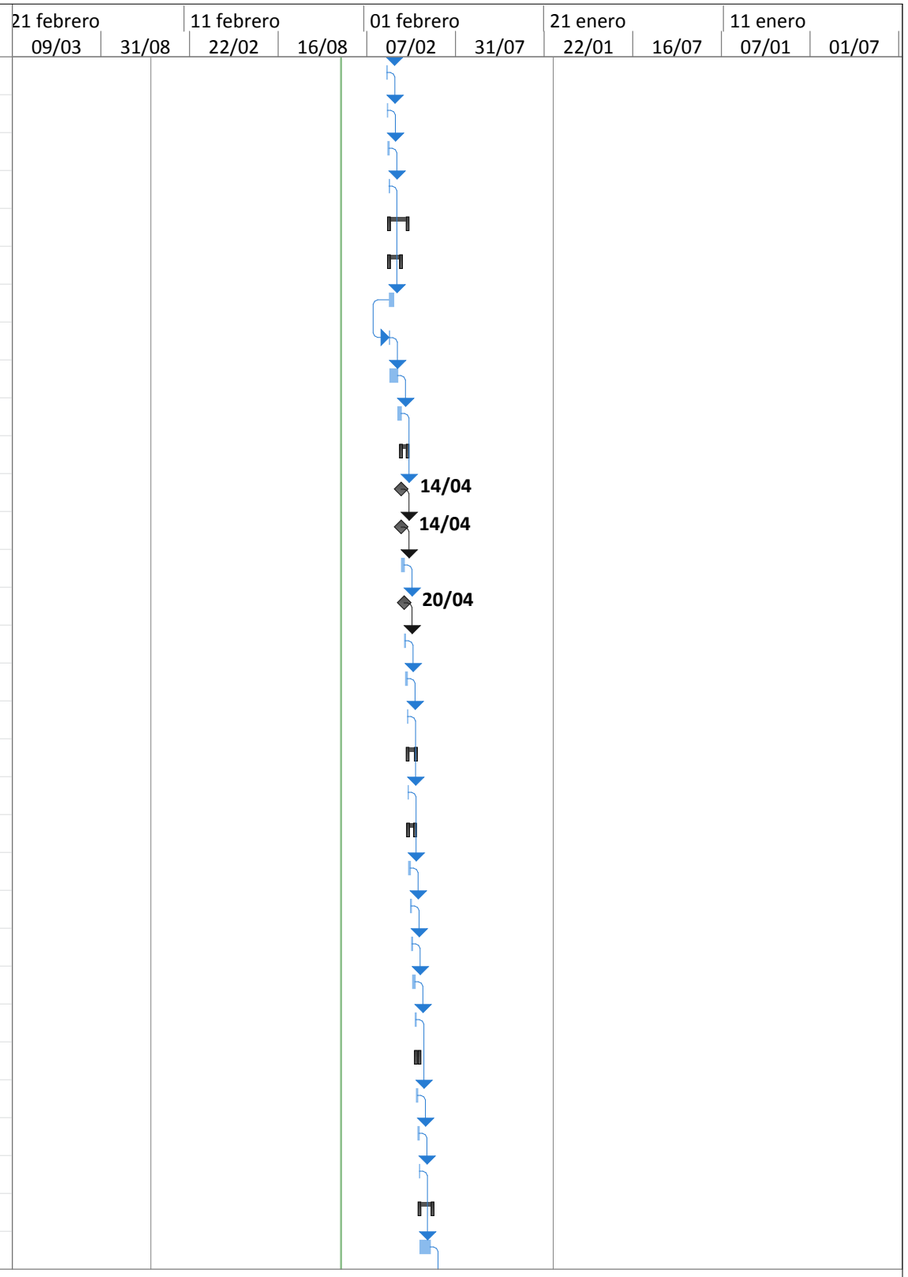

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1518		Recibido a satisfacción	3 días	vie 10/06/16	mié 15/06/16	1517
1519		**Trámite de pago**	**32 días**	**mié 15/06/16**	**lun 01/08/16**	
1520		Envio documentos a Financiero	2 días	mié 15/06/16	vie 17/06/16	1518
1521		Emisión de pago en Financiero	30 días	vie 17/06/16	lun 01/08/16	1520
1522		Conclusión trámite de Contratación	0 días	lun 01/08/16	lun 01/08/16	1521
1523		**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**159,37 días**	**lun 11/01/16**	**lun 29/08/16**	
1524		**2016CD-0000008-503 USG_Luminarias_(Contratado al 01/06/15) (Con Objeción y con Revocatoria) ₡3.000.000.00**	**96,5 días**	**lun 29/02/16**	**vie 15/07/16**	
1525		**Elaboración de Cartel**	**5,5 días**	**lun 29/02/16**	**lun 07/03/16**	
1526		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 29/02/16	lun 29/02/16	
1527		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 29/02/16	mié 02/03/16	1526
1528		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 02/03/16	jue 03/03/16	1527
1529		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 03/03/16	vie 04/03/16	1528
1530		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 04/03/16	lun 07/03/16	1529
1531		Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 07/03/16	lun 07/03/16	1530
1532		**Recepción y estudio de ofertas**	**24 días**	**lun 07/03/16**	**mié 13/04/16**	
1533		**Invitación a participar**	**15 días**	**lun 07/03/16**	**mié 30/03/16**	
1534		Invitación	5 días	lun 07/03/16	lun 14/03/16	1531
1535		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 07/03/16	mar 08/03/16	1534CC
1536		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 08/03/16	mar 22/03/16	1535
1537		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 22/03/16	mié 30/03/16	1536
1538		**Recepción y estudio de ofertas**	**9 días**	**mié 30/03/16**	**mié 13/04/16**	
1539		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	mié 30/03/16	mié 30/03/16	1537
1540		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	mié 30/03/16	mié 30/03/16	1539
1541		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	mié 30/03/16	mar 05/04/16	1540
1542		Envio de prevenciones	0 días	mar 05/04/16	mar 05/04/16	1541
1543		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	mar 05/04/16	jue 07/04/16	1542
1544		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	jue 07/04/16	mar 12/04/16	1543
1545		Elaboración de Informe Técnico	1 día	mar 12/04/16	mié 13/04/16	1544
1546		**Recomendación, adjudicación y comunicación**	**12 días**	**mié 13/04/16**	**vie 29/04/16**	
1547		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	mié 13/04/16	jue 14/04/16	1545
1548		**Recurso de revocatoria**	**9 días**	**jue 14/04/16**	**mié 27/04/16**	

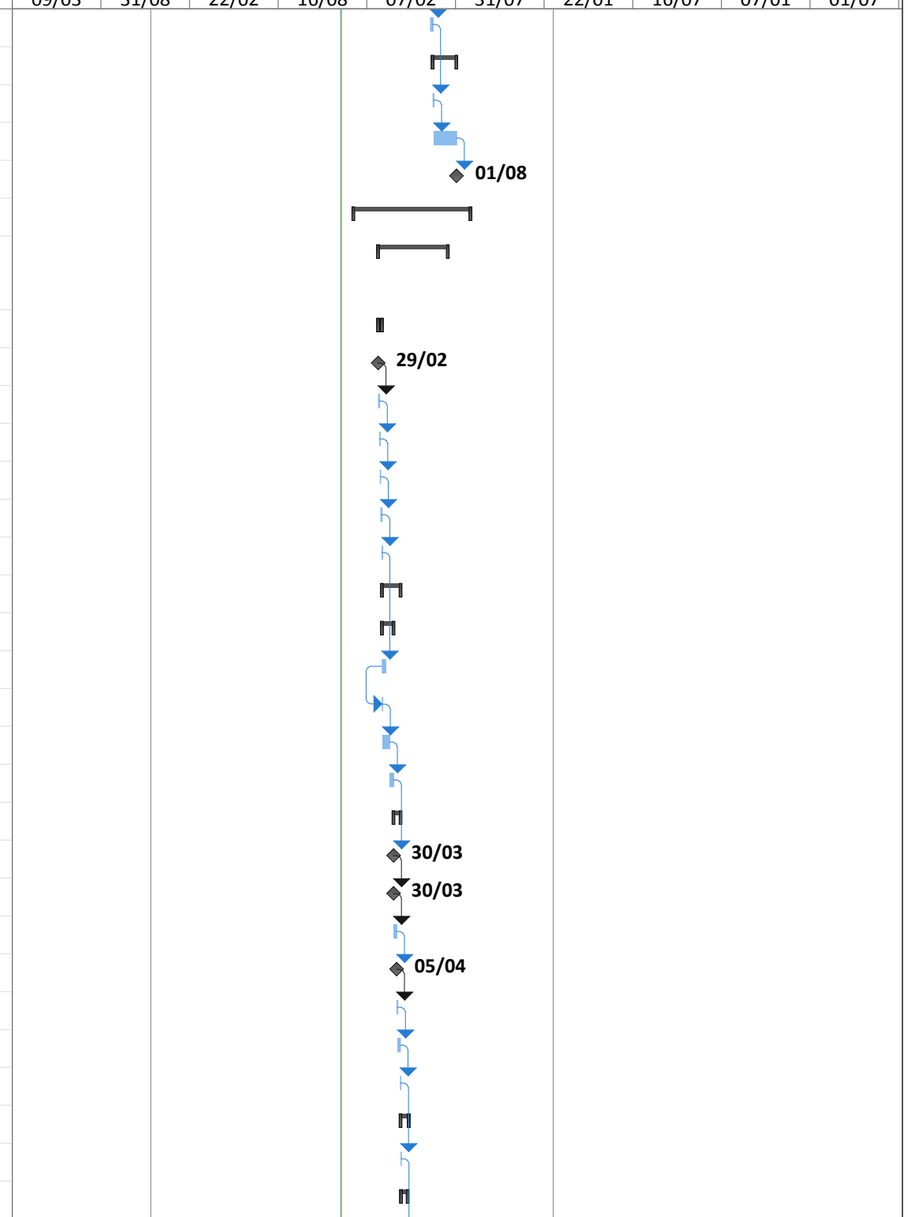

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1549		Plazo para recibir recurso	2 días	jue 14/04/16	lun 18/04/16	1547
1550		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	lun 18/04/16	mié 20/04/16	1549
1551		Plazo para audiencia inicial	2 días	mié 20/04/16	vie 22/04/16	1550
1552		Resolución de Recurso de revocatoria Art 136 RLCA	3 días	vie 22/04/16	mié 27/04/16	1551
1553		Adjudicación en firme	2 días	mié 27/04/16	vie 29/04/16	1552
1554		**Trámite del Pedido**	**5 días**	**vie 29/04/16**	**vie 06/05/16**	
1555		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	vie 29/04/16	lun 02/05/16	1553
1556		Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	lun 02/05/16	jue 05/05/16	1555
1557		Notificación de Pedido de Compra	1 día	jue 05/05/16	vie 06/05/16	1556
1558		**Recepción de los items**	**18 días**	**vie 06/05/16**	**mié 01/06/16**	
1559		Entrega items en Almacén	15 días	vie 06/05/16	vie 27/05/16	1557
1560		Recibido a satisfacción	3 días	vie 27/05/16	mié 01/06/16	1559
1561		**Trámite de pago**	**32 días**	**mié 01/06/16**	**vie 15/07/16**	
1562		Envio documentos a Financiero	2 días	mié 01/06/16	vie 03/06/16	1560
1563		Emisión de pago en Financiero	30 días	vie 03/06/16	vie 15/07/16	1562
1564		Conclusión trámite de Contratación	0 días	vie 15/07/16	vie 15/07/16	1563
1565		**2016CD-000009-503 USG Compra de A/C (Contratado al 15/08/16; Con Objeción y con Revocatoria) ₡7,000.000,00**	**96,5 días**	**mar 12/04/16**	**lun 29/08/16**	
1566		**Elaboración de Cartel**	**5,5 días**	**mar 12/04/16**	**mar 19/04/16**	
1567		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	mar 12/04/16	mar 12/04/16	
1568		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	mar 12/04/16	jue 14/04/16	1567
1569		Revisión Técnica de cartel	1 día	jue 14/04/16	vie 15/04/16	1568
1570		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	vie 15/04/16	lun 18/04/16	1569
1571		Confección de cartel definitivo	1 día	lun 18/04/16	mar 19/04/16	1570
1572		Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	mar 19/04/16	mar 19/04/16	1571
1573		**Recepción y estudio de ofertas**	**24 días**	**mar 19/04/16**	**lun 23/05/16**	
1574		**Invitación a participar**	**15 días**	**mar 19/04/16**	**mar 10/05/16**	
1575		Invitación	5 días	mar 19/04/16	mar 26/04/16	1572
1576		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	mar 19/04/16	mié 20/04/16	1575CC
1577		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mié 20/04/16	mié 04/05/16	1576
1578		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mié 04/05/16	mar 10/05/16	1577
1579		**Recepción y estudio de ofertas**	**9 días**	**mar 10/05/16**	**lun 23/05/16**	

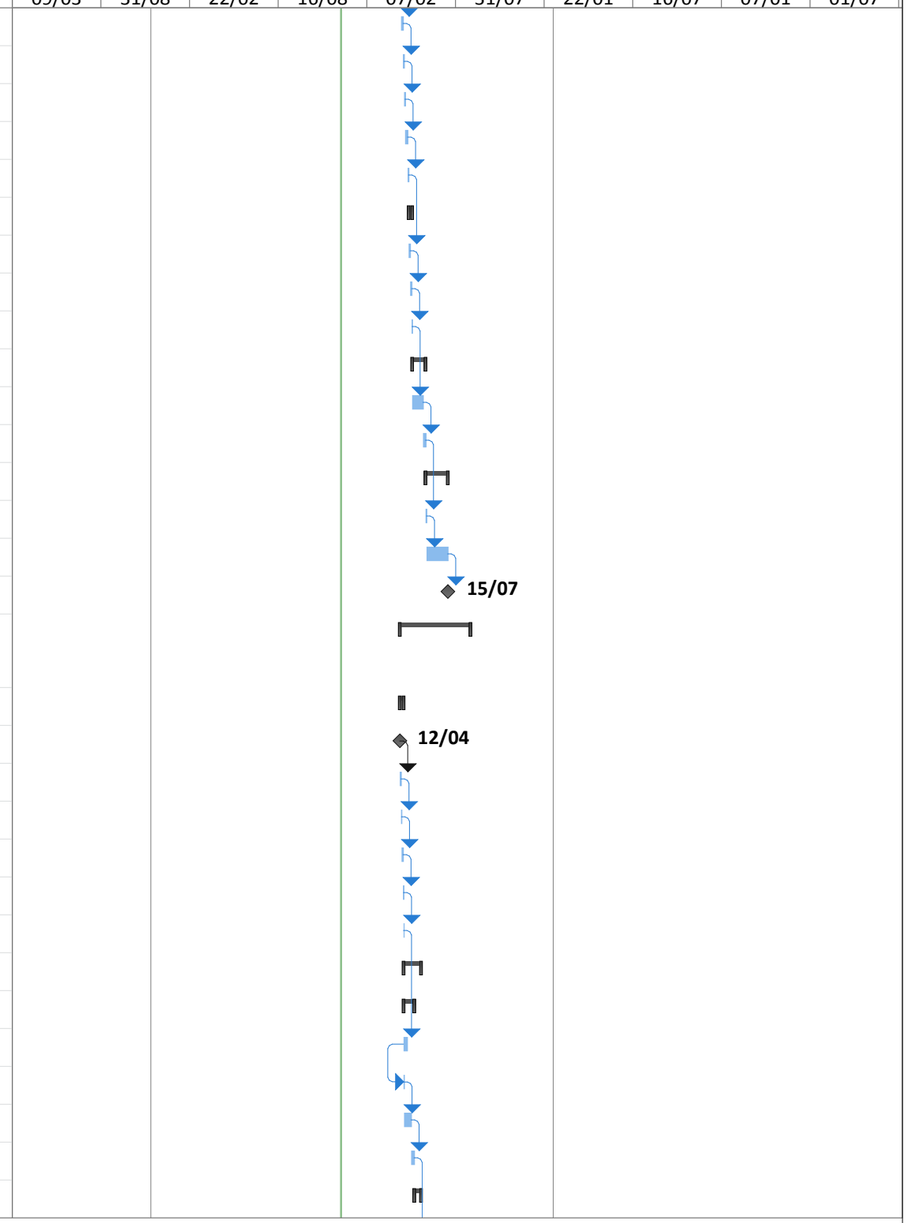

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1580		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	mar 10/05/1(	mar 10/05/1(	1578
1581		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	mar 10/05/1(	mar 10/05/1(	1580
1582		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	mar 10/05/1(	lun 16/05/16	1581
1583		Envio de prevenciones	0 días	lun 16/05/16	lun 16/05/16	1582
1584		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	lun 16/05/16	mié 18/05/1(	1583
1585		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mié 18/05/1(	vie 20/05/16	1584
1586		Elaboración de Informe Técnico	1 día	vie 20/05/16	lun 23/05/16	1585
1587		**Recomendación, adjudicación y comunicación**	**12 días**	**lun 23/05/16**	**mié 08/06/1(**	
1588		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	lun 23/05/16	mar 24/05/1(	1586
1589		**Recurso de revocatoria**	**9 días**	**mar 24/05/1**	**lun 06/06/16**	
1590		Plazo para recibir recurso	2 días	mar 24/05/1(	jue 26/05/16	1588
1591		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	jue 26/05/16	lun 30/05/16	1590
1592		Plazo para audiencia inicial	2 días	lun 30/05/16	mié 01/06/1(	1591
1593		Resolución de Recurso de revocatoria Art 136 RLCA	3 días	mié 01/06/1(	lun 06/06/16	1592
1594		Adjudicación en firme	2 días	lun 06/06/16	mié 08/06/1(	1593
1595		**Trámite del Pedido**	**5 días**	**mié 08/06/1(**	**mié 15/06/1(**	
1596		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mié 08/06/1(	jue 09/06/16	1594
1597		Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	jue 09/06/16	mar 14/06/1(	1596
1598		Notificación de Pedido de Compra	1 día	mar 14/06/1(	mié 15/06/1(	1597
1599		**Recepción de los items**	**18 días**	**mié 15/06/1(**	**lun 11/07/16**	
1600		Entrega items en Almacén	15 días	mié 15/06/1(	mié 06/07/1(	1598
1601		Recibido a satisfacción	3 días	mié 06/07/1(	lun 11/07/16	1600
1602		**Trámite de pago**	**32 días**	**lun 11/07/16**	**lun 29/08/16**	
1603		Envio documentos a Financiero	2 días	lun 11/07/16	mié 13/07/1(	1601
1604		Emisión de pago en Financiero	30 días	mié 13/07/1(	lun 29/08/16	1603
1605		Conclusión trámite de Contratación	0 días	lun 29/08/16	lun 29/08/16	1604
1606		**2016CD-000010-503 USG_Compra de Fibra Mineral para cielos (Contratado al 15/03/16; Con Objeción y con Revocatoria)₡3,469.500.00**	**96,5 días**	**lun 11/01/16**	**vie 27/05/16**	
1607		**Elaboración de Cartel**	**5,5 días**	**lun 11/01/16**	**lun 18/01/16**	
1608		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 11/01/16	lun 11/01/16	
1609		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 11/01/16	mié 13/01/1(	1608
1610		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 13/01/1(	jue 14/01/16	1609

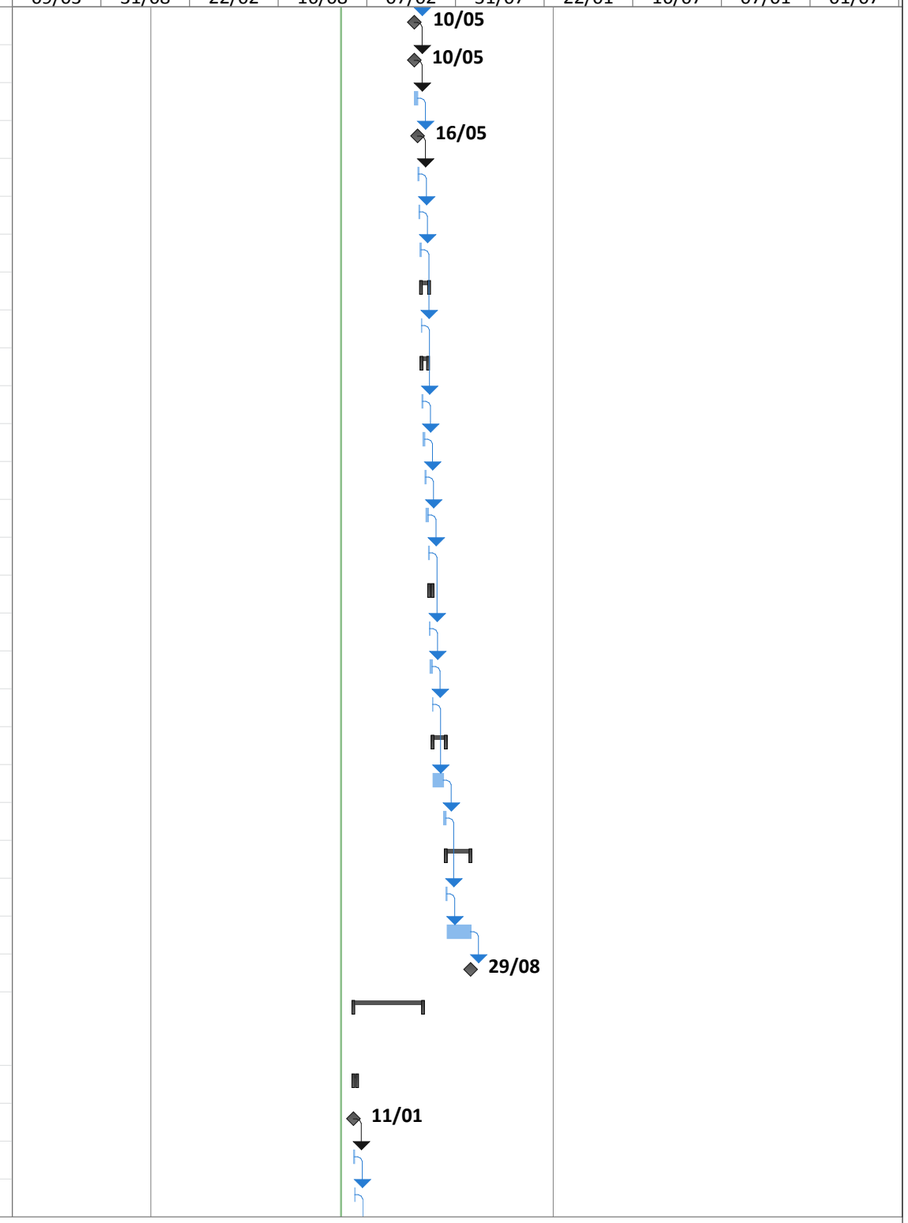

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1611		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 14/01/16	vie 15/01/16	1610
1612		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 15/01/16	lun 18/01/16	1611
1613		Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 18/01/16	lun 18/01/16	1612
1614		**Recepción y estudio de ofertas**	**24 días**	**lun 18/01/16**	**vie 19/02/16**	
1615		**Invitación a participar**	**15 días**	**lun 18/01/16**	**lun 08/02/16**	
1616		Invitación	5 días	lun 18/01/16	lun 25/01/16	1613
1617		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 18/01/16	mar 19/01/1(	1616CC
1618		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 19/01/1(	mar 02/02/1(	1617
1619		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 02/02/1(	lun 08/02/16	1618
1620		**Recepción y estudio de ofertas**	**9 días**	**lun 08/02/16**	**vie 19/02/16**	
1621		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 08/02/16	lun 08/02/16	1619
1622		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 08/02/16	lun 08/02/16	1621
1623		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 08/02/16	vie 12/02/16	1622
1624		Envio de prevenciones	0 días	vie 12/02/16	vie 12/02/16	1623
1625		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 12/02/16	mar 16/02/1(	1624
1626		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 16/02/1(	jue 18/02/16	1625
1627		Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 18/02/16	vie 19/02/16	1626
1628		**Recomendación, adjudicación y comunicación**	**12 días**	**vie 19/02/16**	**mar 08/03/1**	
1629		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 19/02/16	lun 22/02/16	1627
1630		**Recurso de revocatoria**	**9 días**	**lun 22/02/16**	**vie 04/03/16**	
1631		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 22/02/16	mié 24/02/1(	1629
1632		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 24/02/1(	vie 26/02/16	1631
1633		Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 26/02/16	mar 01/03/1(	1632
1634		Resolución de Recurso de revocatoria Art 136 RLCA	3 días	mar 01/03/1(	vie 04/03/16	1633
1635		Adjudicación en firme	2 días	vie 04/03/16	mar 08/03/1(	1634
1636		**Trámite del Pedido**	**5 días**	**mar 08/03/1**	**mar 15/03/1**	
1637		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 08/03/1(	mié 09/03/1(	1635
1638		Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 09/03/1(	lun 14/03/16	1637
1639		Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 14/03/16	mar 15/03/1(	1638
1640		**Recepción de los items**	**18 días**	**mar 15/03/1**	**mié 13/04/1(**	
1641		Entrega items en Almacén	15 días	mar 15/03/1(	jue 07/04/16	1639
1642		Recibido a satisfacción	3 días	jue 07/04/16	mié 13/04/1(	1641

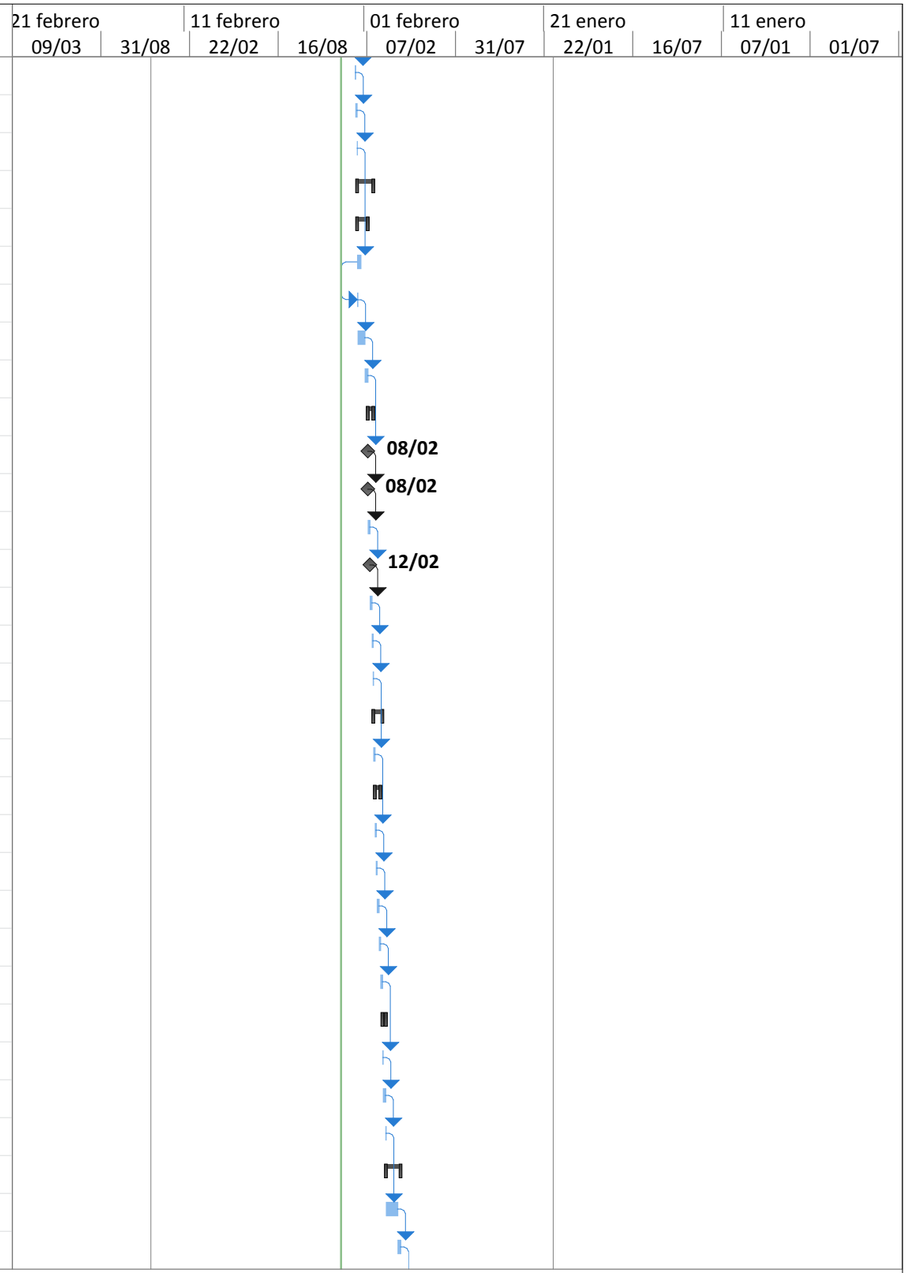

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1643		**Trámite de pago**	**32 días**	**mié 13/04/1**	**vie 27/05/16**	
1644		Envio documentos a Financiero	2 días	mié 13/04/1	vie 15/04/16	1642
1645		Emisión de pago en Financiero	30 días	vie 15/04/16	vie 27/05/16	1644
1646		Conclusión trámite de Contratación	0 días	vie 27/05/16	vie 27/05/16	1645
1647		**2016CD-000011-503 USG_Barra automatizada del Parqueo de Jefaturas Contratado al 01/07/16; Con Objeción y con Revocatoria) ₡5,500.000,00**	**96,5 días**	**lun 28/03/16**	**vie 12/08/16**	
1648		**Elaboración de Cartel**	**5,5 días**	**lun 28/03/16**	**lun 04/04/16**	
1649		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 28/03/16	lun 28/03/16	
1650		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 28/03/16	mié 30/03/1	1649
1651		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 30/03/1	jue 31/03/16	1650
1652		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 31/03/16	vie 01/04/16	1651
1653		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 01/04/16	lun 04/04/16	1652
1654		Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 04/04/16	lun 04/04/16	1653
1655		**Recepción y estudio de ofertas**	**24 días**	**lun 04/04/16**	**lun 09/05/16**	
1656		**Invitación a participar**	**15 días**	**lun 04/04/16**	**mar 26/04/1**	
1657		Invitación	5 días	lun 04/04/16	mar 12/04/1	1654
1658		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 04/04/16	mar 05/04/1	1657CC
1659		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 05/04/1	mié 20/04/1	1658
1660		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mié 20/04/1	mar 26/04/1	1659
1661		**Recepción y estudio de ofertas**	**9 días**	**mar 26/04/1**	**lun 09/05/16**	
1662		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	mar 26/04/1	mar 26/04/1	1660
1663		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	mar 26/04/1	mar 26/04/1	1662
1664		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	mar 26/04/1	lun 02/05/16	1663
1665		Envio de prevenciones	0 días	lun 02/05/16	lun 02/05/16	1664
1666		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	lun 02/05/16	mié 04/05/1	1665
1667		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mié 04/05/1	vie 06/05/16	1666
1668		Elaboración de Informe Técnico	1 día	vie 06/05/16	lun 09/05/16	1667
1669		**Recomendación, adjudicación y comunicación**	**12 días**	**lun 09/05/16**	**mié 25/05/1**	
1670		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	lun 09/05/16	mar 10/05/1	1668
1671		**Recurso de revocatoria**	**9 días**	**mar 10/05/1**	**lun 23/05/16**	
1672		Plazo para recibir recurso	2 días	mar 10/05/1	jue 12/05/16	1670
1673		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	jue 12/05/16	lun 16/05/16	1672

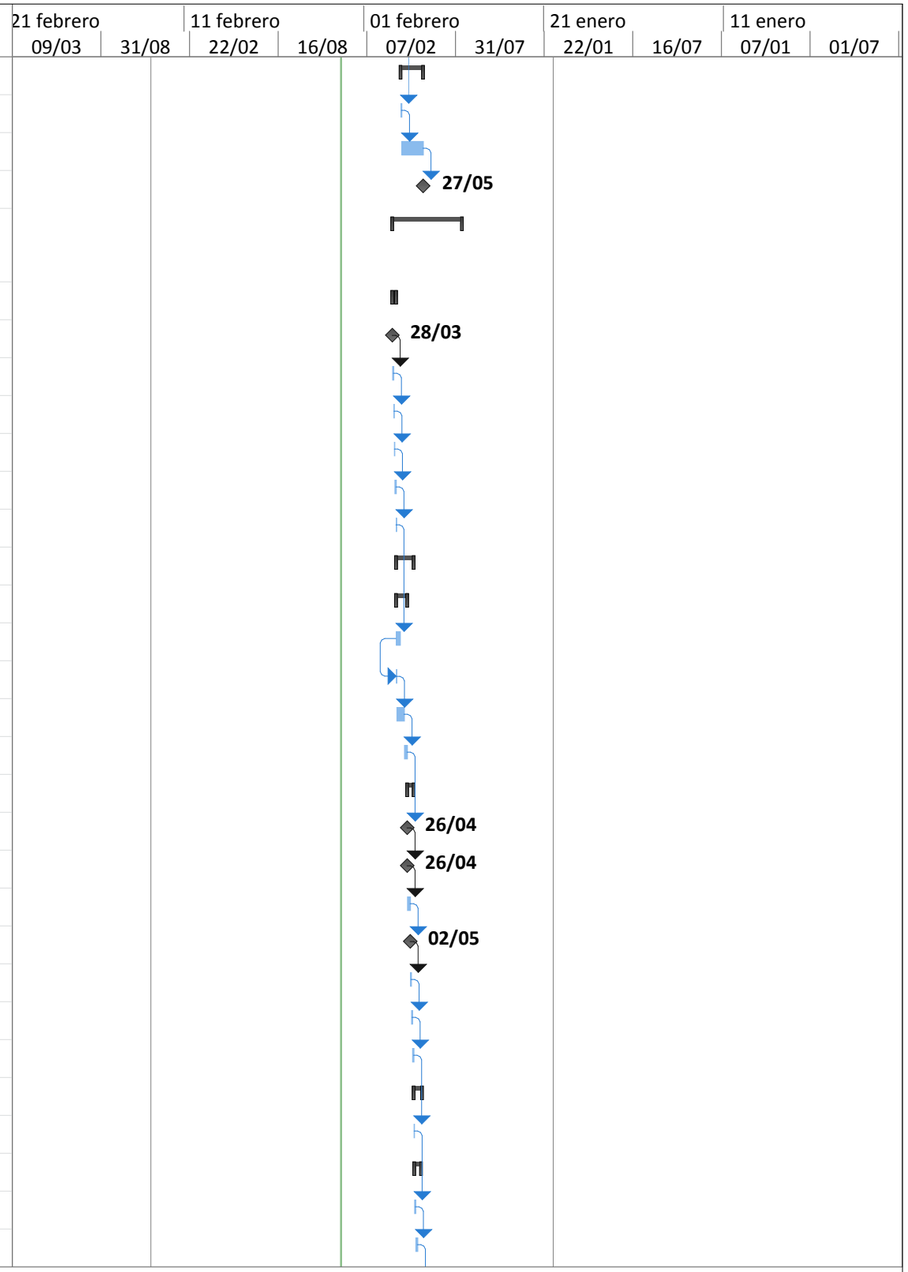

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1674		Plazo para audiencia inicial	2 días	lun 16/05/16	mié 18/05/16	1673
1675		Resolución de Recurso de revocatoria Art 136 RLCA	3 días	mié 18/05/16	lun 23/05/16	1674
1676		Adjudicación en firme	2 días	lun 23/05/16	mié 25/05/16	1675
1677		**Trámite del Pedido**	**5 días**	**mié 25/05/16**	**mié 01/06/16**	
1678		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mié 25/05/16	jue 26/05/16	1676
1679		Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	jue 26/05/16	mar 31/05/16	1678
1680		Notificación de Pedido de Compra	1 día	mar 31/05/16	mié 01/06/16	1679
1681		**Recepción de los items**	**18 días**	**mié 01/06/16**	**lun 27/06/16**	
1682		Entrega items en Almacén	15 días	mié 01/06/16	mié 22/06/16	1680
1683		Recibido a satisfacción	3 días	mié 22/06/16	lun 27/06/16	1682
1684		**Trámite de pago**	**32 días**	**lun 27/06/16**	**vie 12/08/16**	
1685		Envio documentos a Financiero	2 días	lun 27/06/16	mié 29/06/16	1683
1686		Emisión de pago en Financiero	30 días	mié 29/06/16	vie 12/08/16	1685
1687		Conclusión trámite de Contratación	0 días	vie 12/08/16	vie 12/08/16	1686
1688		**2016CD-000012-503 USG_Mantenimiento de equipos Transformador (Contratado al 30/03/2016; Con Objeción y con Revocatoria) ₡2,393.500.00)**	**96,5 días**	**lun 18/01/16**	**vie 03/06/16**	
1689		**Elaboración de Cartel**	**5,5 días**	**lun 18/01/16**	**lun 25/01/16**	
1690		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 18/01/16	lun 18/01/16	
1691		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 18/01/16	mié 20/01/16	1690
1692		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 20/01/16	jue 21/01/16	1691
1693		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 21/01/16	vie 22/01/16	1692
1694		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 22/01/16	lun 25/01/16	1693
1695		Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 25/01/16	lun 25/01/16	1694
1696		**Recepción y estudio de ofertas**	**24 días**	**lun 25/01/16**	**vie 26/02/16**	
1697		**Invitación a participar**	**15 días**	**lun 25/01/16**	**lun 15/02/16**	
1698		Invitación	5 días	lun 25/01/16	lun 01/02/16	1695
1699		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 25/01/16	mar 26/01/16	1698CC
1700		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 26/01/16	mar 09/02/16	1699
1701		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 09/02/16	lun 15/02/16	1700
1702		**Recepción y estudio de ofertas**	**9 días**	**lun 15/02/16**	**vie 26/02/16**	
1703		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 15/02/16	lun 15/02/16	1701
1704		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 15/02/16	lun 15/02/16	1703

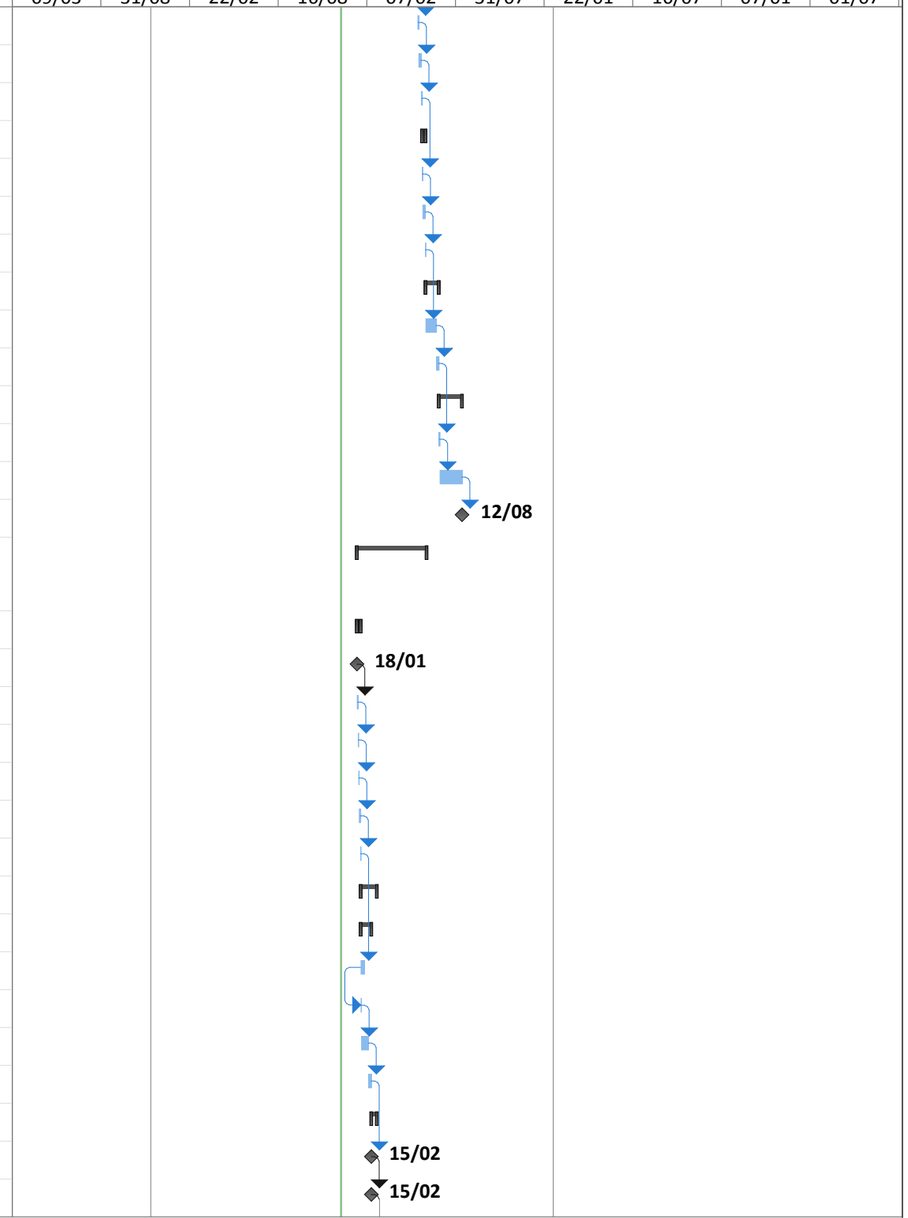

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1705		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 15/02/16	vie 19/02/16	1704
1706		Envio de prevenciones	0 días	vie 19/02/16	vie 19/02/16	1705
1707		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 19/02/16	mar 23/02/1(	1706
1708		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 23/02/1(	jue 25/02/16	1707
1709		Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 25/02/16	vie 26/02/16	1708
1710		**Recomendación, adjudicación y comunicación**	**12 días**	**vie 26/02/16**	**mar 15/03/1**	
1711		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 26/02/16	lun 29/02/16	1709
1712		**Recurso de revocatoria**	**9 días**	**lun 29/02/16**	**vie 11/03/16**	
1713		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 29/02/16	mié 02/03/1(	1711
1714		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 02/03/1(	vie 04/03/16	1713
1715		Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 04/03/16	mar 08/03/1(	1714
1716		Resolución de Recurso de revocatoria Art 136 RLCA	3 días	mar 08/03/1(	vie 11/03/16	1715
1717		Adjudicación en firme	2 días	vie 11/03/16	mar 15/03/1(	1716
1718		**Trámite del Pedido**	**5 días**	**mar 15/03/1**	**mar 22/03/1**	
1719		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 15/03/1(	mié 16/03/1(	1717
1720		Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 16/03/1(	lun 21/03/16	1719
1721		Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 21/03/16	mar 22/03/1(	1720
1722		**Recepción de los items**	**18 días**	**mar 22/03/1**	**mié 20/04/1(**	
1723		Entrega items en Almacén	15 días	mar 22/03/1(	vie 15/04/16	1721
1724		Recibido a satisfacción	3 días	vie 15/04/16	mié 20/04/1(	1723
1725		**Trámite de pago**	**32 días**	**mié 20/04/1(**	**vie 03/06/16**	
1726		Envio documentos a Financiero	2 días	mié 20/04/1(	vie 22/04/16	1724
1727		Emisión de pago en Financiero	30 días	vie 22/04/16	vie 03/06/16	1726
1728		Conclusión trámite de Contratación	0 días	vie 03/06/16	vie 03/06/16	1727
1729		**2016CD-000013-503 USG_Mantenimiento de Puertas Automáticas (Contratado al 30/03/16; Con Objeción y con Revocatoria) ₡ 929.600.00)**	**96,5 días**	**lun 25/01/16**	**vie 10/06/16**	
1730		**Elaboración de Cartel**	**5,5 días**	**lun 25/01/16**	**lun 01/02/16**	
1731		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 25/01/16	lun 25/01/16	
1732		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 25/01/16	mié 27/01/1(	1731
1733		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 27/01/1(	jue 28/01/16	1732
1734		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 28/01/16	vie 29/01/16	1733
1735		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 29/01/16	lun 01/02/16	1734

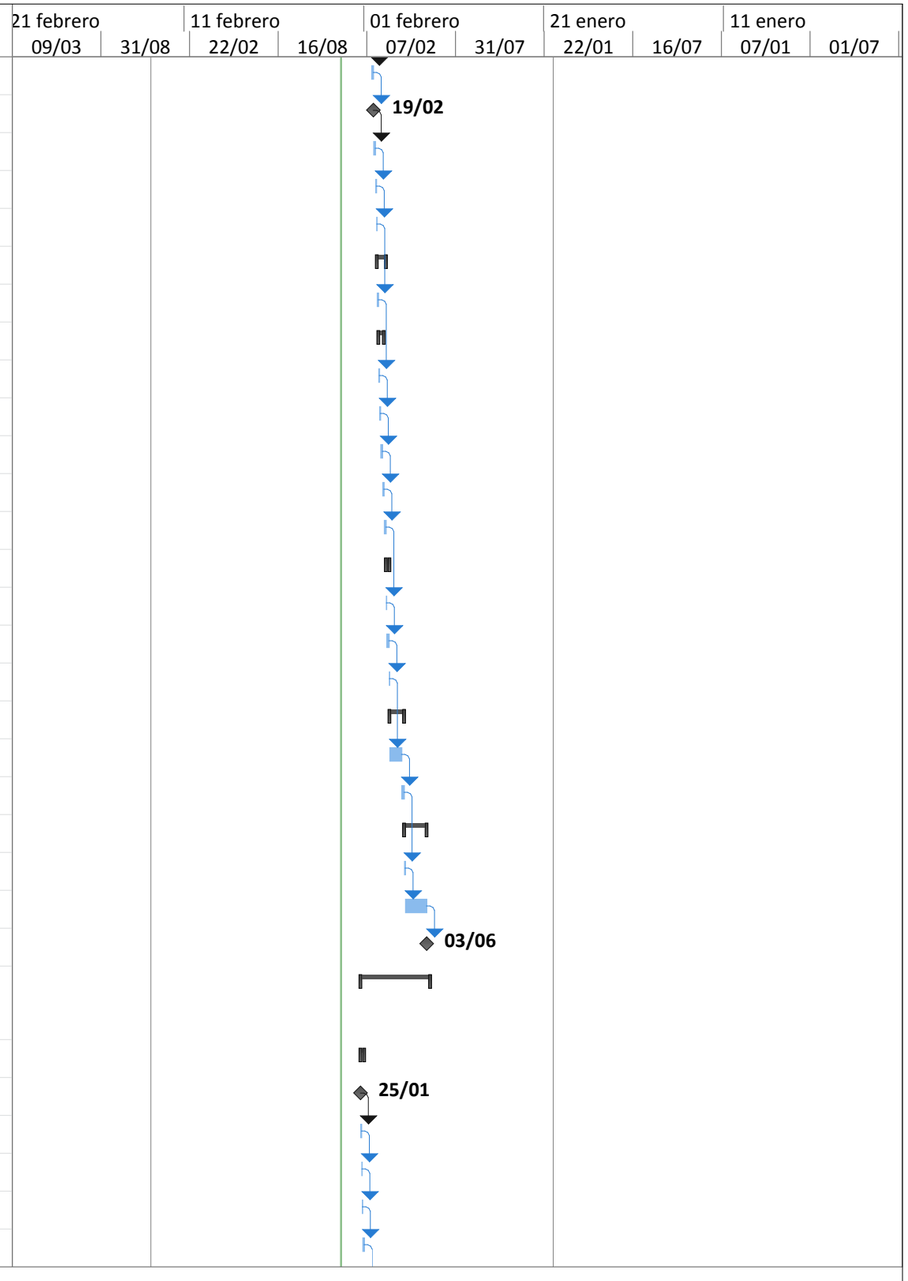

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1736		Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 01/02/16	lun 01/02/16	1735
1737		**Recepción y estudio de ofertas**	**24 días**	**lun 01/02/16**	**vie 04/03/16**	
1738		**Invitación a participar**	**15 días**	**lun 01/02/16**	**lun 22/02/16**	
1739		Invitación	5 días	lun 01/02/16	lun 08/02/16	1736
1740		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 01/02/16	mar 02/02/1(	1739CC
1741		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 02/02/1(	mar 16/02/1(	1740
1742		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 16/02/1(	lun 22/02/16	1741
1743		**Recepción y estudio de ofertas**	**9 días**	**lun 22/02/16**	**vie 04/03/16**	
1744		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 22/02/16	lun 22/02/16	1742
1745		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 22/02/16	lun 22/02/16	1744
1746		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 22/02/16	vie 26/02/16	1745
1747		Envio de prevenciones	0 días	vie 26/02/16	vie 26/02/16	1746
1748		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 26/02/16	mar 01/03/1(	1747
1749		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 01/03/1(	jue 03/03/16	1748
1750		Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 03/03/16	vie 04/03/16	1749
1751		**Recomendación, adjudicación y comunicación**	**12 días**	**vie 04/03/16**	**mar 22/03/1**	
1752		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 04/03/16	lun 07/03/16	1750
1753		**Recurso de revocatoria**	**9 días**	**lun 07/03/16**	**vie 18/03/16**	
1754		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 07/03/16	mié 09/03/1(	1752
1755		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 09/03/1(	vie 11/03/16	1754
1756		Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 11/03/16	mar 15/03/1(	1755
1757		Resolución de Recurso de revocatoria Art 136 RLCA	3 días	mar 15/03/1(	vie 18/03/16	1756
1758		Adjudicación en firme	2 días	vie 18/03/16	mar 22/03/1(	1757
1759		**Trámite del Pedido**	**5 días**	**mar 22/03/1**	**jue 31/03/16**	
1760		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 22/03/1(	mié 23/03/1(	1758
1761		Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 23/03/1(	mié 30/03/1(	1760
1762		Notificación de Pedido de Compra	1 día	mié 30/03/1(	jue 31/03/16	1761
1763		**Recepción de los items**	**18 días**	**jue 31/03/16**	**mié 27/04/1(**	
1764		Entrega items en Almacén	15 días	jue 31/03/16	vie 22/04/16	1762
1765		Recibido a satisfacción	3 días	vie 22/04/16	mié 27/04/1(	1764
1766		**Trámite de pago**	**32 días**	**mié 27/04/1(**	**vie 10/06/16**	
1767		Envio documentos a Financiero	2 días	mié 27/04/1(	vie 29/04/16	1765

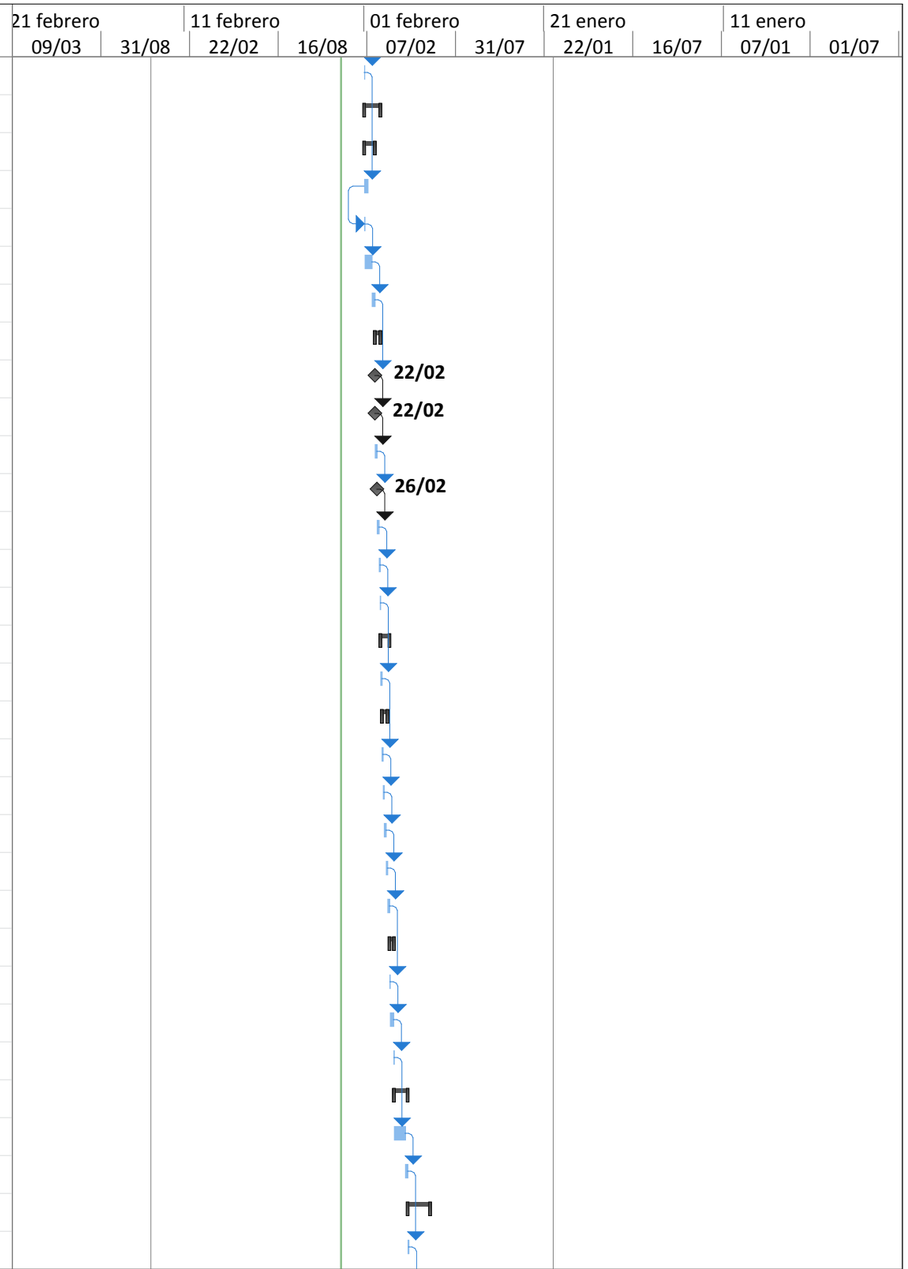

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1768		Emisión de pago en Financiero	30 días	vie 29/04/16	vie 10/06/16	1767
1769		Conclusión trámite de Contratación	0 días	vie 10/06/16	vie 10/06/16	1768
1770		**UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN**	**196,29 días**	**mié 13/01/1**	**mar 25/10/1**	
1771		**2016CD-000014-503 UTI_Reparación de equipos según demanda (Con Objeción y con Revocatoria) ₡7.100.000.00)**	**96,5 días**	**lun 25/01/16**	**vie 10/06/16**	
1772		**Elaboración de Cartel**	**5,5 días**	**lun 25/01/16**	**lun 01/02/16**	
1773		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 25/01/16	lun 25/01/16	
1774		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 25/01/16	mié 27/01/1(	1773
1775		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 27/01/1(	jue 28/01/16	1774
1776		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 28/01/16	vie 29/01/16	1775
1777		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 29/01/16	lun 01/02/16	1776
1778		Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 01/02/16	lun 01/02/16	1777
1779		**Recepción y estudio de ofertas**	**24 días**	**lun 01/02/16**	**vie 04/03/16**	
1780		**Invitación a participar**	**15 días**	**lun 01/02/16**	**lun 22/02/16**	
1781		Invitación	5 días	lun 01/02/16	lun 08/02/16	1778
1782		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 01/02/16	mar 02/02/1(	1781CC
1783		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 02/02/1(	mar 16/02/1(	1782
1784		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 16/02/1(	lun 22/02/16	1783
1785		**Recepción y estudio de ofertas**	**9 días**	**lun 22/02/16**	**vie 04/03/16**	
1786		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 22/02/16	lun 22/02/16	1784
1787		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 22/02/16	lun 22/02/16	1786
1788		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 22/02/16	vie 26/02/16	1787
1789		Envio de prevenciones	0 días	vie 26/02/16	vie 26/02/16	1788
1790		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 26/02/16	mar 01/03/1(	1789
1791		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 01/03/1(	jue 03/03/16	1790
1792		Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 03/03/16	vie 04/03/16	1791
1793		**Recomendación, adjudicación y comunicación**	**12 días**	**vie 04/03/16**	**mar 22/03/1**	
1794		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 04/03/16	lun 07/03/16	1792
1795		**Recurso de revocatoria**	**9 días**	**lun 07/03/16**	**vie 18/03/16**	
1796		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 07/03/16	mié 09/03/1(	1794
1797		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 09/03/1(	vie 11/03/16	1796
1798		Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 11/03/16	mar 15/03/1(	1797

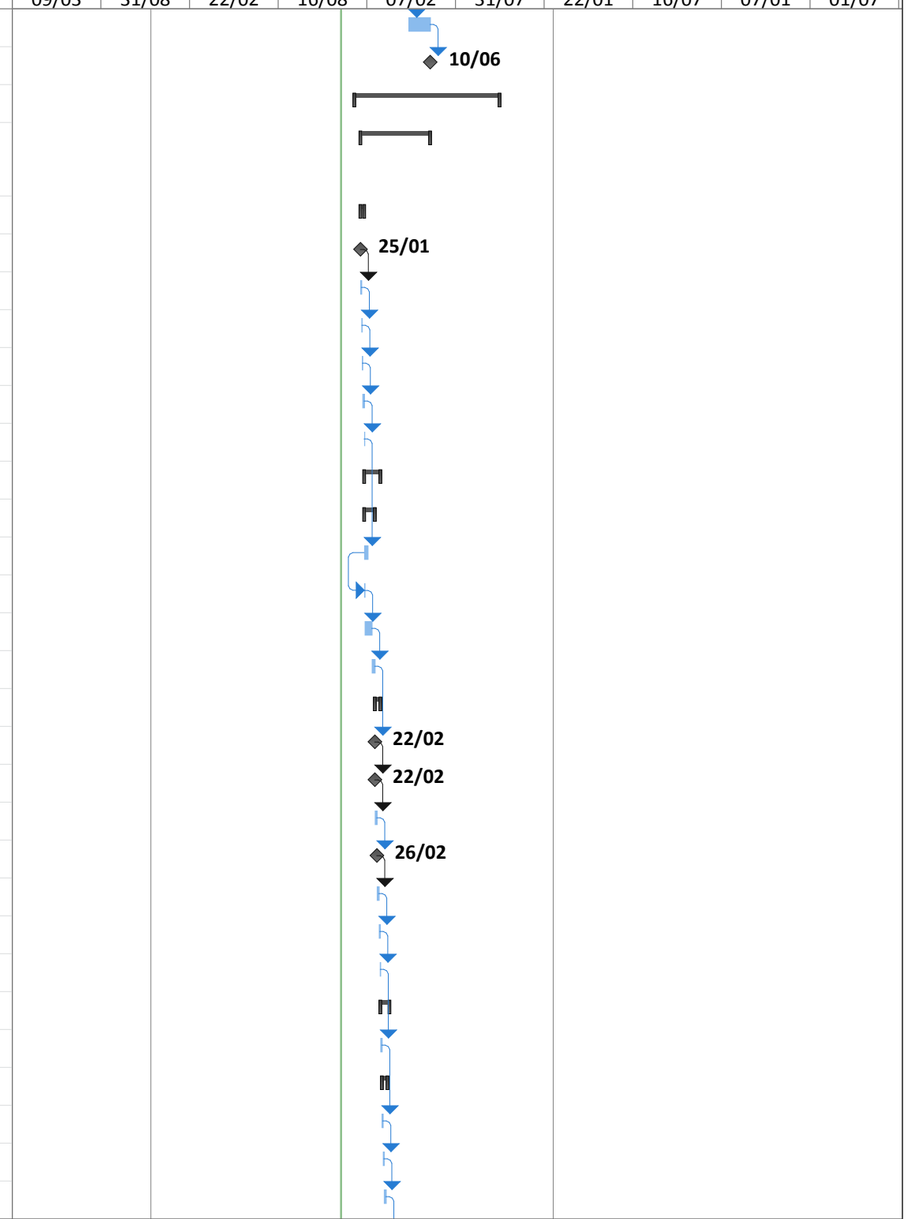

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1799		Resolución de Recurso de revocatoria Art 136 RLCA	3 días	mar 15/03/1(	vie 18/03/16	1798
1800		Adjudicación en firme	2 días	vie 18/03/16	mar 22/03/1(	1799
1801		**Trámite del Pedido**	**5 días**	**mar 22/03/1**	**jue 31/03/16**	
1802		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 22/03/1(	mié 23/03/1(	1800
1803		Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 23/03/1(	mié 30/03/1(	1802
1804		Notificación de Pedido de Compra	1 día	mié 30/03/1(	jue 31/03/16	1803
1805		**Recepción de los items**	**18 días**	**jue 31/03/16**	**mié 27/04/1(**	
1806		Entrega items en Almacén	15 días	jue 31/03/16	vie 22/04/16	1804
1807		Recibido a satisfacción	3 días	vie 22/04/16	mié 27/04/1(	1806
1808		**Trámite de pago**	**32 días**	**mié 27/04/1(**	**vie 10/06/16**	
1809		Envio documentos a Financiero	2 días	mié 27/04/1(	vie 29/04/16	1807
1810		Emisión de pago en Financiero	30 días	vie 29/04/16	vie 10/06/16	1809
1811		Conclusión trámite de Contratación	0 días	vie 10/06/16	vie 10/06/16	1810
1812		**2016CD-000015-503 UTI_Adquisición de Licencias (Contratado al 01/06/16; Con Objeción y con Revocatoria) ₡5.380.000.00)**	**96,5 días**	**lun 15/02/16**	**vie 01/07/16**	
1813		**Elaboración de Cartel**	**5,5 días**	**lun 15/02/16**	**lun 22/02/16**	
1814		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 15/02/16	lun 15/02/16	
1815		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 15/02/16	mié 17/02/1(	1814
1816		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 17/02/1(	jue 18/02/16	1815
1817		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 18/02/16	vie 19/02/16	1816
1818		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 19/02/16	lun 22/02/16	1817
1819		Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 22/02/16	lun 22/02/16	1818
1820		**Recepción y estudio de ofertas**	**24 días**	**lun 22/02/16**	**mar 29/03/1**	
1821		**Invitación a participar**	**15 días**	**lun 22/02/16**	**lun 14/03/16**	
1822		Invitación	5 días	lun 22/02/16	lun 29/02/16	1819
1823		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 22/02/16	mar 23/02/1(	1822CC
1824		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 23/02/1(	mar 08/03/1(	1823
1825		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 08/03/1(	lun 14/03/16	1824
1826		**Recepción y estudio de ofertas**	**9 días**	**lun 14/03/16**	**mar 29/03/1**	
1827		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 14/03/16	lun 14/03/16	1825
1828		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 14/03/16	lun 14/03/16	1827
1829		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 14/03/16	vie 18/03/16	1828

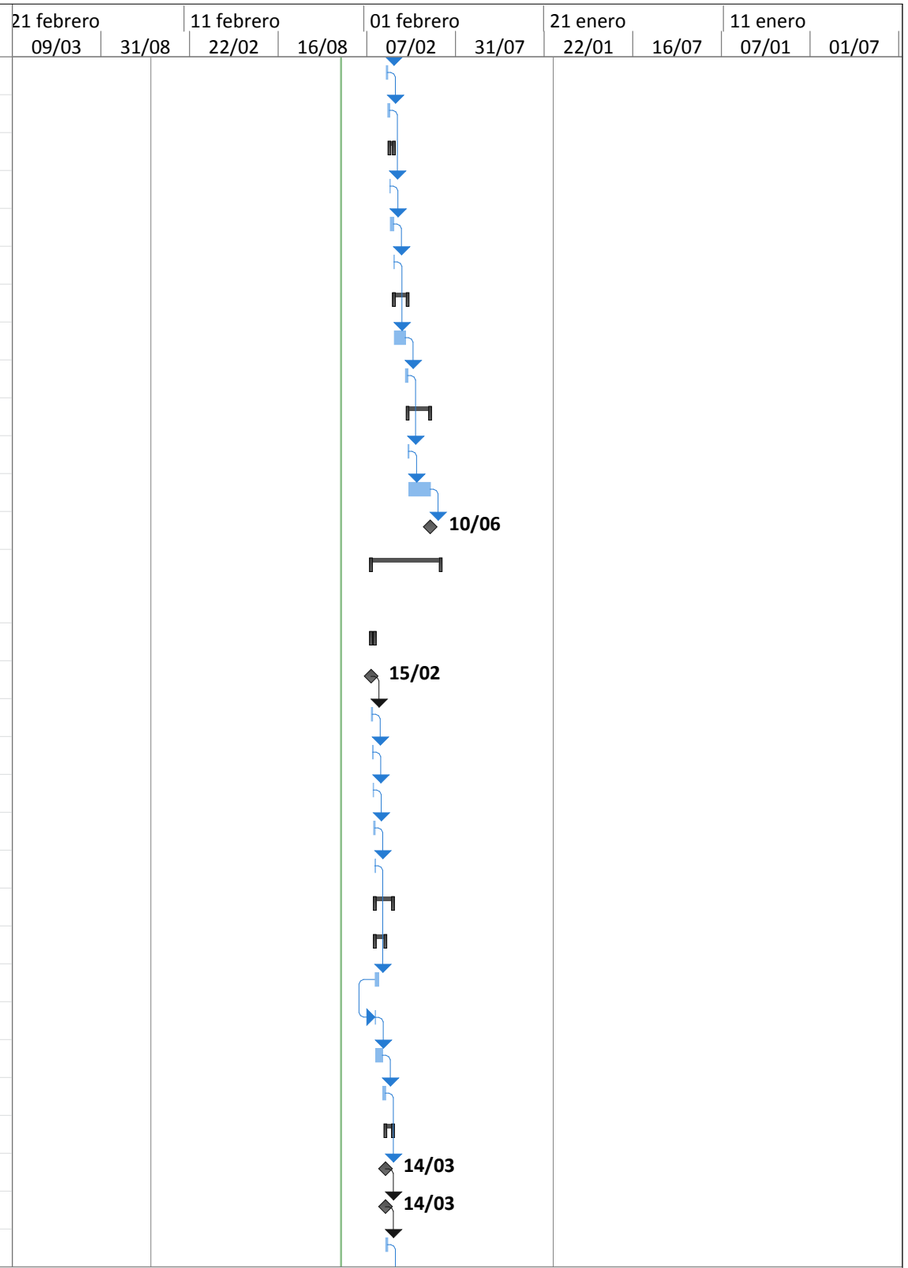

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1830		Envio de prevenciones	0 días	vie 18/03/16	vie 18/03/16	1829
1831		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 18/03/16	mar 22/03/1(	1830
1832		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 22/03/1(	lun 28/03/16	1831
1833		Elaboración de Informe Técnico	1 día	lun 28/03/16	mar 29/03/1(	1832
1834		**Recomendación, adjudicación y comunicación**	**12 días**	**mar 29/03/1**	**vie 15/04/16**	
1835		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	mar 29/03/1(	mié 30/03/1(	1833
1836		**Recurso de revocatoria**	**9 días**	**mié 30/03/1(**	**mié 13/04/1(**	
1837		Plazo para recibir recurso	2 días	mié 30/03/1(	vie 01/04/16	1835
1838		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	vie 01/04/16	mar 05/04/1(	1837
1839		Plazo para audiencia inicial	2 días	mar 05/04/1(	jue 07/04/16	1838
1840		Resolución de Recurso de revocatoria Art 136 RLCA	3 días	jue 07/04/16	mié 13/04/1(	1839
1841		Adjudicación en firme	2 días	mié 13/04/1(	vie 15/04/16	1840
1842		**Trámite del Pedido**	**5 días**	**vie 15/04/16**	**vie 22/04/16**	
1843		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	vie 15/04/16	lun 18/04/16	1841
1844		Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	lun 18/04/16	jue 21/04/16	1843
1845		Notificación de Pedido de Compra	1 día	jue 21/04/16	vie 22/04/16	1844
1846		**Recepción de los items**	**18 días**	**vie 22/04/16**	**mié 18/05/1(**	
1847		Entrega items en Almacén	15 días	vie 22/04/16	vie 13/05/16	1845
1848		Recibido a satisfacción	3 días	vie 13/05/16	mié 18/05/1(	1847
1849		**Trámite de pago**	**32 días**	**mié 18/05/1(**	**vie 01/07/16**	
1850		Envio documentos a Financiero	2 días	mié 18/05/1(	vie 20/05/16	1848
1851		Emisión de pago en Financiero	30 días	vie 20/05/16	vie 01/07/16	1850
1852		Conclusión trámite de Contratación	0 días	vie 01/07/16	vie 01/07/16	1851
1853		**2016CD-000017-503 Mantenimiento de equipo de videoconferencia Contratos vencen 28/03/16 y 01/12/16 (Con Objeción y con Revocatoria) ₡4,484.650.00**	**96,5 días**	**mié 13/01/16**	**mar 31/05/16**	
1854		**Elaboración de Cartel**	**5,5 días**	**mié 13/01/1(**	**mié 20/01/1(**	
1855		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	mié 13/01/1(	mié 13/01/1(	
1856		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	mié 13/01/1(	vie 15/01/16	1855
1857		Revisión Técnica de cartel	1 día	vie 15/01/16	lun 18/01/16	1856
1858		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	lun 18/01/16	mar 19/01/1(	1857
1859		Confección de cartel definitivo	1 día	mar 19/01/1(	mié 20/01/1(	1858
1860		Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	mié 20/01/1(	mié 20/01/1(	1859

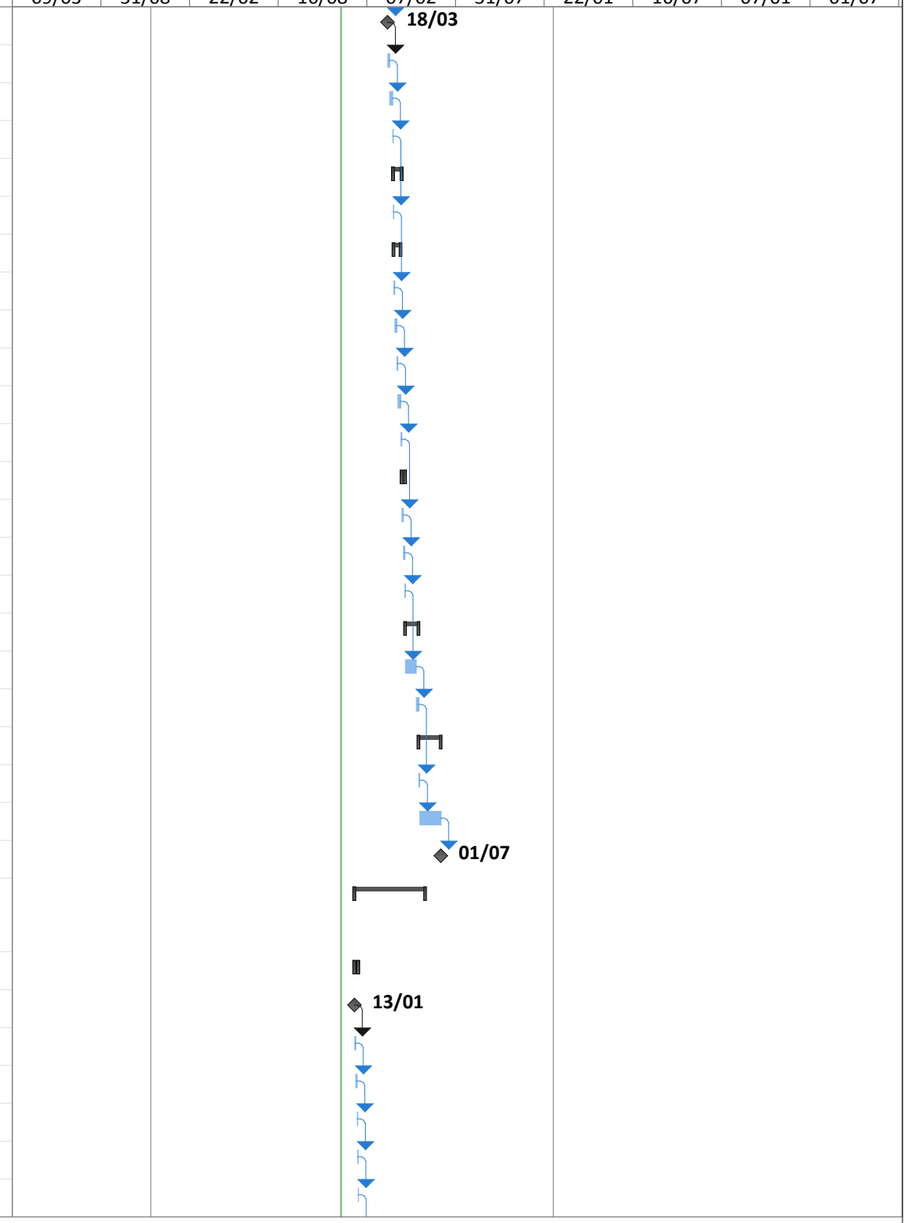

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1861		**Recepción y estudio de ofertas**	**24 días**	**mié 20/01/1**	**mar 23/02/1**	
1862		**Invitación a participar**	**15 días**	**mié 20/01/1**	**mié 10/02/1**	
1863		Invitación	5 días	mié 20/01/1	mié 27/01/1	1860
1864		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	mié 20/01/1	jue 21/01/16	1863CC
1865		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	jue 21/01/16	jue 04/02/16	1864
1866		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	jue 04/02/16	mié 10/02/1	1865
1867		**Recepción y estudio de ofertas**	**9 días**	**mié 10/02/1**	**mar 23/02/1**	
1868		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	mié 10/02/1	mié 10/02/1	1866
1869		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	mié 10/02/1	mié 10/02/1	1868
1870		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	mié 10/02/1	mar 16/02/1	1869
1871		Envio de prevenciones	0 días	mar 16/02/1	mar 16/02/1	1870
1872		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	mar 16/02/1	jue 18/02/16	1871
1873		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	jue 18/02/16	lun 22/02/16	1872
1874		Elaboración de Informe Técnico	1 día	lun 22/02/16	mar 23/02/1	1873
1875		**Recomendación, adjudicación y comunicación**	**12 días**	**mar 23/02/1**	**jue 10/03/16**	
1876		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	mar 23/02/1	mié 24/02/1	1874
1877		**Recurso de revocatoria**	**9 días**	**mié 24/02/1**	**mar 08/03/1**	
1878		Plazo para recibir recurso	2 días	mié 24/02/1	vie 26/02/16	1876
1879		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	vie 26/02/16	mar 01/03/1	1878
1880		Plazo para audiencia inicial	2 días	mar 01/03/1	jue 03/03/16	1879
1881		Resolución de Recurso de revocatoria Art 136 RLCA	3 días	jue 03/03/16	mar 08/03/1	1880
1882		Adjudicación en firme	2 días	mar 08/03/1	jue 10/03/16	1881
1883		**Trámite del Pedido**	**5 días**	**jue 10/03/16**	**jue 17/03/16**	
1884		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	jue 10/03/16	vie 11/03/16	1882
1885		Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	vie 11/03/16	mié 16/03/1	1884
1886		Notificación de Pedido de Compra	1 día	mié 16/03/1	jue 17/03/16	1885
1887		**Recepción de los items**	**18 días**	**jue 17/03/16**	**vie 15/04/16**	
1888		Entrega items en Almacén	15 días	jue 17/03/16	mar 12/04/1	1886
1889		Recibido a satisfacción	3 días	mar 12/04/1	vie 15/04/16	1888
1890		**Trámite de pago**	**32 días**	**vie 15/04/16**	**mar 31/05/1**	
1891		Envio documentos a Financiero	2 días	vie 15/04/16	mar 19/04/1	1889
1892		Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 19/04/1	mar 31/05/1	1891

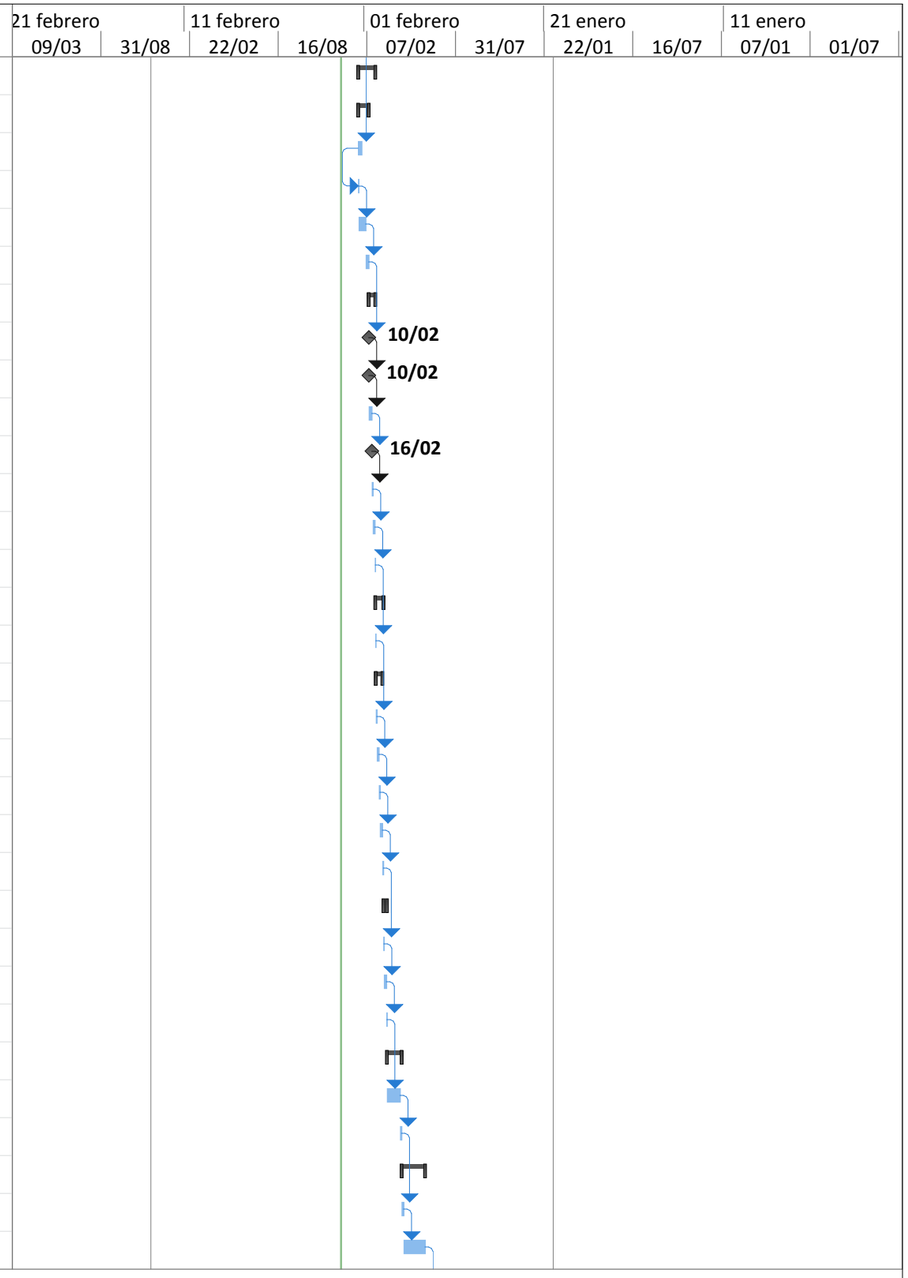

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1893		Conclusión trámite de Contratación	0 días	mar 31/05/1(	mar 31/05/1(	1892
1894		**2016CD-000018-503 UTI_Contrato para el Servidor de Producción T4 (Vence el 01/06/16; Con Objeción y con Revocatoria) ₡2,493.000,00**	**96,5 días**	**mié 20/01/16**	**mar 07/06/16**	
1895		**Elaboración de Cartel**	**5,5 días**	**mié 20/01/1(**	**mié 27/01/1(**	
1896		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	mié 20/01/1(	mié 20/01/1(	
1897		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	mié 20/01/1(	vie 22/01/16	1896
1898		Revisión Técnica de cartel	1 día	vie 22/01/16	lun 25/01/16	1897
1899		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	lun 25/01/16	mar 26/01/1(	1898
1900		Confección de cartel definitivo	1 día	mar 26/01/1(	mié 27/01/1(	1899
1901		Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	mié 27/01/1(	mié 27/01/1(	1900
1902		**Recepción y estudio de ofertas**	**24 días**	**mié 27/01/1(**	**mar 01/03/1**	
1903		**Invitación a participar**	**15 días**	**mié 27/01/1(**	**mié 17/02/1(**	
1904		Invitación	5 días	mié 27/01/1(	mié 03/02/1(	1901
1905		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	mié 27/01/1(	jue 28/01/16	1904CC
1906		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	jue 28/01/16	jue 11/02/16	1905
1907		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	jue 11/02/16	mié 17/02/1(	1906
1908		**Recepción y estudio de ofertas**	**9 días**	**mié 17/02/1(**	**mar 01/03/1**	
1909		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	mié 17/02/1(	mié 17/02/1(	1907
1910		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	mié 17/02/1(	mié 17/02/1(	1909
1911		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	mié 17/02/1(	mar 23/02/1(	1910
1912		Envio de prevenciones	0 días	mar 23/02/1(	mar 23/02/1(	1911
1913		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	mar 23/02/1(	jue 25/02/16	1912
1914		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	jue 25/02/16	lun 29/02/16	1913
1915		Elaboración de Informe Técnico	1 día	lun 29/02/16	mar 01/03/1(	1914
1916		**Recomendación, adjudicación y comunicación**	**12 días**	**mar 01/03/1**	**jue 17/03/16**	
1917		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	mar 01/03/1(	mié 02/03/1(	1915
1918		**Recurso de revocatoria**	**9 días**	**mié 02/03/1(**	**mar 15/03/1**	
1919		Plazo para recibir recurso	2 días	mié 02/03/1(	vie 04/03/16	1917
1920		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	vie 04/03/16	mar 08/03/1(	1919
1921		Plazo para audiencia inicial	2 días	mar 08/03/1(	jue 10/03/16	1920
1922		Resolución de Recurso de revocatoria Art 136 RLCA	3 días	jue 10/03/16	mar 15/03/1(	1921
1923		Adjudicación en firme	2 días	mar 15/03/1(	jue 17/03/16	1922

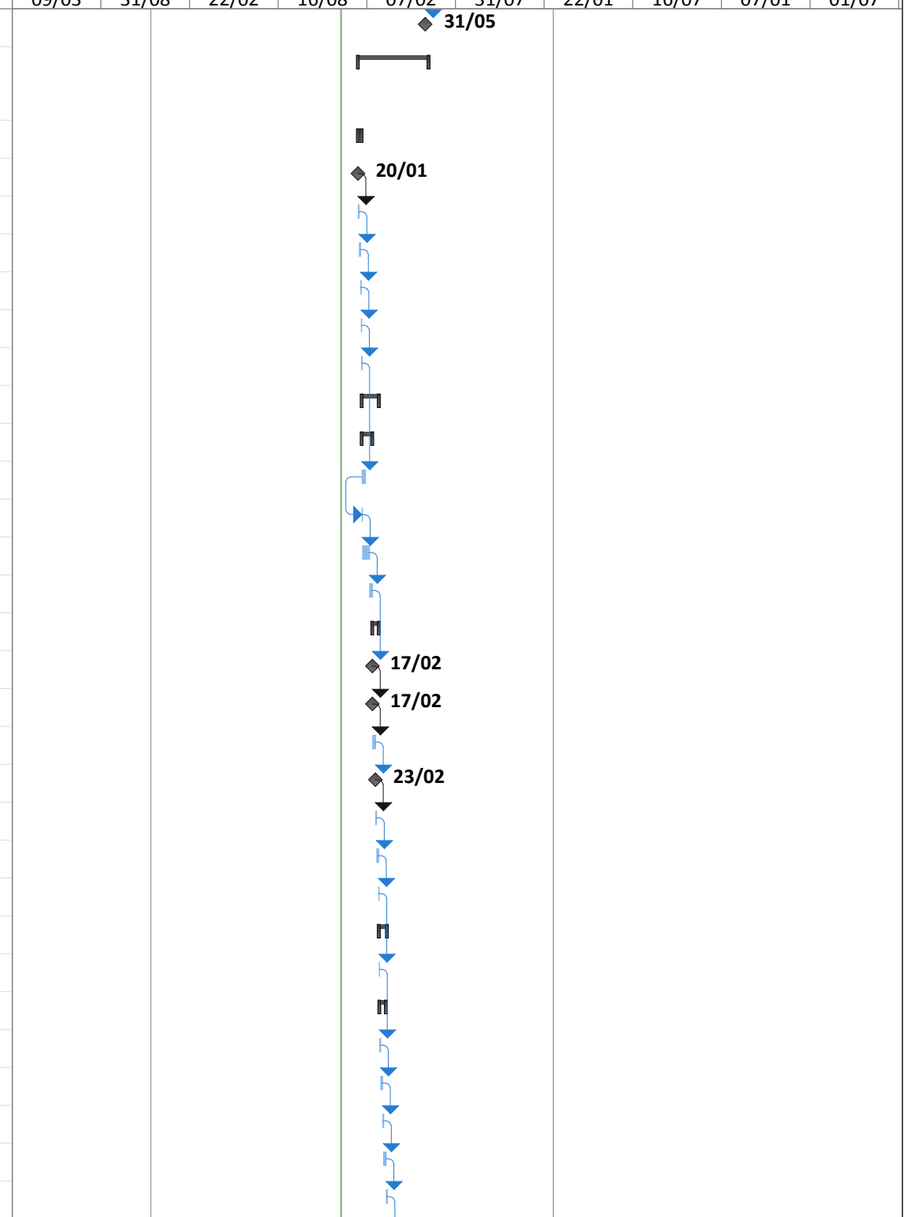

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1924		**Trámite del Pedido**	**5 días**	**jue 17/03/16**	**lun 28/03/16**	
1925		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	jue 17/03/16	vie 18/03/16	1923
1926		Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	vie 18/03/16	mié 23/03/16	1925
1927		Notificación de Pedido de Compra	1 día	mié 23/03/16	lun 28/03/16	1926
1928		**Recepción de los items**	**18 días**	**lun 28/03/16**	**vie 22/04/16**	
1929		Entrega items en Almacén	15 días	lun 28/03/16	mar 19/04/16	1927
1930		Recibido a satisfacción	3 días	mar 19/04/16	vie 22/04/16	1929
1931		**Trámite de pago**	**32 días**	**vie 22/04/16**	**mar 07/06/1**	
1932		Envio documentos a Financiero	2 días	vie 22/04/16	mar 26/04/16	1930
1933		Emisión de pago en Financiero	30 días	mar 26/04/16	mar 07/06/16	1932
1934		Conclusión trámite de Contratación	0 días	mar 07/06/16	mar 07/06/16	1933
1935		**2016CD-000019-503 UTI_Contrato de Mantenimiento y compra de unidades de respaldo(Vence 01/12/2016; Con Objeción y con Revocatoria) #1.108.000.00)**	**96,5 días**	**lun 06/06/16**	**mar 25/10/16**	
1936		**Elaboración de Cartel**	**5,5 días**	**lun 06/06/16**	**lun 13/06/16**	
1937		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 06/06/16	lun 06/06/16	
1938		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 06/06/16	mié 08/06/16	1937
1939		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 08/06/16	jue 09/06/16	1938
1940		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 09/06/16	vie 10/06/16	1939
1941		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 10/06/16	lun 13/06/16	1940
1942		Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 13/06/16	lun 13/06/16	1941
1943		**Recepción y estudio de ofertas**	**24 días**	**lun 13/06/16**	**vie 15/07/16**	
1944		**Invitación a participar**	**15 días**	**lun 13/06/16**	**lun 04/07/16**	
1945		Invitación	5 días	lun 13/06/16	lun 20/06/16	1942
1946		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 13/06/16	mar 14/06/16	1945CC
1947		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 14/06/16	mar 28/06/16	1946
1948		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 28/06/16	lun 04/07/16	1947
1949		**Recepción y estudio de ofertas**	**9 días**	**lun 04/07/16**	**vie 15/07/16**	
1950		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 04/07/16	lun 04/07/16	1948
1951		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 04/07/16	lun 04/07/16	1950
1952		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 04/07/16	vie 08/07/16	1951
1953		Envio de prevenciones	0 días	vie 08/07/16	vie 08/07/16	1952
1954		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 08/07/16	mar 12/07/16	1953

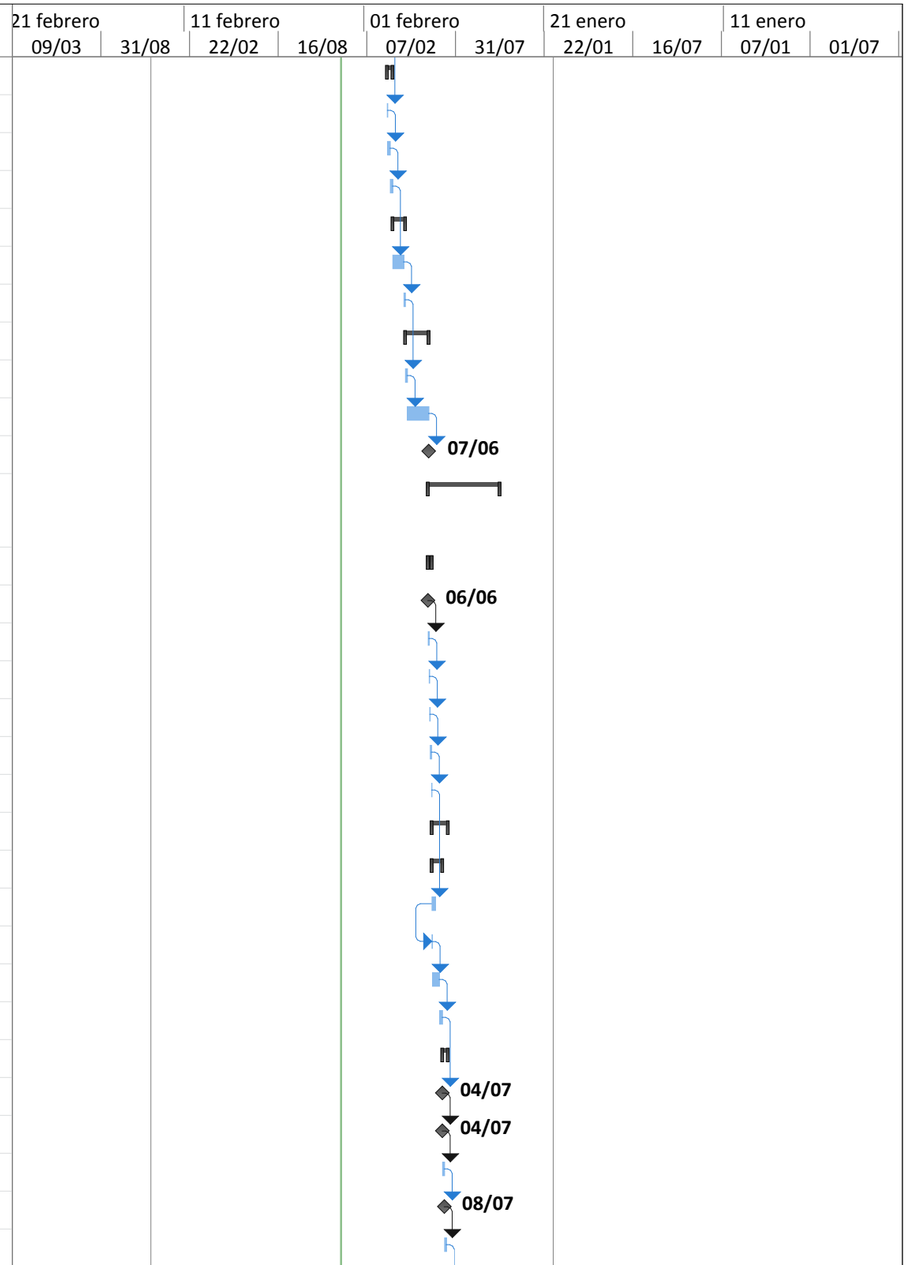

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1955		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 12/07/1	jue 14/07/16	1954
1956		Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 14/07/16	vie 15/07/16	1955
1957		**Recomendación, adjudicación y comunicación**	**12 días**	**vie 15/07/16**	**jue 04/08/16**	
1958		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 15/07/16	lun 18/07/16	1956
1959		**Recurso de revocatoria**	**9 días**	**lun 18/07/16**	**lun 01/08/16**	
1960		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 18/07/16	mié 20/07/1	1958
1961		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 20/07/1	vie 22/07/16	1960
1962		Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 22/07/16	mié 27/07/1	1961
1963		Resolución de Recurso de revocatoria Art 136 RLCA	3 días	mié 27/07/1	lun 01/08/16	1962
1964		Adjudicación en firme	2 días	lun 01/08/16	jue 04/08/16	1963
1965		**Trámite del Pedido**	**5 días**	**jue 04/08/16**	**jue 11/08/16**	
1966		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	jue 04/08/16	vie 05/08/16	1964
1967		Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	vie 05/08/16	mié 10/08/1	1966
1968		Notificación de Pedido de Compra	1 día	mié 10/08/1	jue 11/08/16	1967
1969		**Recepción de los items**	**18 días**	**jue 11/08/16**	**mié 07/09/1**	
1970		Entrega items en Almacén	15 días	jue 11/08/16	vie 02/09/16	1968
1971		Recibido a satisfacción	3 días	vie 02/09/16	mié 07/09/1	1970
1972		**Trámite de pago**	**32 días**	**mié 07/09/1**	**mar 25/10/1**	
1973		Envio documentos a Financiero	2 días	mié 07/09/1	vie 09/09/16	1971
1974		Emisión de pago en Financiero	30 días	vie 09/09/16	mar 25/10/1	1973
1975		Conclusión trámite de Contratación	0 días	mar 25/10/1	mar 25/10/1	1974
1976		**VARIAS UNIDADES**	**223,24 días**	**lun 04/01/16**	**mar 22/11/1**	
1977		**2015CD-000020-503 "Varios" Publicaciones en periódicos (De enero a diciembre 2016; Con Objeción y con Revocatoria) ₡12.354.000.00**	**96,5 días**	**lun 04/01/16**	**vie 20/05/16**	
1978		**Elaboración de Cartel**	**5,5 días**	**lun 04/01/16**	**lun 11/01/16**	
1985		**Recepción y estudio de ofertas**	**24 días**	**lun 11/01/16**	**vie 12/02/16**	
1986		**Invitación a participar**	**15 días**	**lun 11/01/16**	**lun 01/02/16**	
1987		Invitación	5 días	lun 11/01/16	lun 18/01/16	1984
1988		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 11/01/16	mar 12/01/1	1987CC
1989		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 12/01/1	mar 26/01/1	1988
1990		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mar 26/01/1	lun 01/02/16	1989
1991		**Recepción y estudio de ofertas**	**9 días**	**lun 01/02/16**	**vie 12/02/16**	

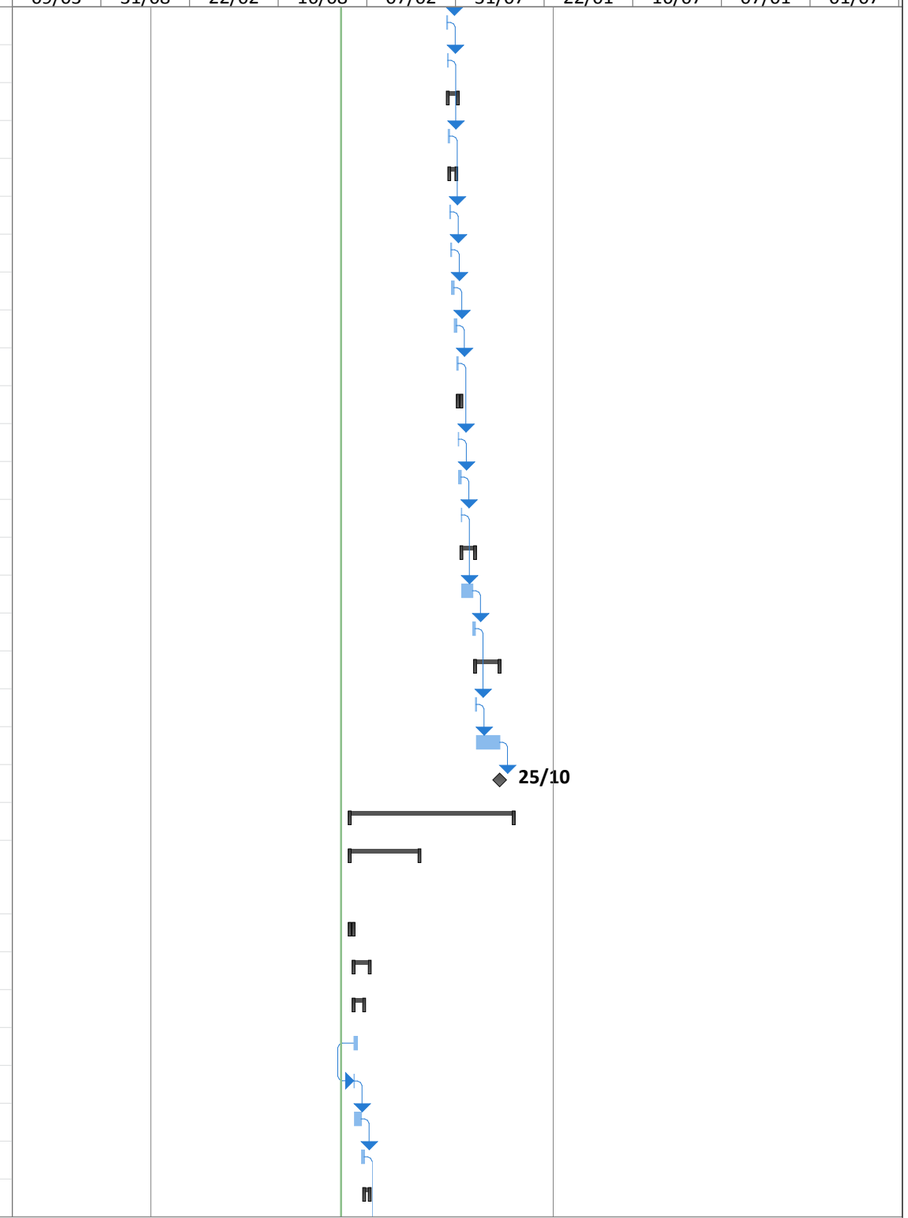

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1992		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	lun 01/02/16	lun 01/02/16	1990
1993		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	lun 01/02/16	lun 01/02/16	1992
1994		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	lun 01/02/16	vie 05/02/16	1993
1995		Envio de prevenciones	0 días	vie 05/02/16	vie 05/02/16	1994
1996		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	vie 05/02/16	mar 09/02/1(	1995
1997		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	mar 09/02/1(	jue 11/02/16	1996
1998		Elaboración de Informe Técnico	1 día	jue 11/02/16	vie 12/02/16	1997
1999		**Recomendación, adjudicación y comunicación**	**12 días**	**vie 12/02/16**	**mar 01/03/1**	
2000		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	vie 12/02/16	lun 15/02/16	1998
2001		**Recurso de revocatoria**	**9 días**	**lun 15/02/16**	**vie 26/02/16**	
2002		Plazo para recibir recurso	2 días	lun 15/02/16	mié 17/02/1(	2000
2003		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	mié 17/02/1(	vie 19/02/16	2002
2004		Plazo para audiencia inicial	2 días	vie 19/02/16	mar 23/02/1(	2003
2005		Resolución de Recurso de revocatoria Art 136 RLCA	3 días	mar 23/02/1(	vie 26/02/16	2004
2006		Adjudicación en firme	2 días	vie 26/02/16	mar 01/03/1(	2005
2007		**Trámite del Pedido**	**5 días**	**mar 01/03/1**	**mar 08/03/1**	
2008		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mar 01/03/1(	mié 02/03/1(	2006
2009		Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	mié 02/03/1(	lun 07/03/16	2008
2010		Notificación de Pedido de Compra	1 día	lun 07/03/16	mar 08/03/1(	2009
2011		**Recepción de los items**	**18 días**	**mar 08/03/1**	**mar 05/04/1**	
2012		Entrega items en Almacén	15 días	mar 08/03/1(	jue 31/03/16	2010
2013		Recibido a satisfacción	3 días	jue 31/03/16	mar 05/04/1(	2012
2014		**Trámite de pago**	**32 días**	**mar 05/04/1**	**vie 20/05/16**	
2015		Envio documentos a Financiero	2 días	mar 05/04/1(	jue 07/04/16	2013
2016		Emisión de pago en Financiero	30 días	jue 07/04/16	vie 20/05/16	2015
2017		Conclusión trámite de Contratación	0 días	vie 20/05/16	vie 20/05/16	2016
2018		**2015CD-000021-503 USI_DFOE_Compra de libros (Iniciar el 04/07/16; Con Objeción y con Revocatoria) ₡10,782.000,00**	**96,5 días**	**lun 04/07/16**	**mar 22/11/16**	
2019		**Elaboración de Cartel**	**5,5 días**	**lun 04/07/16**	**lun 11/07/16**	
2020		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 04/07/16	lun 04/07/16	
2021		Elaboracion del cartel (USP)	2 días	lun 04/07/16	mié 06/07/1(	2020
2022		Revisión Técnica de cartel	1 día	mié 06/07/1(	jue 07/07/16	2021

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
2023		Incorporación de ajustes en cláusulas legales y técnicas	1 día	jue 07/07/16	vie 08/07/16	2022
2024		Confección de cartel definitivo	1 día	vie 08/07/16	lun 11/07/16	2023
2025		Invitación a participar en Mer- Link	0,5 días	lun 11/07/16	lun 11/07/16	2024
2026		**Recepción y estudio de ofertas**	**24 días**	**lun 11/07/16**	**mié 17/08/1(**	
2027		**Invitación a participar**	**15 días**	**lun 11/07/16**	**mié 03/08/1(**	
2028		Invitación	5 días	lun 11/07/16	lun 18/07/16	2025
2029		Plazo para recibir recurso de objeción al Cartel	1 día	lun 11/07/16	mar 12/07/1(	2028CC
2030		Resolver recurso de Objeción al cartel	10 días	mar 12/07/1(	mié 27/07/1(	2029
2031		Nuevo plazo para recibir ofertas	4 días	mié 27/07/1(	mié 03/08/1(	2030
2032		**Recepción y estudio de ofertas**	**9 días**	**mié 03/08/1(**	**mié 17/08/1(**	
2033		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	mié 03/08/1(	mié 03/08/1(	2031
2034		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	mié 03/08/1(	mié 03/08/1(	2033
2035		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	4 días	mié 03/08/1(	mar 09/08/1(	2034
2036		Envio de prevenciones	0 días	mar 09/08/1(	mar 09/08/1(	2035
2037		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	2 días	mar 09/08/1(	jue 11/08/16	2036
2038		Análisis de respuesta a prevenciones	2 días	jue 11/08/16	mar 16/08/1(	2037
2039		Elaboración de Informe Técnico	1 día	mar 16/08/1(	mié 17/08/1(	2038
2040		**Recomendación, adjudicación y comunicación**	**12 días**	**mié 17/08/1(**	**vie 02/09/16**	
2041		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	1 día	mié 17/08/1(	jue 18/08/16	2039
2042		**Recurso de revocatoria**	**9 días**	**jue 18/08/16**	**mié 31/08/1(**	
2043		Plazo para recibir recurso	2 días	jue 18/08/16	lun 22/08/16	2041
2044		Plazo para admisibilidad del recurso	2 días	lun 22/08/16	mié 24/08/1(	2043
2045		Plazo para audiencia inicial	2 días	mié 24/08/1(	vie 26/08/16	2044
2046		Resolución de Recurso de revocatoria Art 136 RLCA	3 días	vie 26/08/16	mié 31/08/1(	2045
2047		Adjudicación en firme	2 días	mié 31/08/1(	vie 02/09/16	2046
2048		**Trámite del Pedido**	**5 días**	**vie 02/09/16**	**vie 09/09/16**	
2049		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	vie 02/09/16	lun 05/09/16	2047
2050		Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	3 días	lun 05/09/16	jue 08/09/16	2049
2051		Notificación de Pedido de Compra	1 día	jue 08/09/16	vie 09/09/16	2050
2052		**Recepción de los items**	**18 días**	**vie 09/09/16**	**jue 06/10/16**	
2053		Entrega items en Almacén	15 días	vie 09/09/16	lun 03/10/16	2051
2054		Recibido a satisfacción	3 días	lun 03/10/16	jue 06/10/16	2053

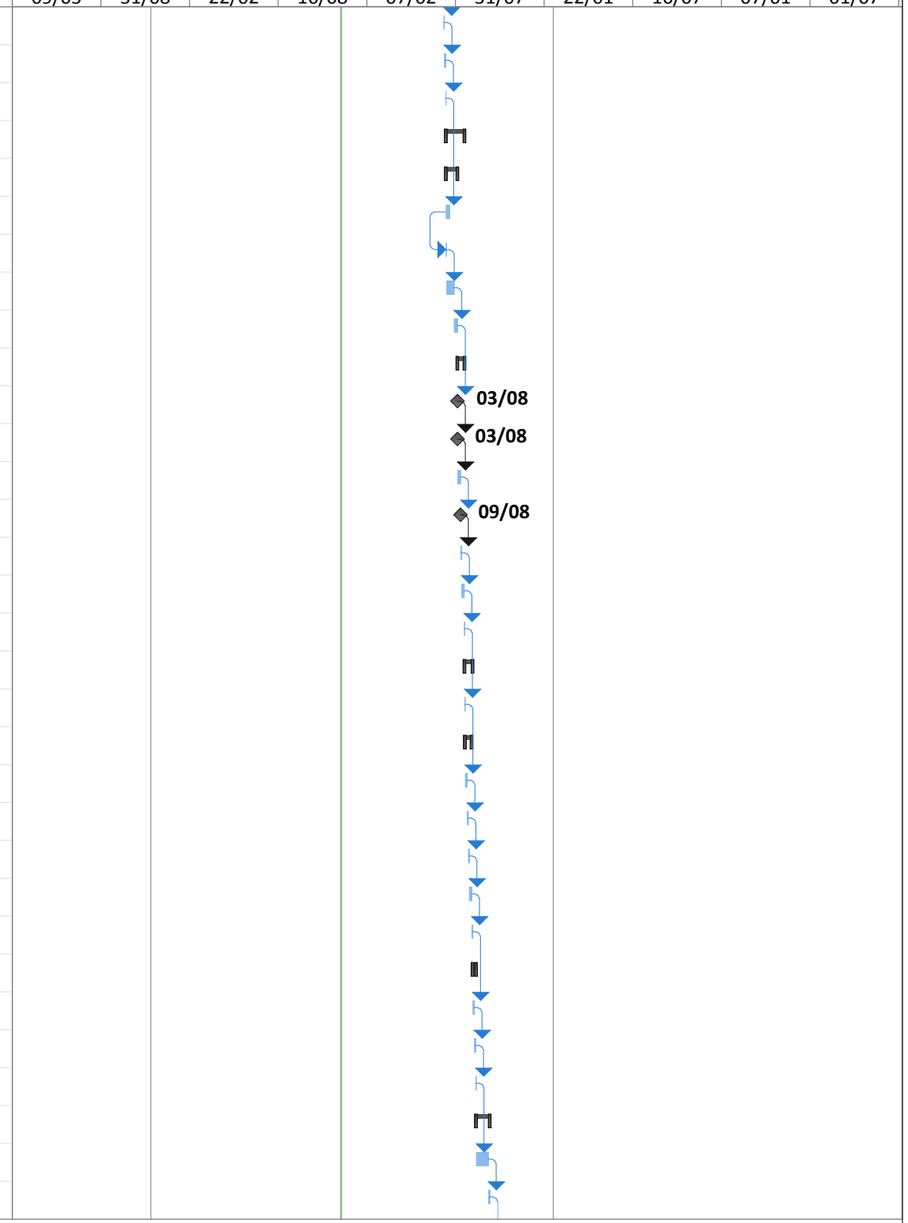

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
2055		**Trámite de pago**	**32 días**	**jue 06/10/16**	**mar 22/11/1**	
2056		Envio documentos a Financiero	2 días	jue 06/10/16	lun 10/10/16	2054
2057		Emisión de pago en Financiero	30 días	lun 10/10/16	mar 22/11/1(	2056
2058		Conclusión trámite de Contratación	0 días	mar 22/11/1(	mar 22/11/1(	2057
2059		**2016CD-0000022-503 CGR_Tiquetes Aéreos (De enero a Dic 2016, Con Objeción y con Revocatoria) ₡14,907.500,00**	**70 días**	**lun 04/01/16**	**jue 14/04/16**	
2060		**Elaboración de Cartel**	**6 días**	**lun 04/01/16**	**mar 12/01/1**	
2061		Recepción Especificaciones técnicas	0 días	lun 04/01/16	lun 04/01/16	
2062		Creación de Código en Mer Link	5 días	lun 04/01/16	lun 11/01/16	2061
2063		Confección de cartel definitivo	1 día	lun 11/01/16	mar 12/01/1(	2062
2064		Invitación a participar en Mer- Link	0 días	mar 12/01/1(	mar 12/01/1(	2063
2065		**Recepción y estudio de ofertas**	**0 días**	**mar 12/01/1**	**mar 12/01/1**	
2066		**Invitación a participar**	**0 días**	**mar 12/01/1**	**mar 12/01/1**	
2067		Envío de invitación	0 días	mar 12/01/1(	mar 12/01/1(	2064
2068		Objeción al cartel	10 días	mar 12/01/1(	mar 26/01/1(	2067
2069		Nuevo plazo para recibir ofertas	5 días	mar 26/01/1(	mar 02/02/1(	2068
2070		**Nuevo plazo para recibir ofertas**	**0,8 días**	**mar 26/01/1**	**mar 26/01/1**	**2068**
2071		**Recepción y estudio de ofertas**	**0,8 días**	**mar 26/01/1**	**mar 26/01/1**	
2072		Apertura de ofertas Mer -Link	0 días	mar 26/01/1(	mar 26/01/1(	
2073		Solicitud de criterio técnico de ofertas	0 días	mar 26/01/1(	mar 26/01/1(	2072
2074		Estudio y valoración de las ofertas estudio técnico	0,8 días	mar 26/01/1(	mar 26/01/1(	2073
2075		Envio de prevenciones	0 días	mar 26/01/1(	mar 26/01/1(	2074
2076		Respuesta a prevenciones (Potenciales oferentes)	0 días	mar 26/01/1(	mar 26/01/1(	2075
2077		Análisis de respuesta a prevenciones	0 días	mar 26/01/1(	mar 26/01/1(	2076
2078		Elaboración de Informe Técnico	0 días	mar 26/01/1(	mar 26/01/1(	2077
2079		**Recomendación, adjudicación y comunicación**	**0,2 días**	**mar 26/01/1**	**mié 27/01/1(**	
2080		Adjudicación y comunicación de Acuerdo de Adjudicación	0,2 días	mar 26/01/1(	mié 27/01/1(	2078
2081		**Recurso de revocatoria**	**15 días**	**mié 27/01/1(**	**mié 17/02/1(**	
2082		Plazo para recibir recurso	2 días	mié 27/01/1(	vie 29/01/16	2080
2083		Resolución de Recurso de revocatoria	10 días	vie 29/01/16	vie 12/02/16	2082
2084		Adjudicación en firme	3 días	vie 12/02/16	mié 17/02/1(	2083
2085		**Trámite del Pedido**	**2 días**	**mié 17/02/1(**	**vie 19/02/16**	

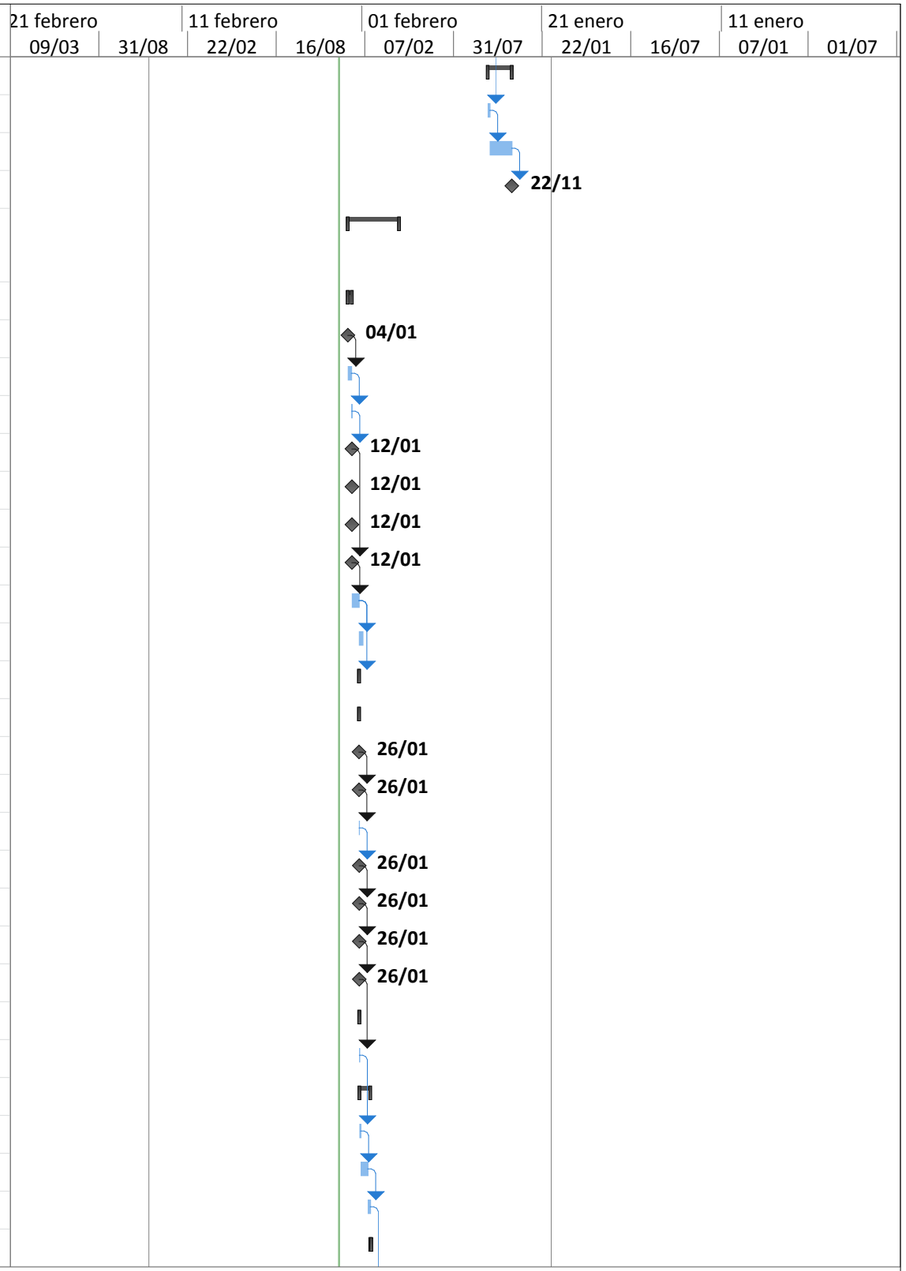

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
2086		Elaboración del Pedido de Compra	1 día	mié 17/02/16	jue 18/02/16	2084
2087		Envio a Financiero, su aprobación y devolución a Proveeduría	1 día	jue 18/02/16	vie 19/02/16	2086
2088		Notificación de Pedido de Compra	0 días	vie 19/02/16	vie 19/02/16	2087
2089		**Recepción de los items**	**4 días**	**vie 19/02/16**	**jue 25/02/16**	
2090		Entrega items en Almacén	1 día	vie 19/02/16	lun 22/02/16	2088
2091		Recibido a satisfacción	3 días	lun 22/02/16	jue 25/02/16	2090
2092		**Trámite de pago**	**32 días**	**jue 25/02/16**	**jue 14/04/16**	
2093		Envio documentos a Financiero	2 días	jue 25/02/16	lun 29/02/16	2091
2094		Emisión de pago en Financiero	30 días	lun 29/02/16	jue 14/04/16	2093
2095		Conclusión trámite de Contratación	0 días	jue 14/04/16	jue 14/04/16	2094
2096		**Artículo 201 RLCA**	**34,97 días**	**lun 11/01/16**	**lun 29/02/16**	
2097		**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**	**21 días**	**vie 29/01/16**	**lun 29/02/16**	
2098		**Contrato Adicional "USG_Radios de comunicación digital" ₡5.000.000,00 (Inicio el 30/01/16)**	**21 días**	**vie 29/01/16**	**lun 29/02/16**	
2099		Elaboración de solicitud de contratacion	5 días	vie 29/01/16	vie 05/02/16	
2100		Envío de solicitud a la USP	1 día	vie 05/02/16	lun 08/02/16	2099
2101		Oficio a empresa preguntando si mantiene términos y condiciones	1 día	lun 08/02/16	mar 09/02/16	2100
2102		Plazo para que la empresa conteste	3 días	mar 09/02/16	vie 12/02/16	2101
2103		Elaboración de Resolución Administrativa	3 días	vie 12/02/16	mié 17/02/16	2102
2104		Revisión y firma de Resolución	3 días	mié 17/02/16	lun 22/02/16	2103
2105		Notificacion de resolución	1 día	lun 22/02/16	mar 23/02/16	2104
2106		Elaboración de pedido de compra	1 día	mar 23/02/16	mié 24/02/16	2105
2107		**Recepción de los items**	**3 días**	**mié 24/02/16**	**lun 29/02/16**	
2108		Entrega items en Almacén	0 días	mié 24/02/16	mié 24/02/16	2106
2109		Recibido a satisfacción	3 días	mié 24/02/16	lun 29/02/16	2108
2110		Fin recepción de items	0 días	lun 29/02/16	lun 29/02/16	2109
2111		**UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN**	**21 días**	**lun 11/01/16**	**mar 09/02/16**	
2112		**Contrato Adicional "UTI_Impresoras láser" ₡8.000.000,00 (Inicio el 11/01/16)**	**21 días**	**lun 11/01/16**	**mar 09/02/16**	
2113		Elaboración de solicitud de contratacion	5 días	lun 11/01/16	lun 18/01/16	
2114		Envío de solicitud a la USP	1 día	lun 18/01/16	mar 19/01/16	2113
2115		Oficio a empresa preguntando si mantiene términos y condiciones	1 día	mar 19/01/16	mié 20/01/16	2114
2116		Plazo para que la empresa conteste	3 días	mié 20/01/16	lun 25/01/16	2115

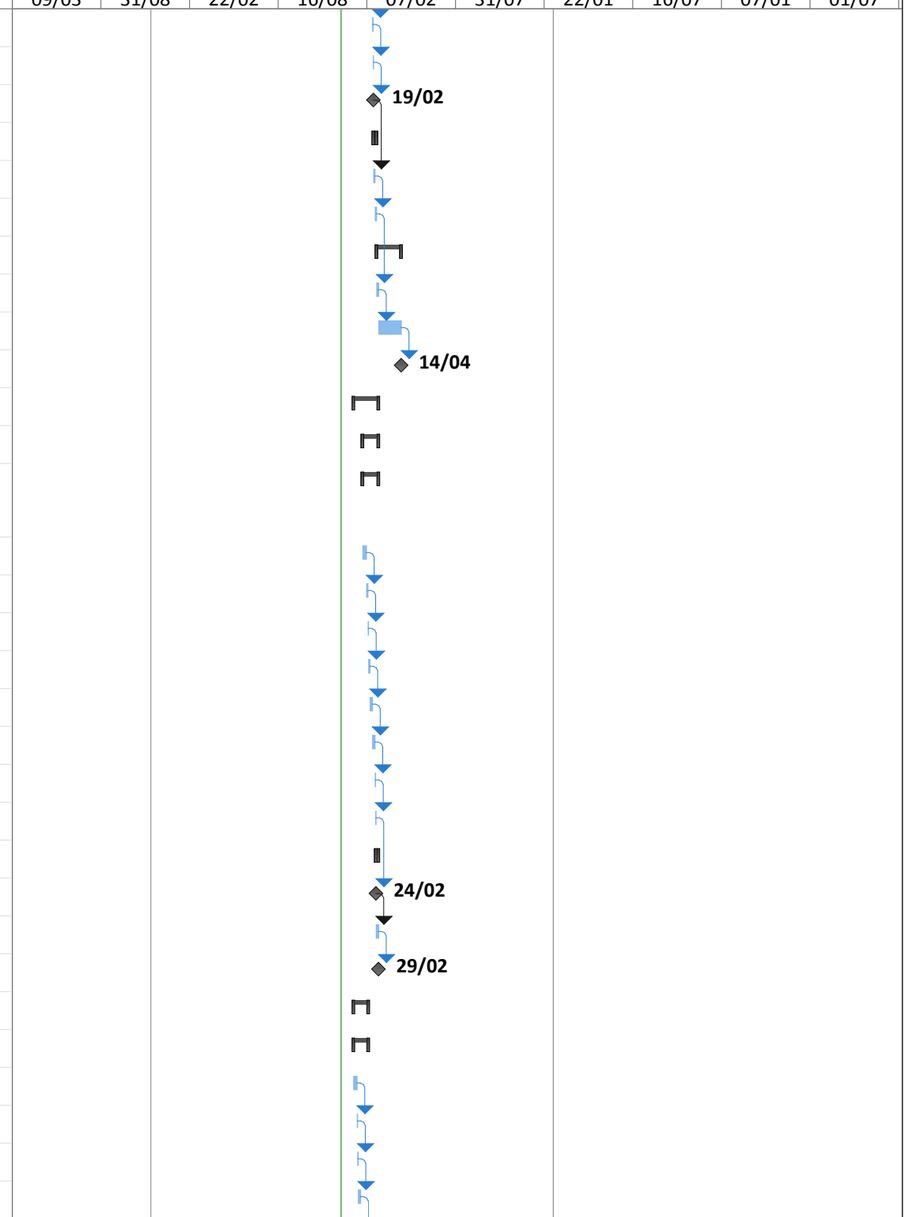

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
2117		Elaboración de Resolución Administrativa	3 días	lun 25/01/16	jue 28/01/16	2116
2118		Revisión y firma de Resolución	3 días	jue 28/01/16	mar 02/02/16	2117
2119		Notificacion de resolución	1 día	mar 02/02/16	mié 03/02/16	2118
2120		Elaboración de pedido de compra	1 día	mié 03/02/16	jue 04/02/16	2119
2121		**Recepción de los items**	**3 días**	**jue 04/02/16**	**mar 09/02/16**	
2122		Entrega items en Almacén	0 días	jue 04/02/16	jue 04/02/16	2120
2123		Recibido a satisfacción	3 días	jue 04/02/16	mar 09/02/16	2122
2124		Fin recepción de items	0 días	mar 09/02/16	mar 09/02/16	2123
2125		**ARTÍCULO 200 RLCA**	**19 días?**	**lun 03/10/16**	**lun 31/10/16**	
2126		**UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN**	**19 días?**	**lun 03/10/16**	**lun 31/10/16**	
2127		**Ampliación de la Licitación Abreviada (con objeción y con revocatoria o apelación):"Adenda de contrato de mantenimiento de componentes de red alámbrica comprados en 2014. (Contrato vence en Dic 2016) (UTI; ¢ 6.648.000)**	**19 días?**	**lun 03/10/16**	**lun 31/10/16**	
2128		Solicitud de ampliación de la licitación	1 día?	lun 03/10/16	lun 03/10/16	
2129		Solicitud a empresa de anuencia para ampliar la contratación en un 50%	2 días	mar 04/10/16	jue 06/10/16	2128
2130		Elaboración de Resolución para ampliación	5 días	jue 06/10/16	vie 14/10/16	2129
2131		Elaboración, formalización y aprobación del contrato	10 días	vie 14/10/16	vie 28/10/16	2130
2132		Ejecución	1 día	vie 28/10/16	lun 31/10/16	2131

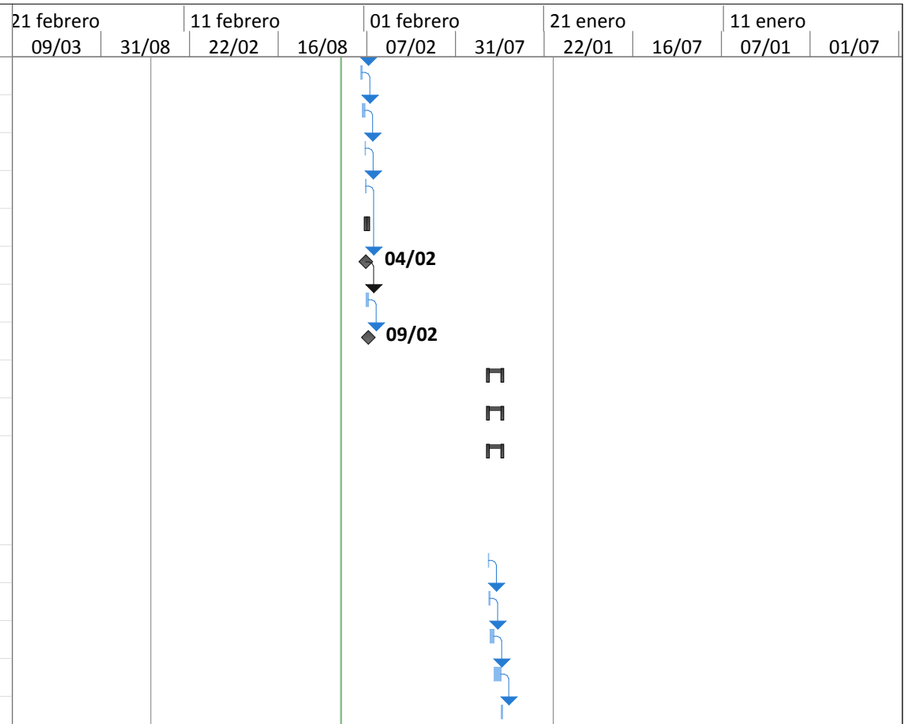

Proyecto: Cronograma de compra
Fecha: vie 18/12/15

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			
